

## Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO 708 89 546  
zástupce: Mgr. Martin Červíček, hejtmán kraje

dále jen „objednatel“ a

#### obchodní firma

**VALC, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677

se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
IČO 45537151  
DIČ CZ45537151  
zastoupený Ing. Pavlem Valcem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2020 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2020-010234, smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 5 – 7, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů (ZL) č. 5 – 7 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
4. Plnění smlouvy bylo přerušeno v období od 23. 8. 2021 do 7. 10. 2021 z důvodu komplikací s dodávkou a montáží výplní otvorů, přičemž do doby dokončení montáží výplní otvorů nebylo možné provádět jakékoli jiné činnosti na stavbě. Lhůta plnění dle článku 6 odst. 3 smlouvy se prodlužuje o délku tohoto období, tj. o 6 týdnů.
5. V návaznosti na změny dle ZL č. 6 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o 18 týdnů, z toho 6 týdnů představuje přerušení stavby z důvodů uvedených v odst. 4 tohoto článku. S ohledem na skutečnost, že změna ovlivňuje realizaci celé stavby, je nutné prodloužit o tuto dobu celkovou dobu realizace stavebních prací.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 5 – 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku.



2. Ustanovení článku 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

*Zhotovitel dokončí stavbu a předá dílo bez vad a nedodělků včetně kolaudačního souhlasu do 9. 6. 2022.*

3. Tabulky ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Celková cena dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH	23.365.635,01
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	23.825.815,09
Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	499.208,16
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	24.325.023,25
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 2	3.648.753,49
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH	27.973.776,74

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne ..... 23. 11. 2021

Za zhotovitele dne.....

\_\_\_\_\_  
Mgr. Martin Červíček  
hejtman Královéhradeckého kraje

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Valc  
jednatel





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	22.03.2021	
<b>Předmět změny:</b> Změna umístění stahovacích schodů do kce stropu <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Z důvodu různých tvarů jednotlivých vazníků střešní konstrukce a jejich umístění dle statického výpočtu je nutné přesunout otvory v konstrukci stropu pro umístění stahovacích schodů. DOZP A z m.č.111 do m.č.101, DOZP B z m.č.211 do m.č.212. Touto změnou nedojde k navýšení ani snížení ceny.		
<b>Přílohy změnového listu:</b> výkres změny umístění DOZP A a DOZP B		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	-	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí		
Datum:	Datum: 26.3.2021	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí		
Datum: 29.03.2021	Datum:	












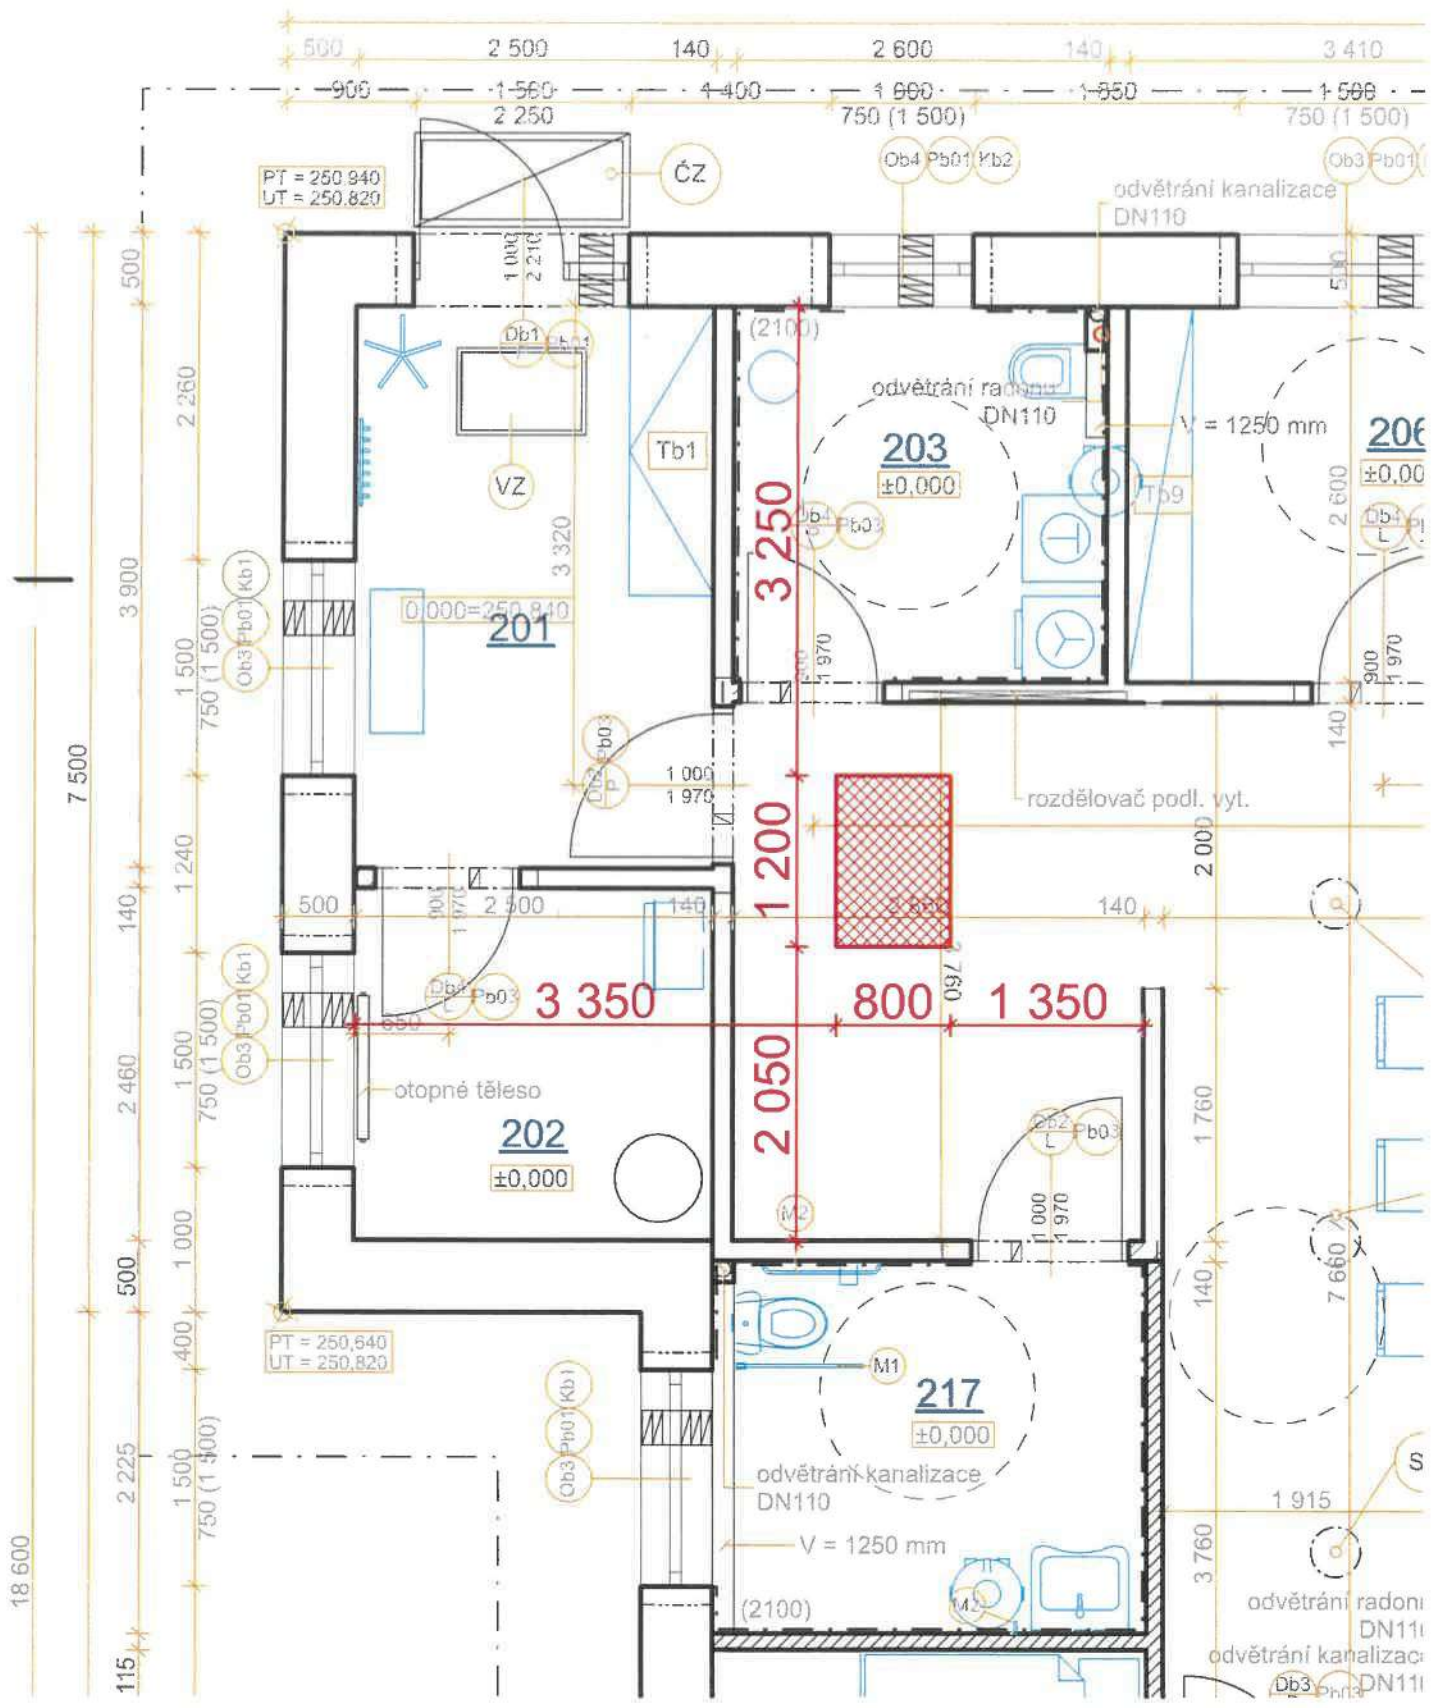

**DOZP B**





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 06
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	11.10.2021	
<b>Předmět změny:</b>	Výplně otvorů	
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>	Při zpracování výrobní dokumentace výplní otvorů byl GD vznešen dotaz ohledně vlastností oken z hlediska třídy bezpečnosti zasklení. Z důvodu nemožnosti současného dodržení požadovaných tepelně izolačních vlastností, bylo GP od původně požadované ochrany oken třídy bezpečnosti PB7 upuštěno. Nově bude z vnější strany (exteriér) sklo se základní úrovní ochrany, <b>Třída: P2A</b> . Z vnitřní strany (interiér) bude provedeno sklo se zvýšenou úrovní ochrany, <b>Třída: P5A</b> . Touto změnou nedojde k navýšení ani snížení ceny. Z důvodu požadavku budoucího provozovatele objektu DOZP na zajištění průjezdu z pokoje do venkovního prostoru s minimální průjezdnou šířkou, která se rovná šířce postele - 1,1m, dojde ke změně členění výplní otvorů v objektu DOZP A označených jako Oa1 a v objektu DOZP B označených jako Ob1. Místo původně navrženého jednokřídlého okna s postranním fixem s průjezdnou šířkou 935mm, bude provedeno otvíravé dvoukřídlé okno bez středového sloupku s bezbariérovým prahem. Zároveň dojde i ke změně vchodových dveří označených Da1 a Db1. Původní jednokřídlé dveře s postranní fixní částí budou provedeny jako dvoukřídlé dveře bez středního sloupku s průchozí šířkou obou křídel 1 286 mm. U těchto dveří bude provedena i změna ve tvaru zasklení. Navýšení ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze. Výše uvedené změny budou mít vliv na termín provedení díla, který se tímto posune o 12 týdnů (k posunu termínu dochází především z důvodu projednávání a schvalování výrobní dokumentace výplní otvorů - viz příloha tohoto ZL) + 6 týdnů přerušení stavby (z důvodu komplikací s dodávkou a montáží výplní otvorů, přičemž do doby dokončení montáží výplní otvorů nebylo možné provádět jakékoli jiné činnosti na stavbě), to je dohromady 18 týdnů.	
<b>Přílohy změnového listu:</b>	položkový rozpočet, výrobní dokumentace dotčených pozic, nabídka zhotovitele oken	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	226 160,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	změny uvedené v tomto ZL budou mít dopad na termín provedení díla, který se tímto <b>posune o 18 týdnů</b>
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	



## Změna posunu termínu o 18 týdnů

e-mailová korespondence:

Montáž výplní dle původního harmonogramu - 04/2021 - 05/2021	
06.04.2021	p. - pro zpracování VD upřesnění pozic s bezp.sklem
07.04.2021	p. - prověření třídy bezp.skel
12.04.2021	p. upřesnil třídy bezp.skel
22.04.2021	nabídka od PKS
29.04.2021	upravená nabídka od PKS
05.05.2021	zaslán PKS návrh SOD
17.05.2021	požadavek na klikové ovladače
21.05.2021	výrobní dokumentace od PKS
26.05.2021	požadavek na průchody
26.05.2021	2. verze VD od PKS
27.05.2021	2.verze VD zaslána investorovi
31.05.2021	3. verze VD od PKS a přeposláno investorovi
05.06.2021	schůzka průchod dveřmi
10.06.2021	4. verze VD od PKS a přeposláno investorovi
14.06.2021	urgence schválení VD
15.a16.6.2021	souhlas investora a zaslání odsouhlasení VD PKS
18.06.2021	uzavřena SOD s PKS výroba oken 6-8 týdnů
02.07.2021	dopřesnění madel
19.08.2021	info od PKS o posunu montáže - viz příloha
<b>23.08.2021</b>	<b>přerušlení stavebních prací</b>
01.09.2021	PKS další posun dodávky skel a montáže - viz příloha
13.09.2021	PKS - viz příloha
01.10.2021	PKS - upřesnění termínu montáže - viz příloha
<b>07.10.2021</b>	<b>zahájení stavebních prací - návoz oken</b>
08.10.2021	zahájení montáže oken na stavbě
15.10.2021	dokončení montáže oken na stavbě



---

**Od:**  
**Odesláno:** pátek 1. října 2021 14:41  
**Komu:**  
**Předmět:** FW: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů - zakázky Valc - 21P04504 a 21P04932

S pozdravem

přípravář realizace

**VALC, s.r.o.**  
Pražská 13/84  
Hradec Králové  
500 04  
mobil:  
telefon:  
fax:  
email:



### STAVEBNÍ FIRMA ROKU 2018

Společnost VALC, s.r.o. Vás tímto upozorňuje, že Vám na základě kterékoli fáze jednání vedených v souvislosti s předmětnou poptávkou nemůže vzniknout nárok na náhradu škody dle § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, neboť vedeme jednání na zadání této konkrétní zakázky s více uchazeči a vybíráme z nich toho, jehož nabídka je nejvhodnější.

**From:**  
**Sent:** Friday, October 1, 2021 2:38 PM  
**To:**  
**Cc:**  
**Subject:** RE: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů - zakázky Valc - 21P04504 a 21P04932

Dobrý den,

zasílám aktuální informace k zakázce DD Borohrádek:

Materiál na 1. etapu je ( dnes ověřeno ) potvrzen na příští středu 6.10.2021, poté zahájíme výrobu.



nástup na montáž nejdříve v týdnu od 11.10.2021 - přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor stavby p.

Materiál na 2. etapu (stěny) máme zatím přísliben na 44. týden, tedy zahájení dodávky je reálné ve 45. týdnu – tento termín budeme v čase ještě upřesňovat (potvrzovat)

Další revidují termíny na akci USP Kvasiny:

Příslibená dodávka skel včera neproběhla, sklo dorazilo až dnes odpoledne

Výplně budeme zasklívat zkraje příštího týdne, návoz a zahájení montáží plánujeme na čtvrtek 7.10.2021 – přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor p.

S pozdravem

regionální obchodní ředitel oblast Brno, východní Čechy

**PKS | okna**

**PKS okna a.s.**

Brněnská 126/38

591 01 Žďar nad Sázavou

Tel: +420 565 222 222

Mobil: +420 732 222 222

e-mail: [info@pksokna.cz](mailto:info@pksokna.cz)

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

■ Skupina firem PKS



Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

**From:** PKS okna a.s.

**Sent:** Thursday, September 23, 2021 1:30 PM

**To:** [info@pksokna.cz](mailto:info@pksokna.cz)

**Cc:** [info@pksokna.cz](mailto:info@pksokna.cz)

**Subject:** RE: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů

Dobrý den,

Bohužel jsem se Vám nedovolal, navazuji na včerejší telefonát a zasílám aktuální informace k zakázce DD Borohrádek:

Materiál na 1. etapu dorazí nejdříve ve středu 6.10.2021 (optimistický odhad), nejpozději následující týden 13.10.2021, poté obratem zahájíme výrobu.

finální potvrzení od dodavatele materiálu budeme mít příští týden st-čt

nástup na montáž nejdříve v týdnu od 11.10.2021, nejpozději v týdnu od 18.10.2021 - přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor stavby p.

Materiál na 2. etapu (stěny) máme zatím přislíben na 44. týden, tedy zahájení dodávky je reálné ve 45. týdnu – tento termín budeme v čase ještě upřesňovat (potvrzovat)

Dále rekapituluji včera avizované termíny na akci USP Kvasiny.

Dodávka skel potvrzena na čtvrtek 30.9., v pátek 1.10.2021 zasklení křidel a v týdnu od 4.10. plánujeme navoz výplní a zahájení montáží

Omlouvám se za způsobené nepříjemnosti a komplikace

S pozdravem

regionální obchodní ředitel oblast Brno, východní Čechy

**PKS | okna**

**PKS okna a.s.**

Brněnska 125/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Tele: +

Mobil: +

e-mail: .....

www.pksokna.cz

■ Skupina firem PKS



Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoli jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoli fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

**From:** .....

**Sent:** Monday, September 13, 2021 3:29 PM

**To:** .....

**Cc:** .....

**Subject:** RE: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů

Dobrý den,

zasílám aktuální informace k zakázce DD Borohrádek:

Materiál na 1. etapu má dle dnešní informace dorazit příští týden ve středu 22.9.2021, poté obratem zahájíme výrobu. Expedice by mohla proběhnout hned následující týden, přesný den návozu a zahájení montáží potvrdí realizátor stavby p.

---

**Od:**  
**Odesláno:** pondělí 13. září 2021 15:30  
**Komu:**  
**Kopie:**  
**Předmět:** RE: Termín k zakázce 4932-21 VALC

Zdravím Vás,

Opětovně se omlouváme za způsobené komplikace vlivem výpadku vstupních materiálů našich dodavatelů, což nám znemožňuje plnit dohodnuté smluvní termíny.

Na akci ÚSP Kvasiny jsem Vás dne 1.9.2021 telefonicky informoval o aktuálním stavu, kdy jsme měli kompletně vyrobené rámy a křídla oken bez zasklení, na které jsme netrpělivě čekali, abychom mohli výplně osadit.

Jako vstřícný krok jsme navrhovali určité „nestandardní“, řešení v podobě možného osazení pouze rámu oken. Následně bychom po dodávce skel provedli dokompletaci křidel na přelomu září a října. Nicméně zpětná informace z Vaší strany byla pozastavení stavby objednatelem na jeden měsíc.

Na základě této informace nyní čekáme na dodávku zasklení pro zkompletování křidel a ihned poté budeme zakázku expedovat a zahájíme montáž výplní.

Mrzí mě, že pro Vás nemám v této chvíli lepší zprávy, ale snažíme se max. tlačit na dodavatele, abychom mohli zahájit montáže co nejdříve.

S pozdravem

obchodník Východní Čechy

**PKS | okna**

PKS okna a.s.

Soukenická 155, Chrudim

Mobil:

e-mail:

[www.pksozna.cz](http://www.pksozna.cz)

■ Skupina firem PKS



**OKNA PROVĚŘENÁ  
VYSOČINOU**

Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

**From:**

**Sent:** Friday, September 10, 2021 12:50 PM

**To:**

**Cc:**

**Subject:** RE: Termín k zakázce 4932-21 VALC

Dobrý den,

děkujeme za Váš email týkající se zpoždění Vaší dodávky na zakázce ÚSP Kvasiny z důvodu nedostatku surového skla a bezpečnostních fólií.

Vzhledem k tomu, že na Vaší dodávce jsou závislé další navazující práce a pro případ prodlení s dodáním celého díla investorovi (Královehradecký kraj) byly sjednány smluvní pokuty, jsme nuceni zcela v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo trvat na dodržení sjednaných termínů. V případě jejich nedodržení budeme zřejmě nuceni přistoupit i k uplatnění příslušných smluvních pokut dle smlouvy.

Výpadek Vašeho dodavatele nás mrzí, nicméně nemůže jít nijak k naší tíži.

S pozdravem

příprava

**VALC, s.r.o.**

Pražská třída 13/84

Hradec Králové - Kukleny

500 04

Mobil:

E-mail: \_\_\_\_\_

IČ: 455 37 151



Společnost VALC, s.r.o. Vás tímto upozorňuje, že Vám na základě kterékoli fáze jednání vedených v souvislosti s předmětnou poptávkou nemůže vzniknout nárok na náhradu škody dle § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, neboť vedeme jednání na zadání této konkrétní zakázky s více uchazeči a vybíráme z nich toho, jehož nabídka je nejvhodnější.

**From:**

**Sent:** Wednesday, September 1, 2021 11:25 AM

**To:**

**Cc:**

**Subject:** Termín k zakázce 4932-21 VALC

Dobrý den, paní ,

v návaznosti na dnešní telefonát s Vaším kolegou jsem nucen předat špatné zprávy ohledně termínu realizace zakázky ÚSP Kvasiny.

Bohužel jsem dostal informaci od skláren, že dodávku skel posouvají o celý měsíc na 28. 9. 2021.



---

**Od:**  
**Odesláno:** středa 1. září 2021 11:25  
**Komu:**  
**Kopie:**  
**Předmět:** Termín k zakázce 4932-21 VALC

Dobrý den, paní ,

v návaznosti na dnešní telefonát s Vaším kolegou jsem nucen předat špatné zprávy ohledně termínu realizace zakázky ÚSP Kvasiny.

Bohužel jsem dostal informaci od skláren, že dodávku skel posouvají o celý měsíc na 28. 9. 2021.

Původně jsme měli dodávku potvrzenou na konec srpna, ale z důvodu nedostatku surového skla a bezpečnostních fólií nejsou schopni našemu požadavku vyhovět.

Nejbližší možný termín expedice z naší strany je tedy nově stanoven na 1. 10. 2021 za podmínky, že nám skla budou reálně dodána.

Za tyto komplikace se znovu omlouvám, nicméně jedná se o věc, kterou jako firma nejsme schopni ovlivnit. Na trhu nejsou materiály, které potřebujeme pro kompletaci našich výrobků.

Děkuji za pochopení a v případě potřeby se obraťte na mě nebo kolegu

S pozdravem

připravář, zakázkář provozu Plastová okna

**PKS | okna**

**PKS okna a.s.**

Brněnská 126/38

591 01 Žďár nad Sázavou

Tel:

Fax:

Mobil:

e-mail:

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

■ Skupina firem PKS



Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

---

**Od:**  
**Odesláno:** čtvrtek 19. srpna 2021 14:30  
**Komu:**  
**Kopie:**  
**Předmět:** RE: ÚSP Třebechovice - ZL č.06 a ZL č.07

Dobrý den, k Vašemu dotazu přeposílám e-mail od dodavatele oken PKS – viz níže. Bližší info zatím nemáme, doufáme, že začnou montovat, jak uvádějí.

S pozdravem

příprava

**VALC, s.r.o.**  
Pražská třída 13/84  
Hradec Králové - Kukleny  
500 04  
Mobil:  
E-mail:  
IČ: 455 37 151



Společnost VALC, s.r.o. Vás tímto upozorňuje, že Vám na základě kterékoli fáze jednání vedených v souvislosti s předmětnou poptávkou nemůže vzniknout nárok na náhradu škody dle § 1729 odst. 2 občanského zákoníku, neboť vedeme jednání na zadání této konkrétní zakázky s více uchazeči a vybíráme z nich toho, jehož nabídka je nevhodnější.

**From:**  
**Sent:** Friday, August 13, 2021 10:37 AM  
**To:**  
**Subject:** ÚSP Kvasiny - 21P4932

Dobrý den,

Na základě společného telefonátu zasílám info k akci ÚSP Kvasiny

Prověřoval jsem termín dodávky materiálu na tuto zakázku

Nyní máme přísliben materiál na okna + rámy VD na 26.8.2021, nejpozději do 30.8.2021, podobný posun dodávky nám avizují i skláři z důvodu nedostatku skloviny  
Poté bychom obratem zahájili výrobu s tím, že se pokusíme nasměrovat zahájení montáže prvků od 6.9.2021

Dodávka křidel vchodových dveří v tomto termínu není jistá, ale předpokládám, že je pro Vás zásadní dodat alespoň rámy, abyste mohli dělat fasádu, křídla bychom dodatečně dovezli, až přijde materiál, i když je to náročnější z pohledu sesazení na stavbě než na dílně, nemluvě o ostatních nákladech s tím spojených

Mrzí mě, že pro Vás nemám lepší zprávy, ale v této době jsme rádi, za každý profil, který k nám dorazí a můžeme vyrobit aspoň některé prvky a části z této zakázky

S pozdravem

regionální obchodní ředitel oblast Brno, východní Čechy

**PKS | okna**

**PKS okna a.s.**

Brněnska 126/38

591 01 Žďar nad Sázavou

Tel:

Mobil: +

e-mail:

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

■ Skupina firem PKS



Tento e-mail nepředstavuje nabídku či její přijetí a společnost PKS okna a.s. nenesе žádné následky z ukončení vyjednávání o uzavření smlouvy v jakékoliv jeho fázi, a to i bez spravedlivého důvodu, což adresát tohoto e-mailu bere na vědomí. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy není považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

**From:**

**Sent:** Thursday, August 19, 2021 2:13 PM

**To:**

**Cc:**

**Subject:** RE: ÚSP Třebechovice - ZL č.06 a ZL č.07

Dobrý den,

Chci požádat o info, kdy bude zahájena D+M výplní otvorů (PKS).

S pozdravem,





<p>počasi jasně 26°C  pracovní doba 4<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  počet pracovníků: 2x vate  provedené práce: Rozbrazení zámkové dlaždy  uklepání vodometné šachty a zvednutí  na současný terén</p>	<p>19. 8. 2021  ČT</p>
<p>počasí polojasně 26°C  pracovní doba 4<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  počet pracovníků: 2x vate  provedené práce: Zapískování vodovodního  potrubí uložení vodometné šachty</p>	<p>20. 8. 2021  PA'</p>
<p>Dnešního dne porostujeme startu - níz  oficiální dopis investitori startu.  za zhotovitele:</p>	<p>23. 8. 2021  pauze'</p>
<p>počasí oblačno 3°-12°C  pracovní doba 4<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  počet pracovníků: 1x vate 3x PKL OKNA  provedené práce: Navážení oken a materiálů  na startu</p>	<p>2. 10. 2021  ČT</p>
<p>Dnešního dne byla opětovně zahájena  práce na ÚSP Trávekouice.</p>	
<p>počasí oblačno 3°-12°C  pracovní doba 4<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  počet pracovníků: 1x vate - 3x PKL OKNA  provedené práce: Montáž oken</p>	<p>9. 10. 2021  PA'</p>

## Změna č. 2) - členění a způsob otvírání oken a vchodových dveří

226 160,00

## ÚSP Třebechovice pod Orebem - DOZP A

113 080,00

D	K	766	Konstrukce truhlářské				
272	K	7668R201	plastové okno 2 kř 2100 x 2250 mm ozn. Oa1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	6,000		
272-1			dvoukřídle dovnitř otvíravé dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix - navýšení ceny 1 - fix pevně zasklený do rámu 2 - vedlejší otvíravé křídlo 3 - hlavní otvíravé-sklopné křídlo pozice OA1 2 ks, pozice OA1A 4 ks	ks	6,000	17 092,00	102 552,00
278	K	7668R2071	plastové vstupní dveře 1 kř s bočním světlíkem 1500 x 2210 mm ozn. Da1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000		
278-1			plastové vstupní dveře 2 kř 1500 x 2210 mm ozn. DA1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M - navýšení ceny	ks	1,000	10 528,00	10 528,00

## ÚSP Třebechovice pod Orebem - DOZP B

113 080,00

D	K	766	Konstrukce truhlářské				
271	K	7668R201	plastové okno 2 kř 2100 x 2250 mm ozn. Ob1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	6,000		
271-1			dvoukřídle dovnitř otvíravé dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix - navýšení ceny 1 - fix pevně zasklený do rámu 2 - vedlejší otvíravé křídlo 3 - hlavní otvíravé-sklopné křídlo pozice OB1 3 ks, pozice OB1 1 ks, pozice OB1A 1 ks, pozice OB1A 1 ks	ks	6,000	17 092,00	102 552,00
277	K	7668R2071	plastové vstupní dveře 1 kř s bočním světlíkem 1500 x 2210 mm ozn. Db1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000		
277-1			plastové vstupní dveře 2 kř 1500 x 2210 mm ozn. DB1 vč. všech předepsaných doplňků vč. všech souv. dodávek a prací D+M - navýšení ceny	ks	1,000	10 528,00	10 528,00

pos. : **DA1**

ks : **1**


Barva rámu : **Anthrazitgrau/Anthrazitgrau**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Anthrazitgrau**

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo **CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F**

VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN => **NÁKRES ZVENKU!**

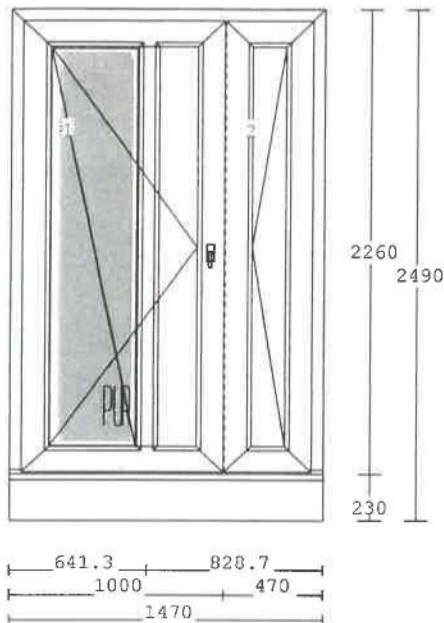

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo **868mm**  
- obě křídla **1 286mm**

**Podchozí výška dveří:** **2 168mm**

#### Popis:

- dvoukřídlé ven otvíravé vchodové dveře bez pevného svislého sloupku
- 1 – hlavní ven otvíravé levé křídlo + 2 – vedlejší ven otvíravé pravé křídlo
- ve spodní části **dveří** je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 200mm
- $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Příslušenství:

- dveřní klika/**koule** – široký štítek, **ušlechtilá ocel**
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**
- dveřní panty, **stříbrná**
- **cyklindrická vložka s 10ti klíči**; vložka na interiéru s kulatou olivou
- samozavírač GEZE TS4000, ramínko s aretací, **stříbrná**
- dveřní stavěč, **stříbrná**

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 1 499 – 1 502mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 275 – 1 279mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 245 – 1 249mm

Vypracoval:

Dne: 9.6.2021



pos. : DB1

ks : 1


Barva rámu : Anthrazitgrau/Anthrazitgrau

Barva křídla: Anthrazitgrau/Anthrazitgrau

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN => NÁKRES ZVENKU!

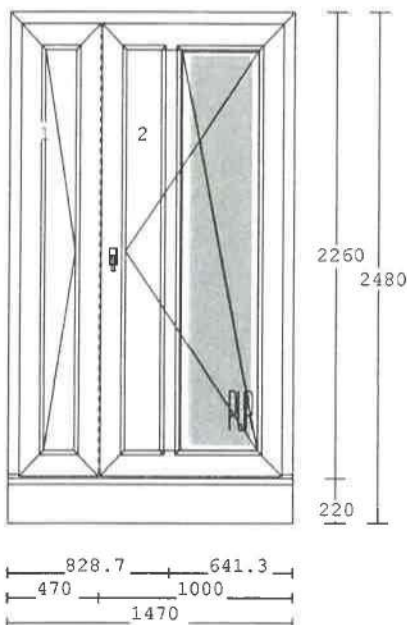

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo **868mm**  
- obě křídla **1 286mm**

**Podchozí výška dveří:** **2 168mm**

#### Popis:

- dvoukřídle ven otvíravé vchodové dveře bez pevného svislého sloupku
- 1 – vedlejší ven otvíravé levé křídlo + 2 – hlavní ven otvíravé pravé křídlo
- ve spodní části **dveří** je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Příslušenství:

- dveřní klika/**koule** – široký štítek, **ušlechtilá ocel**
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerex**
- dveřní panty, **stříbrná**
- ~~cylindrická vložka s 10ti klíči~~; vložka na interiéru s kulatou olivou
- samozavírač GEZE TS4000, ramínko s aretací, **stříbrná**
- dveřní stavěč, **stříbrná**

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 1 500mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 270 – 1 272mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 245 – 1 237mm

Vypracoval:

Dne: 9.6.2021

pos.: OA1

ks: 2


Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

<b>CX33.2 IT CL</b>	- bezpečnostní sklo Connex 2x 3mm sklo + 2x bezp.fólie (2x0,38mm)
<b>14</b>	- distanční rámeček Chromatec Ultra - šířka 14mm
<b>4IT CL ESG</b>	- čiré sklo tl. 4mm s pokovením, kalené
<b>14</b>	- distanční rámeček Chromatec Ultra - šířka 14mm
<b>CX44.6 IT CL</b>	- bezpečnostní sklo Connex 2x 4mm sklo + 6x bezp.fólie (6x0,38mm)
<b>Ar</b>	- mezera mezi skly vyplněna plynem (Argon)
<b>Ug</b>	- součinitel prostupu tepla skla (0,6 W/m <sup>2</sup> *K)
<b>ChU-F</b>	- distanční rámeček Chromatec Ultra (šedý)

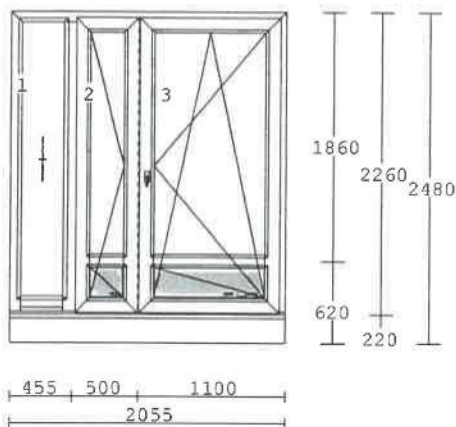

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo **982mm**  
- obě křídla **1 460mm**

**Podchozí výška dveří:** **3 055mm**

#### Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídli a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – fix pevně zasklený do rámu + 2 – vedlejší otvíravé levé křídlo + 3 – hlavní otvíravě-sklopné pravé křídlo
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

#### Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru:	2 097 – 2 103mm
Váhorys /od budoucí čisté podlahy/:	1 000mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/:	1 279 – 1 284mm
Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/:	- 1 234 – 1 242mm

Vypracoval:

Dne: 9.6.2021

pos. : **OA1A**


ks: **4**

Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - **PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)**

- **trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F**

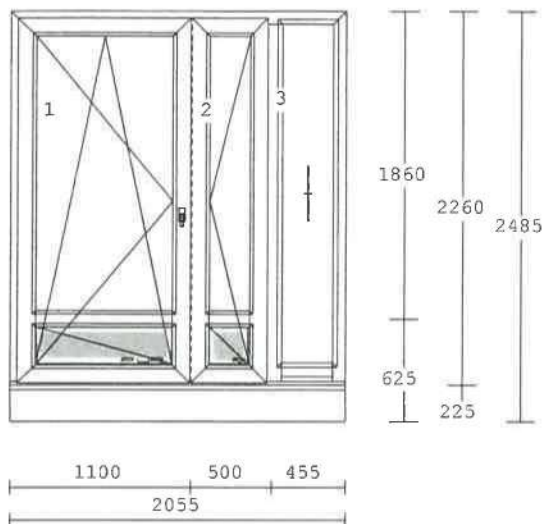

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo **982mm**  
- obě křídla **1 460mm**

**Podchozí výška dveří:** **3 055mm**

#### Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – hlavní otvíravě-sklopné levé křídlo + 2 – vedlejší otvíravé pravé křídlo + 3 – fix pevně zasklený do rámu
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 195mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 088 – 2 105mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 277 – 1 284mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 238 – 1 250mm

Vypracoval:

Dne: 9.6.2021

pos.: OB1


ks: 3

Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojtklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

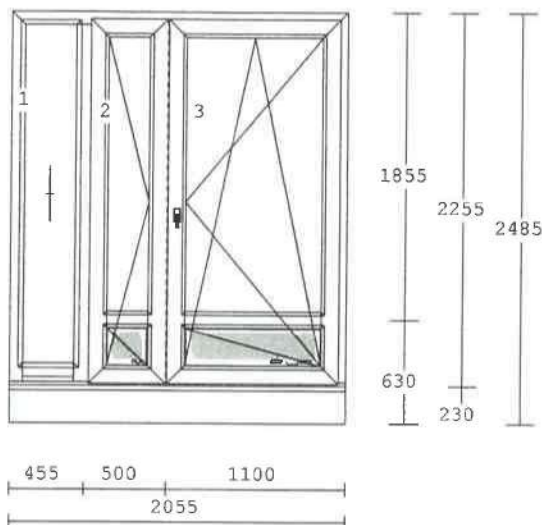

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo **982mm**  
- obě křídla **1 460mm**

**Podchozí výška dveří:** **3 055mm**

#### Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – fix pevně zasklený do rámu + 2 – vedlejší otvíravé levé křídlo + 3 – hlavní otvíravě-sklopné pravé křídlo
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 273 – 1 277mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 239 – 1 245mm



pos. : OB1'


ks:1

Barva rámu : Anthrazitgrau/Bílá

Barva křídla: Anthrazitgrau/Bílá

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

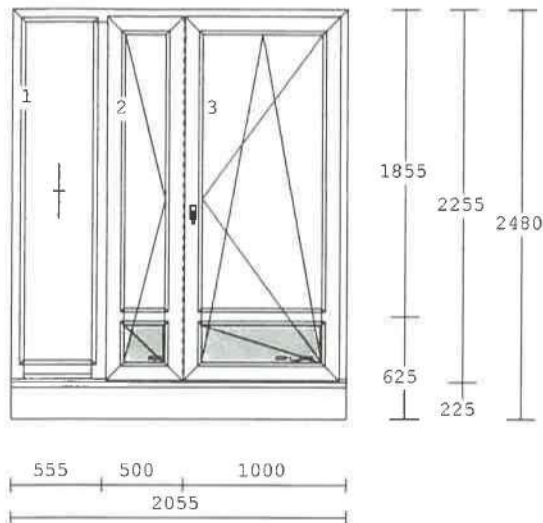

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo 982mm  
- obě křídla 1 460mm

**Podchozí výška dveří:** 3 055mm

### Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – fix pevně zasklený do rámu + 2 – vedlejší otvíravé levé křídlo + 3 – hlavní otvíravě-sklopné pravé křídlo
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 195mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Příslušenství:

- klika okenní, bílá
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, nerez

### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 273 – 1 277mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 239 – 1 245mm

Vypracoval:

Dne: 9.6.2021

pos.: OB1A


ks: 1

Barva rámu : Anthrazitgrau/Bílá

Barva křídla: Anthrazitgrau/Bílá

Zasklení: - PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)

- trojtklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F

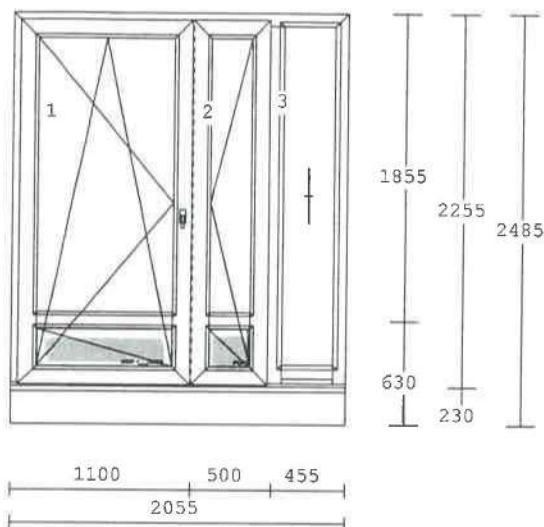

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo 982mm  
- obě křídla 1 460mm

**Podchozí výška dveří:** 3 055mm

#### Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – hlavní otvíravě-sklopné levé křídlo + 2 – vedlejší otvíravé pravé křídlo + 3 – fix pevně zasklený do rámu
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$

#### Příslušenství:

- klika okenní, bílá
- vodorovné dveřní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, nerez

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlad/: 1 270 – 1 277mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 237 – 1 248mm

pos. : **OB1A'**


ks: **1**

Barva rámu : **Anthrazitgrau/Bílá**

Barva křídla: **Anthrazitgrau/Bílá**

Zasklení: - **PUR deska tl. 44mm, Anthrazitgrau/Anthrazitgrau (probarvená část v obrázku)**

- **trojsklo CX33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/CX 44.6 FCL + Ar, Ug 0,6, ChU-F**

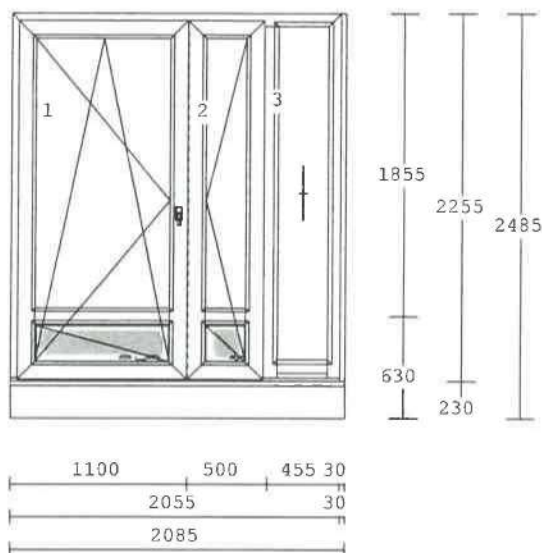

**Průchozí šířka dveří:** - hlavní křídlo **982mm**  
- obě křídla **1 460mm**

**Podchozí výška dveří:** **3 055mm**

#### Popis:

- dvoukřídle dovnitř otvíravé balkonové dveře bez pevného svislého sloupku mezi křídly a s pevným svislým sloupkem, který odděluje boční fix
- balkonové dveře s hliníkovým prahem / fix bude s okopem
- 1 – hlavní otvíravě-sklopné levé křídlo + 2 – vedlejší otvíravé pravé křídlo + 3 – fix pevně zasklený do rámu
- ve spodní části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil výšky 30mm + tepelně izolační purenitový profil výšky 190mm
- v pravé části je na rámu uložen rozšiřovací PVC profil šířky 30mm
- $U_w = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

#### Příslušenství:

- klika okenní, **bílá**
- vodorovné dvevní madlo BERYL A30, jednostranné, na celou šířku křídla, **nerez**

#### Stavební otvor:

Změřená šířka otvoru: 2 084 – 2 100mm  
 Váhorys /od budoucí čisté podlahy/: 1 000mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po překlád/: 1 270 – 1 277mm  
 Změřená výška otvoru /od váhorysu po základovou desku/: - 1 237 – 1 248mm



PKS okna a.s.

15921 - 0100

Řemeslníků 130, 537 01 Chrudim, Tel: 465 222 222

fax: 465 222 221, e-mail: info@pks.cz

[www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)



## CENOVÁ NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

Vážení paní, vážený pane, dovoluujeme si Vám předložit cenovou nabídku **na navýšení úpravy plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 30leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na [www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

Zadavatel: VALC HK Hradec Králové

**Cenová nabídka: P004856H1 – úpravy, navýšení ceny**

ze dne 9.6.2021

Zpracoval:

**PKS okna a.s.**

Soukenická 155


537 01 Chrudim

Telefon :

E-mail :



Pozice	Množství	Popis	Cena / celkem
DA1,	1 ks		

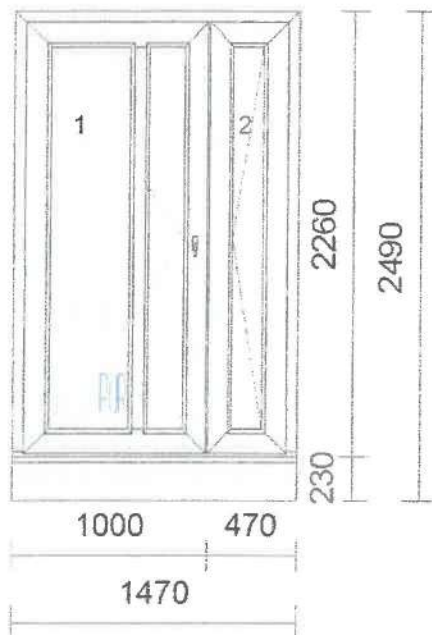

Typ: **Plastové dveře 88**  
 Profil: 88MD  
 Rám: 88172 rám VD s prahem  
 Křídlo: 2x 88277 kř. VD ven k prahu  
 BarvaEx/In: **Anthrazitgrau|Anthrazitgrau**  
 Kování: VD L Automat, VD P Automat štulp  
 VD pant: stříbrný  
 Výplň: 44mm nthrazitgrau/Anthrazitgrau,  
 2 x 6.8Cx33.2 IT CL/14/4IT CL  
 SG/14/10.4Cx44.6 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL  
 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.49.2mm)  
 Příčky: Příčka 88301 100mm  
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:  
                   dole 200 mm Purenit 200/60mm  
                   dole 30 mm Rozšiřovací profil 30mm Lichtgrau  
 Rozměry: 1470mm x 2260mm  
 Hmotnost: 187 Kg

**Poznámka:**

VCHODOVÉ DVEŘE OTVÍRAVÉ VEN!  
 VODOROVNÉ MADLO BUDE OSZAENO VE VÝŠCE 850MM  
 VODOROVNÉ MADLO OSAZENO Z INTERTIÉRU!

Madlo BERYL-TYP A30, NEREZ, NA HL.KŘÍDLO, JEDNOSTRANNĚ, VODOROVNĚ

Zámková vložka 45+65


Oliva kulatá

Dveřní stavěč stříbrný-NENÍ INTEGROVANÝ V SAMOZAVÍRAČI!! -

KLIKA/KOULE HOPPE DALLAS F69 PZ-92 s překrytím cyl.vložky

barva F69 ušlechtilá ocel

Samozavírač GEZE TS4000 rameno s aretací, barva stříbrná

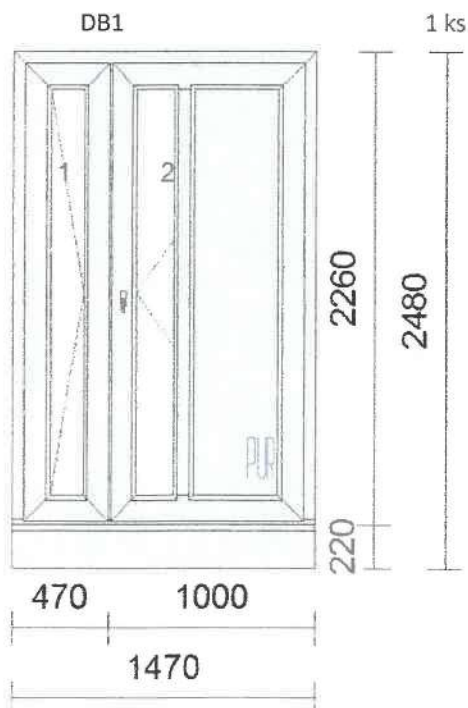

**Změny proti původní pozici:**

Vzhled - jiné členění – dopřesněno uživatelem


Otevírání - dvoukřídle dveře – změna průchozí šířky dveří

Cena navýšení: 10.528,- Kč / ks

mezisoučet

21.056,- Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena / celkem
OA1	2 ks		
OA1A	4 ks		
OB1	3 ks		
OB1'	1 ks		
OB1A	1 ks		
OB1A'	1 ks		

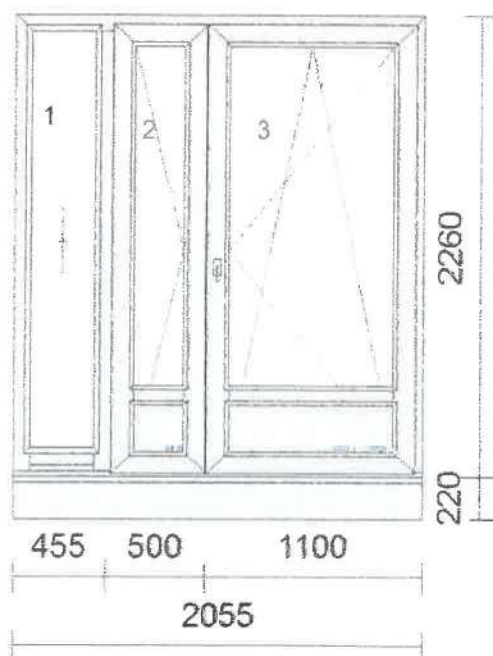

Typ: Plastové okno 88  
 Profil: 88MD  
 Rám: 88171 rám OK  
 Křídlo: FIB-okop na práh, 2 x 88274 kř. BD dov. rovné k AL prahu Barva Ex/In: Anthrazitgrau | Bílá  
 Kování: Pole: Otvírka: 1 pevně v rámu 2 OT balkonové levé 3 OS balkoné pravé  
 Krytky: Bílé  
 Výplň: 3 x 6.8Cx33.2 IT CL/14/4IT CL ESG/14/10.4Cx44.6 FCL, Ar, ChU-F/šedá (RAL 7040), Ug 0.60, (3-sklo, tl.49.2mm), 2 x 44mm Anthrazitgrau / bílá  
 Příčky: Příčka 88301 100mm  
 Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis:  
 dole 190 mm Purenit 90/60mm  
 dole 30 mm Rozšiřovací profil  
 30mm Lichtgrau  
 Rozměry: 2055mm x 2260mm  
 Hmotnost: 272 Kg

**Poznámka:**  
 NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA VYROBIT V CELKU!!  
 MADLO OSAZENO Z EXTERIÉRU!  
 Madlo BERYL-TYP A30, NEREZ, JEDNOSTRANNĚ, VODOROVNĚ  
 Klíka okenní bílá

**Změny proti původní pozici:**

Vzhled - jiné členění – dopřesněno uživatelem  
 Otevírání – změna průchozí šířky dveří  
 fix pevně zasklený do rámu  
 vedlejší otvíravé křídlo  
 hlavní otvíravě-sklopné křídlo

Cena navýšení: 17.092,- Kč / ks

mezisoučet

205.104,- Kč

VD odsouhlasena 16.06.2021  
 SOD podepsána 18.06.2021  
 Výroba výplní 6-8 týdnů  
 Montáž oken na stavbě 16.08.- 29.08.2021

Celková cena		<b>226.160,00 Kč</b>
DPH 0%	0,00 %	0,00 Kč
Celková cena		<b>226.160,00 Kč</b>







EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích p. Orebem	
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové	
Objednatel:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:	25.06.2021	
<p><b>Předmět změny:</b> Zvětšení dveří <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k chybě v realizační PD bylo nutné v DOZP A i v DOZP B zvětšit průchozí šířky dveří do pokojů tak, aby bylo možné projet s klienty na lůžkách. S tím souvisí i rozšíření venkovních zpevněných ploch před pokoji klientů.</p>		
<p><b>Přílohy změnového listu:</b> položkový rozpočet, nabídky subdodavatelů</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH: 273 048,16 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 273 048,16 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</b>		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí Datum:	Za zhotovitele: Souhlasí Datum:	
Za autorský dozor: Souhlasí Datum:	Za objednatele: Souhlasí Datum:	



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ERPLAN 0101 - DOZP A - větší dveře

Místo:

25.6.2021

Datum:

Zadavatel:

#ODKAZI

Projekční

#ODKAZI

Uchazeč:

#ODKAZI

Zpracovatel

#ODKAZI

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>107 356,70</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	78 135,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 261,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 728,90
997 - Přesun sutě	28 284,88
998 - Přesun hmot	7 268,30
PSV - Práce a dodávky PSV	592,66
766 - Konstrukce truhlářské	29 220,87
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	28 724,44
	496,43

# SOUPIS PRACÍ

Stavba

#ODKAZI

Objekt

ERPLAN 0101 - DOZP A - větší dveře

Miáno

Datum: 25.06.2021

Zadávatel  
Účtazeč:

#ODKAZI  
#ODKAZI

Projektant  
Zpracovatel

#ODKAZI  
#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

107 356,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 135,83	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 261,10	
1	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do malového lože, výšky překládu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	356,00	2 848,00	položky obsažené v naší SOD
			8		8,000			
			<b>Součet</b>		<b>8,000</b>			
2	K	342244311	Příčky jednoduché z cihel děrovaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou zdíci maltu, pevnost cihel do P-15, tl. příčky 115 mm	m2	26,759	762,85	20 413,10	SOD
			3,250*(2,55+0,485+0,115)-1,2*2,02		7,814			
			3,250*(0,585*2+0,115*2-2,85+2,325)-1,2*2,02		18,945			
			<b>Součet</b>		<b>26,759</b>			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 728,90	
3	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních ořimárných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn	m2	6,955	12,14	84,43	SOD
			3,250*(0,585*2+0,485*2)		6,955			
			<b>Součet</b>		<b>6,955</b>			
4	K	612321341	Omlitka vápencementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štiuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	6,955	265,20	1 844,47	SOD
			3,250*(0,585*2+0,485*2)		6,955			
			<b>Součet</b>		<b>6,955</b>			
5	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	8,000	450,00	3 600,00	SOD
6	M	55331489	zárubněj jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	SOD
			3+3		6,000			
			<b>Součet</b>		<b>6,000</b>			
7	M	55331489R	zárubněj jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970	kus	2,000	1 950,00	3 900,00	nabídka
			1+1		2,000			
			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			

28 284,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8	K	9772111R	Řezání cihelného zdiva do hloubky 150mm (14*3,250)*2	m	91,000	191,83	17 456,71	
	VV		Součet		91,000			
8X	K	973032863	Vysekáni kapes ve zdivu z dujých cihel nebo tvárnice pro zavázání příček nebo zdi tl. Do 150mm	m	10,166	93,98	955,35	0,74*CS ÚRS 2019 02
9	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	48,10	962,00	SOD
	VV		3*3+2*2+2*4		20,000			
	VV		Součet		20,000			
10	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových palených nebo nepalovaných na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	27,381	65,64	1 797,23	0,74*CS ÚRS 2019 02
	VV		3,250*(3,025+2,85+0,115*2-2,55+0,8-0,115)-1,0*1,970-1,0*1,97		25,765			
	VV		0,1*2,02+0,2*2,02+0,1*2,02+0,1*2,02+0,2*2,02+0,1*2,02		1,616			
	VV		Součet		26,179			
11	K	964011211R	Vybourání prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m	m3	1,150	3 204,20	3 684,83	0,74*CS ÚRS 2019 02
	VV		8*0,115*1,25		1,150			
	VV		Součet		1,150			
12	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - včetně vyřezání	m2	15,760	217,66	3 428,75	0,74*CS ÚRS 2019 02
	VV		(4+4)*1,0*1,97		15,760			
	VV		Součet		15,760			
D	997		Presun suti				7 268,30	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,161	176,86	1 266,49	0,74*CS ÚRS 2019 02
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	136,059	7,70	1 047,11	0,74*CS ÚRS 2019 02
	VV		7,161*19 Přepočtené koeficientem množství		136,059			
15	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (smádkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,161	681,90	4 954,70	0,74*CS ÚRS 2019 02
D	998		Presun hmot				592,65	
16	K	998017001	Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,951	150,00	592,65	SOD





## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

0

Objekt

ERPLAN 0102 - DOZP B - větší dveře

Místo

Datum 25.06.2021

Zadavatel:

Příjemce:

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**119 856,67**

HSV - Práce a dodávky HSV

86 941,51

3 - Svislé a kompietní konstrukce

23 758,02

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 249,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 267,18

997 - Přesun sutě

8 070,14

998 - Přesun hmot

597,00

PSV - Práce a dodávky PSV

32 915,16

766 - Konstrukce truhlářské

32 372,31

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

542,85

# SOUPIS PRACÍ

Stavby 0.

Objekt

ERPLAN 0102 - DOZP B - větší dveře

Místo

Datum: 25.06.2021

Zadavatel

Projektant:

Uchazeč 0

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

119 856,67  
86 941,51

### D HSV Práce a dodávky HSV

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 758,02	
1	K	317168013	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm, šířky 115 mm, délky 1500 mm	kus	8,000	358,00	2 848,00	položky obsažené v naší SOD
VV			4+4		8,000			
VV			Součet		8,000			
2	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm, šířky 140 mm, délky 1250 mm	kus	1,000	350,00	350,00	SOD
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
3	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm, šířky 140 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	396,00	396,00	SOD
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel dřevaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	6,105	721,05	4 402,01	SOD
VV			3,250*2,5-1,0*2,02		6,105			
VV			Součet		6,105			
5	K	342244311	Příčky jednoduché z cihel dřevaných zvukově izolační z cihel broušených na tenkovrstvou ztlící maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	20,662	762,85	15 762,01	SOD
VV			3,250*(2,55+0,115+0,585)*1,2*2,02		8,139			
VV			3,250*(1,945+2,7+0,115+0,585)*2*1,2*2,02		12,523			
VV			Součet		20,662			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 249,17	
6	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch cementový postřik naráženy strojně celoplošně stěn	m2	7,605	12,14	92,32	SOD
VV			3,250*(0,585*2+0,565*2)		7,605			
VV			Součet		7,605			

7	K	612321341	Omlítka vápencementová vnitřních ploch nanášená strojně dvovrstevně, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štluku do 3 mm šluková svíslých konstrukcí stěn	m <sup>2</sup>	7,605	265,20	2 016,85	SOD
VV			3,250*(0,585*2+0,585*2)		7,605			
VV			<b>Součet</b>		<b>7,605</b>			
8	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	10,000	450,00	4 500,00	SOD
9	M	55331489	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970	kus	6,000	1 550,00	9 300,00	SOD
VV			3*3		6,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>6,000</b>			
10	M	55331488	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	SOD
VV			1		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
11	M	55331489R	zárubně jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1970	kus	3,000	1 950,00	5 850,00	nabídka
VV			1*1+1		3,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>3,000</b>			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				<b>31 267,18</b>	
12	K	9772111R	Řezání cihelného zdiva do hloubky 150mm	m	97,500	191,83	18 703,63	
VV			15*3,250*2		97,500			
VV			<b>Součet</b>		<b>110,500</b>			
12X	K	973032883	Vysekáni kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnice pro zavázání příček nebo zdi tl. Do 150mm	m	8,572	93,98	805,60	0,74*CS ÚRS 2019 02
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	22,855	48,10	1 099,33	SOD
VV			1,9*2,7*0,585*2+0,585*2,0*6*2,5*2,0		22,855			
VV			<b>Součet</b>		<b>22,855</b>			
14	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z tvárnice nebo příčkových pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	24,517	65,84	1 609,25	0,74*CS ÚRS 2019 02
VV			0,2*2,02+0,1*2,02+0,1*2,02+0,2*2,02+0,1*2,02*2		1,816			
VV			3,250*(2,55+0,115+2,7+0,115*2+0,585)-1,0*1,97-1,0*1,97		16,145			
VV			3,250*(2,5)-0,9*1,97		6,352			
VV			0,2*2,02		0,404			
VV			<b>Součet</b>		<b>24,517</b>			
15	K	964011211R	Vybourání prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 3 m	m <sup>3</sup>	1,500	3 204,20	4 806,30	0,74*CS ÚRS 2019 02
VV			8*0,115*1,25		1,150			
VV			2*0,14*1,25		0,350			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,500</b>			
16	K	968072455	Vybourání kovových rámu okna s křídly, dveřních zárubní, vrat, slěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup> - včetně vyřezání	m <sup>2</sup>	19,503	217,56	4 243,07	0,74*CS ÚRS 2019 02
VV			9*1,0*1,97		17,730			
VV			1*0,9*1,97		1,773			
VV			<b>Součet</b>		<b>19,503</b>			

D		997	Přesun sítě	8 070,14				
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,951	176,86	1 406,21	0,74*CS ÚRS 2019 02
18	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	151,069	7,70	1 162,63	0,74*CS ÚRS 2019 02
	VV		7,951*19="Přepočtené koeficientem množství		151,069			
19	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,951	691,90	5 501,30	0,74*CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				597,00	
20	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	3,980	150,00	597,00	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 915,16	
D	766		Konstrukce truhlářské				32 372,31	
21	M	262611629R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1000x1970mm	kus	-9,000	5 700,00	-51 300,00	SOD
22	M	262611629R38	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1100x1970mm	kus	6,000	10 080,00	60 480,00	nabídka
	VV		6,000		6,000			
	VV		Součet		6,000			
23	M	262611629R39	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1 křídle 1200x1970mm	kus	3,000	7 672,00	23 016,00	nabídka
24	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	321,960	0,55	176,31	0,74*CS ÚRS 2019 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				542,85	
25	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,238	5,00	36,19	SOD
	VV		3,093*(0,585*2+0,585*2)		7,238			
	VV		Součet		7,238			
26	K	784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	7,238	30,00	217,14	SOD
	VV		3,093*(0,585*2+0,585*2)		7,238			
	VV		Součet		7,238			
27	K	784211163	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra Připlatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	7,238	40,00	289,52	SOD
	VV		3,093*(0,585*2+0,585*2)		7,238			
	VV		Součet		7,238			



## SOUPIS PRACÍ

## Rozšíření zpevněných ploch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

45 834,80

45 834,80

6 723,02

D	D	1	HSV	Práce a dodávky HSV	m3	11,123	350,00	3 893,05	SOD
VV				Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
				<b>DOZP A</b>					
				3,25*0,32		1,040			
				7,11*0,32		2,275			
				4,94*0,32		1,581			
				<b>DOZP B</b>					
				7,41*0,32		2,371			
				7,11*0,32		2,275			
				3,25*0,32		1,040			
				(1,36+0,33)*0,32		0,541			
				<b>Součet</b>		<b>11,123</b>			
				odkop1					
2	K	122202209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	11,123	26,60	295,87	SOD
				odkop1		11,123			
3	K	122302201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	11,123	32,00	355,94	SOD
				odkop1		11,123			
4	K	122302209		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	11,123	2,80	31,14	SOD
				odkop1		11,123			
5	K	162301101		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	22,246	62,00	1 379,25	SOD
				odkop1*2		22,246			
6	K	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	22,246	16,70	371,51	SOD
						22,246			

7	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	34,760	11,40	396,26	SOD
	VV		3,25+7,11+4,94		15,300			
	VV	plan11	Mezisoučet		15,300			
	VV		7,41+7,11+3,25+1,36+0,33		19,460			
	VV	plan12	Mezisoučet		19,460			
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,760</b>			
	D	5	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>29 220,45</b>	
9	K	564861R111	Podklad ze štěrkovité ŠD fr. 0 - 32 s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	34,760	128,00	4 449,28	SOD
	VV		plan11		15,300			
	VV		plan12		19,460			
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,760</b>			
10	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	22,246	265,00	5 895,19	SOD
	VV		11,122*2		22,246			
11	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	34,760	276,00	9 593,76	SOD
	VV	dř1	15,3		15,300			
	VV	dř2	19,46		19,460			
	VV		<b>Součet</b>		<b>34,760</b>			
12	M	59245R015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	15,759	182,00	2 868,14	SOD
	VV		15,3*1,03		15,759			
13	M	59245R016	dlažba zámková tl. 60mm - barva colormix arabica	m2	20,044	320,00	6 414,08	SOD
	VV		19,46*1,03		20,044			
	D	91	<b>Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch</b>				<b>7 302,96</b>	
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	16,800	226,00	3 796,80	SOD
	VV		"v.č. D.1.1.2 - situace zpevněných ploch, TZ"					
	VV		"v.č. D.1.1.3 - charakteristické fezy, TZ"					
	VV	obr2	16,8		16,800			
22	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	34,608	70,00	2 422,56	SOD
	VV		obr2*2*1,03		34,608			
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,504	2 150,00	1 083,60	SOD
	VV		obr2*0,3*0,1		0,504			
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				<b>2 588,37</b>	
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	27,246	95,00	2 588,37	SOD

# MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878  
tel.a fax: 495 537 434

společnost zapsána v obchodním rejstříku  
Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,  
vložka 3259

e-mail:

VALC s.r.o.

V Hradci Králové 16.6 2021

## Cenová nabídka č. 194 A

### Akce: Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny-výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem

Na základě Vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku - ceny uváděny bez DPH. Výše DPH bude účtována dle předpisů platných v době realizace.

Zadávací podklady: rozpočet, tabulka dveří, TZ

**Současná cenová úroveň výrobků \* platí pro rok 2021.**

#### Dodatečná úprava šířek dveří :

• dveře š. 1 000mm se mění na šířku 1 100mm a 1200mm

Uváděné ceny odpovídají popsanému předpokládanému provedení výrobků - po upřesnění zadání mohou ceny doznat změn

#### **Předpokládané (ceněné) provedení vnitřních dveří**

Dle požadavku zadání a vzhledem k charakteru objektu oceněno použití vnitřních dřevěných dveří určených do namáhaných prostor - SAPELI řada ELEGANT s povrchem CPL laminát, který má vyšší odolnost proti otěru a poškrábání (dezény bílá, šedá, dekory dřeva struktur) Vnitřní konstrukce dveří je tvořena masivním dřevěným rámem s výplní odlehčenou DTD.

Dveře vnitřní otočné s polodrážkou. Standardní konstrukce dveřního křídla KLIMA 1 bez nároků na spec.vlastnosti (např. požární, klima dveře atd.)

Dle požadavku v TZ ( a dle normy ) kalkulovány vstupní dveře do pokojů se zvukovou izolací 37 dB.

Dveře do pokoju budou dodány jako akustické se zvukovým útlumem 37 dB Tyto dveře budou osazeny mechanicky výsuvnou těsnicí lištou

technická  
zpráva 4.3  
Akustika

Vložky v systému GK : Pro ocenění dodávky a montáže vložek v systému generálního klíče nutný projekt centrálního klíče se specifikovanými okruhy a přesnou specifikací požadovaného typu vložek a počtu vlastních i generálních klíčů. Řešit společně pro všechny dveře v objektu ( dřevěné, plastové, kovové ... ) - speciální dodávka - neceněno.

#### **Montáž dveří do ocelové zárubně - ocelové zárubně neceněny .**

Prahy, samozavírače, VM a případné další doplňky nepožadovány - neceněny

Přechodové lišty neceněny - obor podlahář.

Pro nabídku platí záruční, reklamční a dodací podmínky výrobce SAPELI a.s. Jihlava.

Záruka na montážní práce 60 měsíců, na dodávku dveří, kování, příslušenství dle výrobců : 24 měsíců.

#### **DOZP A**

M	611629R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídlo 1100x1970 mm	kus	6 000	5 980 00	35 880 00
		v š. D' 114 - pudový 1 NP - DOZP A TZ'				
		v š. D' 111 - dveřní výplně TZ''				
M	E	1100 ATYP dveře plně hladké, CPL laminát JASAN struktur * zámeč pro vložku				
		zámek se 3 křídly, zábrana dveří do pokojů 37 dB, technická 3 výsuvná těsnicí lišta	kus	6 000	4 100 00	24 600 00
		útlumová lišta 37 dB normy 1.17 část 3.1.1				

- 114 pokoj 1
- 119 pokoj 2
- 110 pokoj 1
- 111 pokoj 4
- 115 pokoj 5
- 118 pokoj 6

M	611629R66	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1200x1970mm	kus	2,000	7 672,00	15 344,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

"v č. D 1 1 4 - půdorys 1 NP - DOZP A, TZ"  
 "v č. D 1 1 11 - dveřní výplně, TZ"

**CELKEM bez DPH**

**75 824,00 Kč**

**DOZP B**

M	611629R37	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1křídle 1100x1970 mm	kus	6,000	5 980,00	35 880,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------

"v č. D 1 1 4 - půdorys 1 NP - DOZP B, TZ"  
 "v č. D 1 1 11 - dveřní výplně, TZ"

Do2 1100 ATYP dveře plně hladké, CPL laminat JASAN struktura zámeč pro vložku

důpratek za zvukovou izolaci dveří do pokoje 37 dB "mechanická výšuvná těsnění" v z požadavek normy + TZ pod 4 3 1

kus	6,000	4 100,00	24 600,00
-----	-------	----------	-----------

- 204 pokoj 1
- 209 pokoj 2
- 210 pokoj 3
- 214 pokoj 4
- 215 pokoj 5
- 218 pokoj 6

M	611629R66	dveře vnitřní hladké laminované CPL plně 1200x1970mm	kus	3,000	7 672,00	23 016,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

"v č. D 1 1 4 - půdorys 1 NP - DOZP B, TZ"  
 "v č. D 1 1 11 - dveřní výplně, TZ"

**CELKEM bez DPH**

**83 496,00 Kč**

S pozdravem

Jana Kinzlová  
 za Moint s.r.o.



**MOINT**  
 spol. s r.o.

Pavla Hamáče 252  
 500 02 Hradec Králové  
 tel./fax: +420 495 374 7



**Dodavatel:**

IC 62025481 DIC CZ62025481

**STAMONT CZ s.r.o.**

Soukenická 590

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové

Spisová značka: oddíl C, vložka 6779

**Odběratel:**

IC 45537151 DIC CZ45537151

**VALC, s. r. o.**

Pražská třída 13/84

500 04 Hradec Králové

Kontakt:

Datum vystavení 11.06.2021

Rezervace

Předmět

Transformace ÚSP - zárubně

Vytvořil

Zakázkový list

Zálohová faktura

**Text nabídky:**

Číslo materiálu	Název	Celkem MJ	Prodejní cena	Sleva	Po slevě	Doprava	Bez DPH	Body BP
	* Zárubeň YTONG 125mm 110 L s těsněním MJH	6,000 ks	1 580,00 "	0,00	1 580,00	0,00	9 480,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 125mm 120 P s těsněním MJH	2,000 ks	1 950,00 "	0,00	1 950,00	0,00	3 900,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 125mm 110 P s těsněním MJH	6,000 ks	1 580,00 "	0,00	1 580,00	0,00	9 480,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 125mm 120 L s těsněním MJH	2,000 ks	1 950,00 "	0,00	1 950,00	0,00	3 900,00	0,00
	* Zárubeň YTONG 150mm 120 P s těsněním MJH	1,000 ks	1 950,00 "	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
093395579011	* Zárubeň YTONG 150mm 90 L s těsněním MJH	1,000 ks	1 490,00 "	0,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00
<b>Celkem body BP</b>								<b>0,00</b>

Zboží lze vrátit do 30 dnů od zakoupení na základě předložení originálu daňového dokladu. Zboží označené \* není možno vrátit zpět. Možnost vrácení schvaluje vedoucí střediska a netýká se zboží zjevně poškozeného, náchylného na poškození nevhodným skladováním a zboží objednaného na zakázku.

**Celkem částka nabídky**

**30 200,00 Kč bez DPH**

Doprava : - vlastní odvoz ze stavebnin RK

- v případě dopravy autem STAMONT s hydraulickou rukou, účtujeme 32.-Kč/km bez DPH a skládání HR 80.-Kč/paleta bez DPH.

Platnost cenové nabídky do : 28.6.2021

Při objednání, odběru poptávaného zboží prosím předložte tuto cenovou nabídku.



