



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, SLOVANSKÁ ALEJ 35“ (dále jen „Dodatek“)

KTERÝ UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY:

- (1) **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**, IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábreží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 710, zastoupené Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“);

a

- (2) **Metrostav a.s.**, IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000 Praha 8, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. Zastoupená Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,

jednající jako vedoucí společník **Společnosti Vozovna Slovany**, tvořené dalšími společníky

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217. Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

a

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, společnost zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Bratislava I zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem Chomou, členem představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26126

(dále jen „Zhotovitel“).



(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Objednatel se Zhotovitelem spolu dne 18. 09. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal řádně a včas zhotovit pro Objednatele Dílo definované v čl. 2.2 Smlouvy a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit a splnit další povinnosti stanovené ve Smlouvě;
- (B) Dle odst. 2.8.1 Smlouvy platí, že Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části Díla, přičemž jakákoliv takováto nebo jiná změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a potvrzen v dodatku k této Smlouvě;
- (C) Z důvodů výše uvedených byly již dne 6. 8. 2021 a 15. 10. 2021 uzavřeny dodatky č. 1 a č. 2 ke Smlouvě, které již některé vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce v celkové hodnotě změny Smlouvy ve výši 2,82% reflektovaly a narovnávaly vzájemné vztahy mezi smluvními stranami.
- (D) V průběhu realizace Díla vyvstala potřeba určitých dalších změn Díla, které byly mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzájemně odsouhlaseny;
- (E) Ve smyslu odst. 2.8.4 Smlouvy nemá jakékoliv Změna nařízená Objednatelem jakýkoliv vliv na Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního celku, Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma Smluvními stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list;
- (F) Objednatel a Zhotovitel se postupem dle čl. 2.8 Smlouvy dohodli na úpravě rozsahu Díla a Smluvní ceny a mají zájem na tom, aby tato jejich dohoda nabyla účinnosti;
- (G) Uvažovaná změna závazku ze Smlouvy se nepovažuje za podstatnou změnu závazku podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

Pojmy s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku mají stejný význam jako pojmy definované ve Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, a to o vzájemně odsouhlasené vícepráce a méněpráce, které jsou v podrobnostech popsány ve Změnových listech č. ZL 07, ZL 17, ZL 18, ZL 20, ZL 21, ZL 27, ZL 29, ZL 30, ZL 31, ZL 39, ZL 40 a ZL 41, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Změnové listy“).

1.2. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 21 826 899,05 Kč bez DPH.



- 1.3. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku 12 492 326,03 Kč bez DPH.
- 1.4. Celková hodnota změny Smlouvy dle tohoto Dodatku činí částku 34 319 225,08 Kč bez DPH, což představuje 2,03% původní hodnoty závazku.
- 1.5. Celkový nárůst Smluvní ceny související se změnami Díla dle tohoto Dodatku činí částku **9 334 573,02 Kč bez DPH**.
- 1.6. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v článku 2. tohoto Dodatku specifikováno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Text odst. 3.1.1 až 3.1.3 Smlouvy bude nově znít:

- 3.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši **1 738 016 420,56 Kč** bez DPH (slovy: jedna miliarda sedm set třicet osm milionů šestnáct tisíc čtyři sta dvacet celých a padesát šest haléřů korun českých) (dále jen „**Smluvní cena**“). Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.
 - 3.1.2. Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit **364 983 448,32 Kč** (slovy: tři sta šedesát čtyři milionů devět set osmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet osm celých a třicet dva haléřů korun českých) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákonu o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1 Smlouvy.
 - 3.1.3. Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH **2 102 999 868,88 Kč** (slovy: dvě miliardy jedno sto dva milionů devět set devadesát devět tisíc osm set šedesát osm celých a osmdesát osm haléřů korun českých).
- 2.2. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen a Časový harmonogram zůstává zatím beze změny. Pro vyloučení pochybností nicméně Smluvní strany uvádí, že některé již odsouhlasené změnové listy zakládají Zhotoviteli právo požadovat posun termínu dokončení díla. Smluvní strany se však dohodly, že případná změna termínu dokončení díla bude upravena jiným dodatkem.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že nárůst Smluvní ceny dle odst. 1.5 tohoto Dodatku je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyfakturovat po uzavření tohoto Dodatku; Všechny položky ve Změnových listech, které obsahuje tento Dodatek, budou zaneseny do stávajících fakturačních tabulek (zjišťovacích protokolů a souhrnného zjišťovacího protokolu) a tím dojde k vytvoření nového rozpočtu, ze kterého bude čerpáno dle fakturačních a obchodních podmínek, které se budou řídit čl. 3.2. Smlouvy.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v důsledku zvýšení celkové Smluvní ceny nemusí Zhotovitel přistoupit k navýšení Zajištění za plnění, tak jak je definováno v čl. 8.1.1. Smlouvy, ani k navýšení Zajištění za záruční plnění uvedené v čl. 8.2.1. Smlouvy, když výše těchto obou zajištění bude vycházet ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek sjednané k datu uzavření Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- 3.2 Tento Dodatek je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 3.3 Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany shodně potvrzují, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství.

Přílohy:

- č. 1 – Změnové listy č. ZL 07, ZL 17, ZL 18, ZL 20, ZL 21, ZL 27, ZL 29, ZL 30, ZL 31, ZL 39, ZL 40 a ZL 41

Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt:	F- Zásady organizace výstavby
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany – TDS, [redacted] vedoucí TDS
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s., [redacted] hlavní inženýr projektu

Popis změny	Změna vyvolaná objednatelem. Změna umístění zázemí organizace BT a vybudování provizorní haly vyvazování tramvají. Z důvodu předání staveniště až 13.10.2020 (oproti zadávacímu HMG 1.7.2020) došlo zhotovitelem k úpravě pracovních postupů a urychlení navazujících činností. Dle původního plánu měla servisní organizace využívat průjezdnou vozovnu a její okolí. Toto zázemí bylo se souhlasem Objednatele přesunuto k hale DOKP a byla zde vybudována hala pro vyvazování tramvají, aby byla uvolněna průjezdná vozovna k demolicí pro dřívější nástup. Dále došlo k úspoře na plánovaném pažení mezi neprůjezdnou a průjezdnou vozovnou při demolicích (ZL017).		
	změnu vyvolal: objednatel		
údaje o ceně d	ocenění změny předložil: zhotovitel	cenová změna za změnový list č. 007 bez DPH	
	cena SO bez DPH (dle SoD)	18 889 378,61 Kč	
	náklady na změnu bez DPH:	4 880 067,88 Kč	
	cena SO bez DPH po ZL007	23 769 446,49 Kč	
	cena díla bez DPH (dle SoD):	1 710 095 922,85 Kč	
	cena díla po ZL007 bez DPH:	1 714 975 990,73 Kč	
změn a ceny	Měněpráce celkem bez DPH:	120 848,11 Kč	celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	5 000 916,00 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	
	Zhotovitel	30.9.2021	
	Věcně za TDS	30.9.2021	
	Technicky za AD	30.9.2021	
	Objednatel	J. 10. 2021	
přílohy	č. 1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 007 č. 2 - CN pronájem haly č. 3 - Cenotvorba položek ZL č. 4 - Situace - počet buněk č. 5 - Hala vývazu + řez halou vývazu č. 6 - Souhlas Objednatele		

PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

007

MĚNĚPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
4	K	9000200R	Dočasný objekt pro ED - dvoupodlažní sestava kontejnerů - kompletní zřízení vč. podkladní desky z panelů a napojení na síť <small>Poznamánka k položce Sestava obsahující typové kontejnery (kontejner kancelářský - ředitel (2438x6050mm) 2x, kontejner sanitární - muži (2438x6050mm) 1x, kontejner sanitární - ženy (2438x6050mm) 1x, kontejner zasedací místnost (2438x6050mm) 2x, kontejner odčernávací organizace (2438x6050mm) 2x, kontejner výprava (2438x6050mm) 1x, ochlazení (3000x489mm) 1x, schodiště 1x, kontejnerová sestava je zabudována na výrobních panelových deskách. Tyto desky/rozměsou sázeny mobilními kontejnery. Objekt je napojen na staveništní rozvod elektrické energie a vody. Spláskavé vody budou odvedeny do stávající kanalizace v areálu vozovny Slovany.</small>	kpl	1,000	0,800	0,200	392 924,69 Kč	392 924,69 Kč	314 339,75 Kč	78 584,94 Kč
			změna		0,800						
6	K	9000290R	Dočasný objekt pro ED - dvoupodlažní sestava kontejnerů - kompletní odstranění vč. podkladní desky z panelů a odpojení od sítě <small>Poznamánka k položce Specifikace dočasného objektu viz položka zřízení</small>	kpl	1,000	0,800	0,200	211 315,87 Kč	211 315,87 Kč	169 052,70 Kč	42 263,17 Kč
			změna		0,800						
CELKEM:											120 848,11 Kč

VÍČEPRÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
5	K	9000210R	Dočasný objekt pro ED - dvoupodlažní sestava kontejnerů - náklady na měsíční pronájem a provozní náklady dočasného objektu <small>Poznamánka k položce Specifikace dočasného objektu viz položka zřízení úd. 19,9,21 do 13,4,22,8+4</small>	měsíc	12,000	15,200	3,200	68 882,94 Kč	826 595,28 Kč	1 047 020,69 Kč	220 425,41 Kč
			změna		12,000						
			Vzhledem k celkovému počtu realizovaných buněk - 8 ks je jednotková cena snížena na 80%, tj. 55 106,35 Kč								
			Začátek provozu buněk ED - 05.2020 Předpokládané ukončení provozu buněk ED - 11.2022 8*11=19 → celkové množství po změně je 19 měsíců x 55.106,35 = 1.047.020,65,- 1.047.020,65 - 826.595,28 = 220.425,37,- 220.425,37,- / 68.882,94,- = 3,2								
01 - Provizorní hala pro vyvozování tramvají - stavebné architektonické řešení											
D	1		Zemní práce								
31	K	131251104	Hloubení nezapazných jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny, 3 přes 100 do 500 m3 <small>CS URS 2021.01</small>	m3	0,000	164,500	164,500	184,00	30 268,00	30 268,00 Kč	30 268,00 Kč
			nová pol.								
			VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001, 1, 2, 20-7982-001-10-01-02-002-vyřes_1varu-zaklady_rev.01			164,500					
			37.6*12.5*0.35								
32	K	131351103	Hloubení nezapazných jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těželnosti II skupiny, 4 přes 50 do 100 m3 <small>CS URS 2021.01</small>	m3	0,000	93,380	93,380	383,00	35 764,54	35 764,54 Kč	35 764,54 Kč
			nová pol.								

№	Objekt	Popis	Jednotka	Množství	Cena	Podíl	Podíl	Podíl	Podíl
		VDD - 001_002_20-7982-001-10-01-02-001_..._TZ_20-7982-001-10-01-02-002-výhled_vstupu- skladby rev.01			93,360				
		15-2,0x3,0							
33	K	162351104	m3	257,880	257,880	0,000	81,000	20,886,28 Kč	20,886,28 Kč
		VV nová pol.							
		Prostřední			257,880				
34	K	171251201	m3	257,880	257,880	0,000	18,500	4,770,76 Kč	4,770,76 Kč
		VV nová pol.							
		Deska Hardi			257,880				
35	K	181951112	m2	368,500	368,500	0,000	21,800	8,033,30 Kč	8,033,30 Kč
		VV nová pol.							
		37.6*12.5-33*2.9			368,500				
36	K	181951114	m2	101,500	101,500	0,000	24,500	2,486,75 Kč	2,486,75 Kč
		VV nová pol.							
		CS ÚRS 2021.01			101,500				
37	K	213311113	m3	80,364	80,364	0,000	1,300,000	104,473,20 Kč	104,473,20 Kč
		VV nová pol.							
		Zakládání			80,364				
		Polštář zhrubně pod základy z kamenná hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm							
		Nová položka dle CS ÚRS 2020.02							
38	K	271532212	m3	38,355	38,355	0,000	1,257,700	48,239,08 Kč	48,239,08 Kč
		VV nová pol.							
		Podpory pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kamenná hrubého, frakce 16 - 32 mm							
		Převzato z objektu VST - SO 01/3 pol.2.1							
39	K	931311114	m3	12,144	12,144	0,000	3,730,000	45,297,12 Kč	45,297,12 Kč
		VV nová pol.							
		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplně							
		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí II, přes 50 do 80 mm tl. C							
		Nová položka dle CS ÚRS 2020.02							
40	K	937121114	m2	55,320	55,320	0,000	510,000	28,213,20 Kč	28,213,20 Kč
		VV nová pol.							
		Okapový chodník z kamenná s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku II, 250 mm							
		Nová položka dle CS ÚRS 2020.02							
41	K	971285211	m	15,000	15,000	0,000	170,000	2,550,00 Kč	2,550,00 Kč
		VV nová pol.							
		Trubní vedení							
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tlakového							
		šrotového jednovrstvého, tloušťka stěny SN 4 DN 110							
		Nová položka dle CS ÚRS 2020.02							
		VDD - 001_002_20-7982-001-10-01-02-001_..._TZ_20-7982-001-10-01-02-002-výhled_vstupu- skladby rev.01							
		15-2,0x3,0							
		Výhled kanálu			15,000				
42	K	971395211	m	0,200	0,200	0,000	1,350,000	270,00 Kč	270,00 Kč
		VV nová pol.							
		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tlakového							
		šrotového jednovrstvého, tloušťka stěny SN 4 DN 400							
		Nová položka dle CS ÚRS 2020.02							
		VDD - 001_002_20-7982-001-10-01-02-001_..._TZ_20-7982-001-10-01-02-002-výhled_vstupu- skladby rev.01							
		15-2,0x3,0							
		Prostřední							
		Prostřední							
		0,2			0,200				

43	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého přísušného kolen DN 100	kus	0,000	3,000	3,000	186,00	558,00	558,00 Kč	558,00 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CS ÚRS 2020 02								
	VV		VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001 - _TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivanu- zaklady_rev.01								
	VV		Větrání kanálu			3,000					
	VV		3								
44	M	28671353	koleno kanalizační PVC KG 110x87*	kus	0,000	3,000	3,000	46,30	138,90	138,90 Kč	138,90 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CS ÚRS 2020 02								
	D	g	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
45			Hala pro provizorní vývaz tramvají - kompletní zřízení včetně příslušenství včetně dopravy	kpl	0,000	1,000	1,000	85 330,00	85 330,00	85 330,00 Kč	85 330,00 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CN příloha č. 2								
			74200 * 1,15								
46			Hala pro provizorní vývaz tramvají - kompletní měsíční náklady na pronájem italy včetně příslušenství a provozní náklady	měsíc	0,000	7,000	7,000	61 640,00	431 480,00	431 480,00 Kč	431 480,00 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CN příloha č. 2								
			(49000+4600) * 1,15								
47			Hala pro provizorní vývaz tramvají - kompletní demontáž včetně příslušenství včetně dopravy	kpl	0,000	1,000	1,000	81 650,00	81 650,00	81 650,00 Kč	81 650,00 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CN příloha č. 2								
			71000 * 1,15								
48	K	953961212	Kolvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrová, velikosti M 10, hloubka 50 mm	kus	0,000	32,000	32,000	76,90	2 460,80	2 460,80 Kč	2 460,80 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CS ÚRS 2020 02								
	VV		VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001 - _TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivanu- zaklady_rev.01								
	VV		*schodiště Z01								
	VV		4*4*2				32,000				
	D	398	Présun hmot								
49	K	998021021	Présun hmot pro italy občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m	t	0,000	309,268	309,268	153,51	47 475,73	47 475,73 Kč	47 475,73 Kč
	VV	nová pol.	Převzato z objektu VST - SO 01/3 pol.č.13								
50	K	998021024	Présun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svítlou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,000	309,268	309,268	38,38	11 869,71	11 869,71 Kč	11 869,71 Kč
	VV	nová pol.	Převzato z objektu VST - SO 01/3 pol.č.15								

id	PSV	Práce a dodávky PSV																
0	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
51	K 71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nábrády a tlmy ze studna na ploše vodorovné V	m2	0,000	432,800	432,800	18,64	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39	8 067,39
	VV nová pol.	Průvzdušnostní pásy																
		Y00 - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001, _T2, 20-7982-001-10-01-02-002-výhled_vlavo- základy rev.01			307,100													
		36,111			33,600													
		1,919,912			1,900													
		Součet			432,800													
52	M 11163160	tlmý penetrantní asfaltový	l	0,000	0,120	0,120	60,772,93	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49	7 900,49
	VV nová pol.	Průvzdušnostní pásy z objemu VST - SO 01/1 pol.2.36																
		432 810,0003-TP-ochranná izolace tlakovými membránami			0,120													
53	K 711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nábrády a tlmy ze studna na ploše svislé S	m2	0,000	133,664	133,664	24,96	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89	3 322,89
	VV nová pol.	tlmý penetrantní asfaltový																
		Y00 - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001, _T2, 20-7982-001-10-01-02-002-výhled_vlavo- základy rev.01			34,176													
		35,670,4672			10,080													
		10,570,4672			85,853													
		33,611,2772			3,656													
		1,411,2772			133,664													
		Součet			0,047	0,047	60,772,93	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33	2 856,33
54	M 11163150	tlmý penetrantní asfaltový	l	0,000	0,047	0,047	260,99	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47
	VV nová pol.	Průvzdušnostní pásy z objemu VST - SO 01/1 pol.2.36																
		133 664,0,00035-Průvzdušnostní izolace tlakovými membránami			0,047													
55	K 711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým NAP na ploše vodorovné V	m2	0,000	432,800	432,800	260,99	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47	112 956,47
	VV nová pol.	Průvzdušnostní pásy z objemu VST - SO 01/1 pol.2.36																
		Y00 - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001, _T2, 20-7982-001-10-01-02-002-výhled_vlavo- základy rev.01			307,100													
		36,111			33,600													
		1,919,912			1,900													
		Součet			432,800													
56	M 62853004	pás asfaltový natavený modifikovaný SBS II 4,0mm s vláknou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE A60 nebo jemnozrnným minerálním posypem na homlin povrchu	m2	0,000	497,720	497,720	141,68	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97
	VV nová pol.	Průvzdušnostní pásy z objemu VST - SO 01/1 pol.2.36																
		432 811,15-Průvzdušnostní izolace tlakovými membránami			497,720													
57	M 62855001	pás asfaltový natavený modifikovaný SBS II 4,0mm s vláknou z polyesterové rohože a spalitelnou PE 600 nebo jemnozrnným minerálním posypem na homlin povrchu	m2	0,000	497,720	497,720	141,68	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97	70 516,97
	VV nová pol.	Průvzdušnostní pásy z objemu VST - SO 01/1 pol.2.36																
		432 811,15-Průvzdušnostní izolace tlakovými membránami			497,720													

58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S Převzato z objektu VST - SO 05/1 pol.č.40
	VV	nová pol.	
	VV		VDD -001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru- zaklady_rev.01
	VV		35,6*0,48*2
	VV		10,5*0,48*2
	VV		33,8*1,27*2
	VV		1,4*1,27*2
	VV		Součet
59	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu Převzato z objektu VST - SO 05/1 pol.č.41
	VV		133,664*1,2 *Přepočtené koeficientem množství
60	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu Převzato z objektu VST - SO 05/1 pol.č.42
	VV	nová pol.	
	VV		133,664*1,2 *Přepočtené koeficientem množství
61	K	711745567	Provedení detailu pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením řs 500 mm NAIP Nová položka dle CS ÚRS 2020 02
	VV	nová pol.	
	VV		VDD -001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru- zaklady_rev.01
	VV		*zesílené rohy a zpětné spoje
	VV		35,6*2+10,5*2
	VV		33,8*2+1,4*2
	VV		33,8*2+1,4*2
	VV		Součet
62	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu Převzato z objektu VST - SO 01/1 pol.č.62
	VV	nová pol.	
	VV		233*0,6 *Přepočtené koeficientem množství
63	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu Převzato z objektu VST - SO 01/1 pol.č.63
	VV	nová pol.	
	VV		233*0,6 *Přepočtené koeficientem množství

Provedení detailů, náčrty ařování, množství technických řešení, podíl řešení a objemy

0,000	133,664	133,064	323,13	43 190,85	43 190,85 Kč	43 190,85 Kč
	34 176					
	50 080					
	85 852					
	3 556					
	133,664					
0,000	160,397	160,397	141,68	22 725,05	22 725,05 Kč	22 725,05 Kč
	160 397					
0,000	160,397	160,397	141,68	22 725,05	22 725,05 Kč	22 725,05 Kč
	160 397					
0,000	233,000	233,000	121,00	28 193,00	28 193,00 Kč	28 193,00 Kč
	82 200					
	70 400					
	70 400					
	233 000					
0,000	139,800	139,800	147,68	19 806,86	19 806,86 Kč	19 806,86 Kč
	139 800					
0,000	139,800	139,800	147,68	19 806,86	19 806,86 Kč	19 806,86 Kč

66	M	62855001	pas asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	0,000	2,100	2,100	141,68	297,53	297,53 Kč	297,53 Kč	297,53 Kč
	VV	nová pol.	Prévzato z objektu VST - SO 01/1 pol.č.53									
	VV		3,0,7 Připravené koeficientem hmotnosti			2,100						
67	K	998711202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,000	3 564,514	3 564,514	3,21	11 442,09	11 442,09 Kč	11 442,09 Kč	11 442,09 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CS ÚRS 2020 02									
	D	713	Izolace lepelňe									
68	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál vc specifikací) lepením celoplošně	m2	0,000	133,664	133,664	229,92	30 732,03	30 732,03 Kč	30 732,03 Kč	30 732,03 Kč
	VV	nová pol.	Prévzato z objektu VST - SO 05/1 pol.č.57									
	VV		"VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_lvaru-zaklady rev.01									
	VV		35,6*0,46*2			34,176						
	VV		10,5*0,46*2			10,080						
	VV		33,8*1,27*2			85,852						
	VV		1,4*1,27*2			3,556						
	VV		Součet			133,664						
69	M	28376440	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm	m2	0,000	140,347	140,347	140,00	19 648,58	19 648,58 Kč	19 648,58 Kč	19 648,58 Kč
	VV		133 664*1,05 Připravené koeficientem hmotnosti									
70	K	998713102	Přesun hmot pro izolace lepelňe stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	1,013	1,013	1 118,52	1 133,06	1 133,06 Kč	1 133,06 Kč	1 133,06 Kč
	VV	nová pol.	Prévzato z objektu VST - SO 01/1 pol.č.110									
	D	767	Konstrukce zamečnické									
71	K	767210111	Montáž schodnic ocelových rovných v prostoru, podepřené	m	0,000	8,280	8,280	191,00	1 581,48	1 581,48 Kč	1 581,48 Kč	1 581,48 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CS ÚRS 2020 02									
	VV		"VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_lvaru-zaklady rev.01									
	VV		2,07*4			8,280						
72	M	55102110R	Ocelové schodnice přímé pozinkové UPN 200, včetně přípravy pro kotvení a uchycení stupňů z porosařu	kg	0,000	250,000	250,000	149,14	37 285,00	37 285,00 Kč	37 285,00 Kč	37 285,00 Kč
	VV	nová pol.	Prévzato z objektu 001 - SO 03/1 pol.č.i.13									
	VV		250			250,000						
73	K	767210151	Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním	kus	0,000	12,000	12,000	117,00	1 404,00	1 404,00 Kč	1 404,00 Kč	1 404,00 Kč
	VV		Nová položka dle CS ÚRS 2020 02									
	VV		6*2			12,000						
74	M	55347130	střípeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 800x270mm	kus	0,000	12,000	12,000	478,00	5 736,00	5 736,00 Kč	5 736,00 Kč	5 736,00 Kč
	VV	nová pol.	Nová položka dle CS ÚRS 2020 02									
75	K	998767102	Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	0,348	0,348	832,68	289,77	289,77 Kč	289,77 Kč	289,77 Kč
	VV	nová pol.	Prévzato z objektu VST - SO 01/1 pol.č.187									
	D	783	Dokončovací práce - natěry									

76	K	783933151	Penetrací nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo glejovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový Nová položka dle CS ÚRS 2020 02	m2	0,000	469,866	469,866	128,00	60 142,85	60 142,85 Kč	60 142,85 Kč
	VV	nová pol.									
	VV		VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_lvaru-zaklady_rev.01			373,800					
	VV		35,6*10,5			9,706					
	VV		(33+9,2)*0,23			83,920					
	VV		33,1,27*2			2,540					
	VV		1*1,37*2			469,866					
	VV		Součet			469,866					
77	K	783937163	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový Nová položka dle CS ÚRS 2020 02	m2	0,000	469,866	469,866	312,00	146 598,19	146 598,19 Kč	146 598,19 Kč
	VV	nová pol.									
	VV		VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_lvaru-zaklady_rev.01			373,800					
	VV		35,6*10,5			9,706					
	VV		(33+9,2)*0,23			83,920					
	VV		33,1,27*2			2,540					
	VV		1*1,37*2			469,866					
	VV		Součet			469,866					
78	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Připlatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prospěm křemičným pískem nebo skleněnými kulíčkami Nová položka dle CS ÚRS 2020 02	m2	0,000	373,800	373,800	56,90	21 269,22	21 269,22 Kč	21 269,22 Kč
	VV	nová pol.									
	VV		VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_lvaru-zaklady_rev.01			373,800					
	VV		35,6*10,5			373,800					
	VV		Součet			373,800					
	D	M	Práce a dodávky M								
	D	46-M	Zemní práce při extr.monit.pracích								
79	K	460520174	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy piaslových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm Nová položka dle CS ÚRS 2020 02	m	0,000	6,000	6,000	43,70	262,20	262,20 Kč	262,20 Kč
	VV	nová pol.									
	VV		VDD - 001, 002, 20-7982-001-10-01-02-001_-TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_lvaru-zaklady_rev.01			6,000					
	VV		"chránička dle			6,000					
	VV		6			6,000					
80	M	34571357	Trubka elektromontážní ohebná dvovrstvá korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	0,000	6,060	6,060	89,10	539,95	539,95 Kč	539,95 Kč
	VV	nová pol.									
	VV		Nová položka dle CS ÚRS 2020 02								
	D	2	02 - Provizorní hala pro vyvazování tramvaj - stavebně-konstrukční řešení, beton Zakládání								

81	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,000	41,429	41,429	3 529,08	146 206,26	146 206,26 Kč	146 206,26 Kč
	VV	nová pol.	Prevzato z objektu VST - SO 01/3 pol.č.2								
	VV		VDD - 20-7982-001-10-01-02-001 - TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru-zaklady_rev.01, 20-7982-001-10-01-02-003-vykres_vyzluze_rev.01			39,710					
	VV		35,11*11*0,1			1,650					
	VV		33*0,5*0,1			0,069					
	VV		2,3*0,3*0,1			41,429					
	VV		Součet			111,796	111,796	3 422,82	382 657,58	382 657,58 Kč	382 657,58 Kč
82	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výzluže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prosředí tř. C 30/37	m3	0,000	111,796	111,796	3 422,82	382 657,58	382 657,58 Kč	382 657,58 Kč
	VV	nová pol.	Prevzato z objektu ODT - SO 02/3 pol.č.3								
	VV		VDD - 20-7982-001-10-01-02-001 - TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru-zaklady_rev.01, 20-7982-001-10-01-02-003-vykres_vyzluze_rev.01			85,200					
	VV		35,6*10,5*0,25*33*1*0,25			15,210					
	VV		33,8*1,8*0,25			4,934					
	VV		33*0,65*0,23			3,140					
	VV		10,5*1,3*0,23								
	VV		Klíny			3,312					
	VV		(3,6*2*0,115)*4			111,796					
	VV		Součet			98,468	98,468	899,87	88 608,40	88 608,40 Kč	88 608,40 Kč
83	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,000	98,468	98,468	899,87	88 608,40	88 608,40 Kč	88 608,40 Kč
	VV	nová pol.	Prevzato z objektu VST - SO 01/3 pol.č.4								
	VV		VDD - 20-7982-001-10-01-02-001 - TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru-zaklady_rev.01, 20-7982-001-10-01-02-003-vykres_vyzluze_rev.01			44,256					
	VV		(35,6+10,5)*2*0,48			17,000					
	VV		33*0,25*2+1*0,25*2			17,800					
	VV		(33,8+1,8)*2*0,25			15,180					
	VV		33*0,23*2			4,232					
	VV		9,2*0,23*2			98,468					
	VV		Součet			98,468	98,468	161,54	15 906,52	15 906,52 Kč	15 906,52 Kč
84	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,000	98,468	98,468	161,54	15 906,52	15 906,52 Kč	15 906,52 Kč
	VV	nová pol.	Prevzato z objektu VST - SO 01/3 pol.č.5								
	VV		VDD - 20-7982-001-10-01-02-001 - TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru-zaklady_rev.01, 20-7982-001-10-01-02-003-vykres_vyzluze_rev.01			44,256					
	VV		(35,6+10,5)*2*0,48			17,000					
	VV		33*0,25*2+1*0,25*2			17,800					
	VV		(33,8+1,8)*2*0,25			15,180					
	VV		33*0,23*2			4,232					
	VV		9,2*0,23*2			98,468					
	VV		Součet			98,468	98,468	161,54	15 906,52	15 906,52 Kč	15 906,52 Kč
85	K	273361821	Výzuz základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	4,461	4,461	37 961,30	169 345,36	169 345,36 Kč	169 345,36 Kč
	VV	nová pol.	Prevzato z objektu VST - SO 01/3 pol.č.6								
	VV		VDD - 20-7982-001-10-01-02-001 - TZ, 20-7982-001-10-01-02-002-vykres_ivaru-zaklady_rev.01, 20-7982-001-10-01-02-003-vykres_vyzluze_rev.01			4,461					
	VV		4,461								

PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



Cenová nabídka				
Číslo nabídky	2020 10 211			
Místo výstavby	Slovany			
Termín	pronájem – 12 měsíců			
Základní technické parametry	Šířka	7,50 m	10,00 m	7,50 m
	Délka	7,50 m	15,00 m	70,00 m
	Výška v okapu	4,40 m	4,20 m	5,00 m
	Výška v hřebeni	5,40 m	5,94 m	5,76 m
	Barva	bílá		
Materiál	Konstrukce	hliníkové profily		
	Střecha	vysokopevnostní PVC folie		
	Boky	vysokopevnostní PVC folie ISO panel 40 mm		
	Podlaha			
Kotvení	Ocelové hřebíky (travnatý povrch, asfalt)			
	Chemické kotvy, pevnostní kotvy do betonu (asfalt, beton)			

Hala pro opravy tramvají zateplená hala 10x35/5,20 m, boky – ISO panel 40 mm (délka pronájmu 12 měsíců)			
Návoz materiálu + montáž			74 200,-
Pronájem zateplené mobilní haly 10x35/5,20 m	350 m ²	140,-/m ² /měsíc	49 000,-/měsíc
Posuvná vrata 4750x4100 mm	2 ks	2 300,-/ks/měsíc	4 600,-/měsíc
Demontáž + odvoz materiálu			71 000,-

(výše uvedené ceny jsou bez DPH)

Prachotěsné zářivkové těleso PRIMA 2x36 W - 200,-/ks/měsíc

- D+M osvětlení vč. prokabelování mezi sebou a vyvedení kabelu na požadované místo
- Rozvod musí být bezpečný

Všeobecné podmínky:

Cena montáže a demontáže uvedená v cenové nabídce předpokládá zapůjčení vysokozdvížného vozíku s min. nosností 2 tuny. Pokud není možné ze strany klienta vysokozdvížný vozík zapůjčit, bude mu cena za mechanizaci doúčtována k ceně montáže a demontáže.

Cenová nabídka předpokládá rovný povrch pro zakládání stanu (+/- 30 cm). Náklady spojené s vyrovnáváním větších nerovností jsou účtovány samostatně.

Naše stany jsou kotveny pomocí speciálních hřebů, příp. za použití chemické nebo ocelové kotvy.

Klient je také zodpovědný za všechny způsobené škody a znehodnocení našeho materiálu, který musí být navrácen ve stejném stavu, v kterém byl předán s přihlédnutím k běžnému opotřebení během doby pronájmu.

Před počátkem demontáže musí klient nebo jeho zástupce předat všechny stany a jejich příslušenství. Vzniklé škody nebo ztracené části stanu budou klientovi vyfakturovány na základě odsouhlaseného protokolu o vzniklé škodě. Jakékoliv ztracené nebo zničené části budou klientovi doúčtovány v ceně částí nových.

Skladové haly (případně některé díly) na pronájem mohou být již použité, avšak plně funkční v souladu s účelem pronájmu.

PŘÍLOHA Č. 3

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník



Společnost Vozovna Slovany
"Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35"

CENOTVORBA POLOŽEK ZMĚNOVÉHO LISTU

Přiložená cenová nabídka je na základě dohody s Objednatelem navýšena o + 15 %. Tento postup tvorby cen nových položek, které se nenacházejí v URS bude zaslavně dodatkem č. 1. Uvedené procento zahrnuje kompenzaci nákladů spojených s dodávkou nebo realizací v cenové nabídce uvedených položek, jako je inženýring, doprava, manipulace, údržba, doplňování LTO nebo plynu, přesun hmot, správní režie a zisk.



TABULKA k příloze č. 3 - CENOTVORBA POLOŽEK ZMĚNOVÉHO LISTU

ZL007

PČ	typ	Kód	popis položky	MJ	J.cena z cenové nabídky dodavatele [Kč]	15 %	J.cena + 15 % [Kč]
45			Hala pro provizorní vývaz tramvaji - kompletní zřízení včetně příslušenství včetně dopravy	kpl	74 200,00	11 130,00	85 330,00
46			Hala pro provizorní vývaz tramvaji - kompletní měsíční náklady na pronájem haly včetně příslušenství a provozní náklady	kpl	53 600,00	8 040,00	61 640,00
47			Hala pro provizorní vývaz tramvaji - kompletní demontáž včetně příslušenství včetně dopravy	kpl	71 000,00	10 650,00	81 650,00

PŘÍLOHA Č. 4

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň


Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

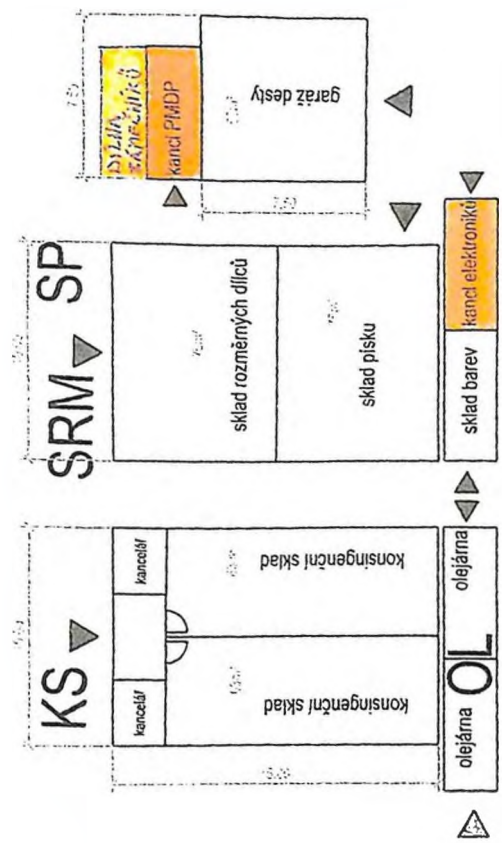

ADM

1:50

1:50



PŘÍLOHA Č. 5

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň



Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

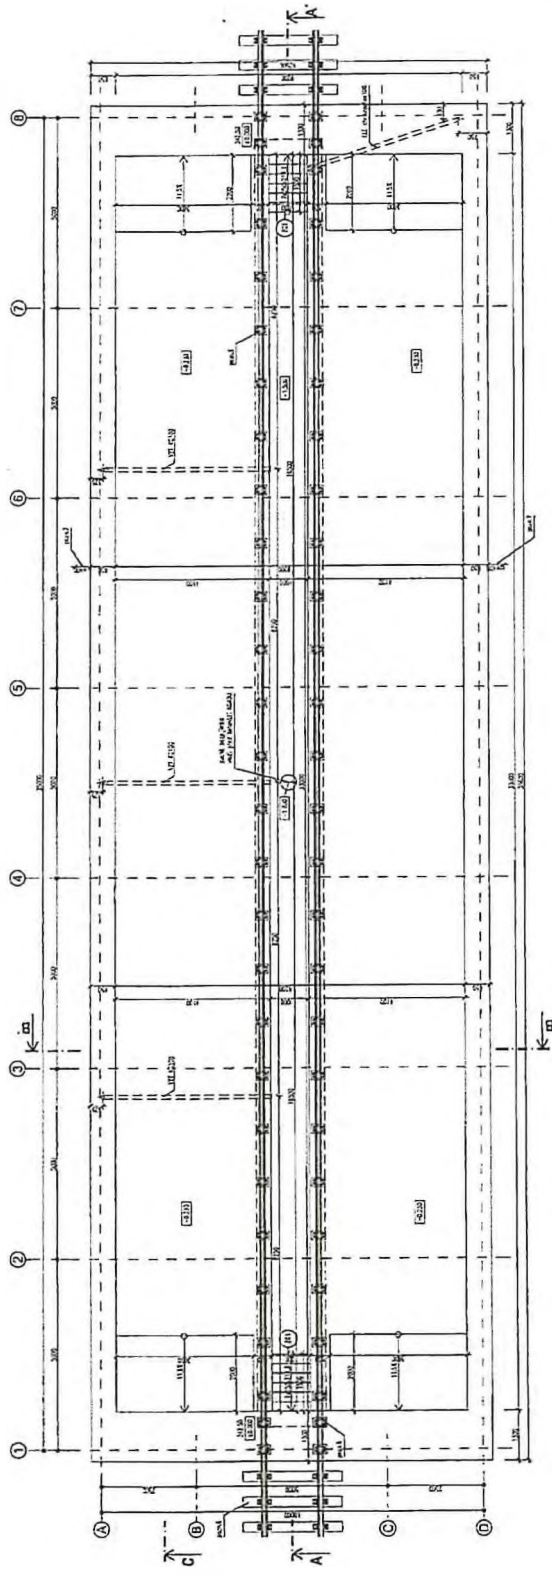

POZNÁMKY



1. Dveřní rám je řešen stěží
2. Vypuklé kování (dveřní kování) je řešeno dle 11/2
3. Vnější kování (dveřní kování) je řešeno dle 11/2
4. Dveřní kování je řešeno dle 11/2
5. Při projekci je nutné vzít v úvahu i možnost kování křídla
6. Kování je řešeno dle 11/2
7. Kování je řešeno dle 11/2
8. Kování je řešeno dle 11/2

LEGENDA:

- 1. HRODINA
- 2. STĚNA
- 3. STROP
- 4. ZEMĚ
- 5. HRODINA
- 6. STĚNA
- 7. STROP
- 8. ZEMĚ



Z1 - 1725




LEGENDA MATERIÁLŮ

- 1. HRODINA
- 2. STĚNA
- 3. STROP
- 4. ZEMĚ
- 5. HRODINA
- 6. STĚNA
- 7. STROP
- 8. ZEMĚ

LEGENDA:

- 1. HRODINA
- 2. STĚNA
- 3. STROP
- 4. ZEMĚ
- 5. HRODINA
- 6. STĚNA
- 7. STROP
- 8. ZEMĚ

REZ C



1. HRODINA
2. STĚNA
3. STROP
4. ZEMĚ
5. HRODINA
6. STĚNA
7. STROP
8. ZEMĚ

PŘÍLOHA Č. 6

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.
IČ: 000 14 915
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00
Praha 8
Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.
IČ:453 57 269
Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika
IČ: 027 65 055
Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice
Třetí společník

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:



Důležitost: Vysoká

Dobrý den,


na základě článku 2.8.2 vydávám PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ.

- **specifikace změny v rozsahu Díla:** *Změna umístění zázemí organizace BT a vybudování provizorní haly vyvazování tramvají. Z důvodu pozdějšího předání staveniště až 13.10.2020 (oproti zadávacímu HMG 1.7.2020) došlo zhotovitelem k úpravě pracovních postupů a urychlení navazujících činností. Dle původního plánu měla servisní organizace využívat průjezdnou vozovnu a její okolí. Toto zázemí bylo se souhlasem objednatele přesunuto k hale DOKP a byla zde vybudována hala pro vyvazování tramvají, aby byla uvolněna průjezdná vozovna k demolici pro dřívější nástup. Došlo k úspoře na plánovaném pažení mezi neprůjezdnou a průjezdnou vozovnou při demolicích (ZL 17).*
- **částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena):** *předpokládaná hodnota 4 898 433,36 Kč bez DPH. Cena je stanovena na základě kalkulace předložené zhotovitelem.*
- **úpravu Časového harmonogramu výstavby:** *bez dopadu na dokončení díla*
- **jakékoliv další změny podmínek Smlouvy:** *bez dopadu na změny podmínek Smlouvy*

Žádám tedy o vypracování změnového listu a předložení co v nejkratším možném termínu.

Děkuji.

Přeji hezký den.



Předmět díla:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
Objekt:	C.4 - Výkopy - HTÚ (Objekt SOD IV - OUT)
Objednatel:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
Zhotovitel:	„Společnost Vozovna Slovany“ Metrostav a.s. , IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník) BERGER BOHEMIA a.s. , IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník) TSS GRADE, a.s. pob. ČR , IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
TDS:	Sdružení IIS – vozovna Slovany [redacted]
Projektant:	METROPROJEKT Praha a.s. , [redacted]

Popis změny	Z důvodu změny postupu výstavby dle ZL007 došlo k úspoře a nerealizaci pažení mezi neprůjezdnou a průjezdnou vozovnou - pažení OUT odečteno. V rámci zpracování RDS při koordinaci mezi Plzeňskou teplárenskou a zhotovitelem došlo k úpravě technologie a rozsahu pažení, čímž se zajistila optimalizace realizace podzemní části PAB a bylo eliminováno prodloužení rozhodnutí Plzeňské teplárenské ohledně části stavby horkovodu. Došlo k zajištění dodržení termínu realizace této části.		
	změnu vyvolal:	objednatel	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.017 bez DPH
	cena SO dle SoD (bez DPH):		21 167 978,12 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		1 385 225,78 Kč
	cena SO po ZL č.017 (bez DPH):		22 553 203,90 Kč
	cena díla bez DPH (dle SoD):		1 697 894 702,32 Kč
	cena díla po ZL č.017 bez DPH:		1 699 279 928,10 Kč
změna ceny	Méněpráce celkem bez DPH:	3 657 163,70 Kč	8 699 553,18 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	5 042 389,48 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	
	Zhotovitel:	[redacted]	30.9.21
	Věcně za TDS:	[redacted]	1.10.21
	Technicky za AD:	[redacted]	5.10.21
	Objednatel:	[redacted]	7.10.21
přílohy	č.1 - Rozpočet ke změnovému listu č. 017 č. 2 - Rozdílový soupis prací		

PŘÍLOHA Č. 1

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Pízeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

017


MĚNĚPŘÁCE										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOD	rozdíli množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíli celk. ceny [Kč]
5	K	153191901R	Zřízení pažení stavebních jam - provedení dle navržené technologie dodavatele	m2	1 003,000	468,000	5 593,02 Kč	5 609 799,06 Kč	2 617 533,36 Kč	2 992 265,70 Kč
	VV		"SOD I - VST:"		300,000					
	VV		"reference" 5,0*50,0		168,000					
	VV		"lapoly" 2*4,0*21,0		468,000					
	VV		Mezisoučet							
	VV		"SOD III - PAB:"		16,000					
	VV		"343-342" 2,0*8,0		85,000					
	VV		"343-338" 5,0*17,0		20,000					
	VV		"343-341" 2,0*10,0		100,000					
	VV		"343-338" 5,0*20,0		70,000					
	VV		"343-341" 2,0*35,0		40,000					
	VV		"343-338" 5,0*8,0		331,000					
	VV		Mezisoučet							
	VV		"SOD IV - OUT:"		60,000					
	VV		"343-340,5" 2,5*24,0		144,000					
	VV		"343-340" 3,0*48,0		204,000					
	VV		Mezisoučet		1 003,000					
	VV		Součet							
	VV		ODPOČET "SOD III - PAB:"							
	VV	změna	"343-342" 2,0*8,0		16,000					
	VV		"343-338" 5,0*17,0		85,000					
	VV		"343-341" 2,0*10,0		20,000					
	VV		"343-338" 5,0*20,0		100,000					
	VV		"343-341" 2,0*35,0		70,000					
	VV		"343-338" 5,0*8,0		40,000					
	VV		Mezisoučet		331,000					
	VV		ODPOČET "SOD IV - OUT:"							
	VV		"343-340,5" 2,5*24,0		60,000					
	VV		"343-340" 3,0*48,0		144,000					
	VV		Mezisoučet		204,000					
	VV		Celkem po změně "1003-204- 331=468		468,000					
6	K	153191911R	Odstranění pažení stavebních jam - provedení dle navržené technologie dodavatele	m2	1 003,000	468,000	1 242,80 Kč	1 246 528,40 Kč	664 898,00 Kč	664 898,00 Kč
	VV	změna	ODPOČET "SOD III - PAB:"							
	VV		"343-342" 2,0*8,0		16,000					
	VV		"343-338" 5,0*17,0		85,000					
	VV		"343-341" 2,0*10,0		20,000					
	VV		"343-338" 5,0*20,0		100,000					
	VV		"343-341" 2,0*35,0		70,000					
	VV		"343-338" 5,0*8,0		40,000					

16	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových šlétovníc z terénu zaberanění šlétovníc ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2
	VV	nová pol.	VZ CS URS 2021 01	
			Početová a souhrnná část 1. V cenách 2111 a 2112 jsou započteny náklady na přímouše zkuševních šlétovníc 2. V cenách nejsou započteny náklady na - dovoz nebo ošetření šlétovníc - dovoz šlétovníc třívle zabudovaných se ocelové ve speciální - vyjádření šlétovníc účasně zabudovaných se ocelové jako 2,9 nabež. použitou ceny nádobu 3) Jprava šlétovníc pro manipulaci včetně nádrží včetně tyto úpravy ze speciál cenami 153 11.1 - úprava ocelových šlétovníc	
	VV		"1. etapa - část PMDP, a.s."	
	VV		V802-VB05 (11,715+11,05+12,915)8,0	
	VV		V812-VB15, dl. 8,0 m* (12,95+20,4+18,4+14,25)8,0	
	VV		Součet	
17	K	153112123	Zřízení beraněných stěn z ocelových šlétovníc z terénu zaberanění šlétovníc ve standardních podmínkách, délky do 12 m	m2
	VV	nová pol.	VZ CS URS 2021 01	
			Početová a souhrnná část 1. V cenách 2111 a 2112 jsou započteny náklady na přímouše zkuševních šlétovníc 2. V cenách nejsou započteny náklady na - dovoz nebo ošetření šlétovníc - dovoz šlétovníc třívle zabudovaných se ocelové ve speciální - vyjádření šlétovníc účasně zabudovaných se ocelové ve speciální jako 6,5 nabež. použitou ceny nádobu 3) Jprava šlétovníc pro manipulaci včetně nádrží včetně tyto úpravy ze speciál cenami 153 11.1 - úprava ocelových šlétovníc	
	VV		"1. etapa: VB12-VB15, dl. 10,0 m* (4,2+1,65+1,15+4,2)10,0	
18	M	15920310	pažnice ocelová UNION dl 4 m	l
	VV		"dle tabulky šlétovníc: délka * počet * kg/bm; pažnice délky 7-10 m"	
	VV		8,00*(6+168+112-60-54-57)*74/1000 "odečet za úsek realizovaný výkopem"	
	VV		10,00*19*74/1000	
	VV		Součet	
19	K	153113112	Vyřízení stěn z ocelových šlétovníc zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2
	VV	nová pol.	VZ CS URS 2021 01	
			Početová a souhrnná část 1. V cenách nejsou započteny náklady na terénní šlétovnice pro manipulaci včetně nádrží včetně tyto úpravy ze speciál cenami 153 11.1 - úprava ocelových šlétovníc 2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravy a m2 včetně zabudování celé stěny	
	VV		"dle pol. zřízení"	
20	K	153113113	Vyřízení stěn z ocelových šlétovníc zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m	m2
	VV	nová pol.	VZ CS URS 2021 01	
			Početová a souhrnná část 1. V cenách nejsou započteny náklady na terénní šlétovnice pro manipulaci včetně nádrží včetně tyto úpravy ze speciál cenami 153 11.1 - úprava ocelových šlétovníc 2. V cenách nejsou započteny náklady na úpravy a m2 včetně zabudování celé stěny	



M	55283924	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm	m	0,000	13,000	660,00 Kč	0,00 Kč	8 580,00 Kč	8 580,00 Kč
23	M	216,5			13,000				
	VV								
24	K	163116113	Kleštiny nebo převázky pro hradičí stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	0,750	2 060,00 Kč	0,00 Kč	1 545,00 Kč	1 545,00 Kč
	VV	nová pol.	<i>Průběžná a souběžná část</i>						
	PSČ		1) v ceně 6112 a 6121 jsou započteny i náklady na dopravu materiál 2) v ceně 6111 nejsou započteny náklady na dopravu nebo zpracování klesťm a převázek 3) dodání klesťm nebo převázek může zahrnovat i cenu za speciální 4) jednotlivé klesťm nebo převázek závislé na specifikaci (jako 0 3) musí být poskytnuty 5) ceny materiálu						
	VV		"dle pol. montáže"						
25	K	998003111	Průhledy, záporny, dřevěné nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	115,796	1 480,00 Kč	0,00 Kč	171 378,08 Kč	171 378,08 Kč
	VV	nová pol.	<i>Průběžná a souběžná část</i>						
	PSČ		1) Průhledy a záporny lze rovněž použít pro armování betonových stěn a sloupů 2) Ceny jsou uvedeny v Kč za m ² včetně DPH						
			VIZ CS ÚRS 2021 01						
CELKEM:									5 042 389,48 Kč

NÁKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]: 1 385 225,78 Kč
CELKOVÝ ROZDIL MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE [KČ]: 8 699 553,18 Kč



vypracoval: datum
 za zhotovitele: 29.9.21
 za TDS: 30.9.21
 J. 10.21

PŘÍLOHA Č. 2

Společnost Vozovna Slovany

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Vedoucí společník

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:453 57 269

Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Druhý společník

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

IČ: 027 65 055

Pražákova 1008/69, 639 00 Brno - Štýřice

Třetí společník

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství nabídka	C.4.a.1 RDS PAB	Množství celkem RDS	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem rozdíll RDS - nabídka [CZK]	Cenová soustava
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m	m3	0,000	4 322,280	4 322,280	4 322,280	10,56	0,00	45 643,28	45 643,28	CS ÚRS 2019 02
	P		"předvýkopy pro beranění štělovnice na úroveň HTÚ; pozn.: Kubatury budou odečteny z části C.4.b HTÚ"			4 322,280							
	VV		Předvýkop. 6										
10	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	0,000	0,000	0,000	43,50	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,000	0,000	0,000	0,000	12,43	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	171201211	Poplatek za uložení slabebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kmeniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	1 296,684	1 296,684	1 296,684	124,28	0,00	161 151,89	161 151,89	CS ÚRS 2019 02
	P		"předvýkopy pro beranění štělovnice na úroveň HTÚ; pozn.: Kubatury budou odečteny z části C.4.b HTÚ"			1 296,684							
	VV		Předvýkop. 1,8										
13	K	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložněním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	0,000	0,000	0,000	0,000	288,27	0,00	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 02





ZMĚNOVÝ LIST Č. 018

Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35
 Objekt: E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT) OUT - SO 10-01 - ZTI
 Objednatel: **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČ: 25220683**
 Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň - Východní Předměstí
 „Společnost Vozovna Slovany“
 Zhotovitel: **Metrostav a.s., IČ: 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 (vedoucí společník)**
BERGER BOHEMIA a.s., IČ: 45357269, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň (druhý společník)
TSS GRADE, a.s. pob. ČR, IČ: 02765055, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (třetí společník)
 TDS: Sdružení IIS – vozovna Slovany
 Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Jan Kocí, hlavní inženýr projektu

Popis změny	<p>Obsahem změnového listu je část objektu OUT SO 10.01a - ležatá kanalizace pro objekt OUT (část A+B - nezpůsobilé a způsobilé položky). Změnový list je zpracován na základě změn zpracovaných v projektové dokumentaci ve stupni RDS pro ležatou kanalizaci. Změny provedeny z důvodu, aby mohl být řešený objekt OUT v provozu samostatně (provizorní stav a uvedení haly do zkušebního provozu). Změny na dešťové kanalizaci souvisí také s optimalizací retenční nádrže.</p>		
	změnu vyvolal: objednatel		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	zhotovitel	cenová změna za změnový list č.018 bez DPH
	cena SO dle SoD (bez DPH):		4 898 140,82 Kč
	náklady na změnu bez DPH:		1 403 487,42 Kč
	cena SO po ZL č.018 (bez DPH):		6 301 628,24 Kč
	cena díla bez DPH (dle SoD+ Dod.č.1):		1 710 095 922,85 Kč
změna ceny	Měněpráce celkem bez DPH:	127 561,19 Kč	1 658 609,80 Kč celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH:	1 531 048,61 Kč	
termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	změna nemá vliv na dokončení díla	
odsouhlasení změny	změnu odsouhlasil	datum	
	Zhotovitel		12.10.21
	Věcně za TDS		12.10.21
	Technicky za AD		12.10.21
	Objednatel		12.10.21
přílohy	č.1 - rozpočet ke změnovému listu č. 018 č.2 - RVV od společnosti Metroprojekt Praha a.s. č.3 - vyjádření AD č.4 - cenotvorba položek ZL		



Předmět díla: Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.:

018 A+B

MĚNĚPŘÁCE												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]	
1	K	721001	Potrubi PVC KG DN200 vč. kolén a odboček "váleč C" 48,70 (PPI) + 0,30 (pokrytí č. 008)	bm	55 000	50 200	4 800	913,86	50 263,40 Kč	45 876,78 Kč	4 386,62 Kč	
	VV		"dodatečně osazené potrubí do RS1" 1,2			1 200						
2	K	721002	Potrubi PVC KG DN150 vč. kolén a odboček "váleč C" 24,10 (PPI) + 1,2 (stoupací potrubí)	bm	69 000	49 200	19 800	95,109	57 874,12 Kč	41 873,63 Kč	16 000,49 Kč	
	VV		"váleč D" 4,50			4 500						
	VV		"váleč E" 18,20 (PPI) + 1,2 (stoupací potrubí)			19 100			0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
4	K	721004	Potrubi PVC KG DN100 vč. kolén a odboček "váleč C" 1,4+2,5 (odbočky) + 1,3+1,2 (stoupací potrubí)	bm	27 000	11 800	15 200	535,97	14 471,19 Kč	6 324,45 Kč	8 146,74 Kč	
	VV		"váleč D" 0,7 (odbočky) + 2,1 (stoupací potrubí)			2 800						
	VV		"váleč E" 2,6 (stoupací potrubí)			2 800						
10	K	721010	Revizní šachta 1200x1000mm vč.poklopu 600x600mm	kus	4 000	0 000	4 000	23 349,65	93 398,60 Kč	0 000 Kč	93 398,60 Kč	
	VV		zaměna sachet									
14	K	721014	Ocelová chránička DN250 dl.1m	kus	1 000	0 000	1 000	1 819,78	1 819,78 Kč	0 000 Kč	1 819,78 Kč	
	VV		prostupy součástí tohoto SP v pol. izolací soupravy; ocelová chránička nebude dle vyjádření Ing. Nýčové									
15	K	721015	Ocelová chránička DN300 dl.1m	kus	1 000	0 000	1 000	3 152,60	3 152,60 Kč	0 000 Kč	3 152,60 Kč	
	VV		prostupy součástí tohoto SP v pol. izolací soupravy; ocelová chránička nebude dle vyjádření Ing. Nýčové									
19	K	721019	Zkoušky těsnosti, revizní zprávy atd.	bm	309 000	354 400	34 400	19,08	7 422,12 Kč	6 765,77 Kč	656,35 Kč	
	VV		polubí do prům. dle zadání DN200 - 0 2 - P 2 - 35 4 - 11 8			16 600						
									CELKEM:	228 401,81 Kč	100 840,62 Kč	127 561,19 Kč

VÍCEPŘÁCE											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	množství po změně	rozdíl množství	J.cena [Kč]	celk.cena v SoD [Kč]	celk.cena po změně [Kč]	rozdíl celk. ceny [Kč]
3	K	721003	Potrubi PVC KG DN125 vč. kolén a odboček "váleč C" 2,4+2,3+0,1+0,2 (odbočky) + 1,6+1,5+2*1,3 (stoupací potrubí)	bm	3 100	35 400	4 400	716,44	22 209,64 Kč	25 361,98 Kč	3 152,34 Kč
	VV		"váleč D" 12,00 (PPI) + 0,8 - 0,9 (odbočky) + 1,8+2 - 2,2 (stoupací potrubí)			10 700					
	VV		"váleč E" 1,3+0,7+0,3 (odbočka) + 2,6 (stoupací potrubí)			4 900					
16	K	721016	Izolační souprava profil tlakové vody DN100-250	kus	8 000	18 000	10 000	1 122,00	8 976,00 Kč	20 196,00 Kč	11 220,00 Kč
106	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska zřízení	m	0 000	111 800	111 800	30,50	0 000 Kč	3 409,90 Kč	3 409,90 Kč
	VV		JS - CS ÚRS 201 01			111 800					
107	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska odstranění	m	0 000	111 800	111 800	13,00	0 000 Kč	1 453,40 Kč	1 453,40 Kč
	VV		JS - CS ÚRS 201 01			111 800					
108	K	13 251 104	Hloubení nezapečených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	0 000	105 756	105 756	184,00	0 000 Kč	19 459,15 Kč	19 459,15 Kč
	VV		JS - CS ÚRS 201 01								
	VV		"polozka pro hloubení plošných výkopů - hloubení jam, obsahuje příplatky a odvoz na skládku"								
	VV		"váleč F" 1,1 spousta "a" 0 0 3,5*12,2+1,8+2 0 1,5			177 600					
	VV		"odbočky" 2 (0,3+0,2 9" 1,2 2,2) 14 2 0 1,5			2 140					
	VV		"váleč G" 9 0" 1,5+2 1,5 8 1,2 0 1,5+9 0" 1,2 1,8 2 0 1,5 1,2 2 1,8 4 0 1,5			69 531					
	VV		potrubím pro sachet RS1 RS2 2 2 1,2 1,1 1,0 1,1 9 1,6 6 1,1 3 1,1 0 6 1,6 9			1 920					



123	K	161951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	0,000	328,970	129,970	14,83	0,00 Kč	4 893,46 Kč	4 893,46 Kč
	VV		Poloha převzata z VST 50 tř.1 pol.30								
	VV		úprava dlažby								
	VV		výš. v C* 118*11			88,540					
	VV		výš. v D* 110*11			18,100					
	VV		výš. v E* 100*11			22,000					
	V		výš. v F* - spocína ražni 40,0*3,5			40,000					
	VV		podklady F* (2,6+3) 4-2 9*11			9,750					
	VV		výš. v G* 19 0*11			53,900					
	K	451572111	Ložné pod potrubí, stoky a dráhové objekty v otepleném výkopu z kamenná drobného těženého C až 4 mm	m3	0,000	44,350	1 040,22		0,00 Kč	46 133,28 Kč	46 133,28 Kč
	VV		Poloha převzata z VST 50 tř.1 pol.35								
	VV		Kam. záclon 0,15 m (0,08+3) 0+2-0,07+0,15+0,03+5*0,5+0,6+3,1+2 9*11,0,15			41,811					
	VV		hlavní ná vlně pod sádky 3*2,2*2,0-3,1*0,10-1,5*0,15+1,1*0,83-1*0,15			2,539					
	K	452112111	Osažení betonových tříč prstenců nebo lamů pod potrubí a mříže, výšky do 100 mm	kus	0,000	9,000	194,20		0,00 Kč	1 747,80 Kč	1 747,80 Kč
	VV		Poloha převzata z VST 50 tř.1 pol.36								
	VV		Výš. v H* - výš. vlně pod sádky v. 0,0500, bod. na p. 592241								
	K	452112121	Osažení betonových tříč prstenců nebo lamů pod potrubí a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	0,000	2,000	2,000		0,00 Kč	460,00 Kč	460,00 Kč
	VV		JC ČS ÚSES R378 B1								
	V		Výš. v I* - viz výš. v H* - 0,0200, bod. na p. 592241								
	M	59224187	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 625x 120x100mm	kus	0,000	3,000	498,09		0,00 Kč	1 494,27 Kč	1 494,27 Kč
	VV		Poloha převzata z ODI 50 tř.1 pol.39								
	VV		prstenec sa 100*110 oválný betonový 625x 200x100mm (RŠ1)			1,000					
	VV		prstenec sa 100*110 oválný betonový 625x 200x120mm, 2 ks (RŠ1)			2,000					
	M	59224116	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 825x 120x80mm	kus	0,000	2,000	458,01		0,00 Kč	916,02 Kč	916,02 Kč
	VV		Poloha převzata z ODI 50 tř.1 pol.40								
	VV		JC ČS ÚSES R378 B1								
	M	59224117	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 800x 150x100mm	kus	0,000	1,000	1 552,50		0,00 Kč	1 552,50 Kč	1 552,50 Kč
	VV		JC - viz příloha č.1, cenová tabulka příloha 4, ZL								
	VV		JC (RŠ7)								
	M	59224122	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 800x 150x80mm	kus	0,000	2,000	1 497,30		0,00 Kč	2 994,60 Kč	2 994,60 Kč
	VV		JC - viz příloha č.1, cenová tabulka příloha 4, ZL								
	VV		JC (RŠ7) + JC (RŠ1)								
	M	59224123	prstenec šachťový vyrovnávací betonový 800x 150x60mm	kus	0,000	3,000	1 449,00		0,00 Kč	4 347,00 Kč	4 347,00 Kč
	VV		JC - viz příloha č.1, cenová tabulka příloha 4, ZL								
	VV		JC (RŠ5) + JC (RŠ6)								
	K	452113131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prosaženo v otepleném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C12/15	m3	0,000	4,652	3 057,29		0,00 Kč	14 222,65 Kč	14 222,65 Kč
	VV		Poloha převzata z VST 50 tř.1 pol.26								
	VV		prokladní beton 3*1*1 0 m 3*1*1 8*3, 1*1*1 6*1 6*3 (2*1 0)			1,960					
	VV		obložení ováln. pot. - blok patř. šouráček 2,0			2,100					
	VV		výš. v J* - viz výš. v I* - 0,0200, bod. na p. 592241			1,085					
	K	71111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti náterem z betonu na prošle vodotěsným náterem penetračním	m2	0,000	5,299	18,64		0,00 Kč	98,77 Kč	98,77 Kč
	VV		Poloha převzata z VST 50 tř.1 pol.41								
	VV		náterem šouráček RŠ1 - R3, 1*3 4*1*1,5 1			5,299					



134	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	0,000	39,329	39,329	24,86	0,00 Kč	977,72 Kč	977,72 Kč
			<i>Polozka prevzata z VST SO 051 pol.35</i>								
			<i>"natěr šachet RS1-RS3" 3,14*1,5*(3,47+2,69+2,19)</i>			39,329					
135	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,000	0,018	0,018	60 772,86	0,00 Kč	1 093,91 Kč	1 093,91 Kč
			<i>Polozka prevzata z VST SO 051 pol.34</i>								
			<i>"přepočtené koeficientem množství" (5,299+39,329)/0,00041</i>			0,018					
136	K	71111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	0,000	5,299	5,299	50,40	0,00 Kč	267,06 Kč	267,06 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"natěr šachet RS1-RS3" 3,14*1,5*1,5/4</i>			5,299					
137	K	71112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěrady a tmely za studena na ploše svíslé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	0,000	39,329	39,329	83,60	0,00 Kč	3 287,86 Kč	3 287,86 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"natěr šachet RS1-RS3" 3,14*1,5*(3,47+2,69+2,19)</i>			39,329					
138	M	SMB_205009002	COMBIFLEX-DS, 28l	litr	0,000	44,627	44,627	116,75	0,00 Kč	5 210,23 Kč	5 210,23 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"společná 1 litr"</i>			44,627					
139	K	21361R	SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXITILIE	M2	0,000	44,627	44,627	56,55	0,00 Kč	2 523,67 Kč	2 523,67 Kč
			<i>Polozka prevzata z SLA SO 11 pol.16</i>								
			<i>"vodorovná a svíslá plocha"</i>			44,627					
			<i>"výhledem odbočky 2,3 litry - dodavatel použije 2,3 litry se zpožděním"</i>			0,000				0,00 Kč	0,00 Kč
			<i>"vz. obj. 2,3 litry"</i>			0,000				0,00 Kč	0,00 Kč
			<i>"vz. obj. 2,3 litry"</i>			0,000				0,00 Kč	0,00 Kč
			<i>"vz. obj. 2,3 litry"</i>			0,000				0,00 Kč	0,00 Kč
141	K	721290113	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300	m	0,000	224,100	224,100	44,80	0,00 Kč	10 039,68 Kč	10 039,68 Kč
			<i>Polozka prevzata z ODT SO 10-07 pol.30</i>								
			<i>"Zkouška těsnosti pro potrubí DN 300"</i>			214,700					
			<i>"Zkouška těsnosti pro potrubí DN 250"</i>			9,400					
142	K	721905R	Dočasně vylučná potrubí PEHD DN 50, vč. signalizačního vodiče a výstražné fólie	bm	0,000	0,000	0,000	143,75	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
			JC - vz příloha 6.4 - cenotvorba položek ZL								
			<i>"vz. obj. 41,000"</i>			41,000					
143	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délkou přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu	kus	0,000	1,000	1,000	3 470,00	0,00 Kč	3 470,00 Kč	3 470,00 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"žebřík výstupový jednoduší přímý z pozinkované oceli dl 4m"</i>			1,000					
144	M	44983025	žebřík výstupový jednoduší přímý z pozinkované oceli dl 4m	kus	0,000	1,000	1,000	4 500,00	0,00 Kč	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"výstupní žebřík pro RŠT 1"</i>								
145	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC (lésných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	0,000	9,400	9,400	152,00	0,00 Kč	1 428,80 Kč	1 428,80 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"výlev F.4" 1,1+1,5 (odbočky)</i>			2,600					
			<i>"výlev G" 5,9+0,9 (odbočky) - realizace pouze část, potrubí bude dočasně zasklepeno z důvodu postupu výstavby"</i>			6,800					
146	M	28611252	trubka kanalizační PVC-U DN 250x300mm SN16	m	0,000	9,682	9,682	1 290,00	0,00 Kč	12 489,78 Kč	12 489,78 Kč
			JC - cs URS 2021 01								
			<i>"přepočtené koeficientem množství" 1,03</i>			9,682					
147	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC (lésné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	0,000	214,700	214,700	158,00	0,00 Kč	33 922,60 Kč	33 922,60 Kč
			JC - CS URS 2021 01								
			<i>"výlev F.1" 39,2 (PP - 1. etapa)</i>			39,200					
			<i>"výlev F.2" 39,6 (PP - 1. etapa)</i>			38,600					
			<i>"výlev F.3" 39,2 (PP - 1. etapa) + 0,5</i>			39,700					
			<i>"výlev F.4" 40,1 (PP) + 2,3+1,1 (odbočky) + 2*2,9 (sloupací vedení)</i>			49,300					
			<i>"výlev G" 33,3 (PP) + 6,8+2,0 (odbočky) + 2*2,9 (sloupací vedení)</i>			47,900					



148	M	2861223	trubka kanalizační PVC-U DN 315x300mm SN16	m	0,000	221,141	221,141	1 780,00	0,00 Kč	393 630,98 Kč	393 630,98 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			propeřené kočičím háčkováním 03								
149	K	87735211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednotnosé DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	246,00	0,00 Kč	246,00 Kč	246,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
150	M	28611610	čistič kus kanalizační PVC DN 200	kus	0,000	1,000	1,000	749,00	0,00 Kč	749,00 Kč	749,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			čistič kus dodávaný v ocelovém pouzdrí RS-1								
151	K	87735211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevíracím výkopu jednoosých DN 315	kus	0,000	25,000	25,000	402,00	0,00 Kč	10 050,00 Kč	10 050,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
152	M	28612210	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 250x45° SN12/16	kus	0,000	2,000	2,000	1 340,00	0,00 Kč	2 680,00 Kč	2 680,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: 1 ks F11 + 1 ks G								
153	M	25612213	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315x30° SN12/16	kus	0,000	1,000	1,000	2 280,00	0,00 Kč	2 280,00 Kč	2 280,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: 1 ks F11								
154	M	28612214	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 315x45° SN12/16	kus	0,000	14,000	14,000	2 520,00	0,00 Kč	35 280,00 Kč	35 280,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: 1 ks F11 + 1 ks F13 + 6 ks F14 + 5 ks G1								
155	M	25611514	reduktory kanalizační PVC 315/250	kus	0,000	3,000	3,000	1 070,00	0,00 Kč	3 210,00 Kč	3 210,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: redukce 300/200 KG + redukce 300/200 G - 2 ks DB, DN1								
156	M	28612238	zátky kanalizační plastové PVC KG DN 250	kus	0,000	1,000	1,000	976,00	0,00 Kč	976,00 Kč	976,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			zastavení odbočky na velký G ke O10								
157	M	25612239	zátky kanalizační plastové PVC KG DN 315	kus	0,000	4,000	4,000	2 190,00	0,00 Kč	8 760,00 Kč	8 760,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: docasné zastavení velké F1 na přeřazení do ODT								
158	K	87737521	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevíracím výkopu dvoosých DN 315	kus	0,000	5,000	5,000	621,00	0,00 Kč	3 105,00 Kč	3 105,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
159	M	28612229	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x25/45° SN12/16	kus	0,000	2,000	2,000	4 290,00	0,00 Kč	8 580,00 Kč	8 580,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: 1 ks F11 + 1 ks G1								
160	M	28612230	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 315x315/45° SN12/16	kus	0,000	3,000	3,000	7 200,00	0,00 Kč	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			pro velké PVC SN16: 1 ks F13 + 1 ks F14 + 1 ks G1								
162	K	89411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty služební	kus	0,000	9,000	9,000	916,00	0,00 Kč	8 244,00 Kč	8 244,00 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			vyprobat viz výřezový snímek 46 - odpovídá PVMU 7 ks (RS1-RS7)								
163	M	59224160	skruž kanalizační ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	0,000	3,000	3,000	1 220,02	0,00 Kč	3 660,06 Kč	3 660,06 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			Polohy přezadl ODT SO 1111 pa 50								
164	M	59224161	skruž kanalizační ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	0,000	4,000	4,000	1 599,52	0,00 Kč	6 398,08 Kč	6 398,08 Kč
			JC - CS URS 201 01								
			Polohy přezadl ODT SO 1111 pa 50								



165	M	59224R1	skruží kanalizační s ocelovými sloupadly 120 x 50 x 15 cm	kus	0,000	2,000	2,000	7 912,50	0,00 Kč	15 985,00 Kč	15 985,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	JC - viz příloha č. 4 - detailní dělení dle položek ZL								
166	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	1,000	1,000	950,00	0,00 Kč	950,00 Kč	950,00 Kč
		VV	JC - CS URS 2021 B1								
167	M	59224168	skruží betonová přechodová 62,5x100x60x12 ctn. sloupadla poplateková a kapsová	kus	0,000	1,000	1,000	1 974,57	0,00 Kč	1 974,57 Kč	1 974,57 Kč
		VV	Výpočet vz vyřezání a detail se rozpis příloha 3 ke RST R3/3								
168	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	0,000	7,000	7,000	1 110,00	0,00 Kč	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
		VV	Podoba převzata z ODT SO 1119 pro 58								
169	M	59224339	dno betonové šachty kanalizační přímě 100x100x60 cm	kus	0,000	4,000	4,000	11 051,38	0,00 Kč	44 205,52 Kč	44 205,52 Kč
		VV	Výpočet vz vyřezání a detail se rozpis příloha 3 ke RST R3/3								
			Podoba převzata z ODT SO 1119 pro 58								
			dno 100/70*215								
			dno 100/80*144								
170	M	59224R1	dno betonové šachty kanalizační přímě 120x140 cm	kus	0,000	1,000	1,000	29 325,00	0,00 Kč	29 325,00 Kč	29 325,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	JC - viz příloha č. 4 - cenovník příloha ZL								
170	M	59224R2	dno betonové šachty kanalizační přímě 120x160 cm	kus	0,000	2,000	2,000	32 545,00	0,00 Kč	65 090,00 Kč	65 090,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	JC - viz příloha č. 4 - cenovník příloha ZL								
171	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytých	kus	0,000	7,000	7,000	707,00	0,00 Kč	4 949,00 Kč	4 949,00 Kč
		VV	JC - CS URS 2021 B1								
172	M	PFB 1121651	Deska přechodová TK Q.1 120-100/25 typ Q.1	kus	0,000	1,000	1,000	8 156,24	0,00 Kč	8 156,24 Kč	8 156,24 Kč
		VV	Výpočet vz vyřezání a detail se rozpis příloha 3 ke RST R3/3								
172	M	59224R1	deska zakrytá 62,5-120/20	kus	0,000	2,000	2,000	6 817,00	0,00 Kč	13 754,00 Kč	13 754,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	JC - viz příloha č. 4 - cenovník příloha ZL								
173	M	59224R2	deska zakrytá 80-100/20	kus	0,000	4,000	4,000	5 313,00	0,00 Kč	21 252,00 Kč	21 252,00 Kč
		NOVÁ POLOŽKA	JC - viz příloha č. 4 - cenovník příloha ZL								
174	K	894410112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro lůdku zařízení DN 400, E600	kus	0,000	7,000	7,000	1 037,69	0,00 Kč	7 263,83 Kč	7 263,83 Kč
		VV	Podoba převzata z ODT SO 1119 pro 68								
175	M	55241001	poklop šachtový DN 300 lůdku D 400, kulhový s ventilační	kus	0,000	4,000	4,000	5 988,94	0,00 Kč	23 955,76 Kč	23 955,76 Kč
		VV	Výpočet vz vyřezání a detail se rozpis příloha 3 ke RST R3/3								
176	M	59224660	poklop šachtový betonová výplň - lůdku 785x610x16mm D400 bez odvětrání	kus	0,000	3,000	3,000	2 710,00	0,00 Kč	8 130,00 Kč	8 130,00 Kč
		VV	Podoba převzata z ODT SO 1119 pro 68								
177	K	994276101	Přesun lůdku pro trubní vedení hloubené z rubu z plastických lůdků nebo ekvivalentních pro vřadový nebo kanalizační v olejném výstupu dopravní vzdálenosti do 15	l	0,000	48,815	48,815	1 021,58	0,00 Kč	49 868,43 Kč	49 868,43 Kč
		VV	Podoba převzata z ODT SO 1119 pro 68								
178	K	994276124	Přesun lůdku pro trubní vedení hloubené z rubu z plastických lůdků nebo ekvivalentních pro příplatek k cenám za zvláštní přesun přes vymezenou největší dopravní vzd	l	0,000	48,815	48,815	879,90	0,00 Kč	42 952,32 Kč	42 952,32 Kč
		VV	Podoba převzata z ODT SO 1119 pro 68								
CELKEM:										31 185,64 Kč	1 531 048,61 Kč

NAKLADY NA ZMĚNU BEZ DPH (VÍCEPRÁCE - MĚNĚPRÁCE) [KČ]:		1 403 487,42 Kč
CELKOVÝ ROZDÍL MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE OPROTI SOG CELKEM [KČ]:		1 658 609,80 Kč

vypracoval:		datum	
za zhotovitele:		01.09.2021	
za TDS:			

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Vozovny Slovany - Z13

Objekt:

E - SOD IV - Objekty oprav a údržby tramvají (OUT)

Soupis:

OUT - SO 10-01 - ZTI

Dílní soupis (podobně):

OUT - SO 10-01.a - ZTI - 1. část ležatá kanalizace

Místo:

Píseň - Východní Předměstí

Zadavatel:

Píseňské městské dopravní podniky, a.s.

Uchazeč:

Výplň údaj

Datum:

25.08.2021

Projektant:

společnost "MP + MMD - Vozovna Slovany"

Zpracovatel:

METROPROJEKT Praha a.s.

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství RDS SO 10-01.a	Rozdíl množství RDS - nabídka	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem RDS - nabídka [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem											
D	PSV	Práce a dodávky PSV					269 759,83	1 576 739,53	1 306 979,70		
D	721.1	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					255 618,81	142 429,97	-113 188,84		
1	K 721001	Potrubi PVC KG DN200 vč. kolien a odboček *včetně C 48,70 (PP) + 0,30 (pokrytí 5.008) *dodatečně osazené potrubí do RS*1,2 Součet	bm	55,000	50,200	-4,800	913,88	50 263,40	45 876,78	-4 386,62	
2	K 721002	Potrubi PVC KG DN150 vč. kolien a odboček *včetně C* 24,10 (PP) + 1,2 (stoupačací potrubí) *včetně D* 4,50 (PP) *včetně E* 18,20 (PP) + 1,2 (stoupačací potrubí) Součet	bm	66,000	49,200	-18,800	851,09	57 874,12	41 873,63	-16 000,49	
3	K 721003	Potrubi PVC KG DN125 vč. kolien a odboček *včetně C* 2,4+2,3+0,1+0,2 (odbočky) + 1,6+1,5+2*1,3 (stoupačací potrubí) *včetně D* 12,00 (PP) + 0,8+0,9 (odbočky) + 1,8+2,1+2,2 (stoupačací potrubí) *včetně E* 1,3+0,7+0,3 (odbočka) + 2,6 (stoupačací potrubí) Součet	bm	31,000	35,400	4,400	716,44	22 209,64	25 361,98	3 152,34	
4	K 721004	Potrubi PVC KG DN100 vč. kolien a odboček *včetně C* 1,4+2,5 (odbočky) + 1,3+1,2 (stoupačací potrubí) *včetně D* 0,7 (odbočky) + 2,1 (stoupačací potrubí) *včetně E* 2,6 (stoupačací potrubí) Součet	bm	27,000	11,800	-15,200	535,97	14 471,19	6 324,45	-8 146,74	
5	K 721005	HT potrubí DN100 vč. kolien a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	662,56	0,00	0,00	0,00	
6	K 721006	HT potrubí DN70 vč. kolien a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	505,60	0,00	0,00	0,00	
7	K 721007	HT potrubí DN50 vč. kolien a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	455,16	0,00	0,00	0,00	
8	K 721008	HT potrubí DN40 vč. kolien a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	376,08	0,00	0,00	0,00	
9	K 721009	HT potrubí DN32 vč. kolien a odboček	bm	0,000	0,000	0,000	353,12	0,00	0,00	0,00	
10	K 721010	Revizní šachta 1200x1000mm vč. poklopu 600x600mm	kus	4,000	0,000	-4,000	23 349,65	93 399,60	0,00	-93 399,60	
11	K 721011	Ventilační hlavice DN100	kus	0,000	0,000	0,000	728,32	0,00	0,00	0,00	
12	K 721012	Podlahová vpusť DN70 - suchá zápach. uzávěrka	kus	0,000	0,000	0,000	2 709,63	0,00	0,00	0,00	
13	K 721013	Podomítkový pračkový sílon DN50	kus	0,000	0,000	0,000	543,97	0,00	0,00	0,00	
14	K 721014	Ocelová chránička DN250 dl.1m	kus	1,000	0,000	-1,000	1 819,78	1 819,78	0,00	-1 819,78	
15	K 721015	Ocelová chránička DN300 dl.1m	kus	1,000	0,000	-1,000	3 152,60	3 152,60	0,00	-3 152,60	
16	K 721016	Izolační souprava proti tlakové vodě DN100-250	kus	8,000	10,000	2,000	1 122,00	8 976,00	20 186,00	11 220,00	
17	K 721017	Sílon pro odvod kondenzátu DN40	kus	0,000	0,000	0,000	1 170,94	0,00	0,00	0,00	
18	K 721018	Sílon DN50	kus	0,000	0,000	0,000	521,48	0,00	0,00	0,00	
19	K 721019	Zkouškový těsnostní, revizní zápravy a.d. *potrubí do přím. sítě zašití: DN200* 50,2+49,2+35,4+11,8	bm	181,000	146,600	-34,400	19,08	3 453,48	2 797,13	-656,35	
20	K 72117404R	Zdravotnicka - podtlakové odvodnění střechy Potrubí PEHD d 40 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolien, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	112,44	0,00	0,00	0,00	
21	K 72117405R	Potrubi PEHD d 50 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolien, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	112,81	0,00	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Množství RDS SO 10-01.a	Rozdílní množství RDS - nabídká	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem RDS [CZK]	Cena celkem rozdíl RDS- nabídká [CZK]	Cimová souhlava
22	K	72117406R	Potrubi PEHD d 56 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	K	72117407R	Potrubi PEHD d 63 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	146,45	0,00	0,00	0,00	0,00
24	K	72117408R	Potrubi PEHD d 75 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	172,54	0,00	0,00	0,00	0,00
25	K	72117409R	Potrubi PEHD d 90 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	K	72117411R	Potrubi PEHD d 110 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	316,55	0,00	0,00	0,00	0,00
27	K	72117413R	Potrubi PEHD d 125 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	456,64	0,00	0,00	0,00	0,00
28	K	72117416R	Potrubi PEHD d 160 pro podtlakové odvodnění, dodávka a montáž včetně tvarovek PEHD (kolen, odboček) a uchycení	m	0,000	0,000	0,000	614,76	0,00	0,00	0,00	0,00
29	K	72123310R	Síťeštní viok QSM 75 260 - fóliový typ, dodávka a montáž	kus	0,000	0,000	0,000	4 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00
30	K	72123311R	Elektrický ohřev QSM 75, dodávka a montáž	kus	0,000	0,000	0,000	3 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	K	72123312R	Příruba pro připojení parozábrany DN 75, dodávka a montáž	kus	0,000	0,000	0,000	2 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32	K	72123313R	Plech základní 600x600x1,5, dodávka a montáž	kus	0,000	0,000	0,000	1 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	K	72123314R	Nástavec síťeštního vioku DN 315, dodávka a montáž	kus	0,000	0,000	0,000	3 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00
34	K	721280112	Zkouška těsnosti podtlakové kanalizace v objektech vodou do DN 200	m	0,000	0,000	0,000	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35	K	713411121	Montáž izolace lepené potrubí a chybné pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií přípověněnými ocelovým drátem potrubí jednotlivě	m	0,000	0,000	0,000	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00
36	M	6315401R	minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 100 mm	m	0,000	0,000	0,000	147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
37	M	6315402R	minerální izolace s hliníkovou fólií tl. 20 mm pro kanalizační potrubí do d = 200 mm	m	0,000	0,000	0,000	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00
D 722												
38	K	722001	Zdravotnická - vnitřní vodovod	bm	0,000	0,000	0,000	366,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39	K	722002	Potrubi EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 20x2,3mm, DN15	bm	0,000	0,000	0,000	408,99	0,00	0,00	0,00	0,00
40	K	722003	Potrubi EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 25x2,8mm, DN20	bm	0,000	0,000	0,000	464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
41	K	722004	Potrubi EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN20; 40x4,5mm, DN32	bm	0,000	0,000	0,000	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	K	722005	Potrubi EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN16; 50x5,6mm, DN40	bm	0,000	0,000	0,000	757,98	0,00	0,00	0,00	0,00
43	K	722006	Potrubi EVO PP-RCT včetně tvarovek a závěsů, PN16; 63x7,1mm, DN50	bm	0,000	0,000	0,000	1 134,85	0,00	0,00	0,00	0,00
44	K	722007	Potrubi z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 100, PN 16, spoj Viciatic	bm	0,000	0,000	0,000	7 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	K	722008	Potrubi z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 80, PN 16, spoj Viciatic	bm	0,000	0,000	0,000	4 959,84	0,00	0,00	0,00	0,00
46	K	722009	Potrubi z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 50, PN 16, spoj Viciatic	bm	0,000	0,000	0,000	2 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00
47	K	722010	Potrubi z ocelových trubek nerezových svařovaných DN 25, PN 16, spoj Viciatic	bm	0,000	0,000	0,000	1 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00
48	K	722011	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm, DN15	bm	0,000	0,000	0,000	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00
49	K	722012	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm, DN20	bm	0,000	0,000	0,000	153,01	0,00	0,00	0,00	0,00
50	K	722013	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm, DN25	bm	0,000	0,000	0,000	181,15	0,00	0,00	0,00	0,00
51	K	722014	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm, DN32	bm	0,000	0,000	0,000	173,54	0,00	0,00	0,00	0,00
52	K	722015	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm, DN40	bm	0,000	0,000	0,000	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00
53	K	722016	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.13 mm, DN50	bm	0,000	0,000	0,000	218,24	0,00	0,00	0,00	0,00
54	K	722017	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm, DN15	bm	0,000	0,000	0,000	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	722018	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.20 mm, DN20	bm	0,000	0,000	0,000	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	722019	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm, DN25	bm	0,000	0,000	0,000	182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
57	K	722020	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm, DN32	bm	0,000	0,000	0,000	216,58	0,00	0,00	0,00	0,00
58	K	722021	Minerální izolace s hliníkovou fólií pro potrubí tl.30 mm, DN40	bm	0,000	0,000	0,000	210,53	0,00	0,00	0,00	0,00
59	K	722022	Ruční šoupě DN 100 (uzavřené víkové);PN 16	kus	0,000	0,000	0,000	6 564,02	0,00	0,00	0,00	0,00
60	K	722023	Kulový kohout DN50	kus	0,000	0,000	0,000	2 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00
61	K	722024	Kulový kohout DN40	kus	0,000	0,000	0,000	1 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00
62	K	722025	Kulový kohout DN32	kus	0,000	0,000	0,000	877,11	0,00	0,00	0,00	0,00
63	K	722026	Kulový kohout DN25	kus	0,000	0,000	0,000	585,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64	K	722027	Kulový kohout DN20	kus	0,000	0,000	0,000	497,38	0,00	0,00	0,00	0,00
65	K	722028	Kulový kohout DN15	kus	0,000	0,000	0,000	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00
66	K	722029	zpeňná klapka DN 100	kus	0,000	0,000	0,000	4 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00
67	K	722030	Vypouštěcí kohout DN15	kus	0,000	0,000	0,000	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
68	K	722031	Rohový ventil DN15	kus	0,000	0,000	0,000	180,44	0,00	0,00	0,00	0,00
69	K	722032	Výtokový ventil DN 20 (se šroubením pro hadici)	kus	0,000	0,000	0,000	633,18	0,00	0,00	0,00	0,00
70	K	722033	Prackový ventil se ZK20	kus	0,000	0,000	0,000	841,28	0,00	0,00	0,00	0,00
71	K	722034	Podružný vodoměr na studenou vodu DN50 s dávkovým odeběratel MBUS	kus	0,000	0,000	0,000	20 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00
