

<b>Dostavba kanalizace v Brně II.</b>			
- dostavba kanalizace v městských částech -			
<b>Změnový list č. 0-002 – sekce 1-5</b>		Datum předložení:	15. 06. 2020
Ev. č.	0-002	Datum schválení:	
Objednatel:	Statutární město Brno		
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV		
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.		

Změnový list předkládá:	[REDAKCE]		
Charakter změny:	<i>Mimořádné opatření</i>	<i>Oprava položek dle skutečnosti</i>	
Stavba / objekt / úsek:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)</i></li> <li>2. <i>Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace</i></li> <li>3. <i>Maloměřice a Obrňany – dostavba stokové sítě</i></li> <li>4. <i>Tuřany-Dvorska – odkanalizování místní části</i></li> <li>5. <i>Brno-jih – dostavba kanalizační sítě</i></li> </ol>		
<p><b>Specifikace změny:</b> <i>Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice v období od 16. 03. 2020 do 17. 05. 2020, dle usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 03. 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, a to dle usnesení vlády do 17. 05. 2020, podle nynějších informací.</i></p> <p><i>Jedná se o prodloužení celkové doby realizace díla o dobu, po kterou nebylo možné provádět zásahy do vodovodní sítě nutné pro další postup realizace kanalizačních stok, související s vyhlášením nouzového stavu v ČR a usnesením z 2. zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje, ze dne 13. 03. 2020 a usnesením z 12. zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje, ze dne 09. 04. 2020 (viz přílohy ZL). Jedná se o mimořádné opatření na všech sekcích.</i></p>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Finanční dopad změny:	Navýšení / úspora / bez dopadu		
Změna ceny po schválení:			

<b>Stanovisko správce stavby:</b>	
<b>Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):</b> viz příloha č. xx – Stanovisko projektanta	
<b>Vyjádření PIU:</b>	
<b>Přílohy:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Popis změny</li> <li>2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet</li> <li>3. Stanovisko projektanta</li> </ol>

	<p>4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)</p> <p>5. Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla zpracována – seznam</p> <p>6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny (fotografie, nákresy, zápisy ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu, apod.)</p> <p>6. A. Kopie – Usnesení z 2. zasedání Krizového štábu JMK ze dne 16. 3. 2020</p> <p>6. B. Kopie – Usnesení z 12. zasedání Krizového štábu JMK ze dne 9. 4. 2020</p> <p>6. C. Kopie Usnesení z 12. zasedání Krizového štábu JMK ze dne 18. 5. 2020</p> <p>6. D. Kopie Datové zprávy odeslané vč. seznamu</p> <p>6. E. Kopie listu stavebního deníku sekce Bosonohy: ulice Hoštická</p> <p>6. F. Kopie listu stavebního deníku sekce Bosonohy: ulice Průjezdní</p> <p>6. G. Kopie listů stavebního deníku sekce Líšeň</p> <p>6. H. Kopie listů stavebního deníku sekce Brno-jih</p> <p>6. I. Kopie listů stavebního deníku sekce Maloměřice - Obřany</p> <p>6. J. Situace jednotlivých dotčených sekcí se znázorněním ulic</p> <p>7. Evidence vlivu události</p> <p>8. Harmonogram s dopadem změny</p>
--	--

<b>Schvalovací proces:</b>	
<b>PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY</b>	<b>PODPIS ZÁSTUPCE PIU</b>
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)
Jméno: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED]
Datum:	Datum:
<b>Vyjádření Zhotovitele:</b> Claim má dopad do celkového HMG stavby – tuto skutečnost reflektují přílohy claimu.	
<b>PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE</b>	<b>PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE</b>
	Změnu schvaluji / neschvaluji xx)
Jméno: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED]
Datum:	Datum:

**Poznámka:**

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu čísla MČ:

1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorská – odkanalizování místní části
5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě

xx) *nehodící se škrtněte*

## Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 0-002 – sekce 1-5

Datum předložení:

15. 6. 2020

Ev. č.

0-002

Datum schválení:

Objednatel:

Statutární město Brno

Správce stavby:

Sdružení Garnets – VRV

Zhotovitel:

Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.

### Příloha č. 1 – popis změny

V souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „**pandemie COVID – 19**“) a opatřeními přijatými pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020, č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, které bylo později nahrazeno usnesením Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, kterými byly uzavřeny mimo jiné základní a střední školy, s čímž souvisí nezbytná péče o nezletilé ze strany jejich rodičů;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, kterým vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, který je zároveň považován za krizovou situaci ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí, kterým mimo jiné zakázala vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí. Tento zákaz byl s účinností od 0:00 16. března 2020 rozšířen
- na zákaz vstupu pro všechny cizince, krom těch s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření v mezinárodní osobní dopravě, kterým mimo jiné bylo zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční dopravě zajišťované vozidly s obstavitelností nad 9 osob a všem dopravcům v mezinárodní drážní dopravě přepravu cestujících přes hranice České republiky;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření v maloobchodním prodeji a prodeji služeb, kterým mimo jiné zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření, kterým mimo jiné zakázala prodej ubytovacích služeb, tedy hotelů a penzionů;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
- o omezení pohybu osob, kterým mimo jiné nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, zaměstnavatelům např. doporučila podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření, kterým mimo jiné uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení jejich provozu;
- Usnesení z 2. zasedání Krizového štábu Jihomoravského Kraje ze dne 16. března 2020, č. j.: JMK 45148/2020  
A zejména:
- Usnesení z 12. zasedání Krizového štábu Jihomoravského Kraje ze dne 9. dubna 2020, č. j.: JMK

53956/2020 , které mimo jiné ukládá vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury zrušení všech plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře.

Po provedené analýze Usnesení z 2. zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje ze dne 16. 03. 2020, konstatujeme, že tato situace má zásadní dopad do termínu realizace námi prováděného Díla a na doporučení hejtmána Jihomoravského kraje a současně s doporučením Krizového štábu Jihomoravského kraje ukládá ve smyslu krizového zákona vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury opatření ve smyslu bodu 1 b) Usnesení.

V této souvislosti došlo k omezení plnění aktuálního harmonogramu prací, kdy jsme předpokládali fyzicky zasahovat do zařízení stávající vodárenské a plynárenské infrastruktury.

Tato situace měla dopad do harmonogramu postupu prací, a to vlivem nemožnosti realizace přeložek vodovodních a plynárenských řadů kolidujících s trasami nově budované kanalizace. Jedná se o následující kolizní místa:

### **Sekce: Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)**

#### **SO III. 11 – ulice Průjezdní**

Při budování nové splaškové kanalizace probíhá částečné bourání stávající dešťové kanalizace, do které jsou částečně svedeny i splaškové vody z nemovitostí.

Dle HMG je naplánováno budování nové dešťové kanalizace včetně přepojování stávajících přípojek v souladu s HMG a bylo nutné zahájit práce na přeložce vodovodního řádu, dle HMG zahájení prací v termínu od 15. 4. 2020.

Na tomto úseku bylo vlivem vzniklé mimořádné situace znemožněno provést přeložky vodovodu, došlo k přerušení stavebních prací na budování splaškové kanalizační stoky A1-1 a dešťové kanalizační stoky D5-2 v úseku mezi šachtami SŠ 4 - SŠ5 (DŠ 56- DŠ60).

#### **SO IV. 6 – ulice Hoštická**

**V uvedeném úseku docházelo ke kolizi s nově budovanou splaškovou kanalizací se stávajícím vodovodním řádem a bylo nutné provést přeložku, abychom mohli pokračovat v příslušných stavebních činnostech.**

Vlivem vzniklé mimořádné situace došlo k přerušení stavebních prací na nově budované splaškové kanalizační, v úseku stoky B3 u šachty A5. Tyto přeložky bylo možné zrealizovat až po zrušení mimořádných opatření a následně obnovit stavební činnost.

### **Sekce: Brno-jih – dostavba kanalizační sítě**

#### **TZ 01 – ulice Ořechovská**

V 1. etapě (ul. Ořechovská) jsme zahájily stavební práce na pokládce nového vedení souladu s HMG, byly provedeny tlakové zkoušky a dezinfekci potrubí, propojení se stávajícím vedením bylo možno provádět až po vydání povolení současného provozovatele této infrastruktury a po vydání rozhodnutí a zrušení mimořádného opatření (k propojení byla přerušena dodávka vody/ odstávka vody).

### **Sekce: Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace**

#### **SO - Ulice Ondráčkova a Velatická**

V tomto úseku docházelo ke kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi (vodárenská a plynárenská infrastruktura), kdy vlivem mimořádných situací nebylo možno provádět přeložky – dochází k posunutí termínu realizace daných úseků po dobu trvání nouzového stavu a opatření.

**Závěr:**

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice v období od 16. 03. 2020 do 17. 05. 2020, dle usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 03. 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, a to dle usnesení vlády do 17. 05. 2020, podle nynějších informací.

Jedná se prodloužení celkové doby realizace díla o dobu, po kterou nebylo možné provádět zásahy do stávající infrastruktury nutné pro další postup realizace kanalizačních stok, související s vyhlášením nouzového stavu v ČR a usnesením z usnesení z 12. zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje, ze dne 09. 04. 2020. Jedná se o mimořádné opatření na všech sekcích.

Je nutné podotknout, že by bez výrazné pomoci všech složek podílejících se na vlastní realizaci tohoto projektu a bez součinnosti objednatele i SpSt při řešení krizových situací s kolizemi stávající infrastruktury a s orgány, které se vyjadřují k různým povolením, žádostem zhotovitele např. zkrácením doby pro svá vyjádření k projednávaným změnám a novým opatřením, by došlo k dalšímu výraznému posunu termínu vlastní realizace výstavby kanalizace ve všech sekcích této stavby.

## ZÁZNAM Z MĚŘENÍ

Název projektu:	Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)			
Secke:	1. Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa) 2. Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace 3. Maloměřice a Obřany – dostavba stokové sítě 4. Tuřany-Dvorská – odkanalizování místní části 5. Brno-jih – dostavba kanalizační sítě			
Objednatel:	Statutární město Brno			
Zhotovitel:	Společnost „Kanalizace Brno II.“ - vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I – HOCHTIEF CZ a.s.; společník II – FIRESTA a.s.			
Správce stavby:	Sdružení Garnets – VRV			
Název objektu:	Stavební objekty všech sekcí 1,2,3,4,5			
Sledované období:	od 12.3.2020 do 8.6.2020			
Datum měření:	08.06.2020			
Popis důvodu měření:	Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v České republice v období od 16.3.2020 do 17.5.2020, dle usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 03. 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., O bezpečnosti České republiky a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, a to dle usnesení vlády do 17. 05. 2020, podle nynějších informací Usnesení z 2. zasedání Krizového štábu Jihomoravského Kraje ze dne 16. března 2020, č.j.: JMK 45148/2020 a Usnesení z 12. zasedání Krizového štábu Jihomoravského Kraje ze dne 9. dubna 2020, č.j.: JMK 53956/2020, které mimo jiné ukládá vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury zrušení všech plánovaných oprav, údržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře.			
Použití měřidla, certifikace				
Popis způsobu provedených měření:	výpočet dopadu opatření do konečného termínu realizace prací.			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
		datum	nárokovaná doba	
<b>Bosonohy – dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)</b>				
<b>SO IV.6 – ulice Hoštická</b>				
	zjištění kolize budované kanalizační stoky s vodovodem	18.03.2020		
	zrušení opatření (usnesení viz příloha 6C)	18.05.2020	61	
	znovuaktivace pracoviště a oznámení propoje	25.05.2020	7	
	uplynutí oznamovací lhůty, propoj	08.06.2020	14	
	<b>dopad do doby realizace</b>		<b>82</b>	
<b>SO III.11 – ulice Průjezdní</b>				
	zjištění kolize budované kanalizační stoky s vodovodem	08.04.2020		
	zrušení opatření (usnesení viz příloha 6C)	18.05.2020	40	
	znovuaktivace pracoviště a oznámení propoje	25.05.2020	7	
	uplynutí oznamovací lhůty, propoj	08.06.2020	14	
	<b>dopad do doby realizace</b>		<b>61</b>	
<b>Brno-jih – dostavba kanalizační sítě</b>				
<b>TZ 01 - ulice Ořechovská</b>				
	přerušeni prací 31.3.2020-25.4.2020		25	
	přerušeni prací 11.6.2020-22.6.2020		11	
	prodloužení doby realizace		26	
	<b>dopad do doby realizace</b>		<b>62</b>	
<b>Líšeň – dostavba splaškové a dešťové kanalizace</b>				
<b>SO - ulice Ondráčkova, Velatická</b>				
	zjištění kolize budované kanalizační stoky s vodovodem	18.03.2020		
	zrušení opatření (usnesení viz příloha 6C)	18.05.2020	61	
	znovuaktivace pracoviště a oznámení propoje	25.05.2020	7	
	uplynutí oznamovací lhůty, propoj	08.06.2020	14	
	<b>dopad do doby realizace</b>		<b>25</b>	
<b>celkový dopad do času - 18.3. - 8.6.2020</b>			<b>82 dny</b>	
Změřeno a ověřeno:				
Datum:	Správce stavby		Podpis:	
Datum:	Zhotovitel		Podpis:	

**KRIZOVÝ ŠTÁB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**  
**Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

---

Sp. Zn.: S – JMK 45148/2020  
Č. j.: JMK 45148/2020



**Usnesení z 2. zasedání**  
**Krizového štábu Jihomoravského kraje**

konaného v budově Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 3, Brno

dne 16. března 2020

Krizový štáb Jihomoravského kraje dle programu zasedání přijal toto usnesení:

**1. Vyhlášení nouzové stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.**

---

Krizový štáb Jihomoravského kraje

**bere na vědomí** vydaná usnesení vlády k provedení vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhláší pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

**doporučuje hejtmanovi:**

- a) uložit starostům obcí s rozšířenou působností aktivovat krizové štáby k plnění úkolů vydaných usnesením vlády a dalších aktuálně vydaných úkolů k provedení opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Činnost krizových štábů zabezpečit v co největší míře v distanční formě;

*Plní: starostové obcí s rozšířenou působností*

*T: ihned*

- b) uložit všem vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací), zrušení všech plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře vyvolávající přerušení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod, s výjimkou všech bezodkladných havarijních stavů na předmětné infrastruktuře;

*Plní: vlastníci a provozovatelé vodárenské infrastruktury na území Jihomoravského kraje*

*T: ihned*

- c) uložit náměstkovi hejtmana pro oblast sociálních věcí a rodinnou politiku koordinovat činnosti a opatření dle usnesení vlády č. 207 ze dne 13. března 2020 v oblasti poskytování sociálních služeb včetně koordinace zásobení osobními ochrannými pomůckami;

*Plní: náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí a rodinnou politiku*

*T: ihned*

- d) uložit náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy koordinovat činnosti a opatření v oblasti dopravy včetně zásobení ochrannými pomůckami;

*Plní: náměstek hejtmana pro oblast dopravy*

*T: ihned*

- e) uložit radnímu pro oblast zdravotnictví koordinovat činnosti a opatření v oblasti zdravotnictví včetně zásobení ochrannými pomůckami;

*Plní: radnímu pro oblast zdravotnictví*

*T: ihned*



- f) uložit vedoucími odboru kancelář ředitele zabezpečit ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídlem v Brně informování osob v případě negativního výsledku testování na koronavirus SARS CoV-2;

*Plní: ředitel KHS JMK, vedoucí OKŘ KrÚ JMK*

*T: ihned*

- g) uložit řediteli Krajského úřadu Jihomoravského kraje ustanovit skupinu pro zabezpečení nákupu ochranných prostředků a materiálu pro výrobu dezinfekce;

*Plní: ředitel KrÚ JMK*

*T: ihned*

- h) uložit řediteli Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a zdravotnickým zařízením na území kraje provádět testování pouze u indikovaných osob. Dále zabezpečit přednostní testování na koronavirus SARS CoV-2 u indikovaných příslušníků základních složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, a také zaměstnanců v zdravotnických pobytových zařízeních a pobytových sociálních službách.

*Plní: ředitel KHS JMK*

*T: ihned*

- i) uložit vedoucímu odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje koordinovat činnosti související s využitím studentů pro řešení krizové situace.



*Plní: vedoucí OKŘ KrÚ JMK*

*T: ihned*

- j) uložit vedoucímu odboru školství zabezpečit činnosti dle usnesení vlády č. 219 ze dne 15. března 2020. Uvedené opatření zabezpečit i pro zaměstnance příspěvkových organizací kraje v oblasti sociální.

*Plní: vedoucí OŠ KrÚ JMK*

*T: ihned*



→ 01/10



JUDr. Bohumil ŠIMEK  
hejtman Jihomoravského kraje

Brno, 18. května 2020  
JMK 67851/2020

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

na základě vydaných usnesení Vládou České republiky k provedení vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, byl vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav na období od 12. března do 17. května 2020.

Dne 15. května 2020 zasedal Krizový štáb Jihomoravského kraje a přijal usnesení, kterým doporučil ukončit opatření přijatá v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2.

Na základě usnesení 22. zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje, **ukončuji platnost opatření, kterým bylo uloženo všem vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací), zrušení všech plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře vyvolávající přerušování dodávky vody nebo odvádění odpadních vod, s výjimkou všech bezodkladných havarijních stavů na předmětné infrastruktuře a s výjimkou případů plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře vyvolávající přerušování dodávky vody, jestliže tyto opravy a práce budou mít za následek přerušování dodávek vody nepřesahující 8 hodin v téže lokalitě za podmínky, že bude zajištěna dostatečná informovanost osob dotčených prováděním takových oprav a prací a bude zajištěno náhradní zásobování vodou způsobem odpovídajícím aktuálním opatřením dotýkajících se nouzového stavu a současně bude zajištěno zásobování vodou pro osoby nacházející se v karanténě v lokalitě dotčené shora uvedenými opravami či pracemi.**

V případě potřeby Vám bližší informace podá člen Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje

S pozdravem

všem obcím v Jihomoravském kraji

**KRIZOVÝ ŠTÁB JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**  
**Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

---

Sp. Zn.: S – JMK 45146/2020  
Č. j.: JMK 53956/2020



**Usnesení z 12. zasedání**  
**Krizového štábu Jihomoravského kraje**

konaného v budově Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 3, Brno

dne 9. dubna 2020

Krizový štáb Jihomoravského kraje dle programu zasedání přijal toto usnesení:

## **1. Řešení situace v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu**

---

Krizový štáb Jihomoravského kraje

### **projednal**

- a) aktuální informace související s vyhlášeným nouzovým stavem v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaním výskytu koronaviru SARS CoV-2;
- b) distribuci OOPP – neplánované zavážení různých OOPP ze strany MV bez ohledu na aktuální potřeby v zásobování; JMK také obdržel 20 tis. rapid testů;
- c) informaci, že s účinností ode dne 7. dubna 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 1. dubna 2020 č.j. MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN, tím se ruší úkol uložený radnímu pro zdravotnictví dne 3. 4. 2020 (dotýkající se vyčlenění 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje pro Covid pacienty ze sociálních služeb – nově je tuto kapacitu třeba zajistit mimo zdravotnická zařízení s akutní lůžkovou péčí + je možné zabezpečení v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením);
- d) nejasnosti u početních možností laboratoří provádějících rozboru odběrů spojených s výskytem onemocnění COVID-19 na území JMK;
- e) nedostatek zdravotnického personálu pro potřeby péče o osoby, jímž jsou poskytovány sociální služby s prokázaným onemocněním COVID-19, které nebyly hospitalizovány, a pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí;
- f) žádost starosty ORP Znojmo o zřízení odběrové stanovy při nemocnici Znojmo;
- g) žádost primátorky a některých dalších starostů o úpravu usnesení KŠ ze dne 16. 3. 2020 týkající se prací na vodárenské infrastruktuře;
- h) žádosti onkologických pacientů o OOP;
- i) pracovní režim SPŠ KŠ JMK.

### **souhlasí s**

- a) oslovením ÚKŠ s žádostí o distribuci OOPP dle potřeby kraje (nyní zejm. ochranné obleky a respirátory) a pokud možno dle pravidelného plánu tak, aby kraj mohl plánovat redistribuci OOPP;
- b) přidělením rapid testů do oblasti sociální pro testování zaměstnanců, případně dle pokynů ÚKŠ;
- c) oslovením zájmových sdružení a komor zdravotnických pracovníků s žádostí o bezúplatnou dobrovolnickou pomoc pro potřeby péče o osoby, jímž jsou poskytovány sociální služby s prokázaným onemocněním COVID-19, které nebyly hospitalizovány, a pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané z důvodu domácího násilí;
- d) zrušením usnesení KŠ JMK uvedeným pod písmenem b) ze dne 16. 3. 2020 a jeho nahrazením usnesením z dnešního KŠ JMK připouštějící výjimky za splnění určitých podmínek;
- e) provedením analýzy zmapování kapacity zařízení provádějících rozboru odběrů spojených s výskytem onemocnění COVID-19 na území JMK;
- f) změnou pracovního režimu SPS KŠ JMK na pracovní dny od 7 do 17 hodin;

### **doporučuje hejtmanovi:**

- a) uložit radnímu pro zdravotnictví ve spolupráci s řediteli zdravotnických zařízení v kraji a ve spolupráci s náměstkem pro sociální oblast zajistit realizaci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020 č.j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN a předat informaci krizovému štábu;

*Plní: radní pro zdravotnictví ve spolupráci s náměstkem pro sociální oblast*

*T: ihned*

- b) uložit všem vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury (vodovodů a kanalizací), zrušení všech plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře vyvolávající přerušení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod, s výjimkou všech bezodkladných havarijních stavů na předmětné infrastruktuře a s výjimkou případů plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací na vodárenské infrastruktuře vyvolávající přerušení dodávky vody, jestliže tyto opravy a práce budou mít za následek přerušení dodávek vody nepřesahující 8 hodin v téže lokalitě za podmínky, že bude zajištěna dostatečná informovanost osob dotčených prováděním takových oprav a prací a bude zajištěno náhradní zásobování vodou způsobem odpovídajícím aktuálním opatřením dotýkajících se nouzového stavu a současně bude zajištěno zásobování vodou pro osoby nacházející se v karanténě v lokalitě dotčené shora uvedenými opravami či pracemi;


*Plní: vlastníci a provozovatelé vodárenské infrastruktury na území Jihomoravského kraje*

*T: ihned*

- c) uložit radnímu pro zdravotnictví ve spolupráci s ředitelem HZS JMK zabezpečit zřízení odběrového stanu při nemocnici Znojmo.

*Plní: radní pro zdravotnictví ve spolupráci s ředitelem HZS JMK*

*T: ihned*



## Seznam ODESLANÝCH datových zpráv

ČÍSLO DZ	DATUM ODESLÁNÍ	ADRESÁT	PŘEDMĚT	PŘÍLOHY/blížeší popis
DZ0042	26.3.2020	Správce stavby	Upozornění na vyšší moc	zpoždění karanténa koronavirus
DZ0044	18.3.2020	Správce stavby	Upozornění na událost	Sekce Brno-Jih „Kolize stoky S1 (ŠS – Š1) v křížení s energokanálem EON
DZ0047	20.3.2020	Správce stavby	Oznámení zhotovitele k události z DZ 0039	-----
DZ0048	20.3.2020	Správce stavby	odpověď na email - usnesení krizového štábu	-----
DZ0051	24.3.2020	Správce stavby	Upozornění na událost - Líšeň - propoje plynu	-----

## Seznam OBDRŽENÝCH datových zpráv

ČÍSLO DZ	DATUM ODESLÁNÍ	ADRESÁT	odpověď na	PŘEDMĚT
DZ72/6/4/2 020	6.4.2020	Kanalizace Brno II	DZ0042	Reakce na COVID 19

**Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele:** 5619054122/SOD00200389  
**Dílo:** Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)  
**Věc:** Oznámení o Vyšší moci pandemie COVID – 19

**Související korespondence:**

**Související pod-články smlouvy:** 1.13, 4.28, 8.4, 8.5, 8.13, 4.28, 13.7, 19.1, 19.2, 19.4 a 20.1

**Adresováno Objednateli:** Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

**Kopie Správci stavby:** Sdružení „Garnets – VRV“, [REDACTED] Garnets Consulting, a.s.,

Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legií 445/4

415 10 Teplice

**ID datové schránky:** 3bcd78d

**Dopis Zhotovitele č.:** DZ0042

**Datum:** 24. 03. 2020

### **Oznámení o Vyšší moci pandemie COVID – 19**

#### **Oznámení o claimu Zhotovitele č. 3**

*V souladu s Pod-články 1.13, 4.28, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.1, 19.2, 19.4 a 20.1 Smluvních podmínek*

Vážení,

tímto dopisem Vám Zhotovitel oznamuje událost Vyšší moci v souladu s Pod-Články 19.1 a 19.2 Smluvních podmínek v souvislosti s výskytem pandemie COVID – 19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „**pandemie COVID – 19**“) a opatřeními přijatými pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízeními Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů, zejména:

- *Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020, č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, které bylo později nahrazeno usnesením Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství, kterými byly uzavřeny mimo jiné základní a střední školy, s čímž souvisí nezbytná péče o nezletilé ze strany jejich rodičů;*
- *Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, kterým vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, který je zároveň považován za krizovou situaci ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon);*
- *Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí, kterým mimo jiné zakázala vstup pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí. Tento zákaz byl s účinností od 0:00 16. března 2020 rozšířen na zákaz vstupu pro všechny cizince, krom těch s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem;*
- *Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření v mezinárodní osobní dopravě, kterým mimo jiné bylo zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční dopravě zajišťované vozidly s obstavitelností nad 9 osob a všem dopravcům v mezinárodní drážní dopravě přepravu cestujících přes hranice České republiky;*

- Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření v maloobchodním prodeji a prodeji služeb, kterým mimo jiné zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření, kterým mimo jiné zakázala prodej ubytovacích služeb, tedy hotelů a penzionů;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření o omezení pohybu osob, kterým mimo jiné nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, zaměstnavatelům např. doporučila podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě;
- Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 216 o přijetí krizového opatření, kterým mimo jiné uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům omezení jejich provozu;

Zhotovitel průběžně monitoruje situaci u všech svých dodavatelů a Podzhotovitelů, avšak při aktuálním dynamickém vývoji situace s výskytem pandemie COVID – 19 se dá předpokládat, že dojde k novým restriktivním opatřením a také zásadním omezením či dokonce výpadkům jejich dodávek a plnění. Tato situace může nastat v řádu dní nebo dokonce hodin, a to nejenom ze svobodného rozhodnutí těchto subjektů, ale zejména z rozhodnutí státních a samosprávních orgánů. Tato nová restriktivní opatření s vážnějšími důsledky, které mohou mít daleko větší negativní vliv na hospodářskou činnost v České republice a na provádění prací Zhotovitelem, personálem Zhotovitele, ale i na straně Podzhotovitelů a dodavatelů, než ty k dnešnímu datu přijaté.

Vzhledem k tomu, že výskyt pandemie COVID – 19 a opatření přijatá pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízenými Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů jsou okolnosti a události, jež naplňují všechny předpoklady pro to, aby kumulativně splnily všechny body v prvním odstavci Pod-Článku 19.1 Smluvních podmínek, tedy:

- a) Zhotovitel je nemůže ovládat,
- b) Zhotovitel nemohl proti nim učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
- c) po jejich vzniku se jim Zhotovitel nemohl účelně vyhnout nebo je překonat a
- d) nelze je v podstatné míře přičíst Objednateli,

tak tyto události a okolnosti jsou Vyšší mocí.

**V souladu s Pod-Článkem 19.2 Smluvních podmínek, Oznamení o vyšší moci:** „ Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejich závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je nebo bude bráněno. Oznamení musí být podáno do 14 dnů potom, co si tato Strana uvědomila nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost nebo okolnost zakládající Vyšší moc. Tato strana musí být po tom, co dala oznámení, omluvena z plnění těchto závazků na tak dlouho, jak jí Vyšší moc brání v jejich plnění. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku se Vyšší moc nepoužije na závazky kterékoli Strany zaplatit druhé Straně podle Smlouvy kromě doby splatnosti povinné částky.“

Zhotoviteli je v tuto chvíli , a to i přes vynaložení veškerého úsilí, které od něj lze spravedlivě požadovat, bráněno v plnění následujících závazků, a to z důvodu nedostatku pracovních kapacit v důsledku výše popsaného výskytu pandemie COVID – 19 a opatření přijatými pro její zmírnění Vládou České republiky a nařízenými Ministerstva zdravotnictví České republiky a jiných státních orgánů:

#### 1. Sekce Bosonohy:

období od 04/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí– např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E- on,a.s..

Období 03/2020 , ulice Hoštická - zde se v současné době tj. od 19. 03. 2020 dostáváme do kolize nově budované splaškové kanalizace se stávajícím vodovodním řádem a bude nutné provést přeložku, abychom mohli pokračovat ve stavebních činnostech



Období 04/2020 , ulice Průjezdní - při budování nové splaškové kanalizace probíhá částečné bourání stávající dešťové kanalizace, do které jsou částečně svedeny i splaškové vody z nemovitostí.

Dle HMG je naplánováno budování nové dešťové kanalizace včetně přepojování stávajících přípojek od 15. 04. 2020. Současně je nutné zahájit práce na přeložce vodovodního řádu, dle HMG zahájení prací v termínu od 15. 04. 2020.

Období 05/2020 , Bosonožském náměstí, v dané lokalitě není plánovaná žádná přeložka vodovodního řádu, ale na stávající dešťové kanalizaci se budou bourat staré RŠ a budeme je nahrazovat novými. Dle našeho průzkumu i zde dochází ke kontaminaci dešťové kanalizace splašky.

## 2. Sekce Kanalizace Brno – JIH

období 05/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí– např. BVak,a.s., v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

období 03/2020, probíhají práce na výstavbě nové splaškové kanalizace, stoka S1 a S2, výtlaku V1

Při budování těchto sítí nepředpokládáme činnost, která vyvolá přerušování dodávky vody nebo odvádění splaškových vod. V území se také nenachází žádná vodoteč. Zatím jediný problém nastal v dodávce materiálu na výtlak V1 , kdy se nám opozdila dodávka trubního materiálu s týdenním zpožděním. V dané lokalitě se nenachází stávající splašková kanalizace, která odvádí splašky z přilehlých nemovitostí.

Období 03 – 04 /2020, ulice Ořechovská. Co se týká rekonstrukce vodovodu. V 1. etapě( ul. Ořechovská) můžeme provést pokládku nového vedení, tlakové zkoušky a dezinfekci potrubí, propojení se stávajícím vedením provedeme až po povolení (k propojení budou potřebovat odstávky vody,.... ).

Problém může nastat v případě déle trvající krizové situace v tom , že ulici Ořechovskou máme pod milníkem (dokončení prací do konce r. 2020) a objevují se nám problémy s délkou pro vyjádření našich žádostí příslušných orgánů( povolení ,vyjádření se k žádostem) ve smyslu:např. k vyřízení povolení ZUK u paní [redacted] na MMB je nutno doložit také souhlas dopravní policie s § 25 – tedy stanovisko k ZUK. Nám byla odsouhlasena Situace DIO k § 77, tedy odsouhlasené značení jako takové dne 4.3. Na podnět paní [redacted] jsem 10. 03. podala žádost k § 25 na PČR DI (doposud bez reakce). Momentálně máme souhlasy z oboru linkové dopravy, Brněnských komunikací, Správy silnic a předběžný souhlas paní [redacted] za obor Investiční. Žádost o stanovení PDZ máme podanou od 04. 03. Žádost o ZUK od 13. 03. s tím, že bez souhlas dopravního inspektorátu k ZUK (§25) nám paní Ing. [redacted] ZUK nepovolí – vzniklou situaci řešíme.

## 3. Sekce Maloměřice a Obřany

období 04/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí– např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

Období 03- 05/2020 Obřany. Nyní zahajujeme stavební práce na objízdě komunikaci a výstavbě nové čerpací stanice, tyto práce by měli probíhat do konce května 2020 a nemají vliv na usnesení JMK.

Období 06/2020, obecná informace - přeložky vodovodního řádu, v dalších fázích výstavby budeme manipulovat se stávajícím vodovodem a to už v průběhu června 2020 - budeme řešit po vydání.

## 4. Sekce Tuřany – Dvorská

období 04/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí - např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

období 03/2020, obecná informace, co se týče sekce Tuřany - Dvorská, tak zde je situace obdobná jako na ostatních sekcích, budujeme nové kanalizační sítě a stávající kanalizace neexistuje - zde k žádnému omezení nedojde. Stejně tak se neplánují žádné koordináční práce s ostatními provozovateli inženýrských sítí (E.on, Innogy, Cetin atd..) kteří by nás svoji možnou nečinností mohli nějakým způsobem omezovat.

Období 05/2020, ulice Výsluní, zde je naplánovaná přeložka vodovodního řádu v délce 80 bm, která je v současné době v kolizi s budoucí trasou dešťové kanalizace, zde také předpokládáme výskyt splaškových vod.

## 5. Sekce Líšeň

Období 05/2020, ulice Ondráčková. V této souvislosti si dovolueme upozornit, že podle aktuálního harmonogramu předpokládáme fyzický zásah do zařízení stávající vodárenské infrastruktury k datu 05/2020 Ondráčkova,

Období 07/2020, ulice Velatická

Po uvedených datech již nebude fyzicky možné v uvedených částech vyhovět případnému omezení z uloženého opatření. Tedy, pokud Objednatel hodlá vyhovět případným omezením z uloženého opatření tak, aby bylo zajištěno nepřerušené fungování předmětné infrastruktury po dobu trvání nouzového stavu, považujeme za nezbytné, aby Objednatel vůči nám konal v souladu a postupy předpokládanými uzavřenou Smlouvou před uvedenými daty i v případě, že uložení omezujícího opatření za strany hejtmána Jihomoravského kraje bude teprve předpokládáno.

Propoje plynovodů

Obdrželi jsme od společnosti GasNet a GridServices, zajišťující propoje plynovodů v Lišni, zprávu prostřednictvím emailové korespondence, že pozastavují veškeré práce na propojích a odpojích, s ohledem na nouzový stav v souvislosti s prohlášením vlády k šíření koronavirové infekce COVID-19 v České republice. - Práce jsou zatím pozastaveny do 05. 04. 2020. - Pokud by však práce byly pozastaveny na delší dobu, tzn. po 05. 04. 2020, bude to mít za následek posunutí/zpoždění doby výstavby o tento časový úsek, tj. prodloužení o které nelze realizovat stavební práce

Zabránění plnění výše vyjmenovaných závazků může, a s největší pravděpodobností i bude mít vliv na Doby dokončení celého Díla, jakožto i splnění Milníků, a Zhotoviteli tím vznikne zpoždění a dodatečné Náklady.


Dále Zhotovitel oznamuje, že z důvodu akutního nedostatku osobních ochranných pracovních pomůcek a ochranných prostředků, pro všechny pracovníky, dále z důvodu absence dostatečných pokynů ze strany Správce stavby a dalších přijatých restriktivních legislativních opatření může dojít až k přerušení provádění všech stavebních prací na Staveništi. Zhotovitel je totiž vázán nejen Pod-Článkem 6.7 Smluvních podmínek přijmout za všech okolností veškerá přiměřená preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnosti Personálu zhotovitele, ale také Pod-článkem 1.13 Smluvních podmínek – tedy jednat v souladu s příslušnými právními předpisy ohledně zajištění bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a také dodržovat postupy stanovené orgány veřejné správy dle Pod-čl. 8.5.

Věříme, že obě smluvní strany si uvědomují závažnost vzniklé situace, přičemž Zhotovitel za těchto okolností vynakládá veškeré své úsilí k minimalizování jakýchkoliv zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku vzniku okolností Vyšší moci.

Avšak vzhledem ke všemu výše uvedenému Vám Zhotovitel tímto podává v souladu s Pod-Články 1.13, 8.4, 8.5, 8.13, 4.28, 13.7, 19.4 a 20.1 oznámení claimu na dodatečnou platbu, Doby pro dokončení a prodloužení pro splnění Milníků.

*Z důvodu extrémních požadavků na Zhotovitele ve spojení s pandemií COVID – 19 Zhotovitel tímto žádá a navrhuje, že detailní claim bude Správci stavby předložen do 42 dnů od ukončení nouzového stavu v České republice.*

*S pozdravem*



**Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele:** 5619054122/SOD00200389  
**Dílo:** Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

**Věc:** Upozornění na událost MČ Brno - JIH

**Související korespondence:**

**Související pod-články smlouvy:** 8.1., 8.3, 8.4, 20.1

**Adresováno Správci stavby:** Sdružení „Garnets – VRV“, [redacted] Garnets Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legií 445/4  
415 10 Teplice

**ID datové schránky:** 3bcd78d

**Dopis Zhotovitele č.:** DZ0044

**Datum:** 18. 03. 2020

### **Upozornění na událost**

*V souladu s Pod-článkem 8.1.až 8.4., 20.1 Smluvních podmínek*


Vážení,

zasíláme Vám v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 5619054122/SOD00200389 a smluvními podmínkami pro stavbu: „Dostavba kanalizace v Brně II., dle odstavce 8. Zahájení, zpoždění a přerušování, upozornění na událost nebo okolnost v sekci 5 – MČ Brno JIH - Kolize stoky S1 (ŠS – Š1)


- Trasa kanalizace kříží vedení EONu. Toto vedení je provedeno formou energokanálu, který svojí hmotou významně zasahuje do výkopu, viz foto a výřez situace (sprejem schematicky vyznačena poloha naší trubky)
- Situace byla řešena i se zástupcem EONu fyzicky na místě i telefonicky (p. Rýpal, 724 053 033).
- EON bohužel s ohledem na výjimečný stav daný současnou situací ohledně šíření koronavirového viru a onemocnění COVID-19 v České republice pracuje na částečnou kapacitu a dle neformálního sdělení nám s touto situací nebude umět v reálném čase jakkoli pomoci.
- Potvrzují, že stavba provedla bez zbytečných odkladů obkopy kanálu kvůli zjištění skutečného rozměru a zaměřila
- Po investorovi tak požadujeme sdělení, jak dále postupovat, zejména s přihlédnutím k tomu, že máme vyřízené zvláštní užívání a dopravní značení do konce tohoto týdne a reálným limitem bylo zahájení prací na kruhovém objezdu v Moravanech.
- Žádáme o sdělení dalšího postupu v této části co nejdříve. V pátek musíme povrch uvést do pojízdného stavu!

*S ohledem na tuto okolnost/událost bychom Vás chtěli informovat, že hodláme také postupovat dle č. 20.1 smluvních podmínek.*

*S pozdravem*

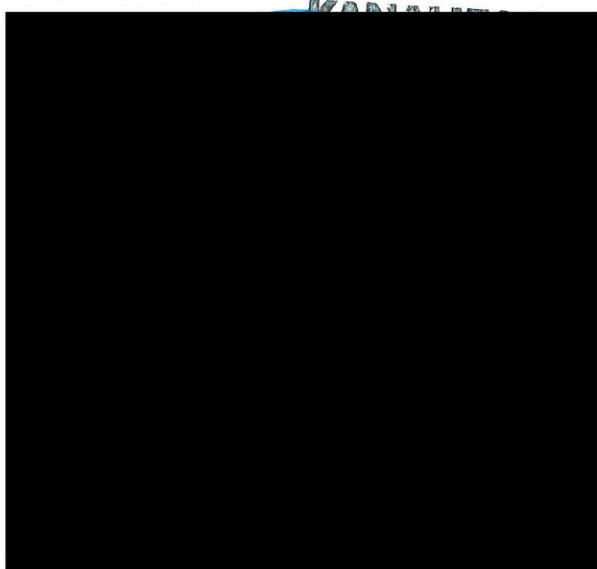


**BRNO II**  
RESTA - Fišer  
D Brno, Vevří

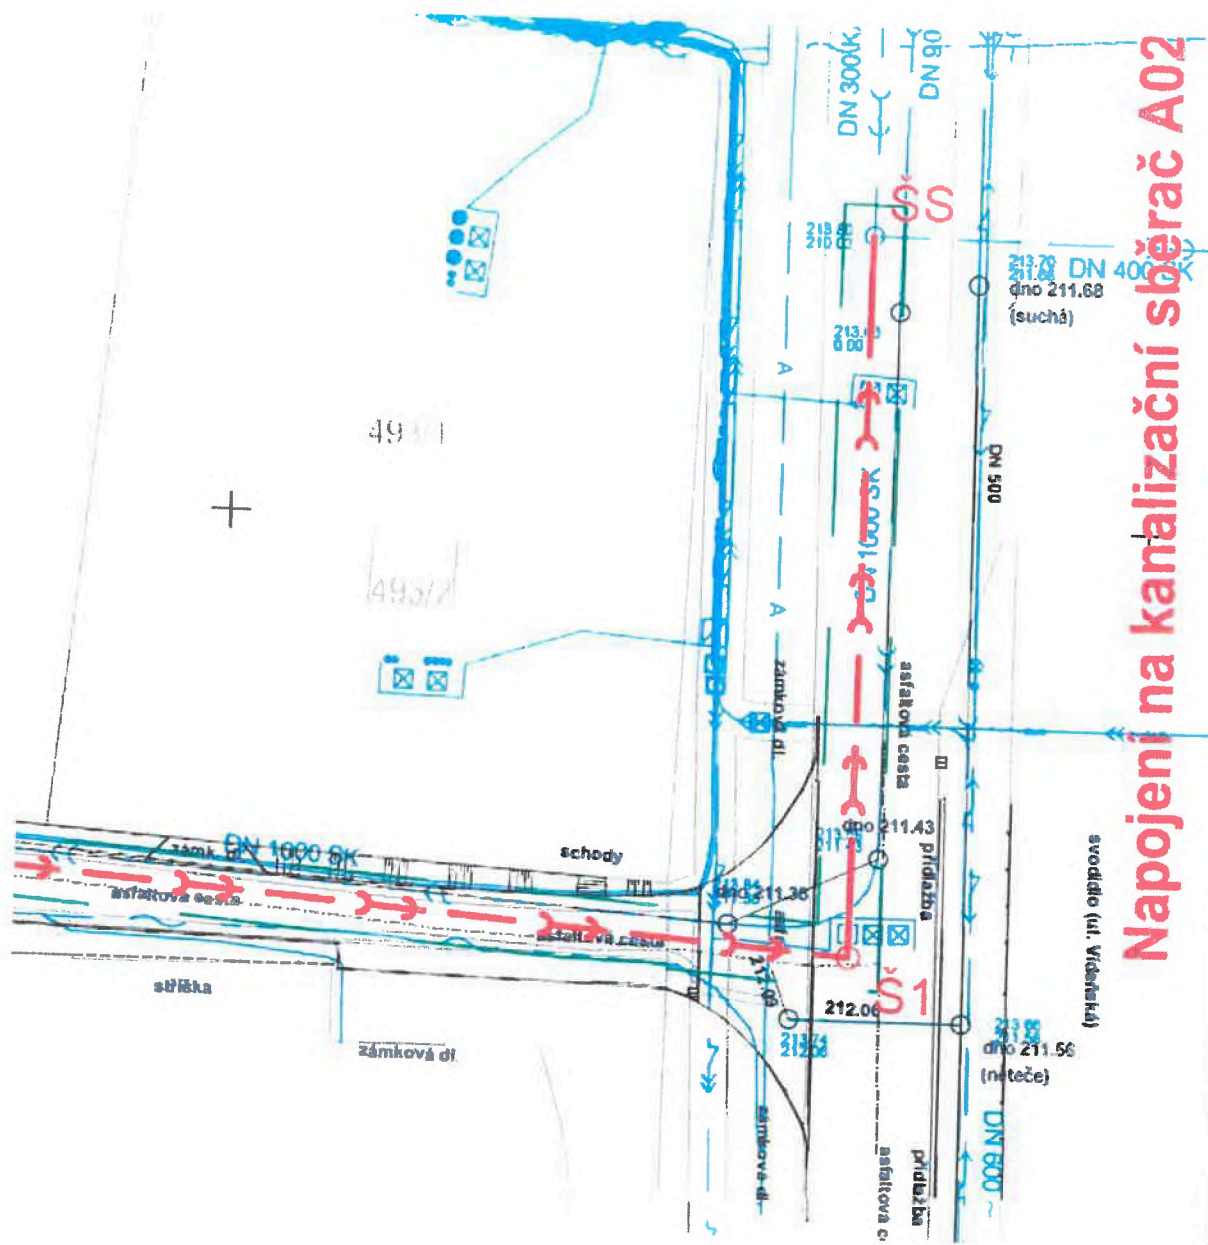

**Napojení na kanalizační sběrač A02**

svodilce (ul. Vítězná)






**Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele:** 5619054122/SOD00200389

**Dílo:** Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

**Věc:** Oznámení zhotovitele k události v MČ Líšeň

**Související korespondence:** DZ0039

**Související pod-články smlouvy:** 8.4, 13.1, 20.1

**Adresováno Správci stavby:** Sdružení „Garnets – VRV“,  Garnets Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legií 445/4  
415 10 Teplice

**ID datové schránky:** 3bcd78d

**Dopis Zhotovitele č.:** DZ0047

**Datum:** 20. 03. 2020

### **Oznámení zhotovitele**

Vážení,


dne 10. 03. 2020 jsme Vám zasílali prostřednictvím DZ0039 upozornění na událost v sekci 2 MČ Líšeň, týkající se nedostatečného krytí kabeláže v chodníkovém pásu, ze které vyplynula nutnost provést přeložku této kabeláže.

V návaznosti na emailovou korespondenci mezi zhotovitelem a zástupcem firmy EON, bylo tímto zástupcem sděleno, že je nutné požádat o přeložku oficiální cestou.

K urychlení celé problematiky bylo zažádáno o přeložku zhotovitelem sekce 2, ja FIRESTA FIŠER.

Tímto Vám tedy oznamujeme, že bylo zažádáno o přeložku kabelů v sekci Líšeň.

S pozdravem





**Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele:** 5619054122/SOD00200389  
**Dílo:** Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)  
**Věc:** Odpověď na usnesení krizového štábu JM kraje

**Související korespondence:**

**Související pod-články smlouvy:** 8.3

**Adresováno Správci stavby:** Sdružení „Garnets – VRV“, [redacted] Garnets Consulting, a.s.,  
Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legii 445/4  
415 10 Teplice

**ID datové schránky:** 3bcd78d

**Dopis Zhotovitele č.:** DZ0048

**Datum:** 20. 03. 2020

### **Odpověď zhotovitele na zaslání Usnesení krizového štábu Jihomoravského kraje**

Vážený pane,

po provedené analýze Usnesení z 2. zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje ze dne 16. 03. 2020, konstatujeme, že toto nemá v danou chvíli žádný vliv na námi prováděnou stavbu. Pouze v případě, kdy hejtmán Jihomoravského kraje v souladu s doporučením Krizového štábu Jihomoravského kraje uloží ve smyslu krizového zákona vlastníkům a provozovatelům vodárenské infrastruktury opatření ve smyslu bodu 1 b) Usnesení, lze očekávat, že Objednatel bude jako takový vlastník konat v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo tak, aby vyhověl uvedenému opatření a současně minimalizoval dopady svého omezení ve vztahu k nám jako Zhotoviteli.

V této souvislosti si dovolueme upozornit, že podle aktuálního harmonogramu předpokládáme fyzický zásah do zařízení stávající vodárenské infrastruktury:

#### **1. Sekce Bosonohy:**

období od 04/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí– např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

Období 03/2020 , ulice Hoštická - zde se v současné době tj. od 19. 03. 2020 dostáváme do kolize nové budované splaškové kanalizace se stávajícím vodovodním řádem a bude nutné provést přeložku, abychom mohli pokračovat ve stavebních činnostech

Období 04/2020 , ulice Průjezdní - při budování nové splaškové kanalizace probíhá částečné bourání stávající dešťové kanalizace, do které jsou částečně svedeny i splaškové vody z nemovitostí.

Dle HMG je naplánováno budování nové dešťové kanalizace včetně přepojování stávajících přípojek od 15. 04. 2020. Současně je nutné zahájit práce na přeložce vodovodního řádu, dle HMG zahájení prací v termínu od 15. 04. 2020.

Období 05/2020 , Bosonožském náměstí, v dané lokalitě není plánovaná žádná přeložka vodovodního řádu, ale na stávající dešťové kanalizaci se budou bourat staré RŠ a budeme je nahrazovat novými. Dle našeho průzkumu i zde dochází ke kontaminaci dešťové kanalizace splašky.

#### **2. Sekce Kanalizace Brno – JIH**

období 05/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí– např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

období 03/2020, probíhají práce na výstavbě nové splaškové kanalizace, stoka S1 a S2, výtaku V1

Při budování těchto sítí nepředpokládáme činnost, která vyvolá přerušeni dodávky vody nebo odvádění splaškových vod. V území se také nenachází žádná vodoteč. Zatím jediný problém nastal v dodávce materiálu na výtak V1, kdy se nám opozdila dodávka trubního materiálu s týdenním zpožděním. V dané lokalitě se nenachází stávající splašková kanalizace, která odvádí splašky z přilehlých nemovitostí.

Období 03 – 04 /2020, ulice Ořechovská. Co se týká rekonstrukce vodovodu. V 1. etapě( ul. Ořechovská) můžeme provést pokládku nového vedení, tlakové zkoušky a dezinfekci potrubí, propojení se stávajícím vedením provedeme až po povolení (k propojení budou potřebovat odstávky vody, .... ).

Problém může nastat v případě déle trvající krizové situace v tom, že ulici Ořechovskou máme pod milníkem (dokončení prací do konce r.2020) a objevují se nám problémy s délkou pro vyjádření našich žádostí příslušných orgánů( povolení, vyjádření se k žádostem) ve smyslu: např. k vyřízení povolení ZUK u paní [REDAKCE] na MMB je nutno doložit také souhlas dopravní policie s § 25 – tedy stanovisko k ZUK. Nám byla odsouhlasena Situace DIO k § 77, tedy odsouhlasené značení jako takové dne 4.3. Na podnět paní [REDAKCE] jsem 10. 03. podala žádost k § 25 na PČR DI (doposud bez reakce). Momentálně máme souhlasy z oboru linkové dopravy, Brněnských komunikací, Správy silnic a předběžný souhlas paní [REDAKCE] a obor Investiční. Žádost o stanovení PDZ máme podanou od 04. 03. Žádost o ZUK od 13. 03. s tím, že bez souhlas dopravního inspektorátu k ZUK (§25) nám paní Ing. [REDAKCE] ZUK nepovolí – vzniklou situaci řešíme.

### 3. Sekce Maloměřice a Obrány

období 04/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí– např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

Období 03- 05/2020 Obrány. Nyní zahajujeme stavební práce na objízdné komunikaci a výstavbě nové čerpací stanice, tyto práce by měli probíhat do konce května 2020 a nemají vliv na usnesení JMK.

Období 06/2020, obecná informace - přeložky vodovodního řádu, v dalších fázích výstavby budeme manipulovat se stávajícím vodovodem a to už v průběhu června 2020 - budeme řešit po vydání.

### 4. Sekce Tuřany – Dvorská

období 04/2020 – obecná informace, začíná být problém s vytyčováním inženýrských sítí – např. BVak,a.s.,v současné době tato organizace pracuje v omezeném provozu a to samé platí pro společnost E-on,a.s..

období 03/2020, obecná informace, co se týče sekce Tuřany – Dvorská, tak zde je situace obdobná jako na ostatních sekcích, budujeme nové kanalizační sítě a stávající kanalizace neexistuje - zde k žádnému omezení nedojde. Stejně tak se neplánují žádné koordináční práce s ostatními provozovateli inženýrských sítí (E.on, Innogy, Cetin atd..) kteří by nás svojí možnou nečinností mohli nějakým způsobem omezovat.

Období 05/2020, ulice Výsluní, zde je naplánovaná přeložka vodovodního řádu v délce 80 bm, která je v současné době v kolizi s budoucí trasou dešťové kanalizace, zde také předpokládáme výskyt splaškových vod.

### 5. Sekce Lišeň


Období 05/2020, ulice Ondráčková. V této souvislosti si dovolueme upozornit, že podle aktuálního harmonogramu předpokládáme fyzický zásah do zařízení stávající vodárenské infrastruktury k datu 05/2020 Ondráčkova,

*Období 07/2020, ulice Velatická*

*Po uvedených datech již nebude fyzicky možné v uvedených částech vyhovět případnému omezení z uloženého opatření. Tedy, pokud Objednatel hodlá vyhovět případným omezením z uloženého opatření tak, aby bylo zajištěno nepřerušené fungování předmětné infrastruktury po dobu trvání nouzového stavu, považujeme za nezbytné, aby Objednatel vůči nám konal v souladu a postupy předpokládanými uzavřenou Smlouvou před uvedenými daty i v případě, že uložení omezujícího opatření za strany hejtmána Jihomoravského kraje bude teprve předpokládáno.*

*Pro případ úkonu Objednatele, potažmo SPST, k naplnění předpokládaného opatření uloženého Hejtmánem Jihomoravského kraje oznamujeme ve smyslu Pod-článku 8.3 Smlouvy, že se bude v takovém případě jednat o pravděpodobnou budoucí událost a okolnost, které negativně ovlivní práce v intencích stávajícího harmonogramu, zvýší Smluvní cenu a mohou zpozdit provádění Díla.*

*S pozdravem*



**Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele:** 5619054122/SOD00200389

**Dílo:** Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

**Věc:** Upozornění na událost MČ Líšeň

**Související korespondence:**

**Související pod-články smlouvy:** 8.1., 8.3, 8.4, 20.1

**Adresováno Správci stavby:** Sdružení „Garnets – VRV“ [redacted] Garnets Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých legii 445/4  
415 10 Teplice

**ID datové schránky:** 3bcd78d

**Dopis Zhotovitele č.:** DZ0051

**Datum:** 24. 03. 2020

### **Upozornění na událost**

*V souladu s Pod-článkem 8.1.až 8.4., 20.1 Smluvních podmínek*


Vážení,

zasíláme Vám v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 5619054122/SOD00200389 a smluvními podmínkami pro stavbu: „Dostavba kanalizace v Brně II., dle odstavce 8. Zahájení, zpoždění a přerušení, upozornění na událost nebo okolnost v sekci 2 – MČ Líšeň - Plynovody

- Obdrželi jsme od společnosti GasNet a GridServices, zajišťující propoje plynovodů v Líšni, zprávu prostřednictvím emailové korespondence, že pozastavují veškeré práce na propojích a odpojích, s ohledem na nouzový stav v souvislosti s prohlášením vlády k šíření koronavirové infekce COVID-19 v České republice.
- Práce jsou zatím pozastaveny do 05. 04. 2020
- Pokud by však práce byly pozastaveny na delší dobu, tzn. po 05. 04. 2020, bude to mít za následek posunutí/zpoždění doby výstavby o tento časový úsek, tj. prodloužení o které nelze realizovat stavební práce

S ohledem na tuto okolnost/událost bychom Vás chtěli informovat, že hodláme také postupovat dle č. 20.1 smluvních podmínek.

S pozdravem

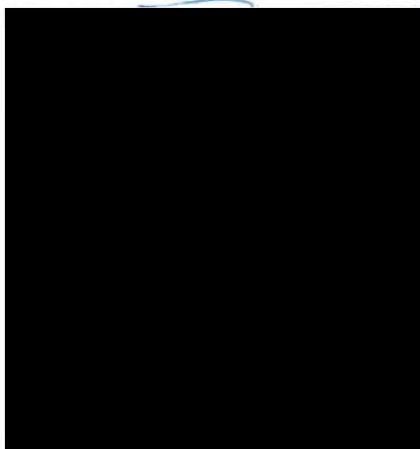

**KANALIZACE BRNO II**

HOCHTIEF CZ, FIRESTA - Fišer  
938/17 CZ - 602 00 Brno, Veveří

adresát

Sdružení „Garnets – VRV“  
K koordinátor týmu Správce stavby  
Československých Legií 445/4  
415 10 Teplice  
ID DS: 3bcd78d

Společnost „Kanalizace Brno II“  
OHL ŽS, a.s. – vedoucí společník  
Vedoucí projektu  
Burešova 938/17  
602 00 Brno - Veveří  
ID DS: xbicgdt

váš dopis značky / ze dne	naše značka	vyřizuje	místo odeslání / dne
DZ0042 / 24.3.2020	72/6/4/2020		Teplice 6.4.2020

**Smlouva:** Smlouva o dílo ze dne 15.10.2019 mezi Zhotovitelem Společnost „Kanalizace Brno II.“ a Objednatelem Statutární město Brno; ev.č. Objednatele 5619054122, ev. č. Zhotovitele SOD00200389

**Dílo:** Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

**Věc:** Reakce Správce stavby na Oznámení claimu Zhotovitele číslo 3; Oznámení o Vyšší moci pandemie COVID-19

Vážený pane inženýre,

Správce stavby (dále SpSt) obdržel dopis Zhotovitele č. DZ0042 ze dne 24.3.2020, oznámení claimu, jehož předmětem je oznámení o Vyšší moci v souvislosti s vývojem šíření nemoci COVID-19 a s tím souvisejícími opatřeními vlády České republiky (dále jen „Okolnost“), která případně mohou mít negativní vliv na náš společný projekt.

V předmětu dopisu Zhotovitel uvádí výčet článků Podmínek Smlouvy, na jejichž základě je předmětné oznámení podáno. Dle názoru Zhotovitele se jedná o Pod-články 1.13, 4.28, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.1, 19.2, 19.4 a 20.1.

SpSt je ve shodě, že uvedená Okolnost naplňuje definici Vyšší moci uvedené v Pod-článku 19.1. Skutečnost, na základě jakých konkrétních ustanovení Podmínek Zhotovitel založí svůj případný nárok na prodloužení doby, resp. dodatečnou platbu, nicméně vyplyne až po předložení detailního claimu.

Naší společnou snahou musí být především dále pokračovat ve výstavbě v míře, kterou umožňují uvedená opatření, zákony a smluvní podmínky, a eliminovat či minimalizovat nepříznivé následky aktuální situace. Proto Vám sdělujeme, že:

- I. **Okolnost není bez dalšího důvodem pro přerušení či zpomalení prací na Stavbě.** Obecně platí, že pokud a dokud nedojde k přerušení prací podle Pod-čl. 8.8 Podmínek, popř. k faktickému bránění plnění závazků ze Smlouvy, což vydaná vládní opatření sama o sobě nepředstavují, musíte pokračovat v provádění Díla způsobem a za podmínek Smlouvy, tedy s náležitou rychlostí a bez zpoždění tak, aby z Vaší strany byly dodrženy smluvní termíny. Pokud Vám Okolnost fakticky brání v plnění závazků ze Smlouvy, **specifikujte prosím, o jaké konkrétní závazky se jedná a jaké konkrétní práce a stavební objekty jsou Okolností dotčeny včetně konkrétních důvodů.**
- II. Přítomnost splaškových vod v některých úsecích, na kterou upozorňujete, nepředstavuje ani za současného nouzového stavu vyvolaného Okolností, takové omezení, které znemožňuje



provádění prací na dotčených úsecích. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky příslušnými OOPP a ti mohou stavební činnost dále vykonávat. SpSt se v tomto ohledu odvolává na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 27.3.2020 „Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese“, které je dostupné na <https://koronavirus.mzcr.cz/doporučení-k-nosení-respirátoru-a-roušek-ústenek-a-doporučene-tridy-ochrany-pro-vybrane-profese/>.

Jsme si vědomi, že specifické OOPP v souvislosti s výskytem pandemie COVID 19 jsou obtížně sehnatelné. Zároveň však konstatujeme, že uvedené OOPP nejsou nedostupné, což potvrzují naše zkušenosti z jiných realizovaných projektů na území ČR. SpSt má tak za to, že Zhotovitel je při vynaložení přiměřeného úsilí schopen zajistit příslušné OOPP, vybavit jimi své pracovníky, jak mu ukládá Smlouva v Pod - člancích 6.7 a 19.3 a minimalizovat tak zpoždění při plnění smlouvy v důsledku Vyšší moci.

- III. Jestliže se domníváte, že jste v souvislosti s Okolností oprávněni k určitým nárokům podle jakéhokoli článku Podmínek, žádáme Vás, abyste postupovali podle Pod-čl. 20.1 Podmínek, tedy zejména oznámili a předložili zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu Vámi požadované doby nebo dodatečné platby. **V tomto případě Vás žádám a zdůrazňuji nutnost vedení podrobných záznamů dokládajících vliv Okolností v odpovídající formě a obsahu, tedy takovým způsobem, který umožní jednoznačné prokázání důvodnosti Vámi vznesených nároků.**

Vedle výše uvedeného Vás v zájmu zajištění maximální možné vzájemné informovanosti, koordinace a spolupráce pokynem ve smyslu Pod-čl. 3.3 Podmínek žádám, abyste

1. nám bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 21.4.2020**, zvláště pro každou městskou část poskytni informaci, jaký konkrétní vliv má Okolnost na plnění Smlouvy, zejména na:
  - a) **Personál zhotovitele a Podzhotovitele**, tj. jaký počet Personálu zhotovitele je pro provádění stavby k dispozici oproti předpokladu (harmonogramu), popřípadě kteří Podzhotovitelé a z jakých důvodů nejsou schopni plnit své závazky. Prosím specifikujte konkrétně, jaký počet Personálu zhotovitele je v karanténě, jaký počet není k dispozici z důvodu péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s Okolností, nebo jaký počet se nachází v zahraničí v souvislosti s Okolností apod.;
  - b) **dodávky Materiálů**, tj. které dodávky Materiálu pro provádění stavby jsou ohroženy z důvodu nedostupnosti a které konkrétní práce, resp. závazky ze Smlouvy obecně jsou tím dotčeny;
  - c) **Vybavení zhotovitele**, tj. provádění jakých prací je omezeno nebo ohroženo z důvodu nedostupnosti Vybavení zhotovitele;
  - d) **postup prací – harmonogram stavby** podle Pod-čl. 8.3 Podmínek;
  - e) **další okolnosti** – uveďte zejména, je-li to již nyní možné, které konkrétní práce a stavební objekty na Stavbě jsou dotčeny.

Prosíme Vás výše uvedené skutečnosti maximálně konkretizovat a doložit, pokud je to z povahy skutečnosti možné.

2. v případě výrobků/ konstrukčních celků, které vyžadují dílenské kontroly a přejímky mimo území České republiky přímo ve výrobě, poskytni detailní dokumentaci, záznamy, protokoly atp. o provedení všech kontrolních kroků (včetně např. foto/ video dokumentace) takovým způsobem, aby mohla být přejímka realizována „na dálku“ formou ověření předložených podkladů pracovníky týmu Správce stavby, pokud je toto z povahy výrobku/konstrukčního celku možné.

## DOPIS

### Správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II

- o vlivu a dopadech Okolnosti na realizaci Stavby pravidelně informovali Správce stavby a (nejdéle v čtrnáctidenním intervalu) v rámci předkládání čtrnáctidenních plánů prací, a abyste tyto čtrnáctidenní plány práce zasílali také v elektronické podobě. Tento pokyn se týká rovněž veškeré korespondence v souvislosti s Okolností.

V této těžké situaci je zásadní, abychom všichni, kdo se podílíme na realizaci staveb, chránili v rámci možností zdraví lidí a zároveň minimalizovaly škody, které vznikají.

Jsme si vědomi toho, že může dojít ke komplikacím a ke zpoždění, proto je důležité, abyste Správce stavby upozorňovali na budoucí události a vedli denní průběžné záznamy o vzniklých komplikacích. Díky tomu budeme moci jednotlivé situace řešit rychle a v konsensu. Jsme v této souvislosti připraveni poskytnout pomoc a součinnost, včetně detailů o formě a obsahu průběžných záznamů. Chápeme, že vedení záznamů může být v této situaci obtížné, pojďme proto detaily řešit rychle a operativně vzájemnou komunikací.

Minimalizujme osobní styk a zjednodušte procesy, např. kontrolní dny můžeme provést formou e-maily odsouhlaseného záznamu o stavu prací nebo přes videokonference s online vedením záznamů v omezeném počtu lidí, společné datové prostředí nebo datové schránky pro schvalování (jak už se částečně děje).

**Chápeme, že situace se mění ze dne na den, přesto bychom Vás chtěli požádat o dodržení výše uvedených pokynů a opatření a zejména o předložení první sady požadovaných údajů do 21.4.2020.**

Lze předpokládat, že Okolnost bude mít přetrvávající vliv. Při předkládání průběžných claimů postupujte prosím dle Pod-článku 20.1 a), b) s uvedením podrobností ve výše uvedeném rozsahu.

Předpokládáme, že díky uvedenému opatření budeme mít po skončení vlivu Okolnosti Zhotovitel i Správce stavby dostatek podkladů a informací pro postup dle Pod-čl. 3.5 a 20.1

SpSt s návrhem na předložení detailního claimu nikoliv ve lhůtě stanovené pod-čl. 20.1 odst. 5 (tj. „42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, z které claim vyplývá“), ale až po ukončení nouzového stavu v České republice, souhlasí, avšak žádá o jeho předložení ve lhůtě 28 dnů od ukončení nouzového stavu.

Pro usnadnění formulace průběžných zpráv přikládáme tabulku požadovaných údajů.

Děkuji Vám za spolupráci a věřím, že vše společně zvládneme.

S pozdravem

**SPRÁVCE STAVBY**  
Dostavba kanalizace v Brně II

Brně II

VRV

(1)

Na vědomí (elektronická kopie):

Příloha: tabulka požadovaných údajů





Obecně	Zhotovitel vede záznam denně a jednou za 14 dní (pondělí) záznam se Skutečnostmi za předchozí období vytiskne, potvrdí a předá Správci stavby (resp. Týmu Sp.St.) v elektronické i tištěné podobě. Sp.St. do elektronické verze záznamu doplní své stanovisko, záznam potvrdí a společně s doklady od Zhotovitele ho předá jednou za 14 dní (úterý) Objednateli e-mailem.
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Zhotovitel uvede konkrétní den, kdy ke Skutečnosti došlo, či uvede období, pokud má Skutečnost přetrvávající charakter
Městská část, Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Zhotovitel uvede konkrétní ovlivnění MČ, SO či soubor SO.
Provedené činnosti (bližší popis)	Zhotovitel uvede bližší popis činností, které byly Skutečností ovlivněny
Příčiny vzniku Skutečnosti	Zhotovitel uvede, proč ke skutečnosti došlo
Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Zhotovitel uvede, počet personálu dle plánu před vznikem Skutečnosti "lomeno" skutečný počet na staveništi
Které dodávky Materiálu pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Zhotovitel uvede, jaký Materiál (tzn. materiál všeho druhu, výrobky, konstrukční celky) je vlivem Skutečnosti nedostupná či obtížně dostupný
Jaké Vybavení zhotovitele je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Zhotovitel uvede, jaké Vybavení zhotovitele (tzn. přístroje, stroje, dopravní prostředky apod.) je vlivem Skutečnosti nedostupná či obtížně dostupný.
Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Zhotovitel uvede, zda ke dni zaznamenání Skutečnosti předpokládá dopad Skutečnosti do HMG stavby. V průběhu času se samozřejmě může ukázat, že Skutečnost má vliv do HMG, i když to Zhotovitel původně nepředpokládal
Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Zhotovitel uvede stručný popis vlivu na HMG
Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Pokud Zhotovitel v tuto chvíli již má k dispozici doklady, které svědčí o Skutečnosti (dopis od subdodavatele o tom, že nebude v určitém období na staveništi; doklad o kompletním zavření ubytovacího zařízení, které předtím používal; oznámení od výrobce jakéhokoliv výrobku, že v tuto chvíli není schopen plnit nasmílované závazky, ...), uvede Zhotovitel odkaz na tento dokument a současně ho přiloží do přílohy Podrobného záznamu
Vyhodnocení Správce stavby/ Pověřené osoby	Vyjádření Správce stavby, zda Skutečnost dle popisu Zhotovitele odpovídá skutečnosti na staveništi. Správce stavby se nevyjadřuje k dopadu na HMG.
Poznámka	Zde uvede Zhotovitel jakékoliv další informace, které bude považovat s ohledem na Skutečnost za relevantní.
