



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na stavební práce ze dne 22. 9. 2020

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČO 45245053, DIČ CZ45245053
zastoupený: Mgr. Reném Zavoralem, generálním ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500
zástupce pro technická a věcná jednání: [redacted]
[redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zlínstav a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín
IČO 28315669, DIČ CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-3717930217/0100
zastoupena: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro technická a věcná jednání: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanoveními článků V. a X. smlouvy o dílo na stavební práce ze dne 22.9.2020, jejímž předmětem je provedení díla **ČRo Olomouc – rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19** (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Dodatek je uzavírán s ohledem na potřebu úpravy rozsahu předmětu díla, termínů dokončení díla. Potřeba úpravy rozsahu předmětu díla a termínů dokončení díla vyplývá jednak:

- a) ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace, ani při přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky v rámci které byla smlouva uzavřena s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL07, ZL17, ZL24, ZL29, ZL30, ZL34, ZL40, ZL41, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o [redacted] **Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);

- b) z důvodu změn rozsahu díla, které jsou vyvolány potřebami objednatele s tím, že tyto změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech s označením ZL13, ZL20, ZL21, ZL38, které jsou přílohami tohoto dodatku, a které se na ceně díla v souhrnu projevují nárůstem ceny díla o **██████████ Kč bez DPH**, tzn. nárůstem, jenž je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.

2. Na základě výše uvedeného je nezbytné upravit termín zhotovení díla, jakož i rozsah prací tak, aby byly naplněny potřeby objednatele a požadavky platné legislativy vztahující se na prováděné dílo a aby dílo bylo řádně dokončeno. S ohledem na uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na provedení změn smlouvy v následujícím znění.

II. Změny ve smlouvě

1. Objednatel mění rozsah předmětu díla o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 07,13,17,20,21,24,29,30,34,38,40 a 41, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho přílohy č. 1 až 12.

2. Článek III., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo do **64 týdnů** od účinnosti této smlouvy.“*

3. Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace plnění se nahrazuje přílohou č. 13 tohoto dodatku - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace rekonstrukce.

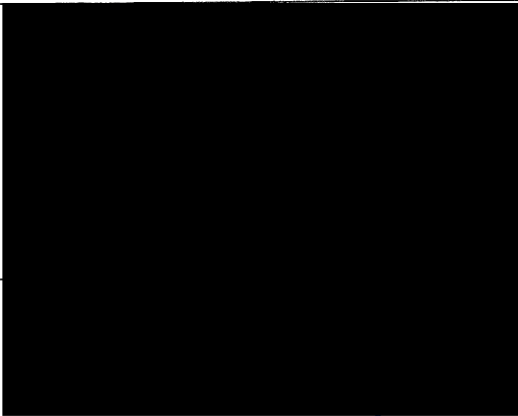

4. Článek IV., odstavec 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

*„Cena díla je dána nabídkou zhotovitele a činí **68.220.448,78 Kč bez DPH**. Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZodPH“). Specifikace ceny díla je uvedena v přílohách této smlouvy.“*

IV. Závěrečná ustanovení

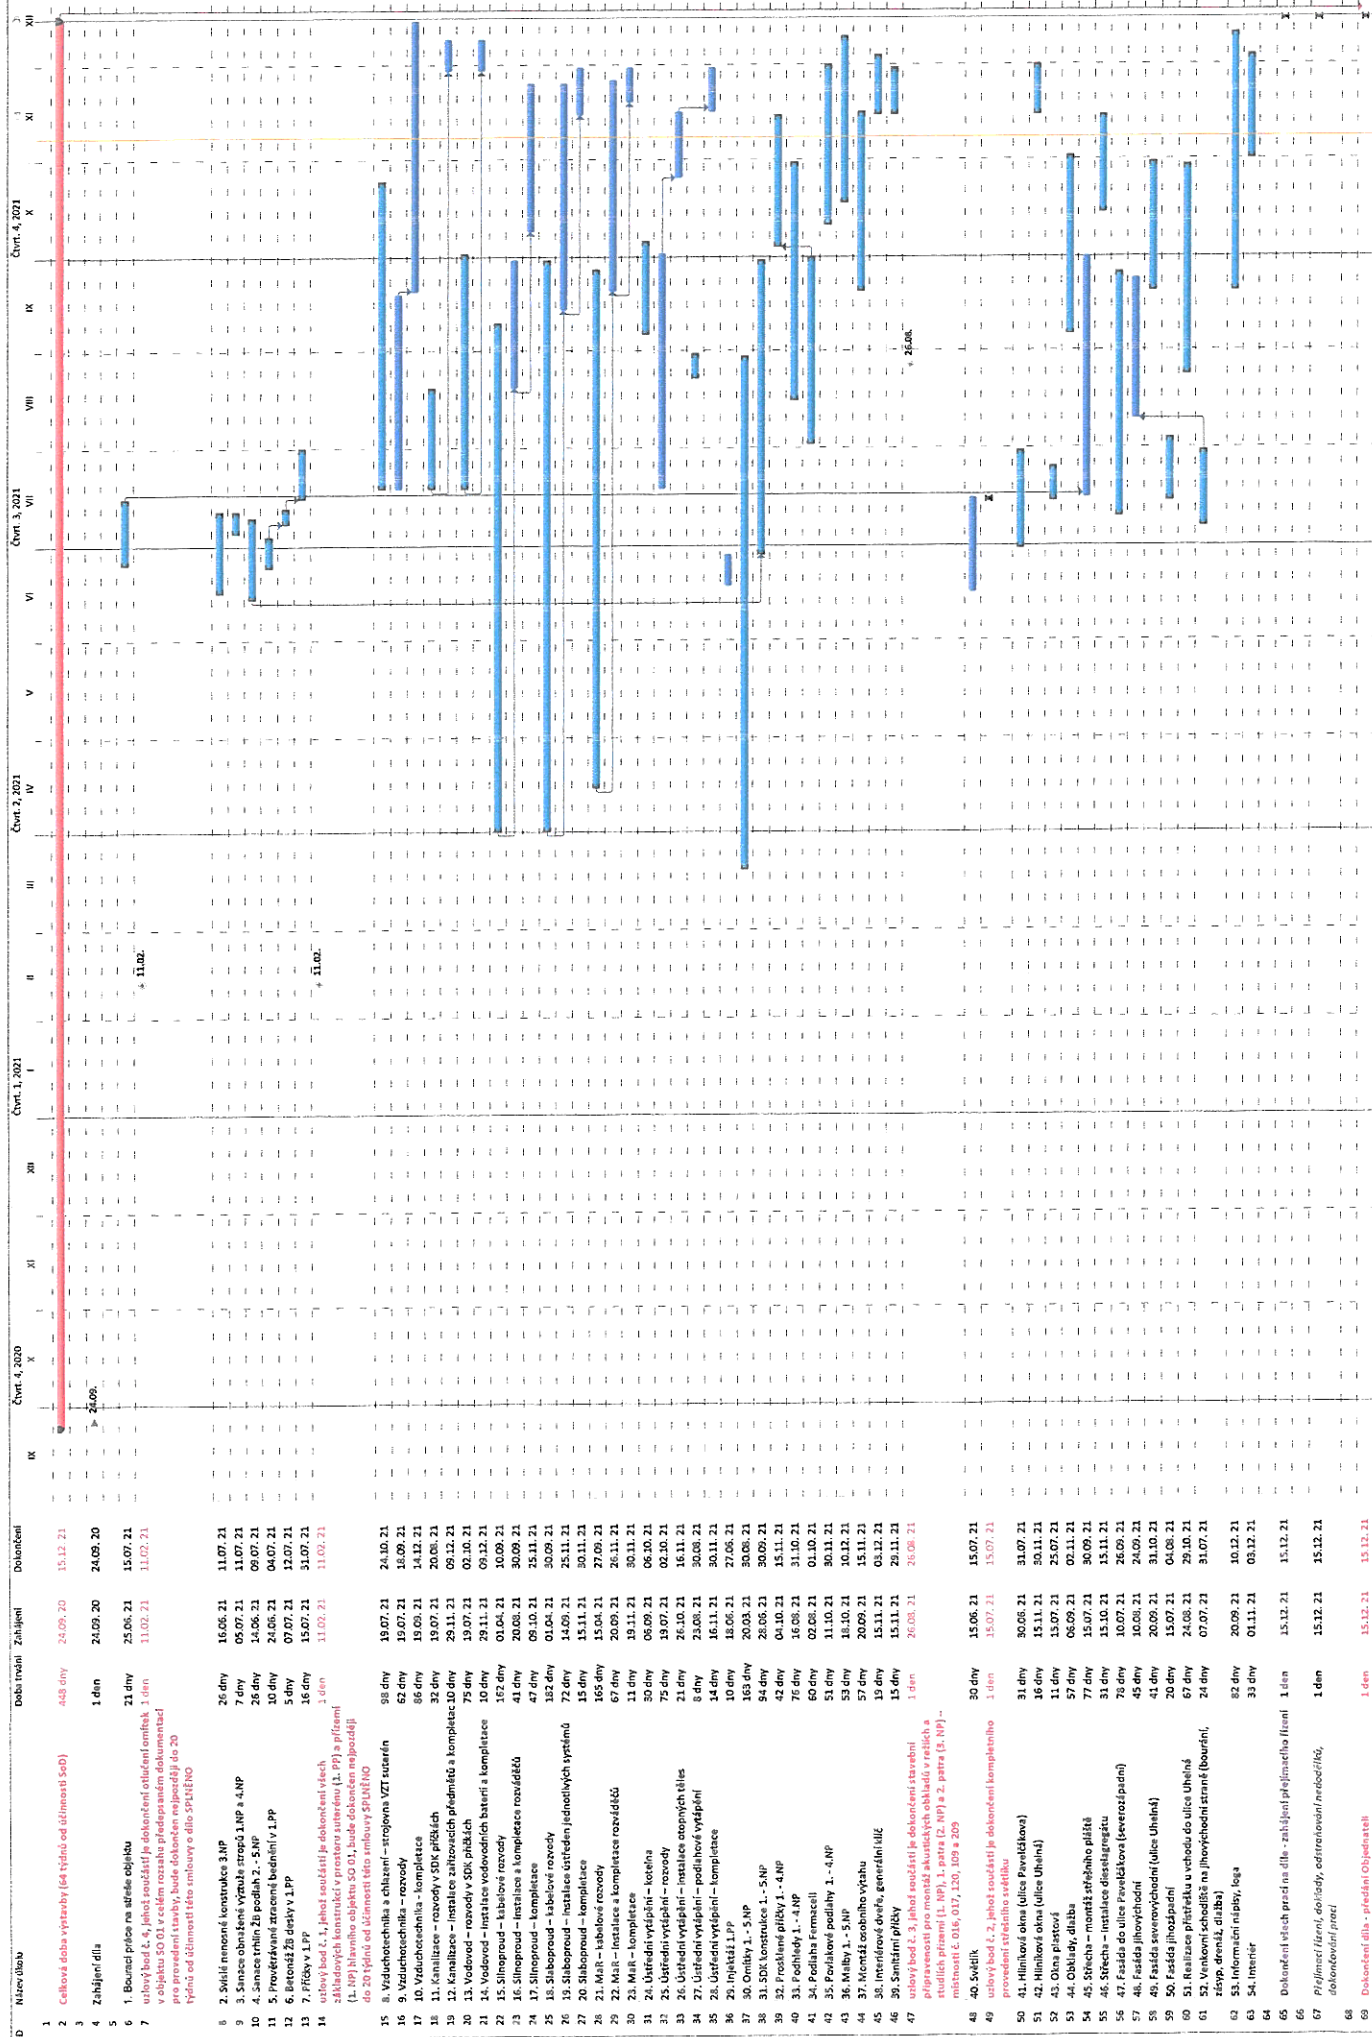
1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 7;
- b) Příloha č. 2 - Změnový list č. 13;
- c) Příloha č. 3 - Změnový list č. 17;
- d) Příloha č. 4 - Změnový list č. 20;
- e) Příloha č. 5 - Změnový list č. 21;
- f) Příloha č. 6 - Změnový list č. 24;
- g) Příloha č. 7 - Změnový list č. 29;
- h) Příloha č. 8 - Změnový list č. 30;
- i) Příloha č. 9 - Změnový list č. 34;
- j) Příloha č. 10 - Změnový list č. 38;
- k) Příloha č. 11 - Změnový list č. 40;
- l) Příloha č. 12 - Změnový list č. 41;
- m) Příloha č. 13 - Aktualizovaný a upřesněný HMG postupu realizace rekonstrukce.

V Praze dne: 23. 11. 2021	V Olomouci dne; 26. 10. 2021
	



HARMONOGRAM REALIZACE PLNĚNÍ - ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavlačkova 2/19



ZMĚNOVÝ LIST**č. 7**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**Smlouva o dílo č.: **OISM**Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Po vybourání původní skladby podlahy byly odhaleny praskliny v železobetonových stropních deskách ve 2. až 4.NP. Ze statických důvodů je nutné tyto trhliny sanovat.

Navrhovatel změny: **Generální projektant**

Technické řešení změny: Sanace je řešená jako typové vzory dle umístění trhliny vůči nosným prvkům stropů se systémem :

- trhliny rovnoběžné nad trámem a v jeho blízkosti do 200 mm - zalití a sešití
- trhliny rovnoběžné s trámem mimo trám - pouze zalití bez sešívání
- trhliny kolmé na trámy - pouze zalití bez sešívání
- totéž platí o drážkách po elektro
- v případě trhlín na celou výšku desky nutná navíc injektáž trhlíny a její vyplnění při spodním lici tixotropní sanační maltou
- trhliny v průvlacích - sešití 4 kusy kotev a injektáž trhlíny - var. u sloupu a mimo sloup
- trhliny v oblasti okolo sloupů u átria - návrh je ve smyslu vytvoření tangenciální a radiální výztuže okolo sloupu - zde je možná úprava - pokud by se kotvy daly ohýbat do oblouků, mohly by se radiální skládané výztuže z rovných úseků nahradit.

Podklady pro ocenění: **Položkový rozpočet, zápis v KD, zápis ve SD**

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
		X	

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **19**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.
jméno dne 15.6.2021Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.
jméno podpis dne 15.6.2021Za TDS - Baucon CZ s.r.o.
jméno podpis dne 15.6.2021Za objednatele - Český rozhlas:
jméno dne 8/7/2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	7	Změnový list č. 7 - Sanace trhlín železnice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 104 869,18	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	4 817,52	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		2 109 686,70	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		2 109 686,70	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		2 109 686,70	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

- rozpočet neobsahuje opravu teracových podlah a opravu teracových soklů pod zábradlím v 5.NP

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	7
Objekt :	SO-01	Změnový list č. 7 - Sanace trhlin železobetonu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce			0,00	0,00	0,00
005 Sanace			0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot			0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00	0,00	0,00
773 Podlahy teracové			0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT			0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	2 109 686,70	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba : 21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčák			Rozpočet: 7			
Objekt : SO-01			Změnový list č. 7 - Sanace trhlín železobetonových konstrukcí			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	0,84		
		4.NP: (0,14*1)*6		0,84		
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 005	Sanace					
2	R01	Provedení sanace trhlín - trhlíny rovnoběžné nad trámem a v jeho blízkosti do 200 mm - zalití a sešití, vč. přesunu hmot	m	399,77		
		2.NP:		114,39		
		3.NP:		110,11		
		4.NP:		167,56		
		5.NP:		7,71		
3	R02	Provedení sanace trhlín - trhlíny rovnoběžné s trámem mimo trám - pouze zalití bez sešívání, vč. přesunu hmot	m	27,36		
		2.NP:		3,09		
		3.NP:		12,04		
		4.NP:		12,23		
4	R03	Provedení sanace trhlín - trhlíny kolmé na trámy - pouze zalití bez sešívání, vč. přesunu hmot	m	4,99		
		3.NP:		0,49		
		4.NP:		4,50		
5	R04	Provedení sanace trhlín - drážky po rozvodech původní elektroinstalace - pouze zalití bez sešívání, vč. přesunu hmot	m	271,02		
		2.NP:		106,55		
		3.NP:		97,29		
		4.NP:		62,68		
		5.NP:		4,50		
6	R05	Provedení sanace trhlín - trhlíny na celou výšku desky, injektáž trhlíny a její vyplnění při spodním lici tixotropní sanační maltou, vč. přesunu hmot	m	28,39		
		2.NP:		7,39		
		3.NP:		14,53		
		4.NP:		6,47		
7	R06	Provedení sanace trhlín - trhlíny v průvlacích - sešití 4 kus kotev a injektáž trhlíny - varianta u sloupů a mimo sloup, vč. přesunu hmot	ks	22,00		
		2.NP:		7,00		
		3.NP:		9,00		
		4.NP:		6,00		
8	R07	Provedení sanace trhlín - trhlíny v oblasti okolo sloupů u atria - vytvoření tangenciální a radiální výztuže okolo sloupů, v případě možnosti ohýbat kotvy do oblouků lze radiální skládané výztuže z rovných úseků nahradit, vč. přesunu hmot	ks	28,00		
		2.NP:		7,00		
		3.NP:		12,00		
		4.NP:		8,00		
		5.NP:		1,00		
9	R08	Vypracování pasportizace trhlín	kpl	1,00		
	Celkem za	005 Sanace				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
10	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,25		
		4.NP: (0,3*0,14*1)*6		0,25		
11	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	44,00		
		nezměřitelné práce demontážní - účtováno dle skutečnosti:				
		demontáž a zpětná montáž zábradlí				
		2.NP: 7 ks * 2 hodiny		14,00		
		3.NP: 9 ks * 2 hodiny		18,00		
		4.NP: 6 ks * 2 hodiny		12,00		
12	965043321	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm pl. do 1m2	m3	0,04		
		4.NP: (0,3*0,02*1)*6		0,04		
13	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl. do 50 mm pl. přes 4 m2	m2	50,48		
		5.NP:				
		0,5*(8,05+6,52)*6,58		47,94		
		2,42*1,05		2,54		
	Celkem za	Bourání konstrukcí				
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
14	632451211	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl. do 35 mm	m2	77,15		
		5.NP:				
		0,5*(8,05+6,52)*6,58		47,94		
		2,42*1,05		2,54		
		0,5*(4,73+3,54)*6,45		26,67		

SoD

pol. č. 81

R

R

R

R

R

R

R

R

SoD

pol. č. 232

SoD

pol. č. 291

ÚRS

21/I

ÚRS

21/I

ÚRS

21/I

Položkový rozpočet

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčák	Rozpočet: 7
Objekt :	SO-01	Změnový list č. 7 - Sanace trhlín železobetonových konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
15	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	77,15			ÚRS	21/I
		5.NP:						
		0,5*(8,05+6,52)*6,58		47,94				
		2,42*1,05		2,54				
		0,5*(4,73+3,54)*6,45		26,67				
	Celkem za	Podlahy a podlahové konstrukce						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					SoD	pol. č. 226
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	77,15				
		5.NP:						
		0,5*(8,05+6,52)*6,58		47,94				
		2,42*1,05		2,54				
		0,5*(4,73+3,54)*6,45		26,67				
	Celkem za	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					SoD	pol. č. 293
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,17				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					SoD	pol. č. 602
18	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,08			SoD	pol. č. 603
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,08			SoD	pol. č. 604
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,08			SoD	pol. č. 605
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,08			SoD	pol. č. 606
22	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	5,08			SoD	pol. č. 607
23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	45,72			SoD	pol. č. 608
24	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	5,08				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
Díl: 773		Podlahy teracové					ÚRS	21/I
25	773611140	Obklady parapetů a jiných desek přírodním litým tercem tl. 20 mm rozvinuté šířky do 400 mm	m2	3,48				
		(0,14+0,14+0,3)*1*6		3,48				
26	998773103	Přesun hmot pro podlahy teracové lité vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,18			ÚRS	21/I
	Celkem za	773 Podlahy teracové						

Tabulka trhlín v bm a ks ŽB stropu/podlahy dle návrhu statika Ing. Sležky ze dne 12.5. 2021 (revize 28.5.2021)

Stavba: ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19

Označení trhliny dle výkresu Ing. Sležky ze dne 12.5.2021 (revize 28.5.2021)	Označení trhliny dle popisu Ing. Sležky ze dne 12.5.2021 (odpovídá pasportizaci)	MJ	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem	
1.	1.	trhliny rovnoběžné nad trámem a v jeho blízkosti do 200 mm - zalití a sešití	bm	114,39	110,11	167,56	7,71	399,77
2.	2.	trhliny rovnoběžné s trámem mimo trám - pouze zalití bez sešívání	bm	3,09	12,04	12,23	0,00	27,36
2.	3.	trhliny kolmé na trámy - pouze zalití bez sešívání	bm	0,00	0,49	4,50	0,00	4,99
3.	4.	totéž platí o drážkách po elektro - pouze zalití bez sešívání (bez injektáže)	bm	106,55	97,29	62,68	4,50	271,02
3. s injektáží	5.	v případě trhlín na celou výšku desky nutná navíc injektáž trhliny a její vyplnění při spodním lici tixotropní sanační maltou	bm	7,39	14,53	6,47	0,00	28,39
4. - 5.	6.	trhliny v průvlastcích - sešití 4 kusy kotev a injektáž trhliny - var. u sloupu a mimo sloup	ks	7,00	9,00	6,00	0,00	22,00
6.	7.	trhliny v oblasti okolo sloupů u átria - návrh je ve smyslu vytvoření tangenciální a radiální výztuže okolo sloupu - zde je možná úprava -pokud by se kotvy daly ohýbat do oblouků, mohly by se radiální skládané výztuže z rovných úseků nahradit*	ks	7,00	12,00	8,00	1,00	28,00

*na výkresech vyznačeno modrou propiskou u jednotlivých sloupů

ZMĚNOVÝ LIST**č. 13**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**Smlouva o dílo č.: **OISM**Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 ZlínDůvod změny: **Zajištění stavební připravenosti pro případné rychlé dokončení a zprovoznění dalších studiových prostor.**Navrhovatel změny: **Objednatel Český rozhlas**Technické řešení změny: **Provedení vyzdívky včetně omítek v prostoru 3. NP v místnosti 220 dle dispozic 2. NP - Vnitřní nosné zdivo z cihel plných pálených P20, tl. 150, 300 na cementovou maltu M5.**Podklady pro ocenění: **Zápis z KD, úprava projektové dokumentace****Změna smluvní ceny díla:**

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.jméno podpis dne **31.8.2021****Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.**jméno podpis dne **31.8.2021****Za TDS - Baucon CZ s.r.o.**jméno podpis dne **31.8.2021****Za objednatele - Český rozhlas:**jméno podpis dne **- 6 -09- 2021**

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19							Zdáněné přičky v m. č. 220				Zl. č.		13		
Odpočet							Přípočet							Rozdíl	
č.pól.	lód		m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pól.	lód	Specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	
8	342012221R00	Příčka SDK tl 100 mm, oceľ koi, 1x opláť, RB 12,5mm	m2	-42,80			1	317944313R12	Válcovité nosníky č 14-22 do připravených otvorů včetně doplnění profilu 1 x 14	t	0,02				
							2	346244381R00	Přetváření ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,24				
							3	342241162R00	Příčky z oceli s jiných CP29 s 140 mm	m2	91,87				
							4	612421626R00	Osmička vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	163,74				
							5	612473188R00	Příplatek za zařizování rohovníků, stěny	m	112,00				
							6	612474450R00	Osmička stěn vnitřní tankovací stěrový - šluk	m2	42,89				
							7	615481111R00	Požárení válců nosníků nádob přívodem a postřik MC	m2	1,70				
							9	609281111R00	Přesun hmot pro opravy a čerpu do výšky 25 m	t	30,63				
							10	768895213R00	Montáž prahu dveří jednokřídlých s. nad 10 cm	kus	2,00				
							11	76657-D14a	0,14a - dřevěné inter. dveře vč. ocelové zárubně a doplňků - 900x2100mm - otočné	kus	2,00				
							12	61687158R	Převh duový dělník 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm	kusy	2,00				
Celkem Kč bez DPH							Celkem Kč bez DPH								

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	13	Zděné příčky v m. č. 220	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	97 010,64	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	15 062,40	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	112 073,04	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		112 073,04	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		112 073,04	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 13
Objekt :	SO-01	Zděné příčky v m. č. 220

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	56 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	54 186,51	0,00	0,00	0,00	0,00
342 Sádkartonové konstrukce	-26 990,68	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	15 062,40	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	97 010,64	15 062,40	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	112 073,04	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	112 073,04	0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					SoD	pol. č. 76
1	317944313RT2	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14 3NP - 140 - p7.2 : 0,0143*(1*1,70)	t	0,02			SoD	pol. č. 84
2	346244381R00	Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm 3NP - 140 - p7.2 : 0,14*1*1,70	m2	0,24			SoD	pol. č. 81
3	342241162R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm Včetně pomocného ležení výšky do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. 11,75*3,65 6,96*3,65 (6,96*3,65) - (1,35*1,35)	m2	91,87	42,89 25,40 23,58			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					SoD	pol. č. 158
4	612421626R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká Tato položka je určena pro jakýkoliv druh podkladu. cementový postřík + omlítka na zdivo - celková tl. cca. 20mm 11,75*3,65*2 6,96*3,65*2 ((6,96*3,65) - (1,35*1,35))*2	m2	183,74	85,78 50,80 47,16		SoD	pol. č. 162
5	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 3NP : 32*3,50	m	112,00	112,00		SoD	pol. č. 164
6	612474450R00	Omlítka stěn vnitřní tenkovrstvé sádrové - štuk Položka obsahuje penetrační nátěr podkladu a tenkovrstvou sádrovou omlítu tl. 5 mm. Ruční provedení. 11,75*3,65	m2	42,89	42,89		SoD	pol. č. 176
7	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřík MC 3NP - 140 - p7.2 : 1,0*(1,70)	m2	1,70	1,70		SoD	pol. č. 91
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce					SoD	
8	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x opláštěn.,RB 12,5mm Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. 3.40.02 systém SK12 odpovídá W111 ozn. W1.1 : m. č. 220 : (11,75*3,65)*(-1)	m2	-42,89	-42,89			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					SoD	pol. č. 293
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,88			SoD	pol. č. 420
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					SoD	pol. č. 429
10	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlých š. nad 10 cm D14a: 2	kus	2,00	2,00		SoD	pol. č. 469
11	76667-D14a	D.14a - dřevěné inler. dveře vč. ocelové zárubně a doplnků - 800x2100mm - otočné kompletní dodávka a montáž dle specifikace viz. výpis dveří D.1.1.c.32. dveřní křídlo, zárubeň vč. povrchové úpravy, kování, zámek	kus	2,00	2,00			
12	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm D14a: 2	kus	2,00	2,00			

[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]

ZMĚNOVÝ LIST**č. 17**

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	Po demolici původní podlahy a zjištění skutečného stavu pod původní skladbou podlahy je z důvodu zajištění rovinnosti podlahy nutné provést revizi její skladby.
Navrhovatel změny:	Generální dodavatel Zlínstav a.s.
Technické řešení změny:	Změna skladby podlah spočívající v doplnění dřevovláknité desky tl. 19 mm a suchého vyrovnávacího podsypu tloušťky 10 – 50 mm a vyřazení tepelné izolace tl. 40 mm.
Podklady pro ocenění:	Položkový rozpočet, zápis v KD, zápis ve SD

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		
jméno	podpis	dne 15.6.2021
Za projektanta - Atelier 38 a.s.		
jméno	podpis	dne 15.6.2021
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno	podpis	dne 15.6.2021
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno	podpis	dne 1.7.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	17	Změna skladby podlah	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	712 068,00	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-197 697,16	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		514 370,84	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		514 370,84	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		514 370,84	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	
DPH		21,0 %	
Základ pro DPH		0,0 %	
DPH		0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 17
Objekt :	SO-01	Změna skladby podlah

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
763 Konstrukce suché výstavby	699 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	12 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	-197 697,16	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	712 068,00	-197 697,16	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	514 370,84	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	514 370,84	0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl:	763	Konstrukce suché výstavby						
1	R01	D+M dřevolátní deska tl. 19 mm	m2	969,80				R
		Včetně stěpení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.						
		F02a - 912,79500			912,80			
		F02b - 47,00000			47,00			
		F02c - 10,00000			10,00			
2	763158115	Ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podlahách suchý podsyp tl. 10 mm	m2	969,80				ÚRS 21/I
		F02a - 912,79500			912,80			
		F02b - 47,00000			47,00			
		F02c - 10,00000			10,00			
3	763158118	Příplatek k ceně za každý další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	3 879,20				ÚRS 21/I
		F02a - 912,79500			912,80			
		F02b - 47,00000			47,00			
		F02c - 10,00000			10,00			
		součet			969,80			
		předpoklad tl. 50 mm: 4*969,8			3 879,20			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,30				SoD pol. č. 293
Díl:	713	Izolace tepelné						
5	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-969,80				SoD pol. č. 335
		F02a - 912,79500*(-1)			-912,80			
		F02b - 47,00000*(-1)			-47,00			
		F02c - 10,00000*(-1)			-10,00			
6	63151450R	Deska z minerální vlny ISOVER T-P tl. 40 mm	m2	-1 088,78				SoD pol. č. 354
		Přesně řezané desky do lehkých a těžkých plovoucích podlah.						
		Součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK						
		Rozměry 1200 x 600 mm						
		F02a - 912,79500*1,10*(-1)			-1 004,08			
		F02b - 47,00000*1,10*(-1)			-51,70			
		F02c - 10,00000*1,10*(-1)			-11,00			
7	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-6,40				SoD pol. č. 355

ZMĚNOVÝ LIST**č. 20**

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**
Smlouva o dílo č.: **OISM**
Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: **Rozšíření předmětu díla.**

Navrhovatel změny: **Objednatel Český rozhlas**

Technické řešení změny: **Provedení nasvětlení fasády - rozvody sil.**

Podklady pro ocenění: **Položkový rozpočet, zápis v KD**

Změna smluvní ceny díla:

Změna smluvní ceny díla:	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			


Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		



Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:


Za zhotovitele - Zlínstav a.s.

jméno  podpis ..  dne **27.7.2021**



Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.

jméno  podpis ..  dne **3.8.2021**

Za TDS - Baucon CZ s.r.o.

jméno  podpis ..  dne **27.7.2021**

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno  podpis ..  dne **- 6 -09- 2021**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	20	Provedení nasvětlení fasády	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	5 483,40	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	5 483,40	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		5 483,40	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		5 483,40	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%		
DPH		21,0	%		
Základ pro DPH		0,0	%		
DPH		0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 20
Objekt :	SO-01	Provedení nasvětlení fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	D+M	HZS
M21 Elektromontážní práce	0,00	0,00	5 483,40	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	5 483,40	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	5 483,40	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	5 483,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

pof.č.	položka	popis položky	MJ	množství	jedn.cena	celkem [Kč]
		Venkovní osvětlení budova ČRo Olomouc				
1	D.026	Kabel CXKH 3x2,5 mm2 RE	m	114,00		
Celkem (bez DPH)						

SoD pol. č. 128

ZMĚNOVÝ LIST**č. 21**

60 01 Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: **OISM**

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: V projektu nebylo požadováno. Dodatečný požadavek dle dohody mezi ČRo Olomouc a MP Olomouc.

Navrhovatel změny: Objednatel Český rozhlas

Technické řešení změny: Provedení přípojného místa pro budoucí možnost napojení kamerového systému Městské Policie Olomouc na ulici Pavelčákova.

Podklady pro ocenění: Položkový rozpočet, zápis v KD

Změna smluvní ceny díla:

Změna smluvní ceny díla.			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		
jméno	podpis	dne 29.9.2021
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		
jméno	podpis	dne 29.9.2021
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno	podpis	dne 29.9.2021
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno	podpis	dne

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19						Příprava pro montáž kamerového systému MP Olomouc						Zl. č.		21	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl			
č.pot.	kód	specifikace	m.j.	množství	J. cena	Celkem	č.pot.	kód	specifikace	m.j.	množství	J.cena	Celkem	Celkem	
							1		Rozvaděč R1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedení na v.č.D.1.4.g 57 dle/brojení Jistěč 230V/10A/8, odpovídaví měření	ks	1,00				
							2		Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, d=18,3mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž	m	4,00				
							3		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 P60-R	m	30,00				
							4		Rozbočovací krabice přisazené 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP65, montáž, zapojení a ukotvení vodičů	ks	1,00				
							5		Kompletování a koordinování činnosti - cena obsahuje kompletaci zařízení a jeho odzkoušení a vyzkou na ostří profesí, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KO, spod., včetně přesunu hmot	ks	1,00				
							6		Připojení zařízení, odvěti, funkční zkoušky, zasklení obalů	kpl	1,00				
							7		Výhledy návrhy - cena obsahuje kompletní návrh, včetně zpracování zprávy a doložení veškerých potřebných dokumentů ke kolaudaci stavby	kpl	1,00				
							8		Selctní drátěk, tapes a průvleky	kpl	1,00				
							9		Termorezerva elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorezervačního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	1,00				
							1	A.027	Keystone modul kovový, RJ45, kat. 6A 10G, STP, samostatný, stříbrný	ks	4,00				
							2	A.032	Pátoch kabel cat 6A stíněný, 2m	ks	2,00				
							3	A.034	Drátový kabel stíněný 4 pár U/UTP cat. 6A Euroflex B2ca s1d1	m	180,00				
							4	A.040	Drátový dvojitý kabel 2xRJ45 Cat.6Aw, ráměšlu komplet, uložení na povrch, na omítku, na odpovídající přístrojovou krabici	ks	1,00				
							5	D.01	Přepřívová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE(max.50W), dvoušupřívový provedení, galvanický izolování svorka PE, montáž na rovný podklad, IP55 v montážní skřínici	ks	1,00				
							6	A.051	Elektróninstalační chráněná plastová trubka 23mm, ohebná pod omítkou	m	20,00				
							7	A.054	Elektróninstalační chráněná trubka plastová pevná hladká 21mm bezhalogenová, montáž po povrchu	m	10,00				
							8	D.012	Skřínice pro montáž přepřív. ochrany	ks	1,00				
							9	A.061	Krabice přístrojová, montáž na povrch	ks	1,00				
							10	A.065	Průřez přes obvodové zavo., vč. zasklení	ks	1,00				
							11	A.065	Instalační materiál	ks	1,00				
							12	A.067	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, šabů, štítů spod	m	180,00				
							13	A.073	Montáž zásuvek vč. přístrojových krabic vč. jejich popisu	ks	1,00				
							14	A.074	Montáž keystone v zásuvice vč. jejich popisu	ks	2,00				
							15	D.026	Montáž přepřívových ochrany, vč. montážního příslušenství, zapojení a uvedení do provozu	ks	1,00				
							16	A.075	Montáž keystone v PatchPanelu vč. jejich popisu	ks	2,00				
							17	A.082	Měření na vývodu + Certifikační měření Permanent link Cat.6A ISO 11802	ks	2,00				
Celkem Kč bez DPH						0,00	Celkem Kč bez DPH							0,00	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21	Příprava pro montáž kamerového systému MP Olomouc	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	2 228,30	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	15 336,50	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	17 564,80	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		17 564,80	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		17 564,80	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	
DPH			21,0 %	
Základ pro DPH			0,0 %	
DPH			0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 21
Objekt :	SO-01	Příprava pro montáž kamerového systému

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontážní práce - SIL	0,00	0,00			
M21 Elektromontážní práce - SLP	0,00	0,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00			

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Síťoproudá elektroinstalace					Materiál		Montáž	
poj.č.	položka	popis položky	MJ	množství	jedn.cena	celkem [Kč]	jedn.cena	celkem [Kč]
		Příprava pro kameru městské policie, Síťoproud						
1		Rozvaděč R1 Touto položkou je myšlena kompletní výzbroj včetně montáže, uvedené na v.č. D.1.4 a 57 dozorčeni listů 230V/10A/B, odpočtové měření	ks	1,00				
2		Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, d=18,3mm, střední mechanická odolnost, upevňovací a spojovací materiál, montáž	m	4,00				
3		Kabel CSKH 3x1,5 mm2 PE60-R	m	30,00				
4		Rozbočovací krabice přisazená 150x110x70mm (š x v x h), včetně vnitřních svorkovnic, IP55, montáž, zapojení a ukončení vodičů.	ks	1,00				
5		Kompletační a koordináční činnost - cena obsahuje kompletní zařízení a jeho odzkoušení s vazbou na ostatní profese, včetně vzájemné koordinace během výstavby, dopravu materiálu, koordinaci na stavbě, účast na KD, apod. včetně přesunu kmpt	ks	1,00				
6		Připojení zařízení, oživení, funkční zkoušky, zaškolení obsluhy	lpl	1,00				
7		Výchozí revize - cena obsahuje kompletní revizi, včetně zpracování zprávy a doložení všech potřebných dokumentů ke koladační stavbě.	lpl	1,00				
8		Sekání drážek, kapes a průvlků	lpl	1,00				
9		Termorevize elektrických rozvaděčů po realizaci projektu - snímkování rozvaděčů, vypracování termorevizního protokolu, doprava, podružný materiál	ks	1,00				
Celkem (bez DPH)								

R
SoD pol. č. 76
SoD pol. č. 117
SoD pol. č. 71

Slaboproudá elektroinstalace					Materiál		Montáž	
P.č.	číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
		Ceník, kapitola						
Díl:	A	SK - Strukturovaná kabeláž						
		Datový rozvaděč DR T.1-4, DR T machine roomy						
1	A.027	Keystone modul kovový, RJ45, kat. 6A 10G, STP, samolepivý, stříbrný	ks	4,00			SoD	pol. č. 24
	A.031	Patch kabely						
2	A.032	Patch kabel cat 6A stíněný, 2m	ks	2,00			SoD	pol. č. 28
3	A.034	Datový kabel stíněný 4 pár U/UTP cat. 6A Eurofide B2ca s1d1	m	180,00			SoD	pol. č. 29
	A.038	Datové zásuvky, design dodržet dle interiéru a dle síťoproudých instalací						
4	A.040	Datová dvojjádrová 2xRJ45 Cat.6Avč. rámečku komplet, uložení na povrch, na omítku, na odpovídající nástrojovou lištu	ks	1,00			SoD	pol. č. 34
5	D.011	Přepětová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo HI PoE(max 90W), dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, montáž na rovný podklad, IP55, v montážní skřínce	ks	1,00			SoD	pol. č. 200
6	A.051	Elektroinstalční chránička plastová trubka 23mm, ohebná pod omítkou	m	20,00			SoD	pol. č. 43
7	A.054	Elektroinstalční chránička trubka plastová pevná hladká 21mm bezžaluziová, montáž na povrchu	m	10,00			SoD	pol. č. 46
8	D.012	Skříňka pro montáž přepět. Ochrany	ks	1,00			SoD	pol. č. 201
9	A.061	Krabice přístrojová, montáž na povrch	ks	1,00			SoD	pol. č. 53
10	A.066	Průraz přes obvodové zdivo, vč. zatčení	ks	1,00			SoD	pol. č. 77
11	A.066	Instalační materiál	ks	1,00			SoD	pol. č. 57
12	A.067	Kabelové trasy - instalace kabelů do trubek, žlabů, šit apod	m	180,00			SoD	pol. č. 58
13	A.073	Montáž zásuvek vč. přístrojových krabic vč. jejich popisu	ks	1,00			SoD	pol. č. 64
14	A.074	Montáž keystone v zásuvce vč. jejich popisu	ks	2,00			SoD	pol. č. 65
15	D.026	Montáž přepětových ochrany, vč. montážního příslušenství, zapojení a uvedení do provozu	ks	1,00			SoD	pol. č. 214
16	A.075	Montáž keystone v PatchPanelu vč. jejich popisu	ks	2,00			SoD	pol. č. 66
17	A.082	Měření na vývodu + Certifikační měření Permanent link Cat.6A ISO 11802	ks	2,00			SoD	pol. č. 73

ZMĚNOVÝ LIST**č. 24**

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**
Smlouva o dílo č.: OISM
Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Zajištění dostatečné tuhosti konstrukce.

Navrhovatel změny: Objednatel Český rozhlas

Technické řešení změny: Doplnění dvojitého záklopu SDK u sanitárních místností.

Podklady pro ocenění: Položkový rozpočet, zápis v KD

Změna smluvní ceny díla:




Změna smluvní ceny díla:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
		X	

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **19**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.			dne <u>15.6.2021</u>
jméno 	podpis		
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.			dne <u>15.6.2021</u>
jméno 	podpis		
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.			dne <u>15.6.2021</u>
jméno 	podpis		
Za objednatele - Český rozhlas:			dne <u>28-06-2021</u>
jméno 	podpis		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	24	Změna SDK - sanitární místnosti	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	92 032,37	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		92 032,37	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		92 032,37	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		92 032,37	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		
DPH	21,0	%		
Základ pro DPH	0,0	%		
DPH	0,0	%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 24
Objekt :	SO-01	Změna SDK - sanitární místnosti

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce	90 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	1 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	92 032,37	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce					URS	21/I
1	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranné	m2		395,00			
		ozn. W2.5 :						
		2NP : 20,0		20,00				
		3NP : 20,0		20,00				
		4NP : 20,0		20,00				
		ozn. W2.1 :						
		1NP : 25,0		25,00				
		2NP : 45,0		45,00				
		3NP : 42,0		42,00				
		4NP : 46,0		46,00				
		ozn. W2.2 :						
		1NP : 10,0		10,00				
		ozn. W2.3 - tl. 175mm :						
		1NP : 15,0		15,00				
		ozn. W2.4 - tl. 250mm :						
		1NP : 10,0		10,00				
		ozn. W2.8 - tl. 155mm :						
		1NP : 10,0		10,00				
		ozn. W2.6 :						
		1NP : 30,0		30,00				
		2NP : 30,0		30,00				
		3NP : 30,0		30,00				
		4NP : 33,0		33,00				
		ozn. W2.7 :						
		1NP : 9,0		9,00				
2	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2		395,00		URS	21/I
		odkaz na mn. položky č. 1:			395,00			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					SoD	pol. č. 293
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		3,67			

ZMĚNOVÝ LIST	č. 29
---------------------	--------------

Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**

Smlouva o dílo č.: OISM

Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Zajištění dostatečné tuhosti konstrukce.

Navrhovatel změny: Objednatel Český rozhlas

Technické řešení změny: Změna SDK konstrukcí - doplnění dvojitého záklopu.

Podklady pro ocenění: Položkový rozpočet, zápis v KD.

Změna smluvní ceny díla:

Změna smluvní ceny díla:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
		X	

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **19**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.

jméno _____ podpis _____

dne 15.6.2021

Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.

jméno _____ podpis _____

dne 15.6.2021

Za TDS - Baucon CZ s.r.o.

jméno _____ podpis _____

dne 15.6.2021

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno _____ podpis _____

dne 28.06.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	29	Doplnění dvojitého záklopu SDK dle posouzení statika	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	261 404,60	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	261 404,60	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	261 404,60	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	261 404,60	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 29
Objekt :	SO-01	Doplnění dvojitého záklopu SDK dle pos

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce	256 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	261 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				
1	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranná	m2	1 339,00		
		ozn. W1.1 :		230,00		
		1NP : 230,0		200,00		
		2NP : 200,0		250,00		
		3NP : 250,0		310,00		
		4NP : 310,0		20,00		
		5NP : 20,0				
		ozn. W1.4 :		20,00		
		2NP : 20,0				
		ozn. W1.2 :		52,00		
		1NP : 52,0		9,00		
		pod stropem : 9,0		47,00		
		2NP : 47,0		50,00		
		3NP : 50,0		56,00		
		4NP : 56,0		23,00		
		5NP : 23,0				
		ozn. W1.3 :		8,00		
		1NP : 8,0				
		ozn. W6.2 :		8,00		
		1NP : 8,0		8,00		
		2NP : 8,0		8,00		
		3NP : 8,0		8,00		
		5NP : 8,0				
		ozn. W6.1 :		10,00		
		1NP : 10,0		22,00		
		ve výšahové šachtě od 3NP - nahoru : 2,00*11,0				
2	59030021	deska SDK A tl 12,5mm	m2	1 297,00		
		odkaz na mn. položky č. 1:		1 339,00		
		ozn. W6.2:		-32,00		
		ozn. W6.1		-10,00		
3	59591001	deska SDK konstrukční DFRIH2 tl 12,5mm	m2	42,00		
		ozn. W6.2:		32,00		
		ozn. W6.1		10,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,50		

ÚRS 21/I

ÚRS 21/I

ÚRS 21/I

SoD pol. č. 293

ZMĚNOVÝ LIST	č. 30
---------------------	--------------

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	Při výkopu byly objeveny základové konstrukce původního objektu (ŽB základy, zdivo) místo uvažované zeminy. Dále byla odhalena přízdívka obvodového zdiva, kterou je nutné odbourat.
Navrhovatel změny:	Generální dodavatel Zlínstav a.s.
Technické řešení změny:	Odstranění zbylých konstrukcí původního objektu, odbourání přízdívky, provedení izolace spodní stavby pouze nopovou fólií bez nátěru penetrační emulzí.
Podklady pro ocenění:	Položkový rozpočet, zápis v KD, zápis ve SD

Změna smluvní ceny díla:

Změna smluvní ceny díla.	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:	0
--	---

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		
jméno	podpis	dne 22. 6. 2021
Za projektanta - Atelier 28 a.s.		
jméno	podpis	dne 22.6.2021
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		
jméno	podpis	dne 22.6.2021
Za objednatele - Český rozhlas:		
jméno	podpis	dne - 6 -09- 2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	30	Ubourání zdiva ve dvorním traktu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	97 650,61	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	-1 653,11	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		95 997,50	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		95 997,50	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		95 997,50	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 30
Objekt :	SO-01	Ubourání zdiva ve dvorním traktu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce			0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy			0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí			0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě			0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT			0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	95 997,50	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	95 997,50	0,00
CELKEM VRN				0,00

Díl: 1	Zemní práce		
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3 31,53
		((1,8*1,1)/2)*18,07)*13,64	31,53
2	583418036R	Kamenivo drcené frakce 16/32 D Olomoucký kraj	t 30,41
		17,89*1,7	30,41
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3 -13,64
		dvorní část - kolem objektu : (1,00*0,80*(8,5+1,0+6,0)*1,1)*(-1)	-13,64
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3 -13,64
		dvorní část - kolem objektu : (1,00*0,80*(8,5+1,0+6,0)*1,1)*(-1)	-13,64
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3 -13,64
		dvorní část - kolem objektu : (1,00*0,80*(8,5+1,0+6,0)*1,1)*(-1)	-13,64
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3 -68,20
		mn. položky pořadí 3 : 13,64*5*(-1)	-68,20
7	109000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3 -13,64
		mn. položky pořadí 3 : 13,64*(-1)	-13,64
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy		
8	945421110	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy, instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m	hod 16,00
		2 dny * 8 hodin	16,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí		
9	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2 52,47
		(9,54*6,4)-(1,41*2,18)-(2,35*2,35)	52,47
10	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h 8,00
		nezměřitelné práce demontážní práce jíz. vyzdáného zdva a překladu nad vchodem dvorní části objektu - 2 pracovníci * 4 hodiny	8,00
Díl: 711	Izolace proti vodě		
11	711112009RZ4	Izolace proti vlhkosti svls. nátěr penetr. emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2 -58,30
		dvorní část - kolem objektu : (1,00*(8,5+1,0+11,0)*1,1)*(-1)	-22,55
		(2,50*(13,0)*1,1)*(-1)	-35,75
12	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t -0,04
Díl: 096	Přesuny sutí a vybouraných hmot		
13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t 69,37
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t 69,37
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t 69,37
16	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 8000 m	t 69,37
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 8000 m	t 624,33
18	979890101R00	Poplatek za skládku sutí-erněs beLa cihel do 30x30cm	t 69,37

SoD	pol. č. 1 (SO-02)
SoD	pol. č. 17
SoD	pol. č. 10
SoD	pol. č. 11
SoD	pol. č. 12
SoD	pol. č. 13
SoD	pol. č. 16
ÚRS	21/1
SoD	pol. č. 231
SoD	pol. č. 291
SoD	pol. č. 295
SoD	pol. č. 306
SoD	pol. č. 602
SoD	pol. č. 604
SoD	pol. č. 605
SoD	pol. č. 606
SoD	pol. č. 607
SoD	pol. č. 608

ZMĚNOVÝ LIST**č. 34**

Akce:

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19

Smlouva o dílo č.:

OISM

Objednatel:

Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

Zhotovitel:

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:

Na základě akustického měření ze dne 5.5.2021 vznikl požadavek instalace prostorových akustických podhledů (pouze jedna vrstva podhledů).

Navrhovatel změny:

Objednatel Český rozhlas

Technické řešení změny:

Ve vybraných místnostech bude provedena instalace akustického prostorového podhledu - jedna vrstva, dle upravené projektové dokumentace.

Podklady pro ocenění:

Zápis z KD, úprava projektové dokumentace

Změna smluvní ceny díla:

změna smluvní ceny díla:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
		X	

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:

19

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.

jméno

podpis

dne

31. 8. 2021

Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.

jméno

podpis

dne

31.8.2021

Za TDS - Baucon CZ s.r.o.

jméno

podpis

dne

31.8.2021

Za objednatele - Český rozhlas:

jméno

podpis

dne

13. 09. 2021

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	34	Doplnění prostorových akustických	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2		Náklady na m.j.	
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav,a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 090 642,62	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	1 090 642,62	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS	1 090 642,62	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	1 090 642,62	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	
Základ pro DPH	0,0 %	
DPH	0,0 %	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2	Rozpočet :	34
Objekt :	SO-01	Doplnění prostorových akustických pod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
342 Sádrokartonové konstrukce		0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot		0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT		0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Díl: 342	Sádrokartonové konstrukce				
1/4160211-6	Podhledy SDK, kovová kce CD, 1x deska akustická perforovaná 8/16 tl 12,5 mm akustický závěs	m2	492,00000		R
	Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací tl. 40mm, deska akustická perforovaná 8/16 tl 12,5 mm				
	4.05.23 systém PK11				
	ozn. P05 :		53,00000		
	1NP : 53,0		167,00000		
	2NP : 167,0		124,00000		
	3NP : 124,0		148,00000		
	4NP : 148,0				
2/4160232-2	Samonosný podhled SDK, jednoduchý rolt z 2 x CW 75, 1x deska akustická perforovaná 8/16 tl 12,5	m2	10,00000		R
	Samonosný podhled, zavěšené profily CW, 1 x opláštěný, s minerální izolací tl. 50 mm, 1x deska akustická perforovaná 8/16 tl 12,5 mm				
	systém PK11				
	ozn. P06 :		6,00000		
	1NP : 6,0		2,00000		
	2NP : 2,0		2,00000		
	3NP : 2,0				
3/4160232-1	Samonosný podhled SDK, jednoduchý rolt z 2 x CW 75, 2x deska RB 12,5	m2	31,00000		R
	Samonosný podhled, zavěšené profily CW, 2 x opláštěný, s minerální izolací tl. 50 mm, 2 x deska standard RB (A) tl. 12,5 mm				
	systém PK12				
	ozn. P01 :		5,00000		
	1NP : 5,0		26,00000		
	2NP : 26,0				
4/416021221R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 2x deska RB 12,5 mm	m2	-100,00		SoD
	Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací 40mm, desky standard RB (A) tl. 12,5mm				
	4.05.23 systém PK12				
	ozn. P08 :		-100,00		
	1NP : (100.0)/(-1)				
5/416021221R00	Podhledy SDK, kovová kce CD, 2x deska RB 12,5 mm	m2	43,00		R
	Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rolt z profilu CD, 1x opláštěný, s minerální izolací 40mm, desky standard RB (A) tl. 12,5mm				
	ozn. P08 :		43,00		
	1NP : 43				
6/R01	Podhled SDK, oceli dvouúrovňový křížový rolt, 1x deska akustická perforovaná 8/16 tl 12,5 mm	m2	63,00000		R
	Podhledy sádrokartonové, zavěšený ocelový dvouúrovňový křížový rolt z profilu CD, s minerální izolací tl. 50 mm, 1x deska akustická perforovaná 8/16 tl 12,5 mm				
	systém PK11				
	ozn. P10 :		63,00000		
	1NP : 63				
7/R02	Demontáž desky z revidních dvířek 600x600 a zplnění montáž akustické desky bez trnání	ks	4,00000		R
Díl: VN	Vedlejší náklady				
8/005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	40,00000		SoD
	Veškeré náklady spojené s vybudováním provozu a odstraněním zařízení staveniště. Poplatky za dobu výstavby dle SoD 407 dní				
	zařízení staveniště dle rozpočtu SOD 636 965,- Kč				
	zařízení staveniště dle rozpočtu SoD na 1 den: 636 965/407 = 1 565,07,- Kč				
9/005122 R	Provozní vývy	Soubor	40,00000		SoD
	Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny				
	doba výstavby dle SoD 407 dní				
	provozní vývy dle rozpočtu SOD 38 200,- Kč				
	provozní vývy dle rozpočtu SoD na 1 den: 38 200/407 = 93,86,- Kč				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
10/669261111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,90		SoD

pol. č. 108

pol. č. 1 Vedlejší a ostatní náklady stavby

pol. č. 2 Vedlejší a ostatní náklady stavby

pol. č. 293

ZMĚNOVÝ LIST**č. 38**

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	Úprava přístupu k záložnímu dieselagregátu související se změnou jeho uvažované dopravy a zvýšení bezpečnosti při jeho údržbě. Na fasádě budou umístěny tři držáky vlajek místo dvou.
Navrhovatel změny:	Atelier 38 s.r.o.
Technické řešení změny:	Mezi střešním výlezem a místností s dieselagregátem bude umístěno ochranné zábradlí. Změna počtu držáků na vliaku na ul. Pavelčákova.
Podklady pro ocenění:	Zápis z KD, úprava projektové dokumentace


Změna smluvní ceny díla:

Změna smluvní ceny díla:	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.		dne <u>31.8.2021</u>
jméno  podpis		
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.		dne <u>31.8.2021</u>
jméno  podpis		
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.		dne <u>31.8.2021</u>
jméno  podpis		
Za objednatele - Český rozhlas:		dne <u>- 6 -09- 2021</u>
jméno  podpis		

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	38	Doplnění zámečnických výrobků	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčáková		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlíňstav a.s.		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	20 740,13	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	20 740,13	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
	HZS	0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
	ZRN+HZS	20 740,13	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	20 740,13	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				
DPH	21,0 %				
Základ pro DPH	0,0 %				
DPH	0,0 %				
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 38
Objekt :	SO-01	Doplnění zámečnických výrobků

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Konstrukce zámečnické	0,00	2 502,90	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	18 237,23	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	0,00	20 740,13	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčák	Rozpočet: 38
Objekt :	SO-01	Doplnění zámečnických výrobků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
Díl:	711	Izolace proti vodě						
1	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm	kus	4,00			ÚRS	21/I
		kotevní plotna pro zábradlí		4,00				
2	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,01			ÚRS	21/I
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						
Díl:	767	Konstrukce zámečnické						
3	9539426-1	Vlajkové drážky na fasádě - nerez dodávka a montáž vč. kotev	kus	1,00			SoD	pol. č. 227
		viz prvek V.06: 2		1,00				
4	R01	Z.16 Ochranné zábradlí	kus	1,00			R	
		ochranné zábradlí u střešního výlezu		1,00				
5	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81			ÚRS	21/I
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické						

ZMĚNOVÝ LIST**č. 40**Akce: **ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19**Smlouva o dílo č.: **OISM**Objednatel: **Český rozhlas**
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny: Po demontáži podhledů v 1.NP a 4.NP bylo zjištěno, že tyto podhledy byly u kotveny na výztuži jednotlivých stropů, která byla pro tyto účely obnažena.

Navrhovatel změny: **Zlínstav a.s.**

Technické řešení změny: Pro zapravení těchto defektů je provedeno jejich vyčištění, nátěr výztuže a vyplnění reprofilační maltou.

Podklady pro ocenění: **Zápis z KD**

Změna smluvní ceny díla:

Změna smluvní ceny díla:	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: **0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.			
jméno	podpis		dne ...3.7.8. 2021...
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.			
jméno	podpis		dne ...31.8.2021...
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.			
jméno	podpis		dne ...31.8.2021...
Za objednatele - Český rozhlas:			
jméno	podpis		dne ...6 -09- 2021...

ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19							Sanace obnažené výztuže v 1.NP a 4.NP							ZL č.		40		
Odpočet							Přípočet										Rozdíl	
č.pól.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	č.pól.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem				
2	614472305RT4	Oprava vnř.beton.konstr.pl do 0,09 m2 š. 5 mm vč.dod.Duracore 222 a Monocrete PPE TH (Befosan)	kus	-50,00			1	614472206RT4	Oprava vnř.beton.konstr.pl do 0,04 m2 š.5 mm vč.dod.Duracore 222 a Monocrete PPE TH (Befosan)	kus	409,00							
3	614472406RT4	Oprava vnř.beton.konstr.pl do 0,25 m2 š. 5 mm vč.dod.Duracore 222 a Monocrete PPE TH (Befosan)	kus	-60,00														
4	614472610RT4	Oprava vnř.beton.konstr.pl do 1 m2 š.10 mm vč.dod.Duracore 222 a Monocrete PPE TH (Befosan)	kus	-10,00														
5	614472650RT4	Oprava vnř.beton.konstr.pl do 1 m2 š.10 mm vč.dod.Duracore 222 a Monocrete PPE TH (Befosan)	kus	-10,00														
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	-1,14														

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	40	Sanace obnažené výztuže v 1.NP a 4	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlíntav a.s.		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	36 245,43	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		36 245,43	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		36 245,43	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		36 245,43	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0	%	
DPH		21,0	%	
Základ pro DPH		0,0	%	
DPH		0,0	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet : 40
Objekt :	SO-01	Sanace obnažené výztuže v 1.NP a 4.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	36 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-489,97	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	36 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	0,00		0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem		
Díl:	81	Úpravy povrchů vnitřní						
1	614472205RT4	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 0,04 m2 tl.5 mm vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan)	kus		409,00		SoD	pol. č. 171
		Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou. 1.NP: 361 4.NP: 98 smluvní rozpočet: -50 celkem: 409			361,00 98,00 -50,00 409,00			
2	614472305RT4	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 0,09 m2 tl. 5 mm vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan)	kus		-50,00		SoD	pol. č. 172
		Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou. rezerva rekonstrukce - účtováno dle skutečnosti : 50			-50,00			
3	614472405RT4	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 0,25 m2 tl. 5 mm vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan)	kus		-50,00		SoD	pol. č. 173
		Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou. rezerva rekonstrukce - účtováno dle skutečnosti : 50			-50,00			
4	614472610RT4	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.10 mm vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan)	kus		-10,00		SoD	pol. č. 174
		Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou. rezerva rekonstrukce - účtováno dle skutečnosti : 10			-10,00			
5	614472650RT4	Oprava vnitř.beton.konstr.pl.do 1 m2 tl.50 mm vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan)	kus		-10,00		SoD	pol. č. 175
		Vymetení prohlubně, nátěr kontaktní plochy adhezním můstkem, vyplnění prohlubně reprofilační maltou. rezerva rekonstrukce - účtováno dle skutečnosti : 10			-10,00			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		-1,14		SoD	pol. č. 293

ZMĚNOVÝ LIST**č. 41**

Akce:	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Smlouva o dílo č.:	OISM
Objednatel:	Český rozhlas Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Důvod změny:	Při provedení sondy do ŽB podlahové konstrukce bylo zjištěno, že stropní deska v lokalitě kolem sloupu 7B stropu nad 2. NP je nabetonována na átriové průvlaky dodatečně. Vzniká tak pracovní spára a třmínky jsou ukončeny v úrovni spodní hrany desky. Ze statického hlediska je nutné tyto konstrukce vzájemně provázat.
Navrhovatel změny:	Zlínstav a.s.
Technické řešení změny:	Prořezání drážek, vyčištění, vrtání otvorů na třmínky, uložení výztuže vč. nátěru, zalití kotevní maltou a provedení sanace desky tixotropní maltou.
Podklady pro ocenění:	Zápis ve SD, výkres Sanace lokální separace desky od průvlatu

Změna smluvní ceny díla:


Změna smluvní ceny díla:			
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:			
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:			
Rozdíl:			
Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.			

Změna smluvních termínů:

Termíny milníků:	zůstávají nezměněny	budou opožděny	budou splněny dříve
	X		
Konečný termín:	zůstává nezměněn	bude opožděn	bude splněn dříve
	X		

Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech: 0

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele - Zlínstav a.s.			dne ... 27.8.2021 ...
jméno 	podpis .		
Za projektanta - Atelier 38 s.r.o.			dne ... 31.8.2021 ...
jméno 	podpis .		
Za TDS - Baucon CZ s.r.o.			dne ... 31.8.2021 ...
jméno 	podpis .		
Za objednatele - Český rozhlas:			- 6 -09- 2021
jméno 	podpis .		dne

[illegible]

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	41	Změnový list č. 41 - Sanace ŽB kons	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21640	ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova		Náklady na m.j.	0
Projektant	ATELIER 38 s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ATELIER 38 s.r.o.			
Objednatel	Český rozhlas			
Dodavatel	Zlínstav, a.s. Zlín		Zakázkové číslo	21640
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	15 036,29	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN	celkem	15 036,29	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)	0,00
ZRN+HZS		15 036,29	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS		15 036,29	Ostatní náklady celkem	0,00
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova	Rozpočet :	41
Objekt :	SO-01	Změnový list č. 41 - Sanace ŽB konstrukce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Sanace		0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot		0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT		0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	15 036,29	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	15 036,29	0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	21640 ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčáko	Rozpočet: 41
Objekt :	SO-01	Změnový list č. 41 - Sanace ŽB konstrukce typ č. 8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:	005	Sanace					
1	R01	Provedení sanace separace desky od průvlaku, prořezání drážek vč. vyčištění, vrtání otvorů na třmínky, D+M výztuže vč. nátěru, zalití kotevní maltou, sanace desky tixotropní maltou, vč. přesunu hmot	kus	1,00			R
		strop nad 2. NP:		1,00			
2	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm	m2	0,44			ÚRS 21/II
		2.NP:					
		0,25*0,20		0,05			
		0,45*0,10		0,05			
		0,32*0,13		0,04			
		0,20*0,15		0,03			
		3.NP:					
		0,41*0,10		0,04			
		0,32*0,14		0,04			
		0,41*0,12		0,04			
		4.NP:					
		0,30*0,18		0,05			
		0,30*0,23		0,07			
		0,26*0,12		0,03			
3	985323912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,44			ÚRS 21/II
		mn. pol.č. 2		0,44			
4	985311315	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,44			ÚRS 21/II
		2.NP:					
		0,25*0,20		0,05			
		0,45*0,10		0,05			
		0,32*0,13		0,04			
		0,20*0,15		0,03			
		3.NP:					
		0,41*0,10		0,04			
		0,32*0,14		0,04			
		0,41*0,12		0,04			
		4.NP:					
		0,30*0,18		0,05			
		0,30*0,23		0,07			
		0,26*0,12		0,03			
5	985311912	Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	0,44			ÚRS 21/II
		mn. pol.č. 4		0,44			
	Celkem za	005 Sanace					
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,04			SoD pol. č. 293
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

