

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2021228

uzavřené dne 3. 11. 2021, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:


Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Arpáš s.r.o.

se sídlem: Sadová 40, Chudeřice, 418 01 Bílina
IČO: 27280012
DIČ: CZ27280012
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 21622
Zastoupená: Ing. Stanislavem Karlem, MBA, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Bílina
Číslo účtu: 35-3594590207/0100
Tel: 
ID datové schránky: **bqgs29f**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 3. 11. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2021228 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, práce a dodávky spočívající **v opravě a úpravě povrchu vjezdů do garáží na stanici Ústí nad Labem a stanici Petrovice, Územního odboru Ústí nad Labem, HZS Ústeckého kraje** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle cenových nabídek zhotovitele ze dne 12. 10. 2021, které jsou přílohami č. 1, 2 a 3 této smlouvy, a kterými je zhotovitel vázán, za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku II. odst. 1 smlouvy o dílo.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že v rámci provádění prací souvisejících s vjezdy do garáží v přední části stanice Ústí nad Labem, je z hlediska dodržení dílčích technologických postupů a přestávek a současně s tím i zajištění akceschopnosti příslušníků stanice Ústí nad Labem, vždy nutné ze strany objednatele na nezbytně nutnou dobu přerušit vjezd služebních vozidel do garáží z přední části a zajistit jejich vjezd ze zadní části, jelikož jiný postup by bránil v realizaci díla zhotovitelem. Z důvodu toho ale není možné, aby zhotovitel současně prováděl práce jak v přední, tak i zadní části stanice Ústí nad Labem, přičemž tyto překážky objektivně vznikly toliko na straně objednatele a zhotovitel za jejich existenci není nijak odpovědný. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést stavební práce a dodávky v termínu, který nebylo možné předem předvídat, a to se zohledněním daného stavu, ale i následného dodržení technologických přestávek z důvodu klimatických změn, které lze předpokládat. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna termínu plnění díla

1. Objektivní důvody vzniklé na straně objednatele reálně neumožňují zhotoviteli realizovat dílo řádně a včas dle smlouvy o dílo, přičemž z důvodu toho je nutné po dohodě smluvních stran změnit termín realizace díla tak, aby bylo dílo možné v novém termínu řádně dokončit.

2. Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo po zohlednění změn nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají tyto termíny k provedení díla:

- a) převzetí prostor a zahájení prací po nabytí účinnosti této smlouvy, vždy po předchozí dohodě smluvních stran,
- b) dokončení a předání díla objednateli:

stanice Ústí nad Labem – přední část nejpozději do: **13. 12. 2021**

stanice Ústí nad Labem – zadní část nejpozději do: **31. 03. 2022**

stanice Petrovice nejpozději do: **13. 12. 2021**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

09. 12. 2021

V Ústí nad Labem dne

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje

Objednatel:

400 01
IČ: 708 86


plk. Ing.

ředitel

HZS Ústeckého kraje

V Bílině dne


8. 12. 2021

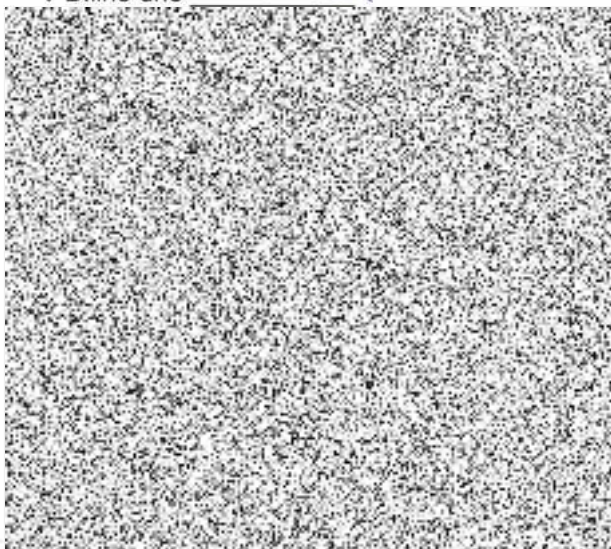

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Garáže HZS ÚL zadní část	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava povrchu vjezdu	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Petr Arpáš s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště - zábrany	5 000
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	206 201,23		
N	PSV celkem	0,00		
	ZRN celkem	206 201,23		
	HZS	0,00		
	RN II.a III.hlavy	206 201,23	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	211 201,23	VRN celkem	5 000
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis :		Jméno : Datum : Podpis :	
				
	Základ pro DPH	0 % činí :		
	Základ pro DPH	15 % činí :		
	DPH	15 % činí :		0,00 Kč
	Základ pro DPH	21 % činí :		211 201,23 Kč
	DPH	21 % činí :		44 352,25 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			255 553,48 Kč	

Poznámka :

Jedná se o opravu narušeného betonového povrchu plochy před garážemi v prostoru okolo odvodňovacího roštu.

Technologický postup : vyříznutí spáry cca 50 cm od roštů - vytvoření nové dilatační spáry

- vybourání poškozené části betonové plochy včetně podkladu

- zhutnění podloží

- montáž zhutněného podkladu z drceného kameniva

- betonáž krytu s vloženou betonářskou sítí

- zálivka dilatačních spár

Aby nebyl nadměrně omezen výjezd požárních vozidel budou práce rozděleny do min.2 etap.

Stavba :	<i>Oprava povrchu vjezdu</i>
Objekt :	<i>Garáže HZS ÚL zadní část</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 671,80	0	0	0	0
5 Komunikace	59 870,92	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	45 260,00	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	47 719,60	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 678,91	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	206 201,23	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště - zábrany	5 000	0,0	206 201,23	5 000
CELKEM VRN				5 000

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Oprava povrchu vjezdu</i>
Objekt :	<i>Garáže HZS ÚL zadní část</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.20 cm (62*0,5)*2	m2	62,00	480,00	29 760,00			-0,22500	-13,95000
2	113 10-7520.R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	62,00	250,00	15 500,00			-0,44000	-27,28000
3	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhuťněním - ručně	m2	62,00	38,90	2 411,80				
	Celkem za	1 Zemní práce				47 671,80				-41,23000
Díl: 5		Komunikace								
4	564 76-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	m2	62,00	280,00	17 360,00	0,48574	30,11588		
5	567 21-1225.R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 20 cm	m2	62,00	550,00	34 100,00	0,63291	39,24042		
6	631 36-2021.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari 62*0,0054	t	0,21	39 900,00	8 410,92	1,06625	0,22477		
	Celkem za	5 Komunikace				59 870,92		69,58107		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
7	919 73-5123.R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 62*2	m	124,00	210,00	26 040,00				
8	919 72-1211.R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou 62*2	m	124,00	155,00	19 220,00	0,00430	0,53320		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				45 260,00		0,53320		
Díl: 97		Prorážení otvorů								
9	979 08-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	41,23	155,00	6 390,65				
10	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,23	280,00	11 544,40				
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 41,23*8	t	329,84	15,30	5 046,55				
12	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	41,23	600,00	24 738,00				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				47 719,60				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
13	998 22-4111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	70,11	45,00	3 154,95				
14	998 22-4194.R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	70,11	36,00	2 523,96				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 678,91				
