

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 21

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-3472/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

RISL, s.r.o.

se sídlem: U Vodárny 461, Hostivice

IČO: 453 10 653

DIČ: CZ45310653

č. smlouvy: 112112020

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8650

zastoupená: Ing. Rudolfem Coufalem, jednatelem

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 12 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatelem schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8 odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	5.641.704,47 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	7.780.482,89 Kč

DPH 21%	1.633.901,41 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	9.414.384,30 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 je Objednatelům odsouhlasený Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 3 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech

V Hostivici dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Ing. Rudolf Coufal, jednatel RISL s.r.o.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

01

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: RISL s.r.o.
U Vodárny 461, Hostivice 253 01
IČO: 45310653, DIČ: CZ45310653

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-524 886,93	2 106 165,71	1 581 278,78

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	557 499,64	557 499,64

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-524 886,93	2 663 665,35	2 138 778,42

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01

Číslo ZBV:

1.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-3472/00066001/2020 a zhotovitel č. 112112020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: RISL s r o., U Vodárny 461, Hostivice 253 01

Přílohy Změnového listu:

1	Krycí list	1	počet listů
2	Změnový list	2	počet listů
3	Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4	Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů
5	Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6	Přehled dalších dokladů	1	počet listů
	Další doklady dle přehledu dokladů	37	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Bourání betonových bloků ve výkopu

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného při hloubení rýh pro uložení kanalizace. Zadávací PD uvažovala s hloubením vykopávek v hornině třídy těžitelnosti 1-4.

Při hloubení rýh byly na mnoha místech ve výkopech objeveny betonové bloky velkých rozměrů (viz doklad č.15 - Fotodokumentace), které bylo nutné odstranit. Pro následnou likvidaci byly tyto betonové bloky rozdraceny na menší kusy a odvezeny na mezidoponii, odkud byly dále odváženy na skládku. Celkem bylo vybouráno a zlikvidováno 577,45 t betonů, tzn. 288,725 m³ odpadu (viz doklad č. 13 - Evidence odpadu).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvní položkou č. 1, položkou novou č. 35 a navyšuje smluvní cenu stavby o 842 788,27 Kč.

Dílčí změna 2: Přepojení stávajících svodů na nově budovanou kanalizaci

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného při odkrytí stávající kanalizace. Zadávací PD uvažovala s realizací řadů - stok splaškové a dešťové kanalizace, nebylo uvažováno s žádnými odbočkami do stávajících objektů v areálu.

Při realizaci kanalizačních stok byly průběžně nacházeny stávající odbočky ze stávajících řadů (viz doklad č.15 - Fotodokumentace) a bylo nutné tyto odbočky přepojit na nově budované potrubí. Celkem bylo takto přepojeno 22 ks svodů do stávající kanalizace (20ks potrubím PVC200 na KT200 a 2ks potrubím PVC150 na potrubí KT150). Přepojení bylo provedeno odbočkou KG300/200 (resp. KG300/150), kolenem potrubím PVC200 (resp. PVC150) SN8 a přechodkou na kameninu PVC/KAM DN200 (resp. DN150) v celkové délce 33 bm (1,5 m x 22 ks).

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 2, 3, 4 a položkami novými č. 36, 37, 38, 39. Dílčí změna 2 navyšuje smluvní cenu stavby o 155 818,25 Kč.

Dílčí změna 3: Nová revizní šachta na stoce splaškové kanalizace

Změna vznikla na základě odlišného stavu oproti zadávací PD. Při vytyčování trasy budoucích stok bylo zjištěno, že v úseku mezi revizními šachtami SŠ5 a SŠ6 se nachází stávající čerpací stanice - nádrž (benkalor) na naftu, kterou používá nájemce areálu (spol. ZKP Kladno s.r.o.).

Z provozních důvodů v areálu a s ohledem na nutnost zachovat nádrž na naftu v provozu, byla po dohodě s objednatelem osazena jedna revizní šachta na splaškové kanalizaci navíc u napojení na stávající šachtu tak, aby trasa kanalizace mohla být provedena mimo stávající nádrž na naftu (viz doklad č.15 - Fotodokumentace).

Dále byl zjištěn nevyhovující stav stávající šachty SŠ6 a byla vyspravena a osazena novým poklopem.

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 12,17,20,21,22,24,27,26 navyšuje smluvní cenu stavby o 32 010 Kč.

Dílčí změna 4: Přeložka areálového vodovodu v kolizi s budovanou stokou

Změna vznikla na základě odlišného stavu oproti zadávací PD, ve které nebyl zakreslen areálový vodovod.

Při realizaci kanalizačních stok v úseku mezi revizními šachtami SŠ3 a SŠ4 byl během výkopových prací nalezen areálový vodovod, s kterým zadávací dokumentace nepočítala (viz doklad č.15 - Fotodokumentace). Vodovod se nacházel v kolizní poloze s nově budovanou kanalizací, proto bylo nutné tento vodovod přeložit tak, aby bylo potrubí vodovodu výškově vyvedeno mimo trasu budovaných stok. Zhotovitelem byl navržen způsob přeložení pomocí etáže - výškové přeložky vodovodu z PE D110 v délce cca 2,5m (4x elektrokoleno PE D110 a propojení přes 2ks zakusovací spojky Waga DN100).

Dílčí změna 4 je vyjádřena novými položkami č. 40, 41, 42, 43, 44, a navyšuje smluvní cenu stavby o 9 174,21 Kč.

Dílčí změna 5: Změna tloušťky odstraněných zpevněných povrchů

Zadávací dokumentace uvažovala s odstraněním asfaltobetonových vrstev o tloušťce 70 mm na celkové ploše 1 018 m².

Během realizace stavby bylo zjištěno, že v areálu KSUS Mělník jsou asfaltobetonové vrstvy v tloušťce 200-250 mm (viz doklad č. 15 - Fotodokumentace) a s ohledem na přepojování přípojek kanalizace a nutnému řezání a odstraňování stávající popraskané komunikace v areálu byly odstraněny asfaltové plochy o výměře 1469,4 m² (viz doklad č. 14 - Geodetické zaměření).

Dílčí změna 5 je vyjádřena smluvními položkami č. 6.1., 6.3., 6.4., 6.7., 6.8., 6.5., 6.6. (které byly určeny rozkladem agregované položky č. 6 (viz doklad č. 08 - Stanovení nových jednotkových cen) a novými položkami č. 48.1. a 48.5. a navyšuje smluvní cenu stavby o 569 691,05 Kč.

Dílčí změna 6: Změna tloušťky konstrukce vyspravení obrusné vrstvy zpevněných povrchů

Zadávací dokumentace uvažovala s provedením obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16 o tloušťce 70 mm (předpokládala tloušťku stávajících asfaltových povrchů také 70 mm) na ploše 1 018 m².

Během realizace stavby bylo zjištěno, že v areálu jsou asfaltové povrchy o tloušťce 200-250 mm (viz dílčí změna č. 5).

S ohledem na předpokládaný pohyb těžké techniky v areálu a větší tloušťku pro skladbu nové asfaltové komunikace oproti předpokladu, bylo objednatelům rozhodnuto o provedení 2 vrstev asfaltového betonu - ložní vrstvě ACL 16 tl. 50 mm (viz dílčí změna č. 2 ve skupině změn 5) a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm (viz doklad č. 12 - Pokyn objednatele).

Výměra vyspravených povrchů v areálu byla s ohledem na přepojování přípojek a nutné řezání a odstranění stávající popraskané komunikace 1469,4 m² (viz doklad č. 14 - Geodetické zaměření).

Tato změna je vyjádřena smluvní položkou č. 6.2, která byla určena rozkladem agregované položky č. 6 (viz doklad č. 08 - rozklad položky) a novou položkou 48.4. Tato změna snižuje smluvní cenu stavby o 25 203 Kč.

Výše popsané změny byly nepředvidatelné, zjištěné provádění zemních prací a odkrytí stávající kanalizace.

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-524 886,93	2 106 165,71	1 581 278,78	2 631 052,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Coufal	datum	9.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum		podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Hofmiller	datum	8.12.2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ivan Husník	datum	9.12.2021	podpis
					Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

01

Číslo ZBV:

1.5

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-3472/00066001/2020 a zhotovitel č. 112112020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 11.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: RISL s.r.o., U Vodárny 461, Hostivice 253 01

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	37	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2

Objednatel

3

Zhotovitel

4

Projektant (AD)

5

Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Nová přípojka pro objekt vrátnice

Zadávací dokumentace nepředpokládala výstavbu přípojky pro objekt vrátnice, objekt nebyl napojen na stávající opravované kanalizační stoky. Změna vznikla na základě požadavku objednatele k vybudování přípojky pro objekt vrátnice na parc. č. 5744/14 (viz doklad č. 12 - Pokyn objednatele). Objednatel požadoval připojení tohoto objektu před jímkou na nově budovanou splaškovou kanalizační stoku. Byla vybudována přípojka PVC 150 v délce 6 m včetně napojení na nově budovaný řad, došlo k osazení 1 ks domovní RŠ PVC DN400 a propojení na svod z objektu. Stávající kanalizační jímka byla vyčerpána a obsah zlikvidován.

Tato změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 2, 3, 4, 8 a položkami novými č. 46, 38. Navyšuje smluvní cenu stavby o 24254,38 Kč.

Dílčí změna 2: Doplnění ložné vrstvy pro zpevněnou plochu

Zadávací PD nepředpokládala provedení dvou vrstev asfaltového betonu, ale pouze výměnu obrusné vrstvy tl. 70 mm.

Během realizace stavby bylo zjištěno, že v areálu jsou asfaltové povrchy o tloušťce 200-250 mm.

S ohledem na předpokládaný pohyb těžké techniky v areálu a větší tloušťku pro skladbu nové asfaltové komunikace oproti předpokladu, bylo objednatelem rozhodnuto o provedení 2 vrstev asfaltového betonu a tedy doplnění ložní vrstvy ACL 16 tl. 50 mm (viz doklad č. 12 - Pokyn objednatele).

Výměra této vrstvy odpovídá výměře odstraněných zpevněných povrchů - 1469,4 m² (viz doklad č. 14 - Geodetické zaměření).

Tato změna je vyjádřena novými položkami č. 48.2. a 48.3.. Navyšuje smluvní cenu stavby o 533.245,26 Kč.

Jedná se o Změnu de minimis, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 5**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	557 499,64	557 499,64	557 499,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Coufal	datum	9.12.2021	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum		podpis
Stavební dozor:	jméno	Josef Hofmiller	datum	8.12.2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum		podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, uokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ivan Husník	datum	9.12.2021	podpis
					Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 641 704,47

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5 641 704,47	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-524 886,93	2 663 665,35	2 663 665,35	47,21%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-524 886,93	7 780 482,89	2 138 778,42	37,91%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jan Coufal

souhlasím

Projektant (autorský dozor):

xxx

Stavební dozor:

Josef Hofmiller

souhlasím

Zástupce Objednatele KSÚS:

Ing. Jan Lichtneger

souhlasím

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO

Číslo a název rozpočtu: SO

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO

Skupina změn 3

Por. po.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	124 10-0010.RA0	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4	M3	1462,000	1 222,775	-239,225	811,000	1 185 682,00	-194 011,48	0,00	991 670,52	-194 011,48	-16,36%
4	122-10-0010.RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5km, uložení	M3	690,000	706,500	16,500	485,000	334 650,00	0,00	8 002,50	342 652,50	8 002,50	2,39%
3	174 10-005xx	Zásyp jam, rýh a šachet pískem	M3	690,000	706,500	16,500	862,000	594 780,00	0,00	14 223,00	609 003,00	14 223,00	2,39%
2	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	M3	467,000	500,000	33,000	150,000	70 050,00	0,00	4 950,00	75 000,00	4 950,00	7,07%
12	286-97181.1	Dno šacht. TEGRA1000 výkyvné průtočné 90° KG 315mm	ks	3,000	4,000	1,000	12 006,000	36 018,00	0,00	12 006,00	48 024,00	12 006,00	33,33%
17	286-xxx#	Šachtová vlnocová roura TEGRA 1000 dl. 2,4m	ks	7,000	8,000	1,000	7 300,000	51 100,00	0,00	7 300,00	58 400,00	7 300,00	14,29%
21	286-97155.A	Konus přechodový TEGRA 1000 DN1000/640 mm	ks	13,000	14,000	1,000	1 500,000	19 500,00	0,00	1 500,00	21 000,00	1 500,00	7,69%
20	286-971xx	Těsnění DN=1000	ks	26,000	28,000	2,000	602,000	15 652,00	0,00	1 204,00	16 856,00	1 204,00	7,69%
22	286-971xx	Betonový roznašecí prsteneček D680	ks	20,000	21,000	1,000	1 500,000	30 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00	1 500,00	5,00%
24	286-971xx	Poklop litinový D400	ks	20,000	22,000	2,000	3 000,000	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00	6 000,00	10,00%
27	899-10-1111.R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	ks	20,000	22,000	2,000	500,000	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	1 000,00	10,00%
26	894-43-1111.R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin	ks	13,000	14,000	1,000	1 500,000	19 500,00	0,00	1 500,00	21 000,00	1 500,00	7,69%
6.1	113154364	Frézování živnicového krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1018,000	0,000	-1018,000	91,425	93 070,65	-93 070,65	0,00	0,00	-93 070,65	-100,00%
6.3	919735112	Řezání stavajícího živnicového krytu hl přes 50 do 100 mm	bm	814,400	0,000	-814,400	92,000	74 924,80	-74 924,80	0,00	0,00	-74 924,80	-100,00%
6.4	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	1018,000	1469,400	451,400	59,000	60 062,00	0,00	26 632,60	86 694,60	26 632,60	44,34%
6.7.	R	Likvidace o odvoz vybouraného krytu z asfaltobetonu na skládku + poplatek	t	178,150	305,030	126,880	369,000	65 737,35	0,00	46 818,72	112 556,07	46 818,72	71,22%
6.8.	R	Likvidace o odvoz vybouraných podkladů ze ŠTD na skládku + poplatek	t	610,800	984,760	373,960	354,000	216 223,20	0,00	132 381,84	348 605,04	132 381,84	61,22%
6.5.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1018,000	1469,400	451,400	144,000	146 592,00	0,00	65 001,60	211 593,60	65 001,60	44,34%
6.6	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1018,000	1469,400	451,400	170,000	173 060,00	0,00	76 738,00	249 798,00	76 738,00	44,34%
6.2	577124111 R	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1018,000	0,000	-1018,000	160,000	162 880,00	-162 880,00	0,00	0,00	-162 880,00	-100,00%
5.2.1	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1018,000	1469,400	451,400	305,000	310 490,00	0,00	137 677,00	448 167,00	137 677,00	100,00%
Nové položky - JC dle UR5 2021 02													
35	129951121	Bourání zdíva (bloků) z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojné	M3	0,000	288,725	288,725	3730,000	0,00	0,00	1 076 944,25	1 076 944,25	1 076 944,25	100,00%
36	OSM.223170	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200	M	0,000	33,000	33,000	535,530	0,00	0,00	17 672,49	17 672,49	17 672,49	100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO

Číslo a název rozpočtu: SO

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	PPL.KGEA3002004	KG odbočka 45° DN300x200	ks	0,000	20,000	20,000	2381,950	0,00	0,00	47 639,00	47 639,00	47 639,00	100,00%
38	PPL.KGEA3001504	KG odbočka 45° DN300x150	ks	0,000	2,000	2,000	1473,380	0,00	0,00	2 946,76	2 946,76	2 946,76	100,00%
39	OSM.223830	KG přechod PVC/KAM DN200	ks	0,000	20,000	20,000	862,000	0,00	0,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00	100,00%
40	871251211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm	M	0,000	3,000	3,000	152,000	0,00	0,00	456,00	456,00	456,00	100,00%
41	877251112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 110	ks	0,000	4,000	4,000	327,000	0,00	0,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	100,00%
42	NCL.612105	elektrokoleno W90 90° d 110	ks	0,000	4,000	4,000	1300,000	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
43	PPL.RC1110100006	vodovodni potrubí Aqualine tr.RC1 voda 110x10 6m RC	M	0,000	3,000	3,000	376,070	0,00	0,00	1 128,21	1 128,21	1 128,21	100,00%
44	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	ks	0,000	2,000	2,000	541,000	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
48.1.	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	1469,400	1469,400	155,000	0,00	0,00	227 757,00	227 757,00	227 757,00	100,00%
48.5.	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	bm	0,000	892,070	892,070	182,000	0,00	0,00	162 356,74	162 356,74	162 356,74	100,00%
Celkem									- 524 886,93	2 106 165,71	1 581 278,78		

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Coufal

Za Objednatele: Josef Hofmiller

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby:

Číslo a název SO/PS: SO

Číslo a název rozpočtu: SO

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO

Skupina změn 5

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	124 10-0010.RAO	Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4	M3	1462,000	1474,000	12,000	811,000	1 185 682,00	0,00	9 732,00	1 195 414,00	9 732,00	0,82%
4	122-10-0010.RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 5km, uložení	M3	690,000	693,000	3,000	485,000	334 650,00	0,00	1 455,00	336 105,00	1 455,00	0,43%
3	174 10-005xx	Zásyp jam, rýh a šachet pískem	M3	690,000	693,000	3,000	862,000	594 780,00	0,00	2 586,00	597 366,00	2 586,00	0,43%
2	174 10-0010.RAO	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	M3	467,000	476,000	9,000	150,000	70 050,00	0,00	1 350,00	71 400,00	1 350,00	1,93%
8	115-20-1514.R00	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160	m	13,000	19,000	6,000	228,000	2 964,00	0,00	1 368,00	4 332,00	1 368,00	46,15%
Nové položky - JC dle URS 2021 02													
46	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	ks	0,000	1,000	1,000	6290,000	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	100,00%
38	PPL..KGEA3001504	KG odbočka 45° DN300x150	ks	0,000	1,000	1,000	1473,380	0,00	0,00	1 473,38	1 473,38	1 473,38	100,00%
#8.2	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	0,000	1469,400	1469,400	349,000	0,00	0,00	512 820,60	512 820,60	512 820,60	100,00%
#8.3	573231109	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m ²	m ²	0,000	1469,400	1469,400	13,900	0,00	0,00	20 424,66	20 424,66	20 424,66	100,00%
Celkem									0,00	557 499,64		557 499,64	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Coufal

Za Objednatele: Josef Hofmiller

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 641 704,47
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 780 482,89
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 414 384,30
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	137,91%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,30%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 581 278,78
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	28,03%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 692 511,34

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	46,64%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 631 052,64
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 820 852,24

12=(1)*0,15	Limit	846 255,67
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	9,88%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	557 499,64

- 1 -		- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnnosti celkové povahy veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		

SO	ZBV č.	Název SO/PS i předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník	- 524 886,93	2 663 665,35	2 138 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 524 886,93	2 106 165,71	1 581 278,78	2 631 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 499,64	557 499,64
SO	1	ZBV 1	- 524 886,93	2 663 665,35	2 138 778,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 524 886,93	2 106 165,71	1 581 278,78	2 631 052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 499,64	557 499,64

Poznámka: Formulář má informální charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	6	
08 Stanovení nových JC	1	
09 Zápis ve stavebním deníku	1	
10 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu	2	
11 Zápis z prohlídky staveniště	1	
12 Pokyn objednatele ke změně	1	
13 Evidence odpadu ze stavby	13	
14 Geodetické zaměření	4	
15 Fotodokumentace	6	
16 Výpis z OR	2	
17 Realizační dokumentace	-	na CD u objednatele
Počet listů celkem	37	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník Číslo a název SO/PS: SO 01 Číslo a název rozpočtu: SO 01								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 01					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m ^j	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m ^j . v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
6.4	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m ²	1 018,00	1 469,400	451,400	59,000	60 062,00	0,00	26 632,60	86 694,60	26 632,60	44,34%
		pol. č. 6.4 určena dle rozkladu agregované položky (viz doklad č. 08) výměra určena dle geodetického zaměření (viz doklad č. 14)											
6.7	R	Likvidace o odvoz vybouraného krytu z asfaltobetonu na skládku + poplatek	t	178,15	305,030	126,880	369,000	65 737,35	0,00	46 818,72	112 556,07	46 818,72	71,22%
		pol. č. 6.4 určena dle rozkladu agregované položky (viz doklad č. 08) výměra určena dle evidence likvidovaných odpadů (viz doklad č. 13)											
6.8	R	Likvidace o odvoz vybouraných podkladů ze ŠTD na skládku + poplatek	t	610,80	984,760	373,960	354,000	216 223,20	0,00	132 381,84	348 605,04	132 381,84	61,22%
		pol. č. 6.4 určena dle rozkladu agregované položky (viz doklad č. 08) výměra určena dle evidence likvidovaných odpadů (viz doklad č. 13) Evidence odpadu Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1613,46 t (A) Evidence odpadu Beton 577,45 t (B) odvoz zeminy dle položky č. 4 709,5m ³ x 1,7 = 1206,15 t (C) celkem (A) + (B) - (C) = 984,76											
6.5.	564851111	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	1 018,00	1 469,400	451,400	144,000	146 592,00	0,00	65 001,60	211 593,60	65 001,60	44,34%
		pol. č. 6.4 určena dle rozkladu agregované položky (viz doklad č. 08) výměra určena dle geodetického zaměření (viz doklad č. 14)											
6.6	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m ²	1 018,00	1 469,400	451,400	170,000	173 060,00	0,00	76 738,00	249 798,00	76 738,00	44,34%
		pol. č. 6.4 určena dle rozkladu agregované položky (viz doklad č. 08) výměra určena dle geodetického zaměření (viz doklad č. 14)											
6.2	577124111R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	1 018,00	0,000	-1018,000	160,000	162 880,00	-162 880,00		0,00	-162 880,00	-100,00%
		ZBV č.1 : odpočet položky dle ZBV č. 1, položka nahrazena ložní vrstvou											
6.2.1.	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu		1 018,00	1 469,400	451,400	305,000	310 490,00	0,00	137 677,00	448 167,00	137 677,00	44,34%
		ZBV č.1 : položka určena dle skutečné výměry dle geodetického zaměření, příloha č. 14											
	g	Trubní vedení						1 498 419,00	0,00	33 378,00	1 531 797,00	33 378,00	2,23%
7	286-1127xxx	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2	m	874,000	874,000	0,000	720,000	629 280,00	0,00	0,00	629 280,00	0,00	0,00%
8	286-112xx	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 (k uličním vpustím)	m	13,000	19,000	6,000	228,000	2 964,00	0,00	1 368,00	4 332,00	1 368,00	46,15%
		pol.8 13 [A] ZBV č.1 : nová přípojky pro objekt vrátnice v dl. 6m 6 [B] celkem [A] + [B] = 19											
9	286-97152.0	Dno šachtové TEGRA 600/315mm přímé pro potrubí KG	kus	5,000	5,000	0,000	5183,000	25 915,00	0,00	0,00	25 915,00	0,00	0,00%
10	286-97152.4	Dno šachtové TEGRA 600/315mm typ T pro potrubí KG	kus	2,000	2,000	0,000	6083,000	12 166,00	0,00	0,00	12 166,00	0,00	0,00%
11	286-97180.2	Dno šacht. TEGRA1000 výkyvné průtočné 0* KG 315mm	kus	4,000	4,000	0,000	10547,000	42 188,00	0,00	0,00	42 188,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník Číslo a název SO/PS: SO 01 Číslo a název rozpočtu: SO 01								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 01					
								celkem					
Poř. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	ks	0,000	2,000	2,000	541,000	0,00	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00%
		ZBV č.1 : Přeložka areálového vodovodu v kolizi s budovanou stokou výměra 2x propojení na stávající vodovod = 2											
48.1.	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	0,000	1469,400	1469,400	155,000	0,00	0,00	227 757,00	227 757,00	227 757,00	100,00%
		ZBV č.1 : Změna tloušťky odstraněných zpevněných povrchů výměra dle geodetického zaměření (viz doklad č. 14)											
48.5.	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	bm	0,000	892,070	892,070	182,000	0,00	0,00	162 356,74	162 356,74	162 356,74	100,00%
		ZBV č.1 : Změna tloušťky odstraněných zpevněných povrchů výměra určena dle geodetického zaměření vyspravených povrchů přílohy č. XX ZBV č. 1											
46	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	ks	0,000	1,000	1,000	6290,000	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	100,00%
		ZBV č.1 : nová přípojky pro objekt vrátnice 1ks RŠ DN400											
48.2.	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	1469,400	1469,400	349,000	0,00	0,00	512 820,60	512 820,60	512 820,60	100,00%
		ZBV č.1 : Doplnění ložné vrstvy pro zpevněnou plochu výměra dle geodetického zaměření (viz doklad č. 14)											
48.3.	573231109	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	0,000	1469,400	1469,400	13,900	0,00	0,00	20 424,66	20 424,66	20 424,66	100,00%
		ZBV č.1 : Doplnění ložné vrstvy pro zpevněnou plochu výměra dle geodetického zaměření (viz doklad č. 14)											
Celkem								5 641 704,47	- 515 154,93	2 653 933,35	7 780 482,89	2 138 778,42	37,91%

Příloha č. 8 ZBV č. 1

Rozklad agregované položky a získání nové pro učení jednotkové ceny za odstranění a vyspravení komunikace.

Položka ze smluvního soupisu prací			cena za m ^j		cena celkem za m ^j	
6	599 00-0010 RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet 7 cm	m2	1,00	1 280,00	1 280,00
6.1	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1,00	91,52	91,52
6.2	577124111 R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,00	160,00	160,00
6.2.1	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,00	305,00	305,00
6.3	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm (1018m2 / š 2,5m = 407,2bm x 2 = 814,4bm řezání, pro 1018m2 = 0,8bm/m2)	bm	0,80	92,00	73,51
6.4	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,00	59,00	59,00
6.5	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	1,00	144,00	144,00
6.6	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1,00	170,00	170,00
6.7	R	Likvidace o odvoz vybouraného krytu z asfaltobetonu na skládku + poplatek	t	0,175	369,00	64,58
6.8	R	Likvidace o odvoz vybouraných podkladů ze ŠTD na skládku + poplatek	t	0,600	354,00	212,40
						1 280,00

Nové položky dle skutečného stavu			cena za m ^j		cena celkem za m ^j		
48	599 00-0010 RAA- skutečnost	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání výměna podkladu tl. 30 cm asfaltobet 2 vrstvy 5 + 4cm frézování živičného krytu v tl 20cm	m2	1,00			
48.1	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1,00	155,00	155,00	cena dle URS 2021 02
48.2	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1,00	349,00	349,00	cena dle URS 2021 02
48.3	573231109	Posiřk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	1,00	13,90	13,90	cena dle URS 2021 02
48.5	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	bm	1,00	182,00	182,00	cena dle URS 2021 02
48.6	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1,00	59,00	59,00	cena dle URS 2021 02
48.7	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	1,00	144,00	144,00	viz smluvní rozklad položky
48.8	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1,00	170,00	170,00	viz smluvní rozklad položky
6.7	R	Likvidace o odvoz vybouraného krytu z asfaltobetonu na skládku + poplatek	t	0,208	369,00	76,60	viz smluvní rozklad položky
6.8	R	Likvidace o odvoz vybouraných podkladů ze ŠTD na skládku + poplatek	t	1,492	354,00	528,17	viz smluvní rozklad položky

ZÁPIS VE 156 BYL PŘEVĚŘEN KD SE ZASTUPÍ
 INVESTOR A BYL PŘEVĚŘEN POSTUP K PŘEVĚŘENÍ.
 ZBV PŘEVA DEJEM VSTAVBY BOURÁNÍ BETONU
 NA KANALIZACI, PŘEPOJENÍ SIPS, VSTUP KANALIZACE,
 PŘEPOJENÍ SUDU DO NOVE DEŠŤOVÉ A
 SPLAŠKÉ KANALIZACE.
 PO REALIZACI VETVE C' BYLY ZJISTĚNY JAKO
 ZMĚNY OPROTÍ PD A JSOU PŘEDPOKLADÁNY
 I PŘI REALIZACI DALŠICH VĚTVÍ
 DOHODNUTA ZMĚNA VSTAVBY, ZP. PLOCH
 NA 2x VSTUP ŽIVICE ABH 5cm + ABS 5cm

PO. AS. : 18 - 32°C JASNO 16.6.21
 PRAC. DOBA : 7 - 15⁰⁰ 13.6.21
 POČET PRAC. : 2 SD, 2x S, 2x R ST-ČT
 MATERIÁL BETON 0,3m³
 STROJE : 1PM KLADIVO, CAT 18, UNC, VV, 2x PAV
 POPIS PRAC. :
 BOURÁNÍ BETONU NA MEZIDĚPOVÍ, NAKLÁDÁNÍ
 A ODVŮZ NA SKLÁDKU - 48t.
 PŘEBÍRÁNÍ ZEMINY A BETONU NA MEZIDĚPOVÍ.
 STAVEBNÍ PRÁCE NA STOCE - B - OD D54 K D58
 A OD S54 K S58 (PO DOHODĚ SE ŽKO).
 ODSTRANĚNÍ ŽIVICE A ŠTĚRK PODKLADU.
 VÝKOP RYHY + ODVŮZ NA DEPOVÍ, M+D PŘÍZEMÍ
 A ÚPRAVA LOŽE.
 M+D PVC 300 2x 6m NÁPOJENÍ, 2x VÝKOP Ø150
 NA SPLAŠKOU ZE STAVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ
 BUDOVY + OBĚTOVÁNÍ.
 BOURÁNÍ A ODVŮZ BETONU NA MEZIDĚPOVÍ
 PÍSKOVÝ OBSTĚP A ZASTĚP POTRUBÍ, HURTIVÝ ZASTĚP
 + BEZPEČENÍ STAVBY, UKLID

RISL s.r.o.

U Vodárny 461,
Hostivice 253 01
IČO:45310653
DIČ:CZ45310653

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21
Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení z důvodu změn během výstavby - ZBV

VZ: „Oprava areálových kanalizačních stok - Mělník“

č. smlouvy: **S-3472/00066001/2021**

Chtěly bychom Vás tímto požádat o prodloužení termínu dokončení výše uvedené zakázky, z důvodu, že během výstavby vznikly okolnosti, které výrazně ovlivňují náročnost výstavby stok, s kterými projektová dokumentace nepočítala a také se nad rámec PD navýšil rozsah prací.

Dále také z důvodu, že v projektové dokumentaci a rozpočtu jsou uvažovány atypické plastové uliční vpusti od výrobce WAVIN, které přesto že jsou již u dodavatele resp. výrobce objednané od 03/2021, výrobce nám vzhledem k neuspokojivé situaci na trhu s plastovými výrobky z důvodu pandemie COVID-19, několikrát prodloužil termín dodání, aktuálně máme potvrzené dodání vpustí na 15.7.2021.

Zásadní okolnosti, které se zatím na stavbě objevily a ovlivňují náročnost i rozsah prací:


1) Přepojování stávajících přípojek na nově budované stoky (v rozpočtu ani PD není projektováno) Během výstavby narážíme na přípojky dešťové i splaškové kanalizace z objektů, které nejsou v PD zakresleny. Stávající přípojky se musí zkoušet, o jaký druh kanalizace se jedná (splašková/dešťová) a na jaké stoky je tedy přepojit (některé byly na stávající stoky napojeny špatně). K dnešnímu dni bylo takto objeveno a přepojeno 11ks přípojek nad rámec PD.

2) Při hloubení rýh je ve výkopech na mnoha místech objevena místa-útvary zalitá betonem mnohdy větších rozměrů, a nebo jako podklady pod komunikací. Je nutné bourání betonů bouracím kladivem, což výrazně zdržuje hloubení rýh a postup výstavby. K dnešnímu dni bylo takto vybouráno a odvezeno na skládku 358,8 tun betonů.

- 3) Z provozních důvodů nájemce areálu (musel být zachován příjezd k ČS) byla provedena 1ks RŠ navíc u napojení a oprava stávající napojovací šachta.
- 4) Při realizaci úseku mezi SŠ3 a SŠ4 byl objeven vodovod v kolizi s nově budovaným potrubím. Je nutné odstavení areálu od vody a provedení přeložky – etáže stávajícího vodovodu.
- 5) V projektové dokumentaci uvažováno s frézováním stávajících živičných povrchů v trase v tl. 7cm, v areálu je však tl. živičných vrstev 25cm.
- 6) Stávající sítě v areálu nebylo možné vytyčit, není k dispozici zaměření skutečného provedení, je nutné zvýšené opatrnosti při hloubení rýh, což také časově ovlivňuje postup výstavby. Při výkopech byl v kolizi objeven (později zjištěno) nefunkční horkovod a kabeláže.

V příloze Vám zasíláme fotodokumentaci k výše uvedeným skutečnostem, seřazenou dle bodů výše a žádáme Vás tímto o posunutí termínu dokončení o 1 měsíc do 31.8.2021.

V Hostivici dne 02.07.2021



Ivan Husník, jednatel
RISL s.r.o.

ZÁPIS Z PROHLÍDKY STAVENIŠTĚ

Stavba: „Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník, Na Průhoně 3320“

č. smlouvy: S-3472/00066001/2021

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21

Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupený: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

Josef Hofmiller, správce majetku

Dodavatel:

RISL s.r.o.

U Vodárny 461,

Hostivice 253 01

IČO:45310653

DIČ:CZ45310653

Zastoupený: Jan Coufal

Dne 15.7.2021 proběhla prohlídka staveniště v přítomnosti ředitele KSUS p. Ing. Lichtnegera, který byl seznámen se změnami, které vznikly během výstavby „ZBV“, a které jsou popsány v samostatné příloze „Žádosti o prodloužení termínu“.

Zástupcem dodavatele J. Coufalem byl z uvedených důvodů vznesen požadavek na prodloužení termínu o 1 měsíc tj. do 31.8.2021.

Dále bylo dohodnuto přepojení objektu KSUS (na parc. 5744/14) na nově budovanou kanalizaci před stávající jímkou a vyvezení vybouraných betonů sutí a zeminy z deponie na skládku dle požadavek nájemce areálu spol. ZKP Kladno s.r.o..

Dne 15.07.2021

Jan Coufal, RISL s.r.o.

Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSUS

Josef Hofmiller, správce majetku



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace

**Formulář: „Souhlas s řešením akce – Oprava kanalizačních
stok Mělník“**

Souhlas s navrženým řešením u akce „Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. v rámci akce „Oprava areálových kanalizačních stok – Mělník“ po projednání **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Při hloubení rýh byly na mnoha místech ve výkopech objeveny betonové bloky velkých rozměrů, které je nutné vybourat a odvézt k likvidaci na skládku
- Při realizaci kanalizačních stok byly průběžně nacházeny stávající odbočky ze stávajících řadů, které je nutné přepojit na nově budované potrubí.
- Z provozních důvodů v areálu a s ohledem na nutnost zachovat nádrž na naftu v provozu, bude po osazena jedna revizní šachta na splaškové kanalizaci navíc u napojení na stávající šachtu
- Při realizaci kanalizačních stok v úseku mezi revizními šachtami SŠ3 a SŠ4 byl během výkopových prací nalezen areálový vodovod, je nutné provést výškovou přeložku vodovodu.
- Během realizace stavby bylo zjištěno, že v areálu jsou asfaltové povrchy o tloušťce 200-250 mm., je nutné frézování asfaltových povrchů v tl. 200-250mm a s ohledem na přepojování přípojek kanalizace a nutnému řezání a odstraňování stávající popraskané komunikace v areálu budou vyspravené plochy provedeny ve vyšší výměře. S ohledem na předpokládaný pohyb těžké techniky v areálu a větší tloušťku pro skladbu nové asfaltové komunikace oproti předpokladu, bylo objednatel rozhodnuto o provedení 2 vrstev asfaltového betonu - ložní vrstvě ACL 16 tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl 40 mm (namísto jedné vrstvy 7cm)
- Objednatel požaduje zhotovení nové kanalizační přípojky pro objekt vrátnice, která bude napojena na nově budovanou splaškovou stoku. Stávající kanalizační jímka byla vyčerpána a obsah zlikvidován.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Josef Hofmiller

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
oblastní pracoviště Klejnská 894, 280 02 Kolín**

Průběžná evidence nakládání s odpady

za období od: 01.01.2021 do 31.12.2021

List č.

1

Počet listů

13

Původce nebo oprávněná osoba				Samostatná provozovna			
ICO:				ICZ / ICP:			
Obchodní firma/název/jméno a příjmení původce nebo oprávněné osoby:				Název provozovny:			
RISL s.r.o.				Mělník, KSUS Nad Drahou			
Ulice č.p., č.o.:				Ulice č.p., č.o.:			
				Nad Drahou			
Obec:				Obec:			
				Mělník			
PSC:				PSC:			
				2 7 6 0 1			
Kód ORP (SOP):				Kód ORP (SOP):			
				2 1 1 4			
ICZUJ:				ICZUJ:			
				5 3 4 6 7 6			
CZ-NACE:				Osoba odpovědná za evidenci:			
Datum vyhotovení dokladu:				Telefon:			
2 3 0 9 2 1				FAX:			
Razítko a podpis:				Poznámka:			

Název odpadu:		beton					
Upřesnění:						170101	O
Poř.	Datum	Množství + [t]	Množství - [t]	Nakl.	Partnerská firma		
1	18.05.2021	9,540000		A00			
2	18.05.2021		9,540000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
3	07.06.2021	8,920000		A00			
4	07.06.2021	11,190000		A00			
5	07.06.2021	11,040000		A00			
6	07.06.2021	11,970000		A00			
7	07.06.2021	11,570000		A00			
8	07.06.2021		8,920000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
9	07.06.2021		11,190000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
10	07.06.2021		11,040000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
11	07.06.2021		11,970000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
12	07.06.2021		11,570000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
13	17.06.2021	11,530000		A00			
14	17.06.2021	12,190000		A00			
15	17.06.2021	11,860000		A00			
16	17.06.2021	12,600000		A00			
17	17.06.2021	11,580000		A00			
18	17.06.2021	11,060000		A00			
19	17.06.2021		11,530000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		
20	17.06.2021		12,190000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765		

IČO		Číslo provozovny:													
												2	1	1	4
21	17.06.2021			11,860000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
22	17.06.2021			12,600000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
23	17.06.2021			11,580000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
24	17.06.2021			11,060000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
25	22.06.2021	5,080000			A00										
26	22.06.2021	4,860000			A00										
27	22.06.2021	5,780000			A00										
28	22.06.2021	11,090000			A00										
29	22.06.2021	13,120000			A00										
30	22.06.2021	12,440000			A00										
31	22.06.2021	13,310000			A00										
32	22.06.2021			5,080000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
33	22.06.2021			4,860000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
34	22.06.2021			5,780000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
35	22.06.2021			11,090000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
36	22.06.2021			13,120000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
37	22.06.2021			12,440000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
38	22.06.2021			13,310000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
39	23.06.2021	9,580000			A00										
40	23.06.2021	10,740000			A00										
41	23.06.2021	9,880000			A00										
42	23.06.2021			9,580000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
43	23.06.2021			10,740000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
44	23.06.2021			9,880000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
45	24.06.2021	5,180000			A00										
46	24.06.2021	6,380000			A00										
47	24.06.2021			5,180000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
48	24.06.2021			6,380000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
49	25.06.2021	12,110000			A00										
50	25.06.2021			12,110000	AN3	9549049, CZ502455, TAPAS BOREK, s.r.o., Pískovna Borek, Borek, 534684									
51	28.06.2021	13,760000			A00										
52	28.06.2021	13,540000			A00										
53	28.06.2021			13,760000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
54	28.06.2021			13,540000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765									
55	29.06.2021	13,240000			A00										
56	29.06.2021	17,420000			A00										
57	29.06.2021	12,080000			A00										
58	29.06.2021	12,800000			A00										
59	29.06.2021	11,440000			A00										

IČO		Číslo provozovny:									
60	29.06.2021		13,240000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
61	29.06.2021		17,420000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
62	29.06.2021		12,080000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
63	29.06.2021		12,800000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
64	29.06.2021		11,440000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
65	30.06.2021	13,040000		A00							
66	30.06.2021		13,040000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
67	15.07.2021	11,800000		A00							
68	15.07.2021		11,800000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
69	16.07.2021	10,000000		A00							
70	16.07.2021	11,190000		A00							
71	16.07.2021		10,000000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
72	16.07.2021		11,190000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
73	19.07.2021	5,390000		A00							
74	19.07.2021		5,390000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
75	22.07.2021	5,320000		A00							
76	22.07.2021	5,100000		A00							
77	22.07.2021	11,960000		A00							
78	22.07.2021		5,320000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
79	22.07.2021		5,100000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
80	22.07.2021		11,960000	AN3	9549049, CZ502455, TAPAS BOREK, s.r.o., Pískovna Borek, Borek, 534684						
81	28.07.2021	5,900000		A00							
82	28.07.2021	6,030000		A00							
83	28.07.2021		5,900000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
84	28.07.2021		6,030000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
85	29.07.2021	10,420000		A00							
86	29.07.2021	12,090000		A00							
87	29.07.2021		10,420000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
88	29.07.2021		12,090000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
89	30.07.2021	3,480000		A00							
90	30.07.2021	3,700000		A00							
91	30.07.2021	6,460000		A00							
92	30.07.2021		3,480000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
93	30.07.2021		3,700000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
94	30.07.2021		6,460000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
95	23.08.2021	13,420000		A00							
96	23.08.2021	9,550000		A00							
97	23.08.2021	11,610000		A00							
98	23.08.2021	11,610000		A00							

IČO		Číslo provozovny:	
99	23.08.2021	10,080000	A00
100	23.08.2021	10,950000	A00
101	23.08.2021	14,700000	A00
102	23.08.2021	13,780000	A00
103	23.08.2021	13,420000	AN3
104	23.08.2021	9,550000	AN3
105	23.08.2021	11,610000	AN3
106	23.08.2021	11,610000	AN3
107	23.08.2021	10,080000	AN3
108	23.08.2021	10,950000	AN3
109	23.08.2021	14,700000	AN3
110	23.08.2021	13,780000	AN3
111	25.08.2021	10,990000	A00
112	25.08.2021	10,990000	AN3
577,450000		577,450000	


Název odpadu:		Množství + [t]		Množství - [t]		Nakl.		Partnerská firma	
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06								170107	0
Poř.	Datum	Množství + [t]	Množství - [t]	Nakl.					
1	17.05.2021	3,220000		A00					
2	17.05.2021		3,220000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
3	21.05.2021	8,980000		A00					
4	21.05.2021		8,980000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
5	24.05.2021	4,040000		A00					
6	24.05.2021		4,040000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
7	11.06.2021	4,680000		A00					
8	11.06.2021		4,680000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
9	15.06.2021	6,290000		A00					
10	15.06.2021		6,290000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
11	24.06.2021	9,020000		A00					
12	24.06.2021		9,020000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
13	29.06.2021	3,300000		A00					
14	29.06.2021		3,300000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
15	08.07.2021	4,020000		A00					
16	08.07.2021		4,020000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
17	15.07.2021	5,400000		A00					
18	15.07.2021		5,400000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
19	23.07.2021	3,090000		A00					
20	23.07.2021		3,090000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765				
52,040000		52,040000							


IČO		Číslo provozovny:									
2	03.05.2021		7,20000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
3	10.05.2021	11,82000		A00							
4	10.05.2021	10,60000		A00							
5	10.05.2021		11,82000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
6	10.05.2021		10,60000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
7	11.05.2021	11,14000		A00							
8	11.05.2021	13,02000		A00							
9	11.05.2021		11,14000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
10	11.05.2021		13,02000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
11	12.05.2021	11,64000		A00							
12	12.05.2021		11,64000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
13	13.05.2021	10,48000		A00							
14	13.05.2021	10,78000		A00							
15	13.05.2021	12,52000		A00							
16	13.05.2021	13,84000		A00							
17	13.05.2021	10,86000		A00							
18	13.05.2021	9,54000		A00							
19	13.05.2021	13,76000		A00							
20	13.05.2021		10,48000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
21	13.05.2021		10,78000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
22	13.05.2021		12,52000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
23	13.05.2021		13,84000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
24	13.05.2021		10,86000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
25	13.05.2021		9,54000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
26	13.05.2021		13,76000	AN3	9452011, CZS02072, KAMENOLOMY ČR s.r.o., Pískovna Tišice, Tišice, 535222						
27	17.05.2021	12,02000		A00							
28	17.05.2021	10,38000		A00							
29	17.05.2021	5,28000		A00							
30	17.05.2021	9,96000		A00							
31	17.05.2021	9,36000		A00							
32	17.05.2021	8,60000		A00							
33	17.05.2021	13,58000		A00							
34	17.05.2021	10,76000		A00							
35	17.05.2021	12,86000		A00							
36	17.05.2021	9,90000		A00							
37	17.05.2021	13,44000		A00							
38	17.05.2021	9,02000		A00							
39	17.05.2021	7,16000		A00							
40	17.05.2021	12,16000		A00							

IČO		Číslo provozovny:									
158	29.07.2021		9,860000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
159	30.07.2021	12,060000		A00							
160	30.07.2021		12,060000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
161	09.08.2021	13,100000		A00							
162	09.08.2021	16,140000		A00							
163	09.08.2021	13,180000		A00							
164	09.08.2021	12,800000		A00							
165	09.08.2021		13,100000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
166	09.08.2021		16,140000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
167	09.08.2021		13,180000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
168	09.08.2021		12,800000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
169	10.08.2021	14,860000		A00							
170	10.08.2021	17,080000		A00							
171	10.08.2021	14,410000		A00							
172	10.08.2021	14,320000		A00							
173	10.08.2021		14,860000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
174	10.08.2021		17,080000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
175	10.08.2021		14,410000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
176	10.08.2021		14,320000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
177	17.08.2021	15,320000		A00							
178	17.08.2021	13,980000		A00							
179	17.08.2021		15,320000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
180	17.08.2021		13,980000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
181	18.08.2021	10,480000		A00							
182	18.08.2021		10,480000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
183	19.08.2021	7,600000		A00							
184	19.08.2021	9,620000		A00							
185	19.08.2021		7,600000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
186	19.08.2021		9,620000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
187	23.08.2021	11,500000		A00							
188	23.08.2021	10,680000		A00							
189	23.08.2021	9,300000		A00							
190	23.08.2021	12,900000		A00							
191	23.08.2021		11,500000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
192	23.08.2021		10,680000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
193	23.08.2021		9,300000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
194	23.08.2021		12,900000	AN3	8395581, CZ500946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765						
195	24.08.2021	14,750000		A00							
196	24.08.2021	11,260000		A00							

IČO		Číslo provozovny:													
197	24.08.2021	13,60000										2	1	1	4
198	24.08.2021	13,71000													
199	24.08.2021	13,98000													
200	24.08.2021	12,61000													
201	24.08.2021	9,20000													
202	24.08.2021	13,94000													
203	24.08.2021	11,16000													
204	24.08.2021	13,89000													
205	24.08.2021	14,00000													
206	24.08.2021	14,68000													
207	24.08.2021	14,51000													
208	24.08.2021		14,75000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
209	24.08.2021		11,26000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
210	24.08.2021		13,60000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
211	24.08.2021		13,71000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
212	24.08.2021		13,98000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
213	24.08.2021		12,61000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
214	24.08.2021		9,20000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
215	24.08.2021		13,94000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
216	24.08.2021		11,16000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
217	24.08.2021		13,89000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
218	24.08.2021		14,00000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
219	24.08.2021		14,68000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
220	24.08.2021		14,51000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
221	25.08.2021	14,46000		A00											
222	25.08.2021	15,20000		A00											
223	25.08.2021	13,20000		A00											
224	25.08.2021	13,32000		A00											
225	25.08.2021	12,42000		A00											
226	25.08.2021		14,46000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
227	25.08.2021		15,20000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
228	25.08.2021		13,20000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
229	25.08.2021		13,32000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
230	25.08.2021		12,42000	AN3	8395581, CZS00946, KVD Plus s.r.o., k.ú. Dolní Beřkovice, Dolní Beřkovice, 534765										
		1613,46000	1613,46000												

Název odpadu:	Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03				
Upřesnění:				170904	0
Poř.	Datum	Množství + [t]	Množství - [t]	Nakl.	Partnerská firma
1	12.05.2021	1,00000		A00	

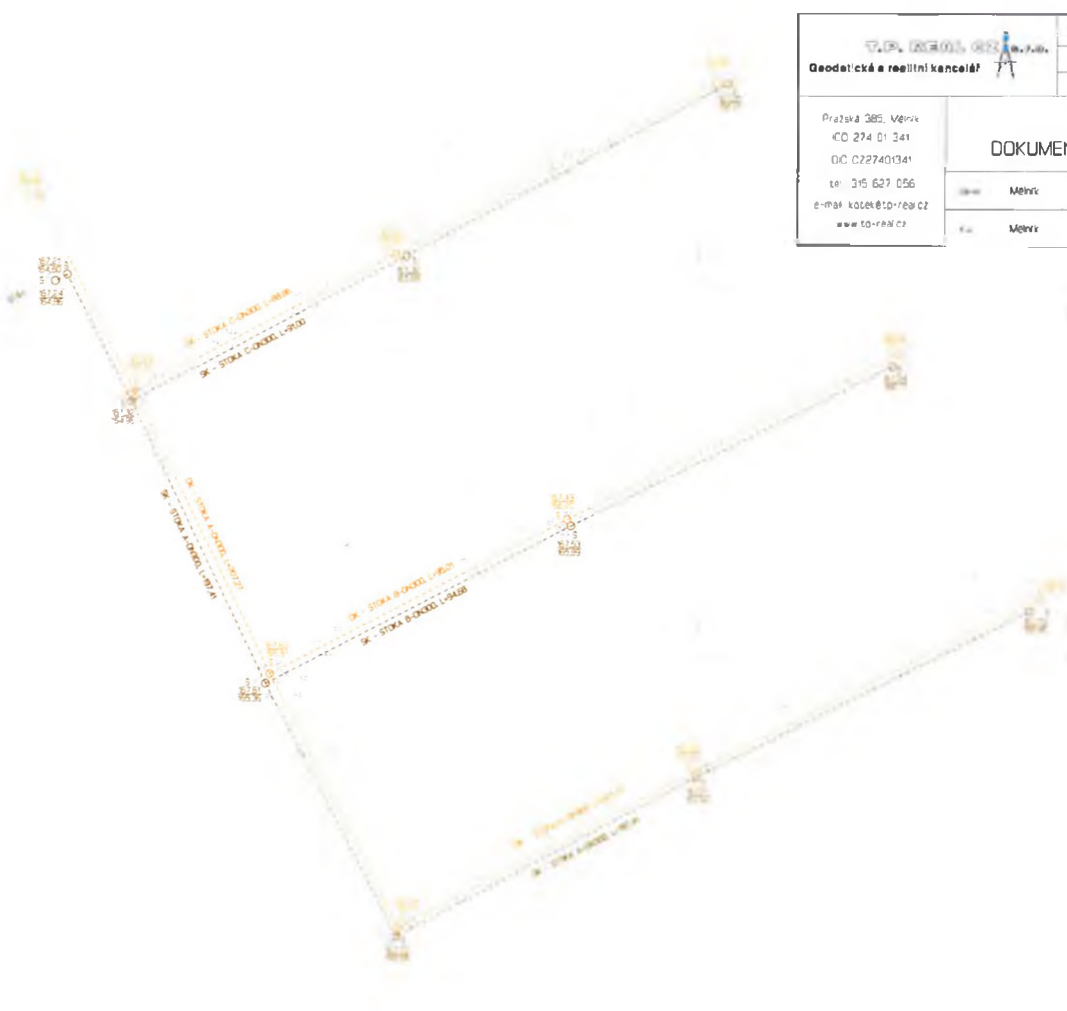


 Geodetická a realitní kancelář	Objednatel: SNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 352/1, 276 01 Mělník																
	Investor: Krajata SUS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5																
	Adr: Učňovská práce erabilové kancelářská, přes SÚS Mělník, Dobruč.č. 5744/4, k.ú.Mělník																
	Č. zn. 4462/2021																
GEODETIKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY																	
Průkazná 385, Mělník IČO 274 01 341 DIČ CZ227401341 tel: 315 627 056 e-mail: kotek@td-real.cz www.td-real.cz	<table border="1"> <tr> <td>Stav:</td> <td>Mělník</td> <td>Stav: Společnost:</td> <td>S-JTSK</td> <td>Kontaktní osoba:</td> <td>Tomáš Kotek</td> <td>Číslo listu:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Kau:</td> <td>Mělník</td> <td>Autentizace:</td> <td>Boj</td> <td>Dat:</td> <td>09/2021</td> <td>Měřítko:</td> <td>1:500</td> </tr> </table>	Stav:	Mělník	Stav: Společnost:	S-JTSK	Kontaktní osoba:	Tomáš Kotek	Číslo listu:	1	Kau:	Mělník	Autentizace:	Boj	Dat:	09/2021	Měřítko:	1:500
Stav:	Mělník	Stav: Společnost:	S-JTSK	Kontaktní osoba:	Tomáš Kotek	Číslo listu:	1										
Kau:	Mělník	Autentizace:	Boj	Dat:	09/2021	Měřítko:	1:500										

Návrh časů a přesností odpovídá
 platným předpisům a podmínkám
 platným dle daných podmínek a objednatelům

Platba a evidence kalkulací
 včetně změněných úhrad,
 c. 30/2021 ze dne 17.9.2021



Právník: 365, Mělník ČD: 274 01 341 DIČ: CZ27401341 IČ: 265 627 036 E-mail: lozcek@tp-real.cz www.tp-real.cz		GEODETICKÁ ČÁST DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PŘEVODNÍ STAVBY			
Obor:	Mělník	Stav. územní:	S-JTSK	Výkres: Tomáš Kotek	Číslo: 1
Číslo:	Mělník	Výkresový systém:	Bpv	Obor: 05/2021	Měřítko: 1:300

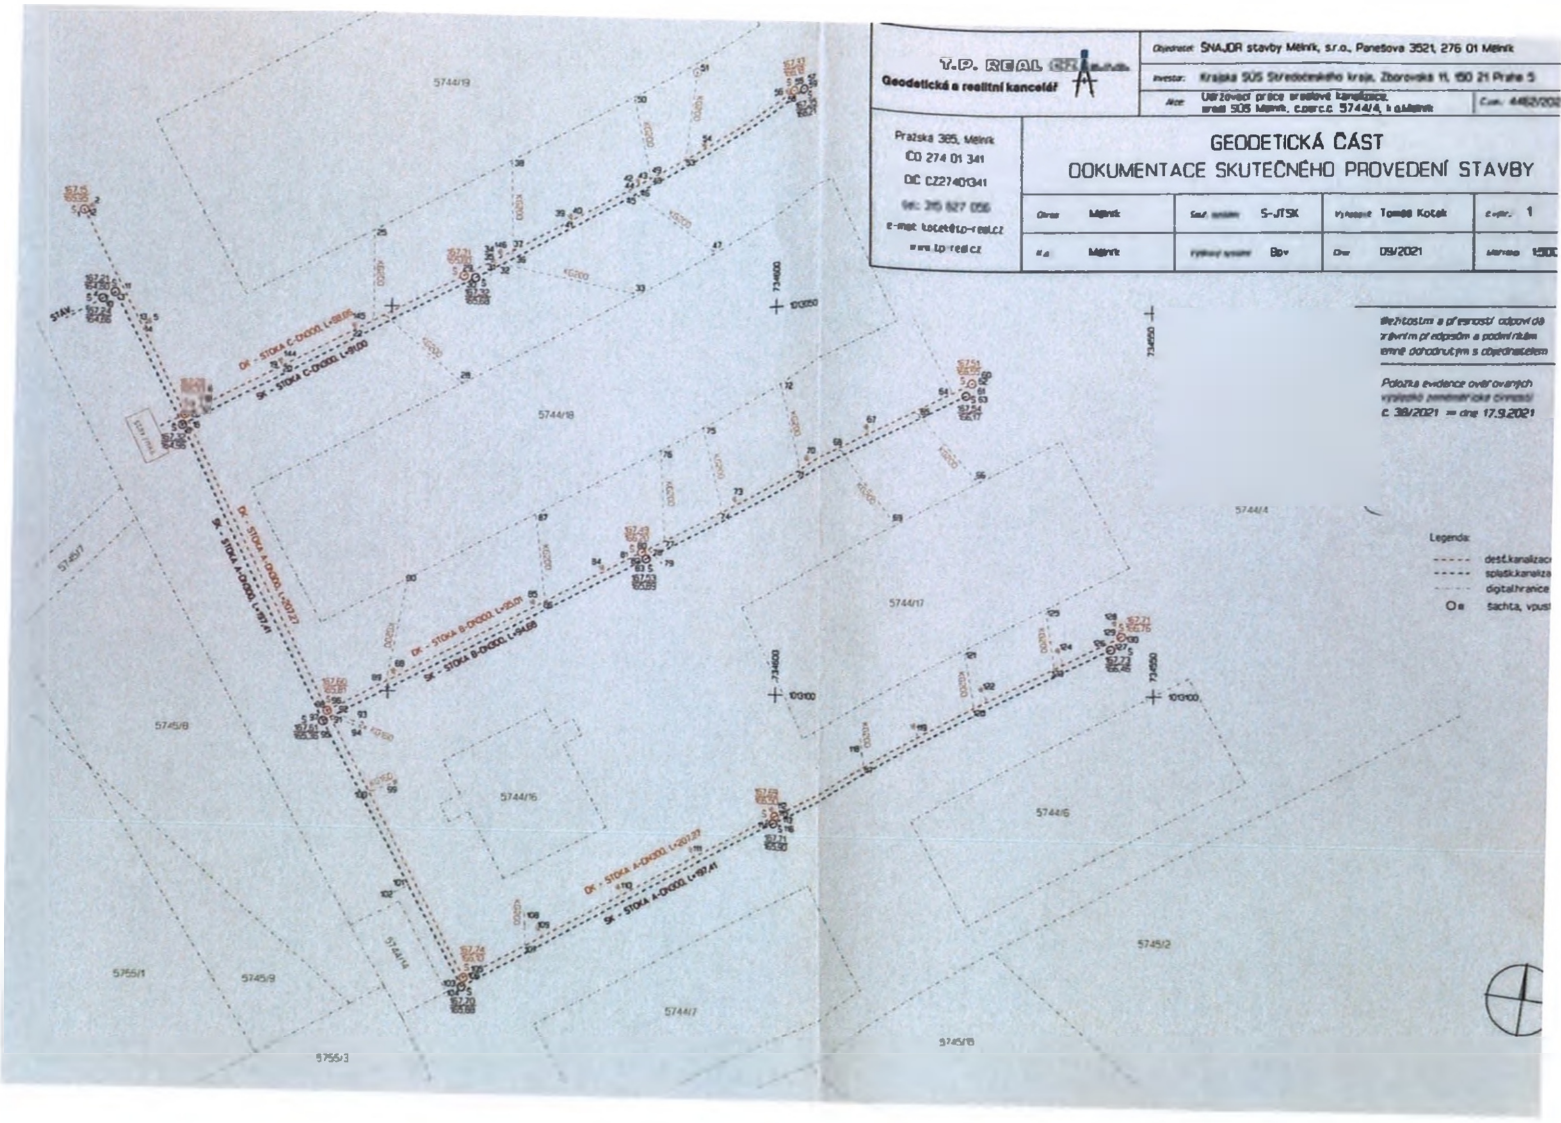

Přesnost a přesnost odpovídá
 příslušným předpisům a požadavkům
 vnitřní dokumentace s účinností
 c. 30/2021 = dne 17.9.2021

- Legenda:
- dešťkanalizace
 - spádkanalizace
 - digitální hranice
 - sacht, vpus



1469,4 m²



T.P. REAL GZ
Geodetická a realitní kancelář

Pražská 365, Mělník
ČD 274 01 341
IČ: CZ2740341
tel: 315 627 056
e-mail: kotek@tp-real.cz
www.tp-real.cz

Objednatel:	SNAJDR stavby Mělník, s.r.o., Panešova 352/1, 276 01 Mělník
Investor:	Krajská SÚS Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ariz:	Údržbové práce areálové kanalizace, areál SÚS Mělník, c.parc.č. 5744/4, k.o.Mělník
Č.jak:	4452/2021

GEODETICKÁ ČÁST

Objekt:	Mělník	Souř. systém:	S-JTSK	Výkresoval:	Tomáš Kotek	Č. výk.	
Ka:	Mělník	Výkresový systém:	Bpv	Dne:	09/2021	Měřítko:	1:500

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům a podmínkám
písemně dohodnutým s objednatелеm

Poloha evidence ověřovaných
výsledků zeměměřické činnosti
č. 38/2021 ze dne 17.9.2021



Fotodokumentace k ZBV 1

Dílčí změna 1: Bourání betonových bloků ve výkopu



Dílčí změna 2: Přepojení stávajících svodů na nově budovanou kanalizaci



Dílčí změna 3: Nová revizní šachta na stoce splaškové kanalizace



Dílčí změna 4: Přeložka areálového vodovodu v kolizi s budovanou stokou



Dílčí změna 5: Změna tloušťky odstraněných zpevněných povrchů



Dílčí změna 6: Změna tloušťky konstrukce vyspravení obrusné vrstvy zpevněných povrchů



podkladní vrstva



obrusná vrstva

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 8650

Datum vzniku a zápisu:	6. dubna 1992
Spisová značka:	C 8650 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	RISL s.r.o.
Sídlo:	Hostivice, U vodárny 461, okres Praha-západ, PSČ 25301
Identifikační číslo:	453 10 653
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě realitní kancelář provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona) podnikání v oblasti nakládání s odpady (v režimu živnosti volné) montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení ubytovací služby
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. RUDOLF COUFAL, dat. nar. 28. prosince 1954 Husovo náměstí 1717, 253 01 Hostivice Den vzniku funkce: 6. dubna 1992
jednatel:	IVAN HUSNÍK, dat. nar. 4. února 1961 Husovo náměstí 1715, 253 01 Hostivice
Způsob jednání:	Společnost navenek zastupují jednatelé, každý samostatně. Podepi- sování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z jednatelů.
Prokura:	DANIEL ROZTOČIL, dat. nar. 19. září 1966 Máchova 765, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun
Společníci:	
Společník:	Ing. RUDOLF COUFAL, dat. nar. 28. prosince 1954 Husovo náměstí 1717, 253 01 Hostivice
Podíl:	Vklad: 36 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 30% Druh podílu: základní
Společník:	IVAN HUSNÍK, dat. nar. 4. února 1961 Husovo náměstí 1715, 253 01 Hostivice
Podíl:	Vklad: 60 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50% Druh podílu: základní
Společník:	JAN COUFAL, dat. nar. 28. prosince 1982

Husovo náměstí 1717, 253 01 Hostivice

Podíl:	Vklad: 24 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20%
Základní kapitál:	120 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Datum uzavření společenské smlouvy: 1.3.1992. Na základě projektu došlo k rozdělení společnosti RISL s.r.o. odštěpením se založením dvou nových společností s ručením omezeným Grey s.r.o. a Zámecký dvůr s.r.o. Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
