

DODATEK č. 1ke **SMLOUVĚ O DÍLO č.6440-0001-2016-041** ze dne **26.8.2016**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na plnění veřejné nadlimitní zakázky na zhotovení díla - „**Stadion Juliska, Praha – oprava tribuny**“
(dále jen „*Smlouva*“)**1. Smluvní strany****Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 1462/2016-7542KM ze dne 29.září 2016 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůn, ředitel OPNI AHNM, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Vladimír Švejda, vedoucí PS 0014 [REDACTED]
Stanislav Toman, technik PS 0014 [REDACTED]
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, technik BOZP, tel. [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor nemovité infrastruktury
Hradební 772/12, PO BOX 45, 110 05 Praha 1dále také jen „*Objednatel*“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS ČECHY a
Ing. Michal Weinreb, ředitel oblasti 2 závodu PS ČECHY závodu PS ČECHY

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS ČECHY, tel: [REDACTED]

Ing. Michal Weinreb, ředitel oblasti 2 závodu PS ČECHY, tel: [REDACTED]

- ve věcech technických:

- Ing. Ondřej Krejčí, ředitel závodu PS ČECHY, tel: [REDACTED]
[REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: amx5p38

Adresa pro doručování: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

dále také jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a Zhotovitel jsou společně pro potřeby této smlouvy označováni jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“.

Strany se dohodly na dodatku č.1, kterým se upravuje či doplňuje předmětná Smlouva (dále jen „Dodatek“) následovně:

2. Změny Smlouvy

2.1. Změna díla

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla. Rozsah předmětu díla nadále vychází z článku 2.1. Smlouvy a příloh Smlouvy s tím, že uvedená změna vyplývá ze změnových listů č.1-5, jež jsou přílohou č.1 tohoto Dodatku.

Strany souhlasně prohlašují, že všechny shora uvedené změnové listy byly Stranami odsouhlaseny a podepsány.

2.2 Změna termínů

Článek 4.3. Smlouvy se nahrazuje novým článkem 4.3. v následujícím znění:

„Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději 1.6.2017.“

2.3 Změna ceny díla

Smluvní strany se s ohledem na změnu rozsahu díla podle č. 2.1 výše a všechny potvrzené změnové listy č. 1-5 dohodly, že cena díla stanovená v čl. 3.1. Smlouvy se odpovídajícím způsobem (podle čl. 3.6. Smlouvy) mění a výsledná cena díla tak činí **19.528.784,66 Kč bez DPH**.

Vzhledem k tomu se čl. 3.1 Smlouvy nahrazuje novým článkem 3.1 v následujícím znění:

*„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši: **19.528.784,66 Kč bez DPH***

(slovy: devatenáct milionů pět set dvacet osm tisíc sedm set osmdesát čtyři korun českých, šedesát šest haléřů).“

A článek 3.2 se nahrazuje novým článkem 3.2 v následujícím znění:

„K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 4.101.044,78 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 23.629.829,44 Kč.“

3. Přílohy Dodatku, které se stávají přílohami Smlouvy


Příloha č. 1 – Odsouhlasené změnové listy č.1-5

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 4.3. Tento Dodatek nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi Smluvními stranami, související s předmětem Dodatku a představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.


V Praze dne 22. 12. 2016

Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany



V Praze dne 19. 12. 2016

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.



Ing. Ondřej Krejčí
ředitel závodu PS ČECHY



SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ**Stavba:** Stadion Juliska, Praha - oprava tribuny**Dodatek č.1 - příloha č.1**


| Číslo ZL | Popis změny | Datum | Celkem |
|-------------------------|---|------------|--------------------|
| 001 | Záměna konstrukce lešení v přední části tribuny | 30.9.2016 | bez dopadu na cenu |
| 002 | Záměna skladby tepelné izolace na střeše atletického tunelu | 24.11.2016 | bez dopadu na cenu |
| 003 | Pozastavení prací v místě tribuny k sezení (25.10.2016 - 18.11.2016) | 24.11.2016 | 341 793 Kč |
| 004 | Nová elektroinstalace pro stávající svítidla osvětlení venkovního schodiště tribuny | 24.11.2016 | 18 750 Kč |
| 005 | Odvoz demontovaných plechů a ocelových konstrukcí mimo stavbu | 2.12.2016 | 228 400 Kč |
| CELKEM (bez DPH) | | | 588 943 Kč |

Cena dle SoD ze dne 26.8.2016 (bez DPH)

18 939 841,66 Kč

Cena dle Dodatku č.1 (bez DPH)

19 528 784,66 Kč



| | | | |
|--|------|--|-----------|
| Stavba: Stadion Juliska - oprava tribuny | | Ze dne: 26.8.2016 | |
| Smlouva č.: S17-163-0001 | | Ze dne: 26.8.2016 | |
| Registrační číslo Změnového listu (ZL) | ZL 1 | Datum vydání ZL | 30.9.2016 |
| Index návrhatele změny: Obj. Objednatel Z Zhotovitel GP Generální projektant O Ostatní | | Datum vydání revize ZL | |
| Objednatel: Česka republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany | | Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká budějovice | |
| Název změny: Záměna konstrukce lešení v přední části tribuny | | | |
| Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo | | | |
| Předmět změny: | | | |
| Položka popis: | | Důvod změny | |
| Zhotovitel navrhl záměnu konstrukce lešení v přední části tribuny ze zavěšených lávek na prostorové lešení. | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle příložené cenové nabídky): | |
| Přílohy: - cenová nabídka | | 0 Kč bez DPH | |
| Výváá změnu stavebního povolení před dokončením stavby: | | | NE |
| Dopady do harmonogramu zhotovitele: | | | NE |
| Poznámky: | | | |
| Podpis zástupce Zhotovitele SWIETELSKY stavební s.r.o. SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME IČ: 480 35 599 Datum a podpis: 30.9.2016 | | Podpis zástupce Objednatel: SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis: Stanislav TOMAN | |
| Podpis zástupce TDI SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Datum a podpis: | | | |
| Rozdělovník: 1. Objednatel 2. TDI 3. GP(AD) 4. Zhotovitel | | Důvod zamítnutí (vyplní objednatel): | |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné

ROZPOČET

Stavba: Stadion Juliska - oprava tribuny

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 30.9.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Smluvní řešení - řešení | | | Nové řešení - řešení | | |
|---------------|----------|-----|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| D | | | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 332 078,00 | | | 5 332 078,00 |
| D | 9 | | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 5 332 078,00 | | | 5 332 078,00 |
| 4 | K | 003 | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m | m ² | 552,000 | 46,00 | 25 392,00 | 552,000 | 46,00 | 25 392,00 |
| 5 | K | 003 | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m ² | 49 680,000 | 1,10 | 54 648,00 | 49 680,000 | 1,10 | 54 648,00 |
| 6 | K | 003 | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m | m ² | 552,000 | 36,00 | 19 872,00 | 552,000 | 36,00 | 19 872,00 |
| 7 | K | 003 | 943211112 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m | m ³ | 16 092,000 | 40,00 | 643 680,00 | 16 092,000 | 40,00 | 643 680,00 |
| 8 | K | 003 | 94321212 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití | m ³ | 321 840,000 | 1,00 | 321 840,00 | 1 458 000,000 | 1,00 | 1 458 000,00 |
| 9 | K | 003 | 94321812 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 25 m | m ³ | 16 092,000 | 32,00 | 514 944,00 | 16 092,000 | 32,00 | 514 944,00 |
| 10 | K | 003 | 944411111 | Montáž záchytné sítě třídy A | m ² | 5 730,000 | 48,24 | 276 415,20 | 0,000 | 48,24 | 0,00 |
| 11 | K | 003 | 944411211 | Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití | m ² | 5 15 700,000 | 0,64 | 330 048,00 | 0,000 | 0,64 | 0,00 |
| 12 | K | 003 | 944411811 | Demontáž záchytné sítě typu A | m ² | 5 750,000 | 32,16 | 184 920,00 | 0,000 | 32,16 | 0,00 |
| 13 | K | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m ² | 5 750,000 | 6,00 | 34 500,00 | 1 517 682 | 6,00 | 9 106,09 |
| 14 | K | 003 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m ² | 5 17 500,000 | 0,20 | 103 500,00 | 182 121,876 | 0,20 | 36 424,38 |
| 15 | K | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m ² | 5 750,000 | 4,00 | 23 000,00 | 1 517 682 | 4,00 | 6 070,73 |
| 16 | K | 003 | 944711112 | Montáž záchytné síťky š do 2 m | m | 150,000 | 72,00 | 10 800,00 | 0,000 | 72,00 | 0,00 |
| 17 | K | 003 | 944711212 | Příplatek k záchytné síťce š do 2 m za první a ZKD den použití | m | 13 500,000 | 2,20 | 29 700,00 | 0,000 | 2,20 | 0,00 |
| 18 | K | 003 | 944711812 | Demontáž záchytné síťky š do 2 m | m | 150,000 | 52,00 | 7 800,00 | 0,000 | 52,00 | 0,00 |
| 19 | K | 003 | 946113123 | Montáž věží trubkových/dilcových o ploše přes 5 m ² v do 12,6 m | kus | 12,000 | 4 288,80 | 51 465,60 | 2,000 | 4 288,80 | 8 577,60 |
| 20 | K | 003 | 946113223 | Příplatek k věžím o ploše přes 5 m ² v do 12,6 m za první a ZKD den použití | kus | 360,000 | 864,00 | 311 040,00 | 240,000 | 864,00 | 207 360,00 |
| 21 | K | 003 | 946113823 | Demontáž věží trubkových/dilcových o ploše přes 5 m ² v do 12,6 m | kus | 12,000 | 3 713,60 | 44 563,20 | 2,000 | 3 713,60 | 7 427,20 |
| 22 | K | 003 | 946311132 | Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² | m ² | 5 750,000 | 143,00 | 822 250,00 | 0,000 | 143,00 | 0,00 |
| 23 | K | 003 | 94631232 | Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému 200 kg/m ² za první a ZKD den použití | m ² | 5 17 500,000 | 1,70 | 879 750,00 | 0,000 | 1,70 | 0,00 |
| 24 | K | 003 | 946311832 | Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení tř. 3 do 200 kg/m ² | m ² | 5 750,000 | 101,00 | 580 750,00 | 0,000 | 101,00 | 0,00 |
| 25 | K | 003 | 949221112 | Montáž lešetové podlahy s příčníky pro dilcová lešení v do 25 m | m ² | 900,000 | 31,00 | 27 900,00 | 0,000 | 31,00 | 0,00 |
| 26 | K | 003 | 949221211 | Příplatek k lešetové podlaže pro dilcová lešení za první a ZKD den použití | m ² | 18 000,000 | 0,80 | 14 400,00 | 0,000 | 0,80 | 0,00 |
| 27 | K | 003 | 949221812 | Demontáž lešetové podlahy s příčníky pro dilcová lešení v do 25 m | m ² | 900,000 | 21,00 | 18 900,00 | 0,000 | 21,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | | | 5 332 078,00 | | | 5 332 078,00 |

Dopad do smluvní ceny

0,00

| | | | |
|--|---|---|------------|
| Stavba: | | Stadion Juliska - oprava tribuny | |
| Smlouva č.: | S17-163-0001 | Ze dne: | 26.8.2016 |
| Registrační číslo Změnového listu (ZL): | ZL 2 | Datum vydání ZL: | 31.10.2016 |
| Index navrhovatele změny: Obj Objednatel Z Zhotovitel GP Generální projektant O Ostatní | Z | Datum vydání revize ZL: | |
| Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany | Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká budějovice | | |
| Název změny: Záměna skladby tepelné izolace na střeše atletického tunelu | | | |
| Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo | | | |
| Předmět změny: | | | |
| <i>Položka, popis:</i> | | <i>Důvod změny:</i> | |
| Zhotovitel navrhl novou skladbu tepelné izolace nad atletickým tunelem z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek pro původní řešení s použitím PUR pěny. Skladba souvrství je navíc doplněna o vrstvu parotěsné izolace. | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky): | |
| Přílohy: - cenová nabídka - skladba tepelné izolace nad atletickým tunelem | | 0 Kč | bez DPH |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby: | | | NE |
| Dopady do harmonogramu zhotovitele: | | | NE |
| <i>Poznámky:</i> | | | |
| <i>Podpis zástupce Zhotovitele</i> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 24. 11. 2016 | | <i>Podpis zástupce Objednatele</i> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 24. 11. 2016 | |
| <i>Podpis zástupce TDI</i> SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | | | |
| <i>Datum a podpis</i> | | <i>Datum a podpis</i> | |
| <i>Rozdělovník:</i> 1. Objednatel 2. TDI 3. GP(AD) 4. Zhotovitel | | <i>Důvod zamítnutí (vyplní objednatel):</i> | |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze,

ROZPOČET

Stavba: S17-163-0001

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zhotovitel:


Datum: 10.10.2016

Smluvní řešení**Nové řešení**

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----------|------------|--------------|--|-----|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| | D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 1 975 785,96 | | | 1 975 785,96 |
| | D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 1 975 785,96 | | | 1 975 785,96 |
| 39 | K | 712 | 712300831-1 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě | m2 | 1 398,740 | 85,00 | 118 892,90 | 1 398,740 | 85,00 | 118 892,90 |
| 40 | K | 712 | 712411118-1 | Provedení povlakové krytiny střech za studena nástřikem PU pěnou tl 140 mm | m2 | 1 398,740 | 1 324,92 | 1 853 218,40 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 713291122-1 | Montáž parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 93,03 | 130 124,78 |
| | | | 6285212300-1 | asfaltový modifikovaný pás Rooftek AL mineral | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 186,73 | 261 185,32 |
| | | | 713141135-1 | Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva desek | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 76,62 | 107 171,46 |
| | | | 2837588000-1 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 155,05 | 216 869,88 |
| | | | 713141135-1 | Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva desek | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 76,62 | 107 171,46 |
| | | | 2837588000-2 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 1000 x 80 mm | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 122,05 | 170 711,68 |
| | | | 713291122-2 | Montáž izolace střech plochých vrchem asfaltovým pásem | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 93,03 | 130 124,78 |
| | | | 6285212300-2 | asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 mineral | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1 398,740 | 185,40 | 259 319,43 |
| | | | 795421002-1 | Izolace tepelná svislá lepená bodově z desek EPS 100 S 1000 x 1000 x 50 mm | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 150,000 | 537,00 | 80 550,00 |
| | | | 000000001 | D+M Opracování prostupů | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 700,000 | 258,00 | 180 600,00 |
| | | | 000000002 | D+M Vyplnění mezer u prostupů montážní pěnou | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 48 | K | 712 | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 2,263 | 967,00 | 2 188,32 | 25,289 | 967,00 | 24 454,46 |
| 49 | K | 712 | 998712181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace | t | 2,263 | 406,20 | 919,23 | 25,289 | 406,20 | 10 272,39 |
| 50 | K | 712 | 998712194 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m | t | 2,263 | 250,60 | 567,11 | 25,289 | 250,60 | 6 337,42 |
| | D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| | | | 000000003 | Příplatek za úpravu prvků K2 a K3 z důvodu navýšení tloušťky izolační vrstvy | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| | | | | Celkem | | | | 1 975 785,96 | | | 1 975 785,96 |

NOVÝ STAV

- ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 MIN.
- PODKLADNÍ LEMENKA A 330 H *
- EPS 100, 180 MM
- PAROTNÍ, ROOFTEK AL SPECIAL
- TRAPÉZOVÝ PLECH

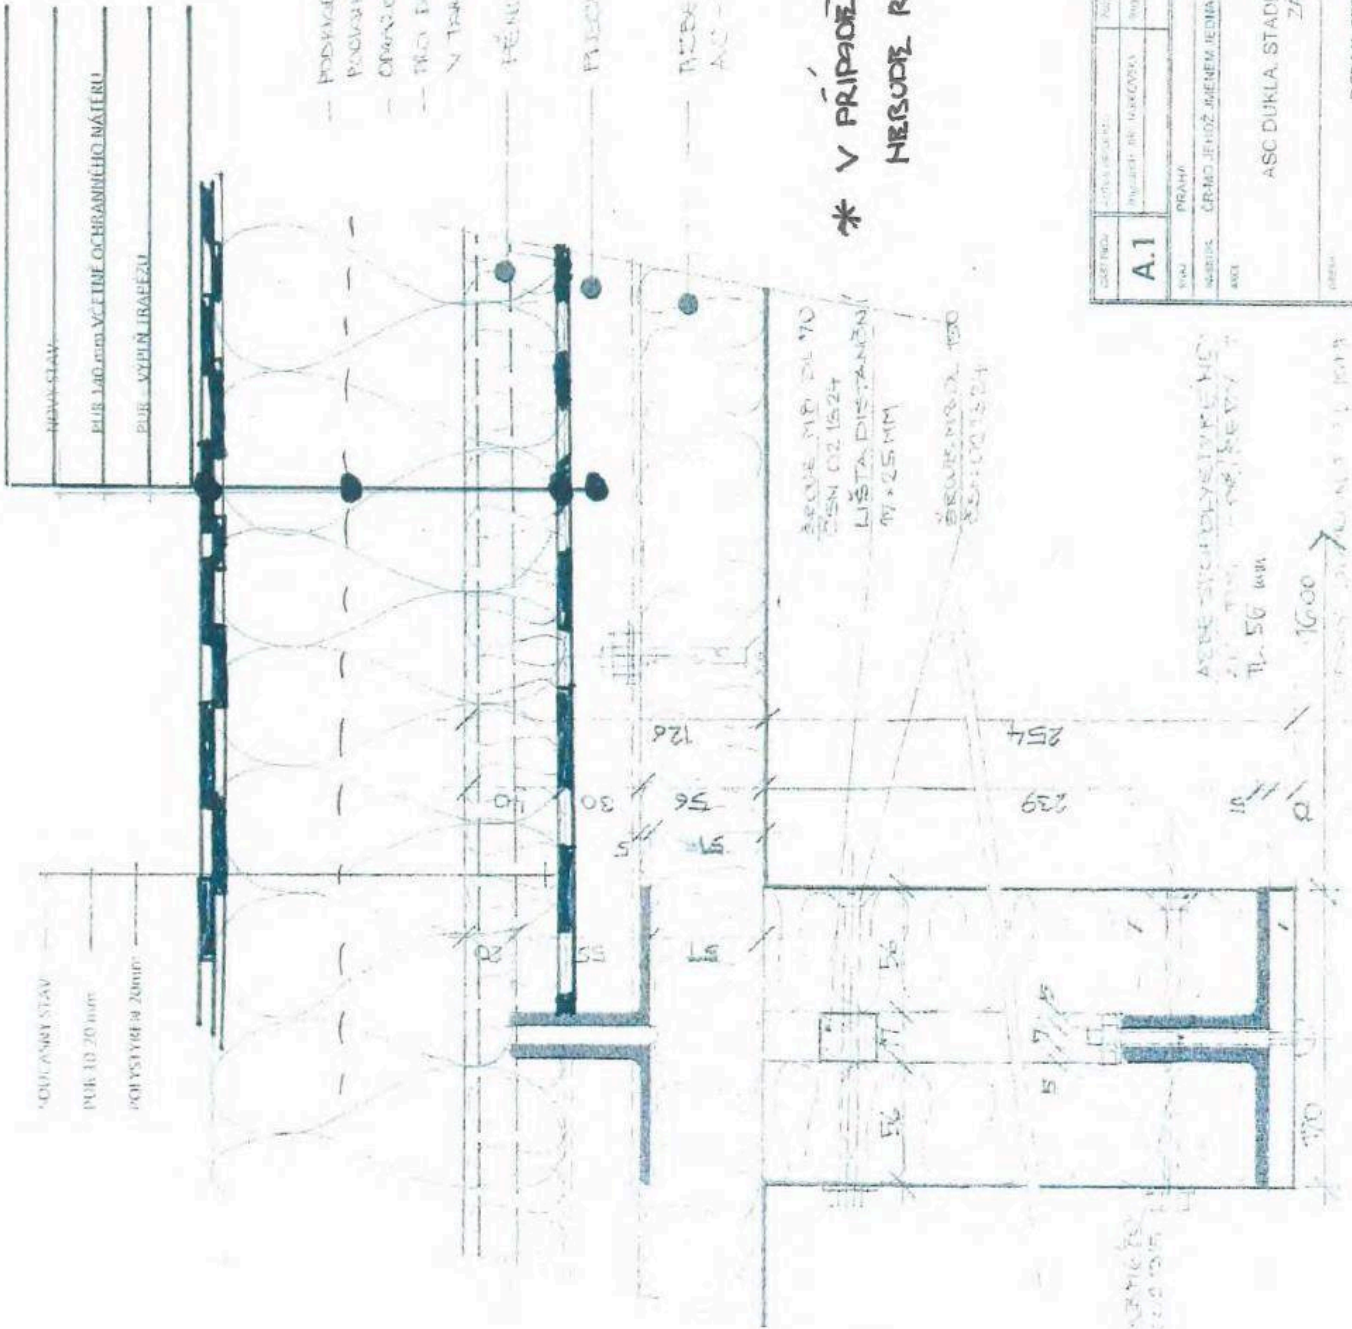


- PODKLADNÍ LEMENKA 330 MM (KONKRETNÍ TYP LEMENKY PODKLADNÍ)
- OPROSTOVÉ BĚŽKY A ŠROUBOVÁNÍ NA BĚŽKY
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)
- TRAPÉZOVÝ PLECH (KONKRETNÍ TYP PLECHU NAŘAZOVANÍ)

* V PŘÍPADĚ ZÁNĚHY TECHNOLOGIE NAŘAZOVANÍ NESUDE REALIZOVÁN

| ČÍSLO | NÁZEV | PROJEKTANT | PROJEKČNÍ ÚSTAV | PROJEKČNÍ ČÍSLO | PROJEKČNÍ MÍSTO | PROJEKČNÍ DATUM | PROJEKČNÍ STAV |
|--|--------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| A.1 | ROOFTEK AL SPECIAL | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ASC DUKLA, STADION JULISKA - OPRAVA STŘECHY ZAPADNÍ TRIBUNY | | | | | | | |
| DETAIL STROPU - ATLETICKÝ TUNEL | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

ROOFTEK AL SPECIAL

| | | | |
|---|------|---|--------------------------|
| Stavba: | | Stacion Juliska - oprava tribuny | |
| Smlouva č.: | | S17-163-0001 | Ze dne: 26.8.2016 |
| Registrační číslo Změnového listu (ZL) | ZL 3 | Datum vydání ZL : | 13.10.2016 |
| Index navrhovatele změny : | | Obj | Datum vydání revize ZL : |
| Obj Objednatel | Obj | | 22.11.2016 |
| Z Zhotovitel | | | |
| GP Generální projektant | | | |
| O Ostatní | | | |
| Objednatel: | | Zhotovitel: | |
| Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany | | SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká budějovice | |
| Název změny: Pozastavení prací v místě tribuny k sezení (25.10.2016-18.11.2016) | | | |
| Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo | | | |
| Předmět změny: | | | |
| Položka, popis: | | Důvod změny: | |
| Objednatel požaduje pozastavení prací spojených s mtž prostorového lešení v přední části tribuny k sezení z provozních důvodů. Objednatel umožňuje zhotoviteli využít pro instalaci lešení prostor do 2/3 sektoru k sezení písmene U. Pokračování prací na přední části tribuny bude možné od 18.11.2016. | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky): | |
| Přílohy: - cenová nabídka - protokol o pozastavení prací na prostorovém lešení | | 341 793 Kč bez DPH | |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby: | | NE | |
| Dopady do harmonogramu zhotovitele: | | ANO, prodloužení výstavby o 10 dni | |
| Poznámky: Nový termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla (čl.4.3. SoD): 1.06.2017 | | | |
| Podpis zástupce Zhotovitele | | Podpis zástupce Objednatele | |
|  SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 3-370 04 Čes 24. 11. 2016 | | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME 24. 11. 2016 | |
| Datum a podpis | | Datum a podpis | |
| Podpis zástupce TDI | | | |
| SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | | | |
| Datum a podpis | | | |
| Rozdělovník: | | Důvod zamítnutí (vyplní objednatel): | |
| 1. Objednatel | | | |
| 2. TDI | | | |
| 3. GP(AD) | | | |
| 4. Zhotovitel | | | |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze,

Cenový dopad při pozastavení prací v místě tribuny k sezení pro období 25.10.2016 - 18.11.2016

Stavba: Stadion Juliska - oprava tribuny

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 13.10.2016

| P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití (období 25.10.-18.11.2016, 1 takt, 25 dní) | m3 | 186 475,000 | 1,00 | 186 475,00 |
| 2 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití (období 10.11.-18.11.2016, 2 takty, 9 dní) | m3 | 93 978,000 | 1,00 | 93 978,00 |
| 3 | Příplatek k věžím o ploše přes 5 m2 v do 12,6 m za první a ZKD den použití | kus | 10,000 | 864,00 | 8 640,00 |
| 4 | Zařízení staveniště a mobilní oplocení (úctováno 50% nákladů) | den | 5,000 | 1 890,00 | 9 450,00 |
| 5 | Režijní náklady kompletační činnosti (úctováno 50% nákladů) | den | 5,000 | 3 650,00 | 18 250,00 |
| 6 | Přesun strojů a pracovních mechanismů ze stavby a zpět | kpl | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |

Celkem

341 793,00

Pozn.: Výše uvedené vyčíslení nákladů předpokládá pozastavení prací pouze v místě tribuny k sezení.

| | | | |
|---|------|---|--------------------------|
| Stavba: | | Stadion Juliska - oprava tribuny | |
| Smlouva č.: | | S17-163-0001 | Ze dne: 26.8.2016 |
| Registrační číslo Změnového listu (ZL): | ZL 4 | Datum vydání ZL : | 31.10.2016 |
| Index navrhovatele změny: | | | |
| Obj: Objednatel | Obj | Datum vydání revize ZL : | |
| Z: Zhotovitel | | | |
| GP: Generální projektant | | | |
| O: Ostatní | | | |
| Objednatel: | | Zhotovitel: | |
| Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychoňova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany | | SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká budějovice | |
| Název změny: Nový elektroinstalace pro stávající svítidla (osvětlení venkovního schodiště tribuny) | | | |
| Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo | | | |
| Předmět změny: | | | |
| Položka, popis: | | Důvod změny: | |
| Nová elektroinstalace pro stávající svítidla (osvětlení venkovního schodiště tribuny). | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky): | |
| Přílohy: | | 18 750 Kč bez DPH | |
| - cenová nabídka | | | |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby: | | | NE |
| Dopady do harmonogramu zhotovitele: | | | NE |
| Poznámky: | | | |
| Podpis zástupce Zhotovitele | | Podpis zástupce Objednatele | |
| SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | |
| 24. 11. 2016 | | 24. 11. 2016 | |
| Datum a podpis | | Datum a podpis | |
| Podpis zástupce TDI | | Podpis zástupce TDI | |
| SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | |
| Datum a podpis | | Datum a podpis | |
| Rozdělovník: | | Důvod zamítnutí (vyplní objednatel): | |
| 1. Objednatel | | | |
| 2. TDI | | | |
| 3. GP(AD) | | | |
| 4. Zhotovitel | | | |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze.

ROZPOČET

Stavba: S17-163-0001

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 10.10.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 921

Ostatní konstrukce a práce

0000000004

Kabeláž

kpl

1,000

5 700,00

18 750,00

0000000005

Trubkování

kpl

1,000

4 450,00

4 450,00

0000000006

Pomocný a montážní materiál

kpl

1,000

1 250,00

1 250,00

0000000007

Připojení svítidel

ks

5,000

300,00

1 500,00

0000000008

Demontáž stávající elektroinstalace

kpl

1,000

3 000,00

3 000,00

0000000009

Revize

ks


1,000

2 850,00

2 850,00

Celkem

18 750,00

| | | | |
|---|-------------|--|--------------------------|
| Stavba: | | Stadion Juliska - oprava tribuny | |
| Smlouva č.: | | S17-163-0001 | Ze dne: 26.8.2016 |
| Registrační číslo Změnového listu (ZL): | ZL 5 | Datum vydání ZL: | 30.11.2016 |
| index navrhovatele změny: | | Datum vydání revize ZL: | |
| Obj Objednatel | Obj | | |
| Z Zhotovitel | | | |
| GP Generální projektant | | | |
| O Osiatní | | | |
| Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany IČ: 601 62 694, DIČ: CZ601 62 694 Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany | | Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Česká Budějovice | |
|  | | | |
| Název změny: Odvoz demontovaných plechů a ocelových konstrukcí mimo stavbu | | | |
| Následující změny budou provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo | | | |
| Předmět změny: | | | |
| <i>Položka popis</i> | | <i>Důvod změny</i> | |
| Objednatel rozhodl, na základě požadavku provozovatele ASC Dukla, že demontované plechy a ocelové konstrukce se odvezou mimo areál stavby Stadion Juliska. Místo složení bude v armádním skladu v ulici Pilotů, Praha Ruzyně. | | Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiložené cenové nabídky): | |
| Přílohy: - cenová nabídka | | 228 400 Kč | bez DPH |
| Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením stavby: | | | NE |
| Dopady do harmonogramu zhotovitele: | | | NE |
| Poznámky | | | |
| Podpis zástupce Zhotovitele | | Podpis zástupce Objednatele | |
| SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME stavební s.r.o. 1 - 370 04 České Budějovice Datum a podpis 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599 | | SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME - 2 -12- 2016 Stanislav TGM | |
| Podpis zástupce TDI | | Datum a podpis | |
| SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME | | | |
| Datum a podpis | | Důvod zamítnutí (vyplní objednatel) | |
| Rozdělovník: 1. Objednatel 2. TDI 3. GP(AD) 4. Zhotovitel | | | |

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být vždy opatřena registračním číslem ZL !!!

ROZPOČET

Stavba: S17-163-0001
Objekt: Stadion Juliska, Praha - oprava tribuny
Část: ZL 5 - odvoz demontovaných plechů a OK mimo stavbu
JKSO:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Datum: 30.11.2016

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem bez DPH |
|------|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----|-----------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| D | | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 183 200,00 |
| D | | 99 | | Přesun hmot | | | | 183 200,00 |
| | | MAT | 999jeřáb | Zdvihací prostředky - nakládky Stadion Juliska | hod | 16,000 | 2 600,00 | 41 600,00 |
| | | MAT | 999jeřáb | Zdvihací prostředky - vykládka sklad Ruzyně | hod | 16,000 | 2 600,00 | 41 600,00 |
| | | | 000000005 | Řízení dopravy na místě stavby | kpl | 2,000 | 16 000,00 | 32 000,00 |
| | | | 000000006 | Přeprava demontovaného materiálu ze Stadionu Juliska do skladu Ruzyně | otoč | 10,000 | 6 800,00 | 68 000,00 |
| D | | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 45 200,00 |
| D | | 921 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | 45 200,00 |
| | | | 000000007 | Vazačské práce | kpl | 2,000 | 7 600,00 | 15 200,00 |
| | | | 000000008 | Zvážení nákladu (jízdy přes vážní zařízení) | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Celkem bez DPH

228 400 Kč

Pozn.1: Cenová kalkulace předpokládá odvoz demontovaných plechů a ocelových konstrukcí ve 2 etapách.

Pozn.2: Vážní zařízení není certifikováno.
