

Příloha č. 1

k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, na akci:

Lom Most - Pařidelský lalok - pěstební péče sanovaného území

Kód akce: A1099

č. KOH/Se/1 47/2019 + D1

Protokol změny č. 01/2021

PROTOKOL ZMĚNY		číslo PZ: 01/2021
<i>Zhotovitel:</i> LESORS s.r.o. Dubská 311/9, 417 01 Dubí - Dubí 1 IČO: 286 92 403 DIČ: CZ28692403		<i>Objednatel:</i> Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumeč IČO: 000 07 536 DIČ: CZ00007536
<i>Název akce:</i> Lom Most - Pařídelský lalok - pěstební péče sanovaného území Kód akce: A1099		<i>Datum:</i> 4. 11. 2021
<i>Smlouva o dílo:</i>	uzavřená dne 17. 6. 2019, pod č. objednatele KOH/Se/147/2019	
<i>Odkazy:</i>	PD - Lom Most - Pařídelský lalok, sanované území, pěstební péče 2019 - 2021; zak. č. 5326/DPS; leden 2019	
<i>Důvod změny:</i>	změny v položkách pěstební péče pro roky 2019, 2020 a 2021	
I. POPIS ZMĚNY Změna postupu prací <p>V průběhu vegetačního období roku 2019 panovaly nepředvídatelné klimatické podmínky v podobě vysokých teplot doprovázených nízkými srážkovými úhrny. Uvedené klimatické podmínky byly na prudkých svazích s jižní expozicí zejména v letních měsících značně nepříznivé pro růst travních porostů, proto nedošlo k zapojení travního porostu po osetí v minulém období na plochách č. 5 a č. 6, kde nebylo nutné udržovat části těchto ploch vyžínáním v rozsahu 1,09 ha. Jelikož přírůst travních porostů po prvním provedeném vyžínání stagnoval, nebylo účelné vynakládat finanční prostředky na druhé vyžínání buřeně. Osetí dílčí plochy č. 5 (0,36 ha), které bylo plánováno dle projektové dokumentace (dále jen PD) na konec měsíce srpna, resp. v září, bylo z důvodu podmáčení části plochy po vydatných srážkách, přesunuto na jaro roku 2020.</p> <p>V roce 2020 byly v měsíci dubnu provedeny práce spočívající v předseťové přípravě a osetí dílčí plochy č. 5 o rozloze 0,36 ha. Jednalo se o přesun neprovedených prací z roku 2019. Ani v roce 2020 nedošlo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek k výraznějšímu zapojení travního porostu ve spodní části svahu o rozloze 0,7 ha na ploše č. 6 a nebylo nutněji udržovat vyžínáním, Jelikož přírůst travních porostů po prvním provedeném vyžínání stejně jako v předchozím roce stagnoval, nebylo účelné vynakládat finanční prostředky ani na druhé vyžínání buřeně,</p> <p>Vegetační období roku 2021 bylo srážkově bohaté, v rámci realizace prací bylo realizováno vyžínání ve dvou opakováních. Nižší objem provedených prací reflektoval stav travních porostů na dílčí ploše č. 6, kde nebyl travní drn zapojen v plném rozsahu dle předpokladu uvedeném v PD.</p> <p>Tato změna nevyvolá potřebu navýšení celkové ceny díla dle smlouvy o dílo, naopak bude ušetřeno 148 063,20 Kč bez DPH. V souladu s výše uvedenými skutečnostmi byl zpracován nový položkový rozpočet prací pro roky 2019 - 2021, ve kterém dochází k mezipoložkovým přesunům v rámci plánovaných prací dle platné projektové dokumentace.</p>		
II. POPIS ZMĚNY V OBJEMU PRACÍ V LETECH 2019 AŽ 2021 Změna objemu prací uvedena v oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (nový položkový rozpočet prací pro roky 2019 - 2021), který tvoří přílohu č. 1.		
III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ		
Rok 2019	- 90 969,60 Kč	
Rok 2020	- 40 093,60 Kč	
<u>Rok 2021</u>	<u>- 17 000,00 Kč</u>	
Změna objemu financí celkem bez DPH	- 148 063,20 Kč	

Vyčíslení změny v rámci celé akce:

Původní cena dle Smlouvy o dílo 553 040,20 Kč
Finanční objem změny - 148 063,20 Kč


Cena po provedení změny bez DPH 404 977,00 Kč


IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Navrhovaná změna nemá kromě časové a věcné aktualizace harmonogramu prací žádné další dopady na realizaci díla.

V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Nový položkový rozpočet prací pro roky 2019 - 2021
Příloha č. 2 - Zápis z kontrolního dne konaného dne 29. 10. 2021

Za zhotovitele:	Lukáš Orság jednatel LESORS s.r.o.
Za objednatele:	 ----- rekultivací a správy území střediska Kohinoor Palivový kombinát Ústí, státní podnik

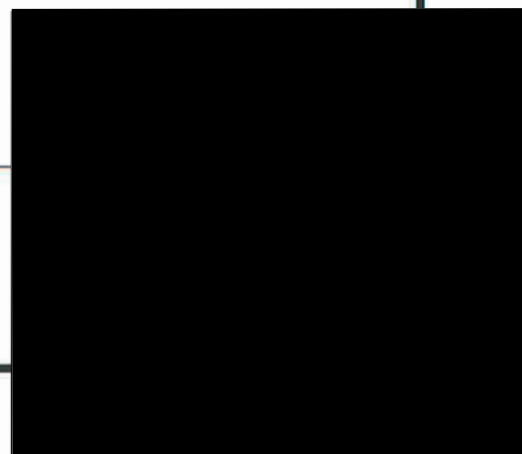

Příloha č. 1

Protokolu změny č. 01/2021

Nový položkový rozpočet pro roky 2019 - 2021

Rozpočet pro rok 2019

Stavba: Lom Most - Pánský lalok - pátební péče sanovaného území 2019-2021

Objekt: 1. rok pátební péče (2019)

Část:

Objednatel: Paliový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: LESORSsro

číslo smlouvy: KOH5srl_47/2019_kódakce: A1099

Datum: 3 11 2021

pot. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle Sd		Změna práci pro rok 2019		rozdíl			
					množství celkem	cena jednotková	množství celkem	cena jednotková				
1	*	183551413	Úprava zemědělské půdy - oba relaxním kypřičem, hl do 0,15 m, na ploše jednolivé do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,460	5 000,00	2 300,00	8 000,00	0,00	0,00	141,291,20	90,969,60
2	*	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 000,00	1,00	4 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00
3	*	183403152	Obdělání půdy vlákem v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 600,00	1,00	4 600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00
4	*	180451111	Seř. zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,47	6 000,00	2 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
5	*	00572100	osivo jeteletráva intenzivní víceletá	l0	36,800	200,00	7 360,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-7 360,00
6	*	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4 600,00	1,00	4 600,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00
7	*	184651282	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	1,320	10 000,00	13 200,00	10 000,00	0,660	6 600,00	6 600,00	-6 600,00
8	*	184651273	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	6,600	12 000,00	79 200,00	12 000,00	2,210	26 520,00	26 520,00	62 690,00
9	*	184651276	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	0,060	10 000,00	600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
10	*	184651273	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	0,500	10 000,00	6 000,00	12 000,00	0,250	3 000,00	3 000,00	-3 000,00
11	*	185803106R	Shrabání pokoseného porostu	ha	0,250	10 000,00	2 500,00	10 000,00	0,250	2 500,00	2 500,00	-2 500,00
12	*	183111213	Hlubení jámeč pro výsazování rostlin v zemině tl.1 až 4 s výměňnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	-	1 810,000	5,00	9 050,00	5,00	1 810,000	9 050,00	9 050,00	0,00
13	*	02650300R	lesní sazenice listnaté ZB 36-50 cm	-	728,000	12,00	8 736,00	12,00	728,000	8 736,00	8 736,00	0,00
14	*	004023K	obalované LS jehličnaté 25-36 cm	-	347,000	12,00	4 164,00	12,00	347,000	4 164,00	4 164,00	0,00
15	*	004023K	lesní sazenice listnaté ZB 36-50 cm	kus	735,000	35,00	25 725,00	35,00	735,000	25 725,00	25 725,00	0,00
16	*	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého vykopku nebo sypanniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tl 1 až 4	m3	38,915	140,00	5 448,10	140,00	38,915	5 448,10	5 448,10	0,00
17	*	162701103	Vodorovné přemíslení vykopku nebo sypanniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	38,915	200,00	7 783,00	200,00	38,915	7 783,00	7 783,00	0,00
18	*	411C	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tl 3	k:s	400,000	5,00	2 000,00	5,00	400,000	2 000,00	2 000,00	0,00
19	*	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvířeti náletem nebo postikem	-	5 245,000	50,00	10 690,00	50,00	6 860,000	10 690,00	10 690,00	0,00
20	*	2511915R	peřilník	l0	32,070	50,00	1 603,50	50,00	32,070	1 603,50	1 603,50	0,00
21	K	16481312R	Ochrana dřevin před okusem zvířeti mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletem, výšky do 2 m	-	44,000	200,00	8 800,00	200,00	44,000	8 800,00	8 800,00	0,00
22	K	938902113	Profilaxe a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou dna a svahů do předepného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemíslením na homady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu náosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	100,000	95,00	9 600,00	95,00	100,000	9 600,00	9 600,00	0,00
23	K	938907141R	Čištění usazení odstranění náosu ze sedimentační jámky	m3	1,000	170,00	170,00	170,00	1,000	170,00	170,00	0,00
24	K	183559009	Nájeté kilometry	m	60,000	50,00	3 000,00	50,00	60,000	3 000,00	3 000,00	0,00
25	*	HZ51291	řemeslný zář o sa s azb z p o n e c h z ž i n k	ha	6,000	10 000,00	60 000,00	10 000,00	6,000	60 000,00	60 000,00	0,00
26	K	99231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	-	5,789	800,00	4 631,00	800,00	5,789	4 631,00	4 631,00	0,00

Rozpočet pro rok 2020

Stavba: Lom Most - Párečský lalok - péče samovaného území 2019-2021

Objekt: 2. rok péčební péče (2020)

Část:

Objednatel: Paliwový kombinát Ústí státní podnik

Zhotovitel: LESORSsro

Číslo smlouvy: KONVSr/172019 kód akce: A1099

Datum: 3 11 2021

		dle SOD		Změna prací pro rok 2020		
ř	kód položky	popis	MJ	množství celkem	cena jednotková	cena celkem
	0	ROK 2020 - celkem (CZ-CPV 7211500-7)		1,0	723	141 629,50
	1	Úprava zemědělské půdy - obta rotačním kypěčem. hl do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,0	5 000,00	2 900,00
	2	Obdělení půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,00	1,00	4 600,00
	3	Obdělení půdy válečím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,0	1,0	4 600,00
	4	Sel. zemědělských kultur na plochách do 5 ha, o sklonu do 5°	ha	0,0	5 000,00	2 300,00
	5	jetel	ha	0,00	1,0	7,00
	6	Obdělení půdy válečím v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	0,0	1,0	4 600,00
	7	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při válečnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	ha	1,83	10 000,00	6 600,00
	8	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při válečnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	3,00	12 000,00	31 200,00
	9	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při válečnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	ha	0,0	10 000,00	0
	10	Mechanizované ožňání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při válečnosti dobré, výšky přes 60 cm	ha	0,250	12 000,00	3 000,00
	11	Sřasání pokoseného porostu	ha	0,0	10 000,00	0
	12	Hlubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	m3	360,000	5,00	1 800,00
	13	lesní sazenice listnaté ZB 36-50 cm	ks	145,000	10,00	1 450,00
	14	obalované LS jeřmínaté 25-36 cm	ks	70,0	10,00	700,00
	15	jeřmínové	ks	1,50	1,00	1,50
	16	Nakládání, skládání a překládání neuhnilého výkopku nebo sypaviny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,740	14,00	1 083,60
	17	Vodorovné přemisění výkopku nebo sypaviny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	7,740	1,00	7,740
	18	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kuč	4,00	2 000,00	8 000,00
	19	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří náletem nebo posítkem	m	6 316,000	10 680,00	67 281,60
	20	regener	m	32,00	1 603,50	51 712,00
	21	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1,5, pleškem, výšky do 2 m	m	5 200,00	1,00	5 200,00
	22	Kontrola a oprava oplůtků	hod	1 200,00	1,00	1 200,00
	23	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým výsadem s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapomených nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	10,00	9 500,00	95 000,00
	24	Čištění usazenin odstranění nánosu ze sedimentací jímky	m3	1,00	17,00	17,00
	25	Nájeté klenoty	m	3 000,00	1,00	3 000,00
	26	Hodnová zúčtovací sázka pomocný dělník	hod	8,00	1 200,00	9 600,00
	27	hloubení sazenic průměrylovními hnojivky v množství do 0,25 kg k jedné sazenici	m	5 345,000	16 035,00	85 942,50
	28	pomalu rozpustné hnojivo (hořelky)	m	213,900	17 104,00	3 659,60
	29		m	1 124,00	1,00	1 124,00
	30		m	1,00	1,00	1,00
	31		m	1,00	1,00	1,00
	32		m	1,00	1,00	1,00
	33		m	1,00	1,00	1,00
	34		m	1,00	1,00	1,00
	35		m	1,00	1,00	1,00
	36		m	1,00	1,00	1,00
	37		m	1,00	1,00	1,00
	38		m	1,00	1,00	1,00
	39		m	1,00	1,00	1,00
	40		m	1,00	1,00	1,00
	41		m	1,00	1,00	1,00
	42		m	1,00	1,00	1,00
	43		m	1,00	1,00	1,00
	44		m	1,00	1,00	1,00
	45		m	1,00	1,00	1,00
	46		m	1,00	1,00	1,00
	47		m	1,00	1,00	1,00
	48		m	1,00	1,00	1,00
	49		m	1,00	1,00	1,00
	50		m	1,00	1,00	1,00
	51		m	1,00	1,00	1,00
	52		m	1,00	1,00	1,00
	53		m	1,00	1,00	1,00
	54		m	1,00	1,00	1,00
	55		m	1,00	1,00	1,00
	56		m	1,00	1,00	1,00
	57		m	1,00	1,00	1,00
	58		m	1,00	1,00	1,00
	59		m	1,00	1,00	1,00
	60		m	1,00	1,00	1,00
	61		m	1,00	1,00	1,00
	62		m	1,00	1,00	1,00
	63		m	1,00	1,00	1,00
	64		m	1,00	1,00	1,00
	65		m	1,00	1,00	1,00
	66		m	1,00	1,00	1,00
	67		m	1,00	1,00	1,00
	68		m	1,00	1,00	1,00
	69		m	1,00	1,00	1,00
	70		m	1,00	1,00	1,00
	71		m	1,00	1,00	1,00
	72		m	1,00	1,00	1,00
	73		m	1,00	1,00	1,00
	74		m	1,00	1,00	1,00
	75		m	1,00	1,00	1,00
	76		m	1,00	1,00	1,00
	77		m	1,00	1,00	1,00
	78		m	1,00	1,00	1,00
	79		m	1,00	1,00	1,00
	80		m	1,00	1,00	1,00
	81		m	1,00	1,00	1,00
	82		m	1,00	1,00	1,00
	83		m	1,00	1,00	1,00
	84		m	1,00	1,00	1,00
	85		m	1,00	1,00	1,00
	86		m	1,00	1,00	1,00
	87		m	1,00	1,00	1,00
	88		m	1,00	1,00	1,00
	89		m	1,00	1,00	1,00
	90		m	1,00	1,00	1,00
	91		m	1,00	1,00	1,00
	92		m	1,00	1,00	1,00
	93		m	1,00	1,00	1,00
	94		m	1,00	1,00	1,00
	95		m	1,00	1,00	1,00
	96		m	1,00	1,00	1,00
	97		m	1,00	1,00	1,00
	98		m	1,00	1,00	1,00
	99		m	1,00	1,00	1,00
	100		m	1,00	1,00	1,00
	101		m	1,00	1,00	1,00
	102		m	1,00	1,00	1,00
	103		m	1,00	1,00	1,00
	104		m	1,00	1,00	1,00
	105		m	1,00	1,00	1,00
	106		m	1,00	1,00	1,00
	107		m	1,00	1,00	1,00
	108		m	1,00	1,00	1,00
	109		m	1,00	1,00	1,00
	110		m	1,00	1,00	1,00
	111		m	1,00	1,00	1,00
	112		m	1,00	1,00	1,00
	113		m	1,00	1,00	1,00
	114		m	1,00	1,00	1,00
	115		m	1,00	1,00	1,00
	116		m	1,00	1,00	1,00
	117		m	1,00	1,00	1,00
	118		m	1,00	1,00	1,00
	119		m	1,00	1,00	1,00
	120		m	1,00	1,00	1,00
	121		m	1,00	1,00	1,00
	122		m	1,00	1,00	1,00
	123		m	1,00	1,00	1,00
	124		m	1,00	1,00	1,00
	125		m	1,00	1,00	1,00
	126		m	1,00	1,00	1,00
	127		m	1,00	1,00	1,00
	128		m	1,00	1,00	1,00
	129		m	1,00	1,00	1,00
	130		m	1,00	1,00	1,00
	131		m	1,00	1,00	1,00
	132		m	1,00	1,00	1,00
	133		m	1,00	1,00	1,00
	134		m	1,00	1,00	1,00
	135		m	1,00	1,00	1,00
	136		m	1,00	1,00	1,00
	137		m	1,00	1,00	1,00
	138		m	1,00	1,00	1,00
	139		m	1,00	1,00	1,00
	140		m	1,00	1,00	1,00
	141		m	1,00	1,00	1,00
	142		m	1,00	1,00	1,00
	143		m	1,00	1,00	1,00
	144		m	1,00	1,00	1,00
	145		m	1,00	1,00	1,00
	146		m	1,00	1,00	1,00
	147		m	1,00	1,00	1,00
	148		m	1,00	1,00	1,00
	149		m	1,00	1,00	1,00
	150		m	1,00	1,00	1,00
	151		m	1,00	1,00	1,00
	152		m	1,00	1,00	1,00
	153		m	1,00	1,00	1,00
	154		m	1,00	1,00	1,00
	155		m	1,00	1,00	1,00
	156		m	1,00	1,00	1,00
	157		m	1,00	1,00	1,00
	158		m	1,00	1,00	1,00
	159		m	1,00	1,00	1,00
	160		m	1,00	1,00	1,00
	161		m	1,00	1,00	1,00
	162		m	1,00	1,00	1,00
	163		m	1,00	1,00	1,00
	164		m	1,00	1,00	1,00
	165		m	1,00	1,00	1,00
	166		m	1,00	1,00	1,00
	167		m	1,00	1,00	1,00
	168		m	1,00	1,00	1,00
	169		m	1,00	1,00	1,00
	170		m	1,00	1,00	1,00
	171		m	1,00	1,00	1,00
	172		m	1,00	1,00	1,00
	173		m	1,00	1,00	1,00

Rozpočet pro rok 2021

Stavba: Lom Most - Pařídelský lalok - pěstební péče sanovaného území 2019-2021
 Objekt: 3. rok pěstební péče (2021)

Část:

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Zhotovitel: LESORSsro,

Číslo smlouvy: KOH/Se/1 47/20 19 kód akce: A1099

Datum: 3 11,2021

Oř. č.	typ	kód položky	popis	MJ	dle SdD			Změna prací pro rok 2021			rozdíl
					množství celkem	cena jednotková	cena celkem	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	
03a	*	Rok 2021 - celkem (CZCPV 77211500-7)				139 056,30			122 056,30		-17 000,00
04	K	184851282	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti špatné, výšky od 30 do 60 cm	h ₀	1,80	10 000,00	18 000,00	1,80	10 000,00	18 000,00	0,00
51	*	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	h ₁	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	10 000,00	62 400,00	-16 800,00
52	K	184851276	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti střední, výšky od 30 do 60 cm	h ₂	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	-200,00
53	*	184851273	Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm	h ₁	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	*	15500 31	Shrabání pokoseného porostu	h ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	184814113	Okopání okolo sazenic hloubky do 0,10 m, na ploše 0,50 x 0,50 m v zemině tř. 3	kuš	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	5,00	0,00	0,00
56	K	184813111	Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří náterem nebo postřikem	kuž	5 345,000	0,00	10 690,00	5 345,000	0,00	10 690,00	0,00
57	0	0	elent	kg	89,07	0,00	0,00	89,07	0,00	0,00	0,00
58	±	184813121R	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pleťvem, výšky do 2 m	h ₀	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	K	1842021 1R	Kontrola a oprava oplůtek	h ₀	1,00	0,00	1 200,00	1,00	0,00	1 200,00	0,00
60	*	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpěvněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
61	X	938907141R	Čištění usazenin odstranění nánosu ze sedimentační jímky	m ³	1,00	17,00	17,00	1,00	17,00	17,00	0,00
62	K	183559009	Najeté kilometry	1	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
63	K	183559009	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník	h	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
64	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivaci území ovlivněných důlní a hutnickou činností	.	0 000,00	0,00	4 000,00	0 000,00	0,00	4 000,00	0,00

Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2021

Zápis z kontrolního dne konaného dne 29. 10. 2021

Datum	Denní záznamy stavby
29. 10. 2021	Zápis 3 j? - 6tyl > - volno 4 = e dno
	Dost "u" o f.S. j, <~>Z, Lt for Cmi' -Cetr z-z -'
	l > C Li' Id vebnl A' irr? A- *J2<>IA 'Ziskupcif' nsjedmatele
	a 4 rA- pce A ú* *■ A>A
	Po bontole -íA mu v-Sf<chh <*, p Cl t<A'~ -, C.S "dual" (Z
	Vr*čf> ri ('i iK< A +4:3 o-- A A L<-á VJ? 72 ý-Zz/c-zyr r e
	p> *■'<. rZA éo>-> <fp ■■Af A / íí? v letarCmi i o cc'
	z/Z> ? íP «- 00 bndow v d'rt -vr-u. í/ /?-'i × C'zit ku
	V termínu veřejnosti do 5. 11. bude zpracován
	r a í<'■>A <Aí*7 , o A </ z* 'íA. 74 i/ 44 4 z' zblinod.
	*v xítelí' měřiče > Z T" 2c 70 ' Z< 2 7
	F*Z' 07 f. d / bude <L* /A z (4 r<~ - puz L, v> do dodatek
	c- 'l C- 3-c J>.
	-jA- bledatele
	A- > V4?A t-vA A ' p. 0(A íe-Jt',

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.DPTYS.CZ
