








ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04	
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy		
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným		
Objednatel:	Královéhradecký kraj		
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava		
Datum:	17.12.2021		
Předmět změny:			
Zatřídění zeminy Cena: 423.660,45,-Kč bez DPH.			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Při provádění zemních prací na ploše zeleně vyznačené na příloze č.3 bylo zjištěno, že v části viz příloha se nachází skalní podloží, které neodpovídá zatřídění zeminy v rozpočtu prací. Bylo provedeno odborné zatřídění těžitelnosti zeminy viz příloha.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na půdorysu je zeleně vyznačená plocha, kde se nachází skalní podloží třídy 4 a 5 včetně plošné výměry. K tomu je doložen i řez, kde je zřejmé v jaké tloušťce se podloží třídy 4 a 5 nachází včetně vypočítané kubatury vytěžené zeminy třídy 4 a 5. Je zde přiložen i protokol od SÚZ, v němž bylo provedeno zatřídění podloží dle tříd tvrdosti. - Ve výkopech byly vytěženy i kameny velkých rozměrů – Ty musely být rozbity a odvezeny na skládku. - Plochu vyznačená zeleně, se z důvodu vzniklých kaveren po vytěžení, bude muset srovnat vybetonováním dna v průměrné tloušťce 19 cm betonu. 			
Dovětek AD:			
S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.			
Přílohy změnového listu:			
Příloha č.1 – rozpočet s výkazem výměr			
Příloha č.2 – posouzení těžitelnosti zeminy			
Příloha č.3 – půdorys a řez			
Příloha č.4 - foto			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
-139.647,77,- Kč		563.308,22,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
423.660,45,-Kč		Bez vlivu na termín	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele:		Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík		Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:		Datum:	


Za autorský dozor: Ing. Lukáš Najman Datum:		Za uživatele: Ing. Petr Jarý Datum:	
Za zhotovitele: Pavel Svoboda Datum: 17.12.2021			

Dokumentace

Hajnice posouzení těžitelnosti

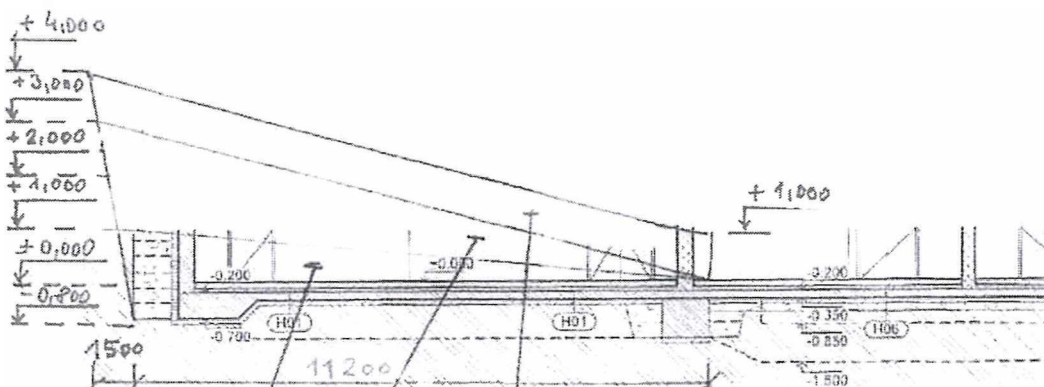

TŘÍDA ZEMINY (5) $746,38 \times 1,05 = 783,70 \text{ m}^3$
 TŘÍDA ZEMINY (4) $746,38 \times 1 = 746,38 \text{ m}^3$
 TŘÍDA ZEMINY DLE PD (1 A 2) 2

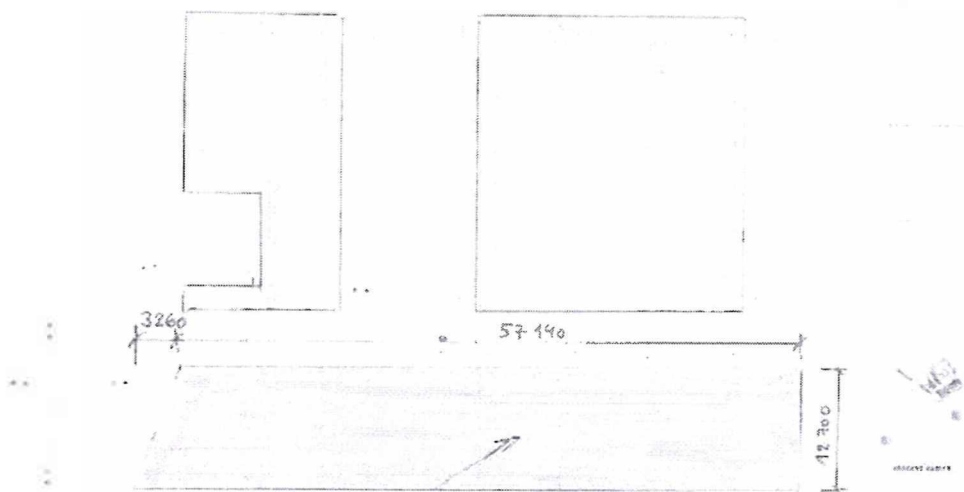

TŘÍDA ZEMINY (4) $746,38 \times 2$

Změnový list č. 4

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Podč: ZL 4 - Změna zatřídění zeminy

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokry

Datum: 15. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						423 660,45		151,567
1 Zemní práce						244 891,04		0,000
2	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-1 134,261	105,00	-119 097,41	0,000	0,000
		místo horniny tř. 5 - ODPOČET						
		$-(8 \cdot (1,4 + 0,45) / 2 \cdot 58,77)$		-434,898				
		Mezisoučet		-434,898				
		místo horniny tř. 4 - ODPOČET						
		$-(11,9 \cdot 2 / 2 \cdot 58,77)$		-699,363				
		Mezisoučet		-699,363				
		Součet		-1 134,261				
409	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	699,363	187,00	130 780,88	0,000	0,000
		jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 216x0,87						
		$11,9 \cdot 2 / 2 \cdot 58,77$		699,363				
410	131451105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3	m3	434,898	415,00	180 482,67	0,000	0,000
		jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 478x0,87						
		$(8 \cdot (1,4 + 0,45) / 2 \cdot 58,77)$		434,898				
3	132151255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	-84,402	180,00	-15 192,36	0,000	0,000
		místo horniny tř. 5 - ODPOČET						
		$-(1,9 \cdot 0,25 \cdot 60,4 + 1,3 \cdot 0,75 \cdot 57,14)$		-84,402				
411	132451254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	84,402	582,00	49 121,96	0,000	0,000
		jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 670x0,87						
		$1,9 \cdot 0,25 \cdot 60,4 + 1,3 \cdot 0,75 \cdot 57,14$		84,402				
9	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-42,300	120,00	-5 076,00	0,000	0,000
10	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-23,500	12,00	-282,00	0,000	0,000
		-42,3/1,8		-23,500				
412	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) kamení	t	42,300	571,00	24 153,30	0,000	0,000
		jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 657x0,87						
		42,3		42,300				
2 Zakládání						142 073,01		151,567
15	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	67,174	2 115,00	142 073,01	2,256	151,567
		podkladní beton tl. 100 mm - ODPOČET						
		$-12,7 \cdot 58,77 \cdot 0,1$		-74,638				
		v ploše s tř. zeminy 5 vyrovnání podkladu v průměrné tl. 19 cm						
		jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 2460x0,87						
		$12,7 \cdot 58,77 \cdot 0,19$		141,812				

Součet

67,174

998**Přesun hmot****30 789,40****0,000**

414	997006005	Drcení stavebního kamenného odpadu s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením	t	42,300	65,00	2 749,50	0,000	0,000
-----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------	-------

jednotková cena: (ÚRS 2021 02) = 74,7x0,87

42,3

42,300

145	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	151,567	185,00	28 039,90	0,000	0,000
-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------	-------

VRN3**Zařízení staveniště****4 677,00****0,000**

3	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,003	1 559 000,00	4 677,00	0,000	0,000
---	-----------	---------------------	-----	-------	--------------	----------	-------	-------

výpočet koeficientu VRN 3:

417753/147874758

0,003

VRN7**Provozní vlivy****1 230,00****0,000**

5	070001000	Provozní vlivy	kpl	0,003	410 000,00	1 230,00	0,000	0,000
---	-----------	----------------	-----	-------	------------	----------	-------	-------

výpočet koeficientu VRN 7:

417753/147874758

0,003

Celkem**423 660,45****151,567**



Stako s.r.o.
Bieblova ul. 782
500 03 Hradec Králové

Věc: Posouzení těžitelnosti zeminy

Dne 19.11.2021 bylo na akci barevné domky Hajnice provedeno ohledání zeminy v místech prováděných výkopových prací.
Výsledky ohledání jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 – Těžitelnost zemin a hornin

Výšková úroveň/Zemina - hornina	býv. ČSN 73 3050	ČSN 73 6133
Úroveň cca 0,0 – 1,0 m		
Pískovec, R3-R2 se střední hodnotou diskontinuit převážně >250 mm	5	III
Úroveň cca 1,0 – 3,0 m		
Pískovec R3-R2 se střední hodnotou diskontinuit převážně <150 mm, místy 150 – 250 mm	4	II
Úroveň cca 3,0 – původní terén m		
Ornice, hlinitá zemina, R5 se střední hodnotou diskontinuit převážně <150 mm	1-2	I

Zatřídění bylo provedeno dle bývalé ČSN 73 3050 a dle ČSN 73 6133.


Ohledání provedl: Sláma, Michek
Zprávu zpracoval: Michek
dokumentace



Jiří Kudrna
vedoucí odd. laboratorního zkušebnictví

V Pardubicích 22.11.2020


Přílohy: fotodokumentace
dokumentace
počet výtisků: 2x Stako Hk.
1x archiv ÚSZ






Fotodokumentace




foto: Hajnice 19.11.2021

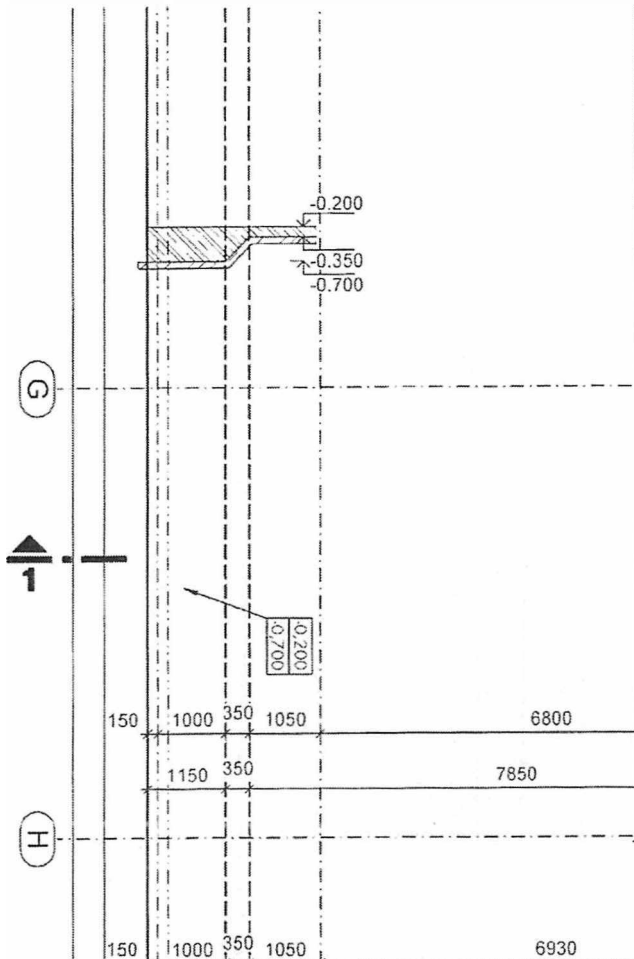

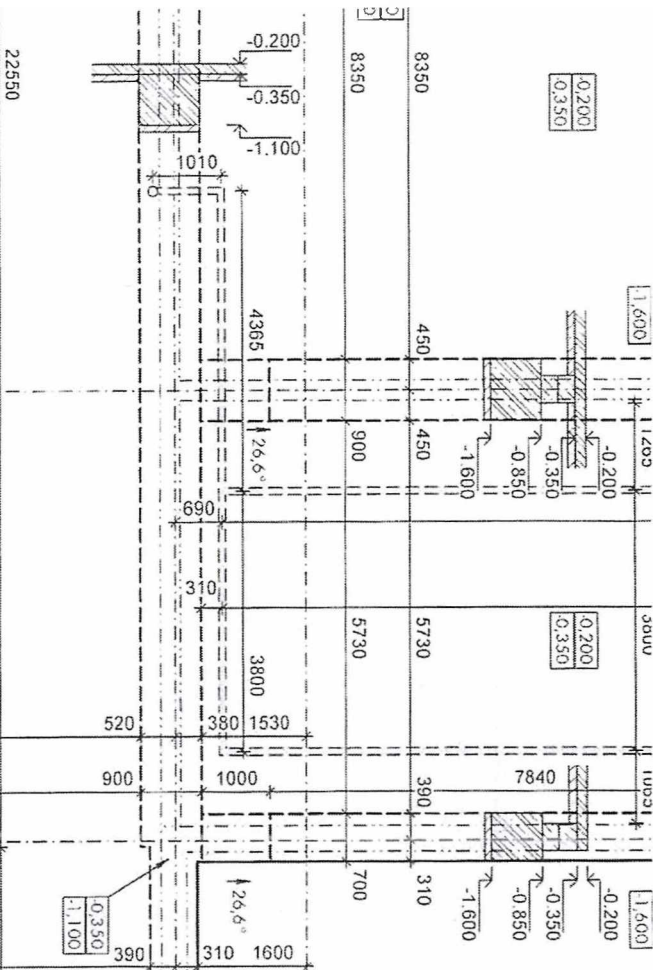

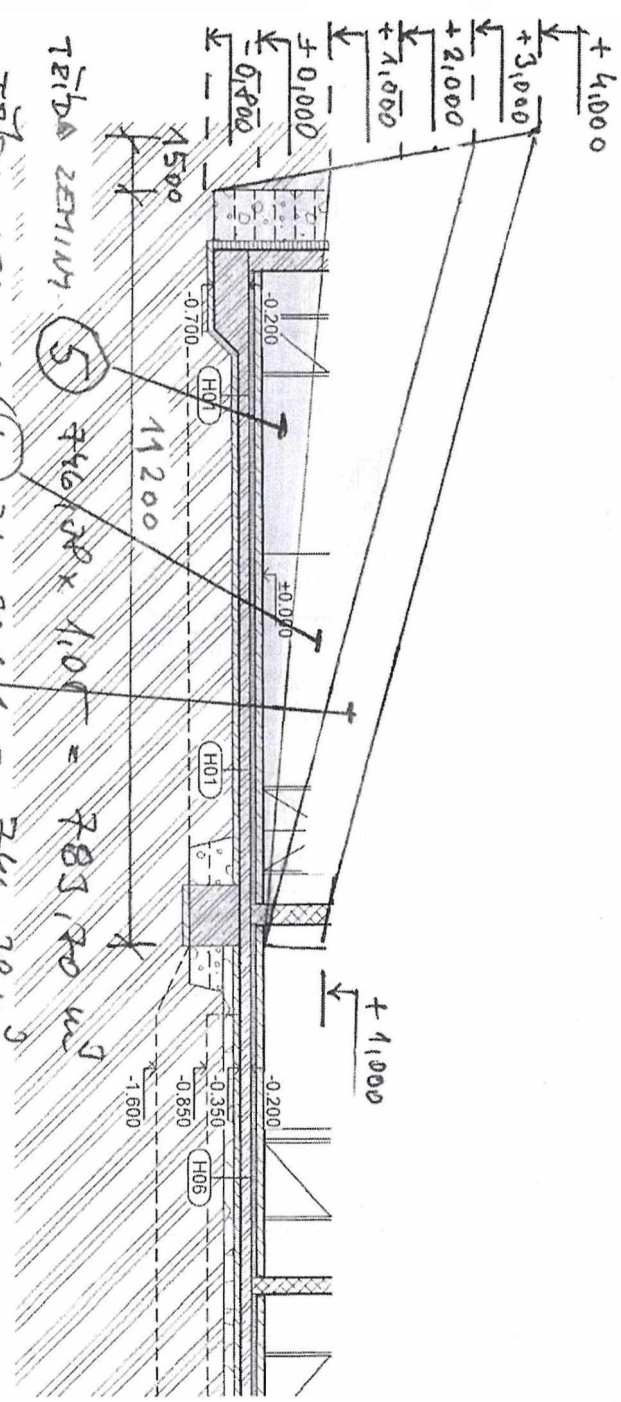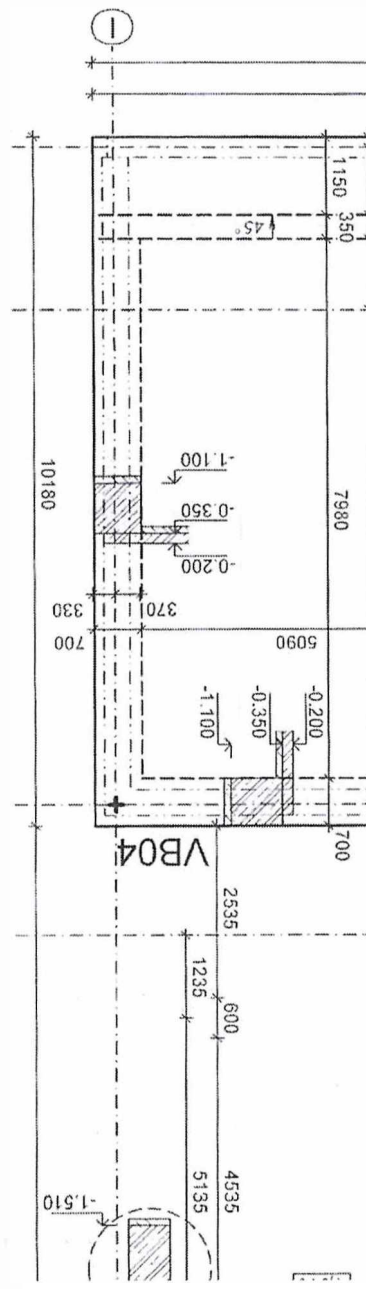

TEIÐA ZEMINŲ (5) 746,38 x 1,00 = 746,38 m²
 TEIÐA ZEMINŲ (4) 746,38 x 1 = 746,38 m²
 TEIÐA ZEMINŲ DĒE PĒD (1) 422

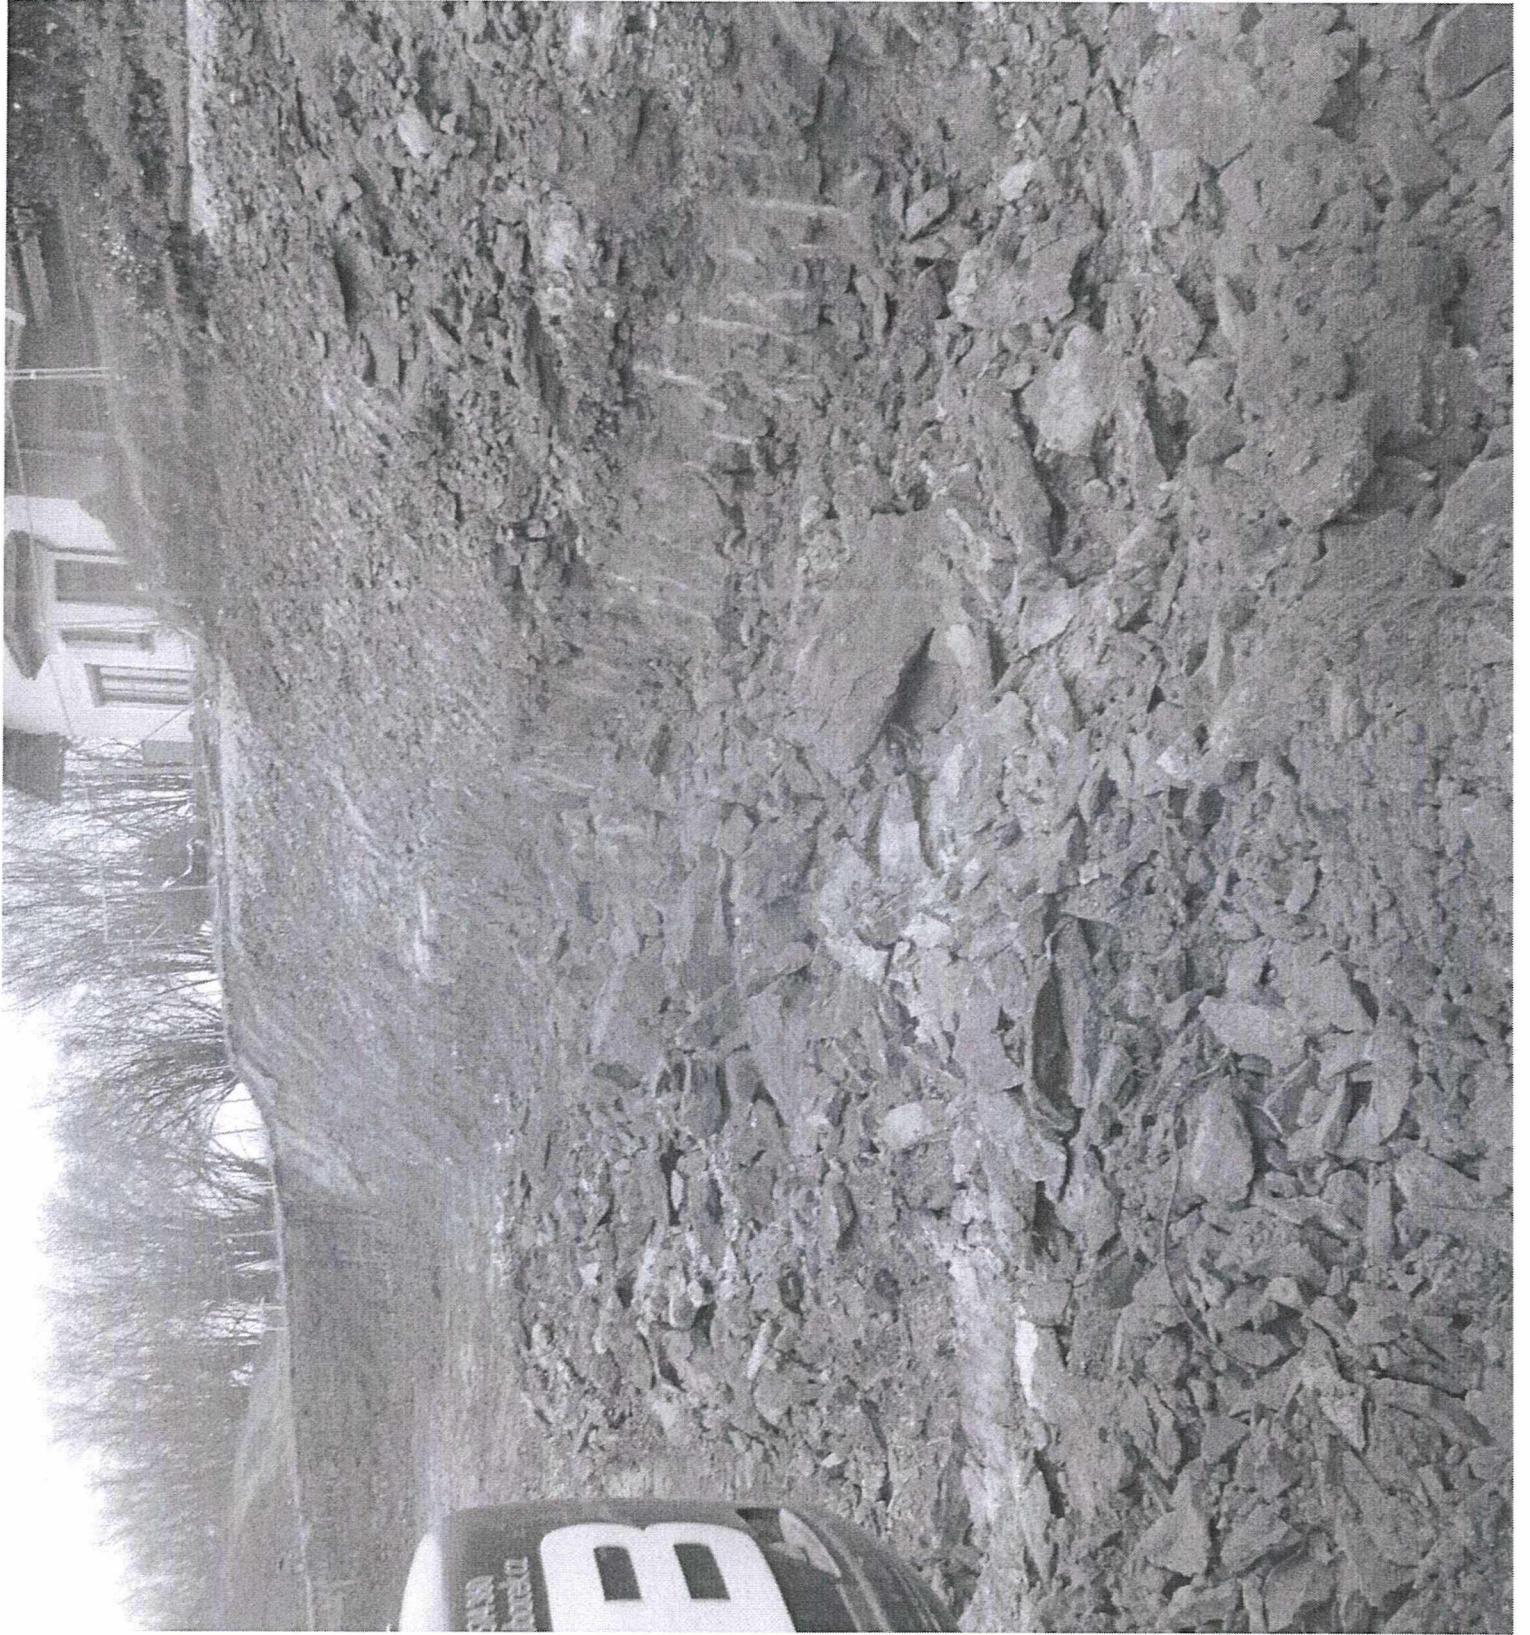



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	17.12.2021	
Předmět změny:		
Zrušení čistících šachet Cena: -43.570,24,-Kč bez DPH.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Z důvodu vyšší efektivity čištění odpadního potrubí, navrhuje provést záměnu čistících šachet 4ks za čistící kusy na odpadních potrubí 11ks.		
Projektant souhlasí se zrušením revizních šachet na ležaté splaškové kanalizaci v objektu SO-01. K čištění ležaté kanalizace budou použity čistící tvarovky na odpadních potrubích splaškové kanalizace. Toto řešení je v souladu s odstavcem 7.2.5 ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace.		
Dovětek AD: S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.		
Přílohy změnového listu:		
Příloha č.1 – rozpočet s výkazem výměr Příloha č.2 – PD se zakreslením čistících kusů		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-44.774,92,- Kč	1.204,68,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-43.570,24,- Kč	Bez dopadu na termín	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík	Ing. Tomáš Pazdera	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman	Ing. Petr Jarý	
Datum:	Datum:	
Za zhotovitele:		
Pavel Svoboda		
Datum: 17.12.2021		

Změnový list č. 5

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Ubytovací budova

Podč: ZL 5 - Zrušení revizních šachet

Objednatel: Královéhradecký kraj, Hradec Králové


Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice

Zpracoval: Ing. Vladimír Mokry

Datum: 17. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-43 570,24		-5,952
2		Zakládání				1 204,68		1,066
16	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 0,6*0,9*0,2*4	m3	0,432	2 390,00	1 032,48	2,453	1,060
20	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "KARI síť 6/100x6/100" 0,6*0,9*2*0,00444*1,15 Součet	t	0,006	28 700,00	172,20	1,063	0,006
8		Trubní vedení				-23 953,80		-7,018
125	894215112R	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, bez poklopu obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní "dle výkresu základů AR.03" - ODPOČET -1*1,3*1 -1*1,3*1,4 -1*1,3*1,3 Součet	m3	-4,810	4 980,00	-23 953,80	1,459	-7,018
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-19 720,00		0,000
142	99001	Kompl. dod. + mtž. poklop pro revizní šachtu vel. 600 x 900 ozn. Z01 Zrušeno - ODPOČET -4	ks	-4,000	4 930,00	-19 720,00	0,000	0,000
998		Přesun hmot				-1 101,12		0,000
143	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-5,952	185,00	-1 101,12	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00		0,000
VRN3		Zařízení staveniště				0,00		0,000
3	030001000	Zařízení staveniště výpočet koeficientu VRN 3: -43570/147874757	kpl	0,000	15 590 000,00	0,00	0,000	0,000
VRN7		Provozní vlivy				0,00		0,000
5	070001000	Provozní vlivy	kpl	0,000	410 000,00	0,00	0,000	0,000
Celkem						-43 570,24		-5,952

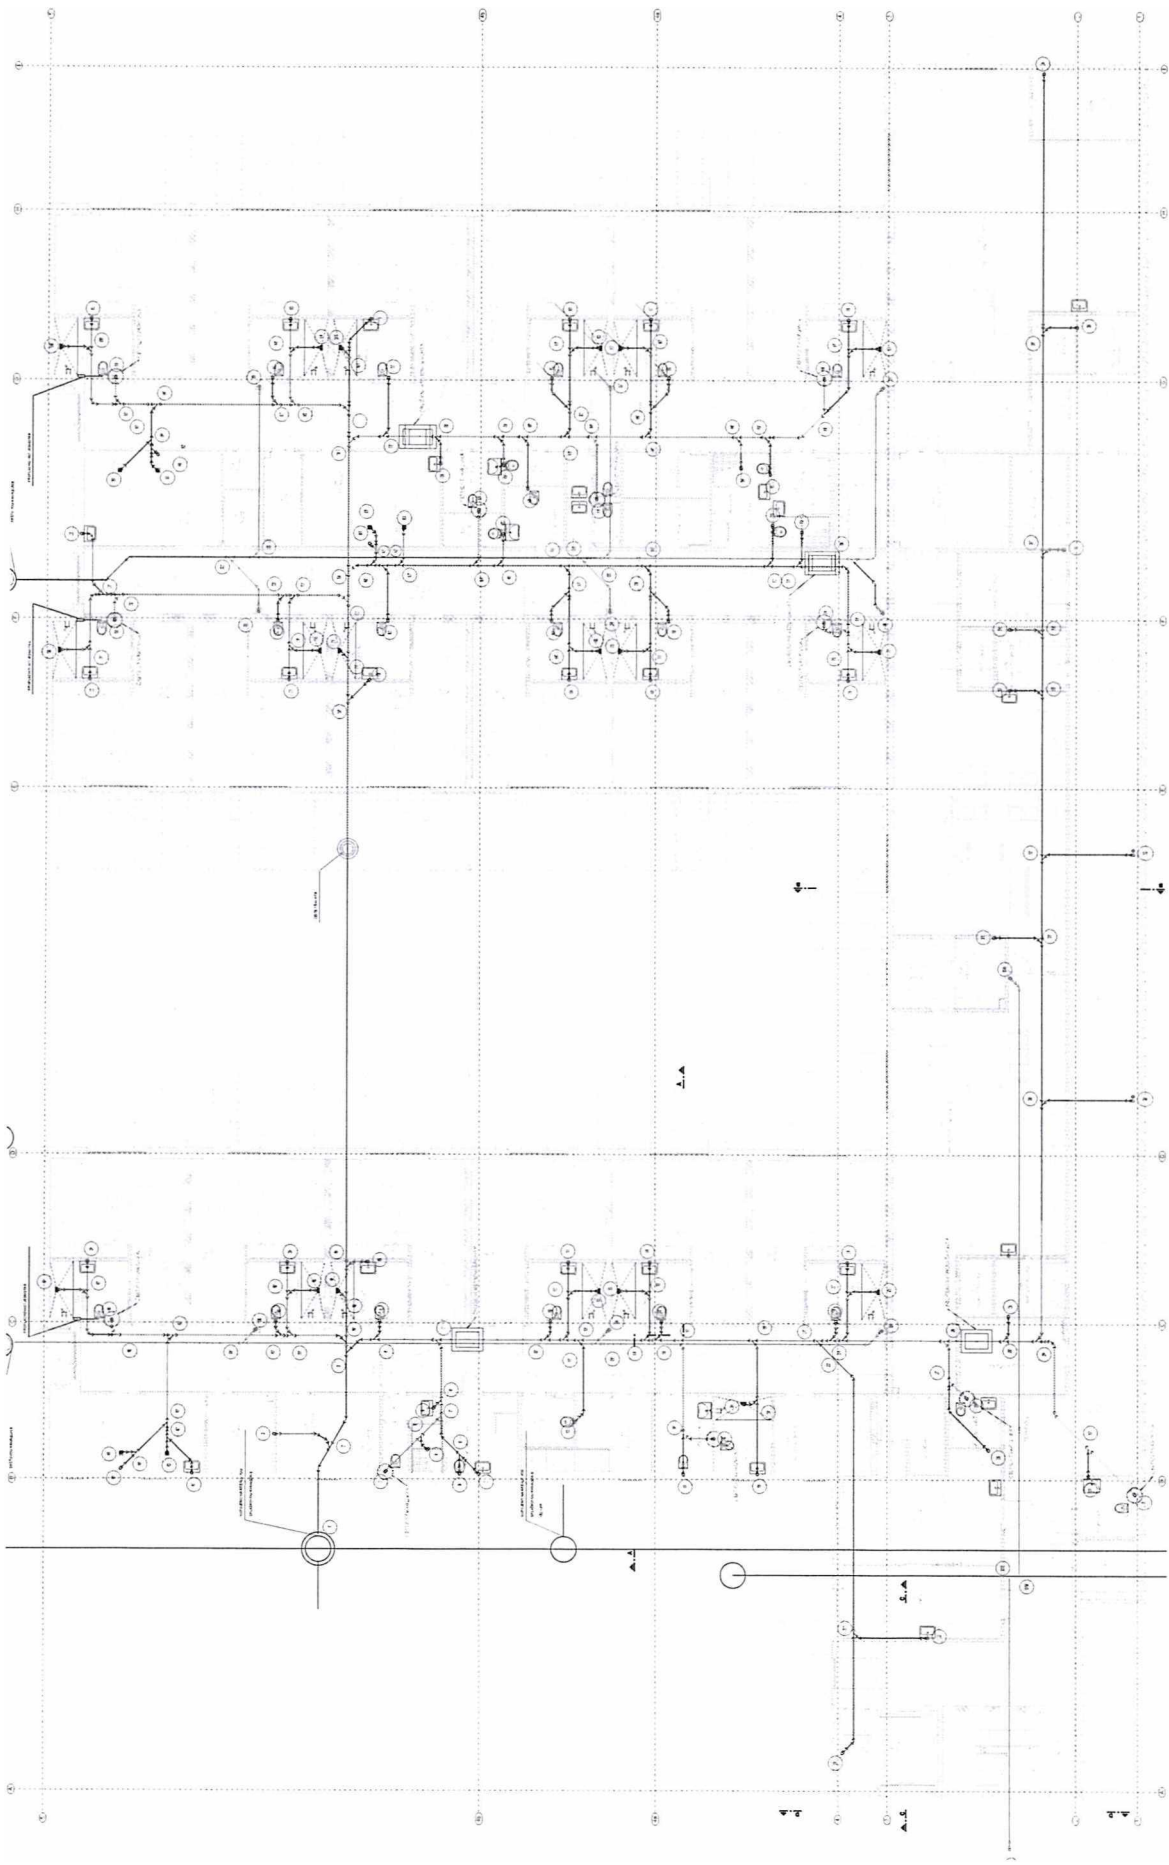

LEGENDA
 Simbol-simbol yang tertera pada gambar ini menunjukkan letak perlengkapan listrik yang akan dipasang di lokasi tersebut.
 Keterangan:
 (1) Saklar (2) Stop Kontak (3) Lampu (4) Busbar (5) Pemutus tenaga (6) Instalasi tenaga listrik lainnya
REVISI
 No. Revisi: 01
 Tanggal: 20/08/2024
 Disetujui: [Signature]
 Dibuat: [Signature]

PRACON PEOPLE

NO.	1	2	3
REVISI	01	02	03
TANGGAL	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024
DISetujui	[Signature]	[Signature]	[Signature]
DIBuat	[Signature]	[Signature]	[Signature]
PRACON PEOPLE			
Jl. Raya Pahlawan No. 100, Jakarta Barat 12160			
Telp: (021) 5000 1000			
Email: pracon@praconpeople.com			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy	
Zhotovitel:	S T A K O společnost s ručením omezeným	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Michal Němec, příprava	
Datum:	17.12.2021	
Předmět změny:		
Demolice ČOV Cena: 481.539,71,-Kč bez DPH.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Při odhalování základů ČOV a jejich bourání včetně základové desky, bylo zjištěno, že železobetonové konstrukce je ve větším rozsahu, než se předpokládalo viz příloha č.2 a příloha č.3		
Dovětek AD: S technickým řešením souhlasíme, ke změně rozsahu díla se nevyjadřujeme.		
Přílohy změnového listu:		
Příloha č.1 – rozpočet s výkazem výměr Příloha č.2 – zákres skutečnosti Příloha č.3 - foto		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	481.539,71,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
481.539,71,- Kč	Bez dopadu na termín	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za technický dozor stavebníka:	
Ing. Marek Pavlík	Ing. Tomáš Pazder	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za uživatele:	
Ing. Lukáš Najman	Ing. Petr Jarý	
Datum:	Datum:	
Za zhotovitele:		
Pavel Svoboda		
Datum: 17.12.2021		

Změnový list č. 6

Stavba: Barevné domky Hajnice - revize 4

Objekt: Bourané objekty

Část: ZL 6 - Demolice ČOV

Objednatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové


Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným

Místo: Hajnice


Zpracoval: Ing. Vladimír Mokry

Datum: 3. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost suť	Hmotnost suť celkem
HSV Práce a dodávky HSV						481 539,71		222,403
1		Zemní práce				3 915,65		0,000
1	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,664	132,00	3 915,65	0,00000	0,000
		"prohlubeň ČOV" - ODPOČET						
		-10,3*6,4*2,5		-164,800				
		prohlubeň ČOV - skutečnost						
		10,3*6,4*2,95		194,464				
		Součet		29,664				
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				333 604,80		222,403
2	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	92,668	3 600,00	333 604,80	2,40000	222,403
		"prohloubená část ČOV" - ODPOČET						
		-20		-20,000				
		základy ČOV skutečnost						
		(6,8+9,1)*2*0,8*2,95		75,048				
		základy a stěny pro oc. vanu						
		9,5*3,8*0,45+9,5*2*0,45*2,5		37,620				
		Součet		92,668				
997		Přesun suť				138 112,26		0,000
6	997006512	Vodorovná doprava suť na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	222,403	128,00	28 467,58	0,00000	0,000
7	997006519	Vodorovná doprava suť na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	4 225,657	7,00	29 579,60	0,00000	0,000
		222,403*19		4 225,657				
8	997013603R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	222,403	360,00	80 065,08	0,00000	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				4 677,00		0,000
3	030001000	Zařízení staveniště	kpl	0,003	1 559 000,00	4 677,00	0,00000	0,000
		výpočet koeficientu VRN 3:						
		475632/147874757		0,003				
VRN7		Provozní vlivy				1 230,00		0,000
5	070001000	Provozní vlivy	kpl	0,003	410 000,00	1 230,00	0,00000	0,000
		výpočet koeficientu VRN 3:						
		475632/147874757		0,003				
Celkem						481 539,71		222,403

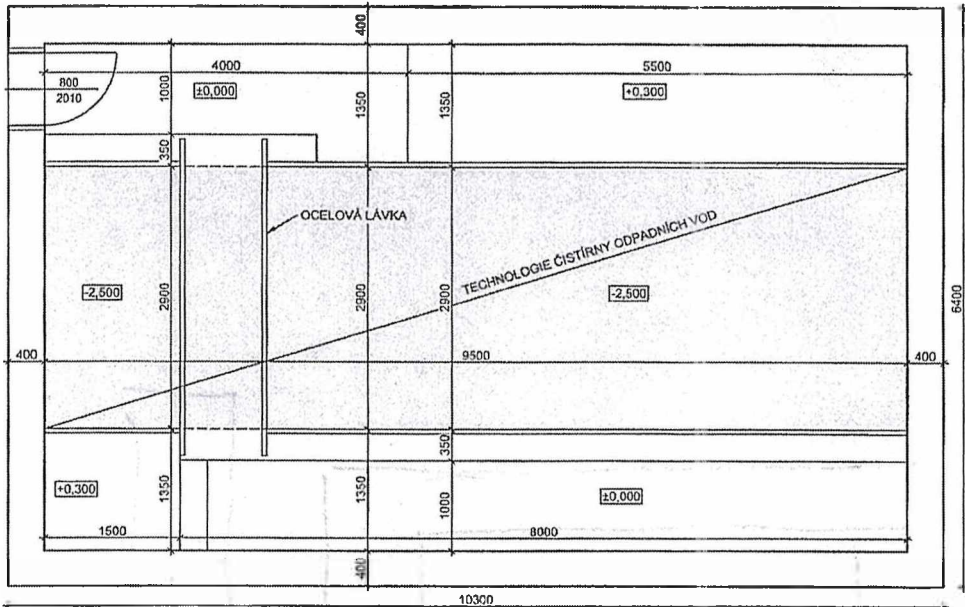



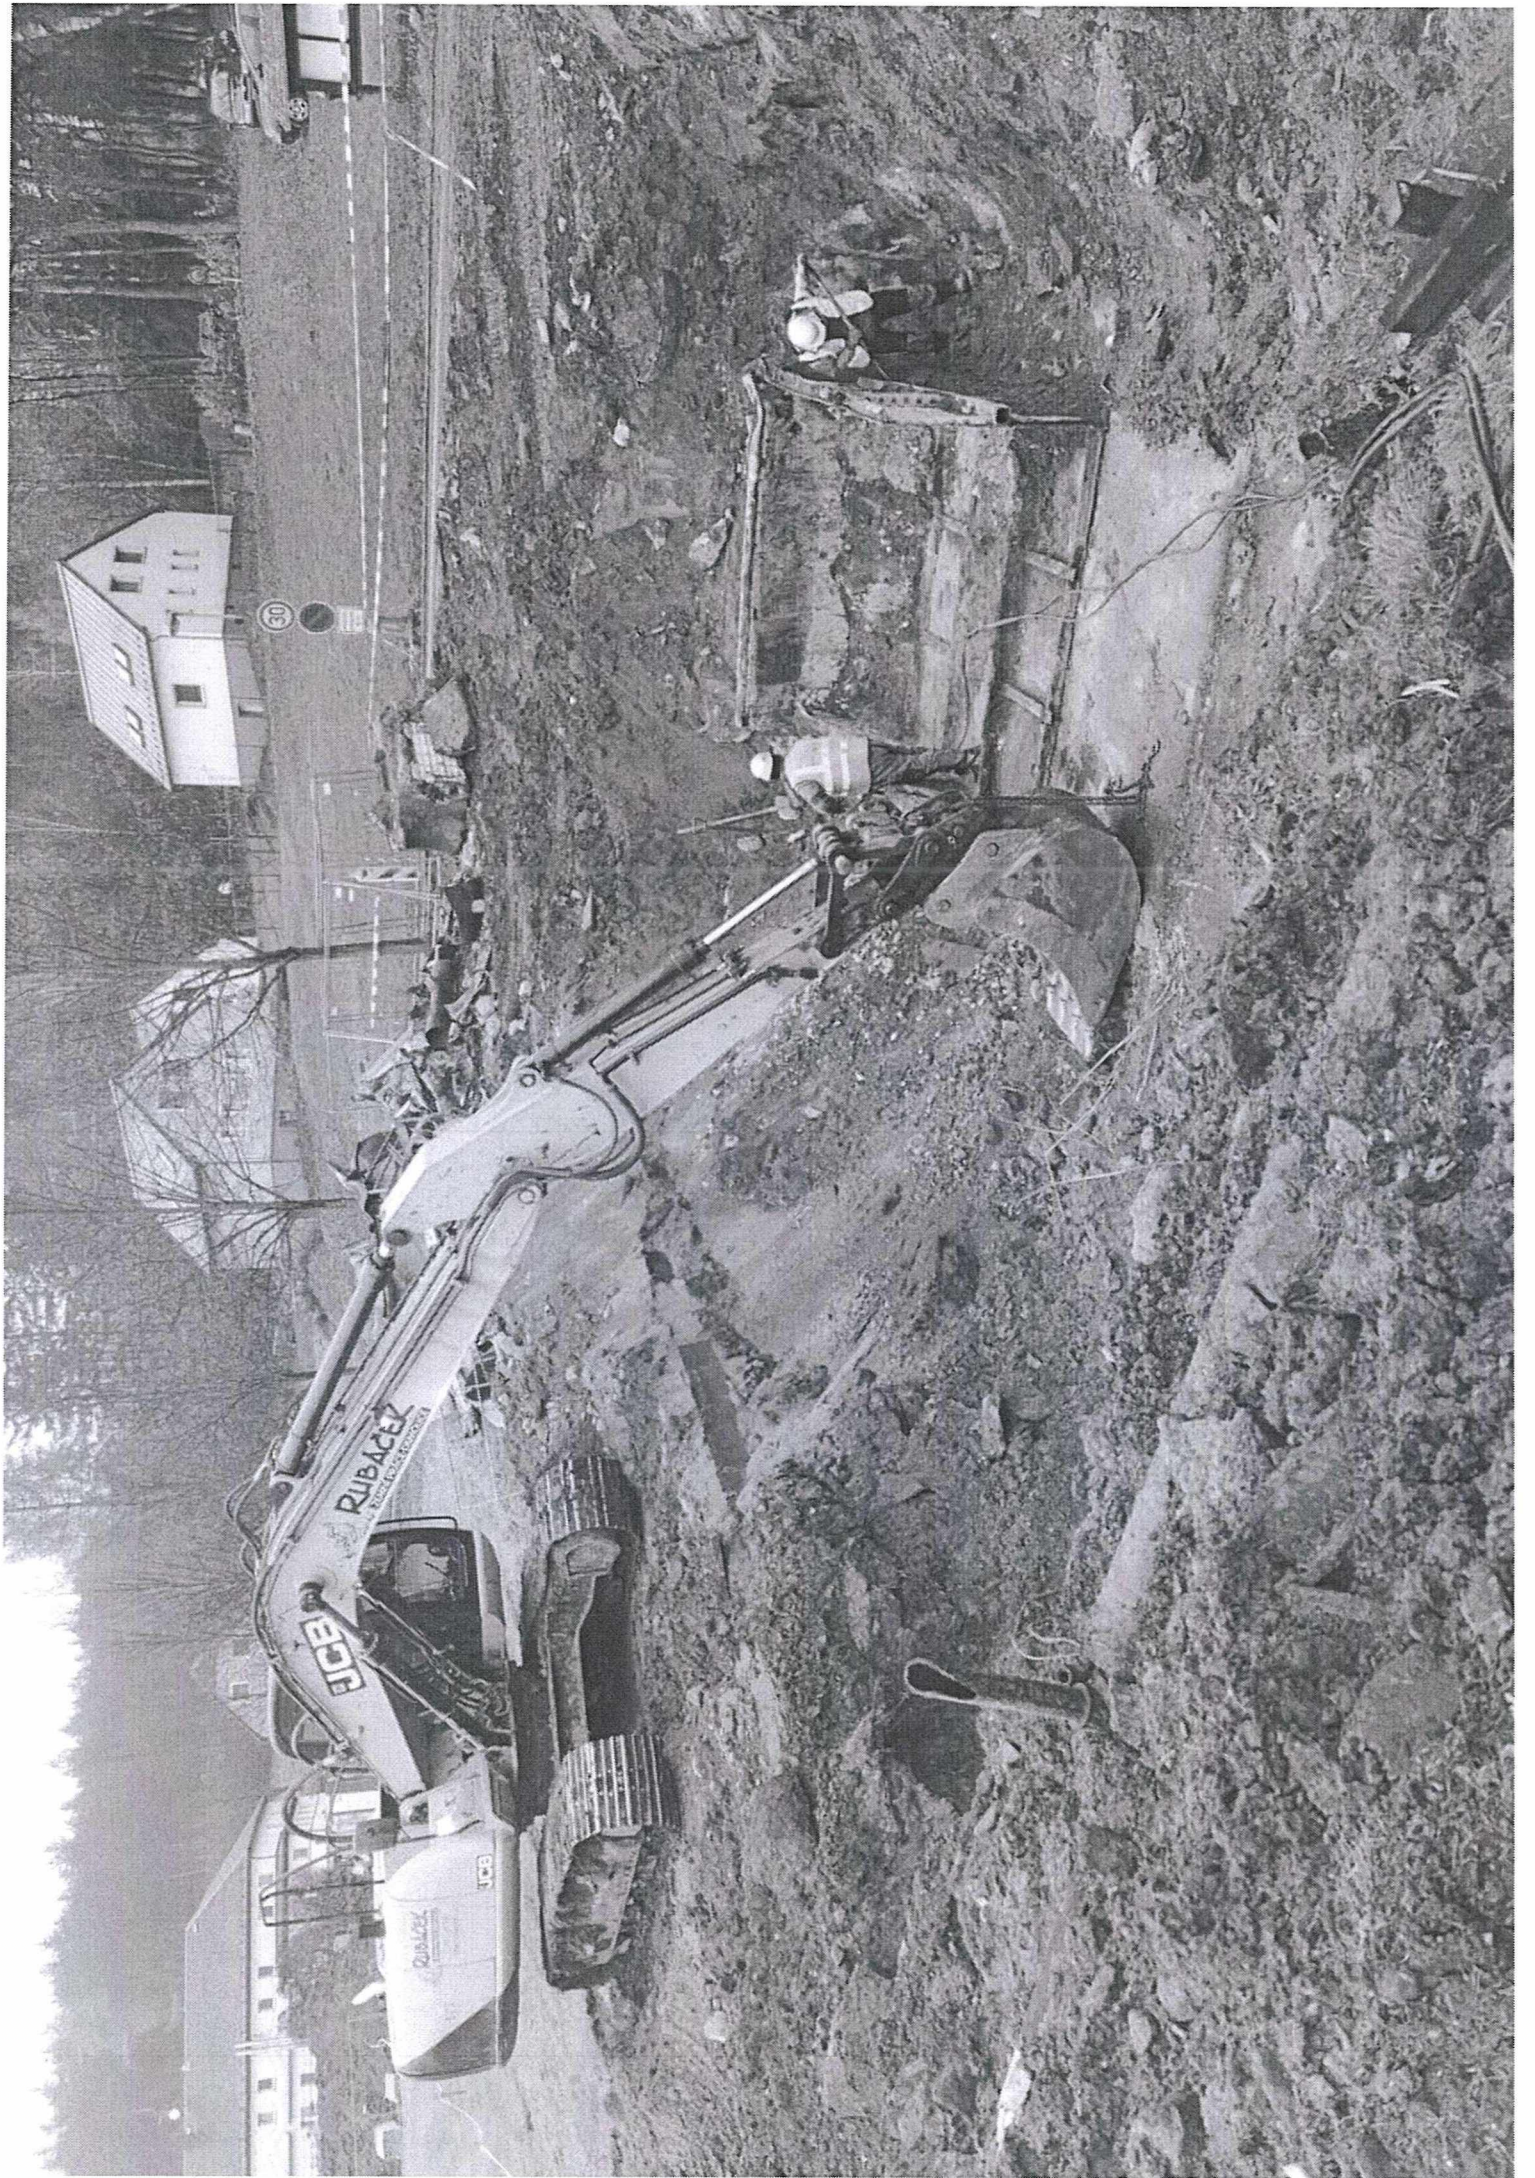

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

BD Hajnice, novostavba a rekonstrukce ubytovací a správní budovy

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	147 874 757,47 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	147 874 757,47 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	147 874 757,47 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 055 032,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 284 408,29 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 055 032,27 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 284 408,29 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 339 440,56 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	1,58 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		147 874 757,47 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 055 032,27 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 284 408,29 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 770 623,98 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,20 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 055 032,27 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 284 408,29 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 770 623,98 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	147 874 757,47 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	149 645 381,45 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	149 645 381,45 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Marek Pavlík**

