

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Sml 0193/2021

Město Milevsko

se sídlem nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831, DIČ: CZ00249831

zastoupené Ing. Michalem Hermou, vedoucím odboru investic a správy majetku, pověřené Radou města Milevska dne 21.02.2022 usnesením č. 67/22 (Směrnice o zdávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM-RMM-3/2020)

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Kaplan

se sídlem B. Smetany 1646/34, 370 01 České Budějovice

IČO: 47253070, DIČ: CZ6407011732

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0193/2021 ze dne 28.06.2021 (dále jen „dodatek“):

A)

PREAMBULE:

Objednatel změnil dispozici zadání řešení parkoviště u bytových domů v Nádražní ul. na pozemku parc. č. pozemku 546/8, k.ú. Milevsko.

Proto se smluvní strany dohodly dle čl. XIV.. odst. 14.2. smlouvy o dílo č. Sml 0193/2021 ze dne č. Sml 0193/2021 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který úpravy předmětu smlouvy, prodloužení termínu, v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. II. odst. 2.4 nově zní:

2.4. Projektová dokumentace dle odst. 2.2. smlouvy bude nově řešit výstavbu parkoviště vycházející z dispozice v projektu G uvedené v příloze č. 1. tohoto dodatku Zhotovitel bude navrhovaná řešení průběžně konzultovat s objednatelem a řídit se jeho pokyny.

čl. III. odst. 3.1 , fáze 3 věta první nahrazuje („předpoklad do 04.03.2022“ nově „předpoklad do 30.06.2022“)

c)
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

O uzavření dodatku rozhodl, v souladu se Směrnicí SM-RMM-3/2020 ev.č. MM 09514/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou Radou města Milevska dne 21.02.2022, usnesení č. 67/22, Ing. Michal Herma, vedoucí odboru investic a správy majetku. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek platnosti právního jednání dle tohoto zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve dvou elektronických vyhotoveních, objednatel obdrží jedno elektronické vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno elektronické vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Přílohy:

1. nové dispoziční řešení

V Milevsku dne

V Českých Budějovicích dne



.....
za objednatele
město Milevsko

Ing. Michal Herma

.....
za zhotovitele

Ing. Petr Kaplan

KANCELÁŘ PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

VERA
ICONICAING. PETR KAPLAN, B. SMETANY 1646/34, 370 01 Č. BUDĚJOVICE
TEL/FAX: 387 319 295 MOBIL: 774 957 426 E-MAIL: veraiconica@volny.cz

Dne 4. března 2022

Žádost o dodatek ke Smlouvě o dílo

S ohledem na měnící se dispozici zadání řešení parkoviště u bytových domů v Nádražní ulici v Milevsku, na poz. parc. č. 546/8 žádám o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo 0193/202, prodlužující termín.

Dodatek by měl zohlednit množství vynaložené práce na změny řešení parkoviště prodloužením termínu zpracování projektu a inženýrské činnosti.

Na základě původního zadání (A dle přílohy) bylo vypracován opět variant návrhu (B dle přílohy). Následně stavebník všechny návrhy odmítl a zadal novou dispozici řešení (C dle přílohy). Po vypracování řešení (D dle přílohy) stavebník dispozici odmítl a zadal novou dispozici (E dle přílohy). Na základě tohoto návrhu byly zpracovány 3 varianty řešení (F dle přílohy). Z těchto variant vybral stavebník k jednu ke zpracování v projektu (G dle přílohy).

V současné době probíhají projektové práce na této variantě.


Předpokládaný termín dokončení projektových prací na nové dispozici parkoviště je do 30. dubna 2022, následně bude projekt předán k vyjádření dotčeným orgánům/organizacím státní a místní správy a po obdržení stanovisek postoupen ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení. Předpokládaná lhůta projednání projektu ze strany státní a místní správy a dotčených organizací je 1 měsíc za předpokladu, že nikdo z uvedených dotčených nebude požadovat zásadní změny v projektu (což nelze předjímat), tj. 31. května.


Následně bude vedeno stavební a územní řízení, které v případě bezproblémového průběhu (tzn. nikdo z dotčených projektem projekt nenapadne) bude zakončeno vydáním stavebního povolení (předp. 30. června)


Lhůty, které nemohu ovlivnit jsou uvedeny jako předpokládané.


Děkuji


Ing. Petr Kaplan

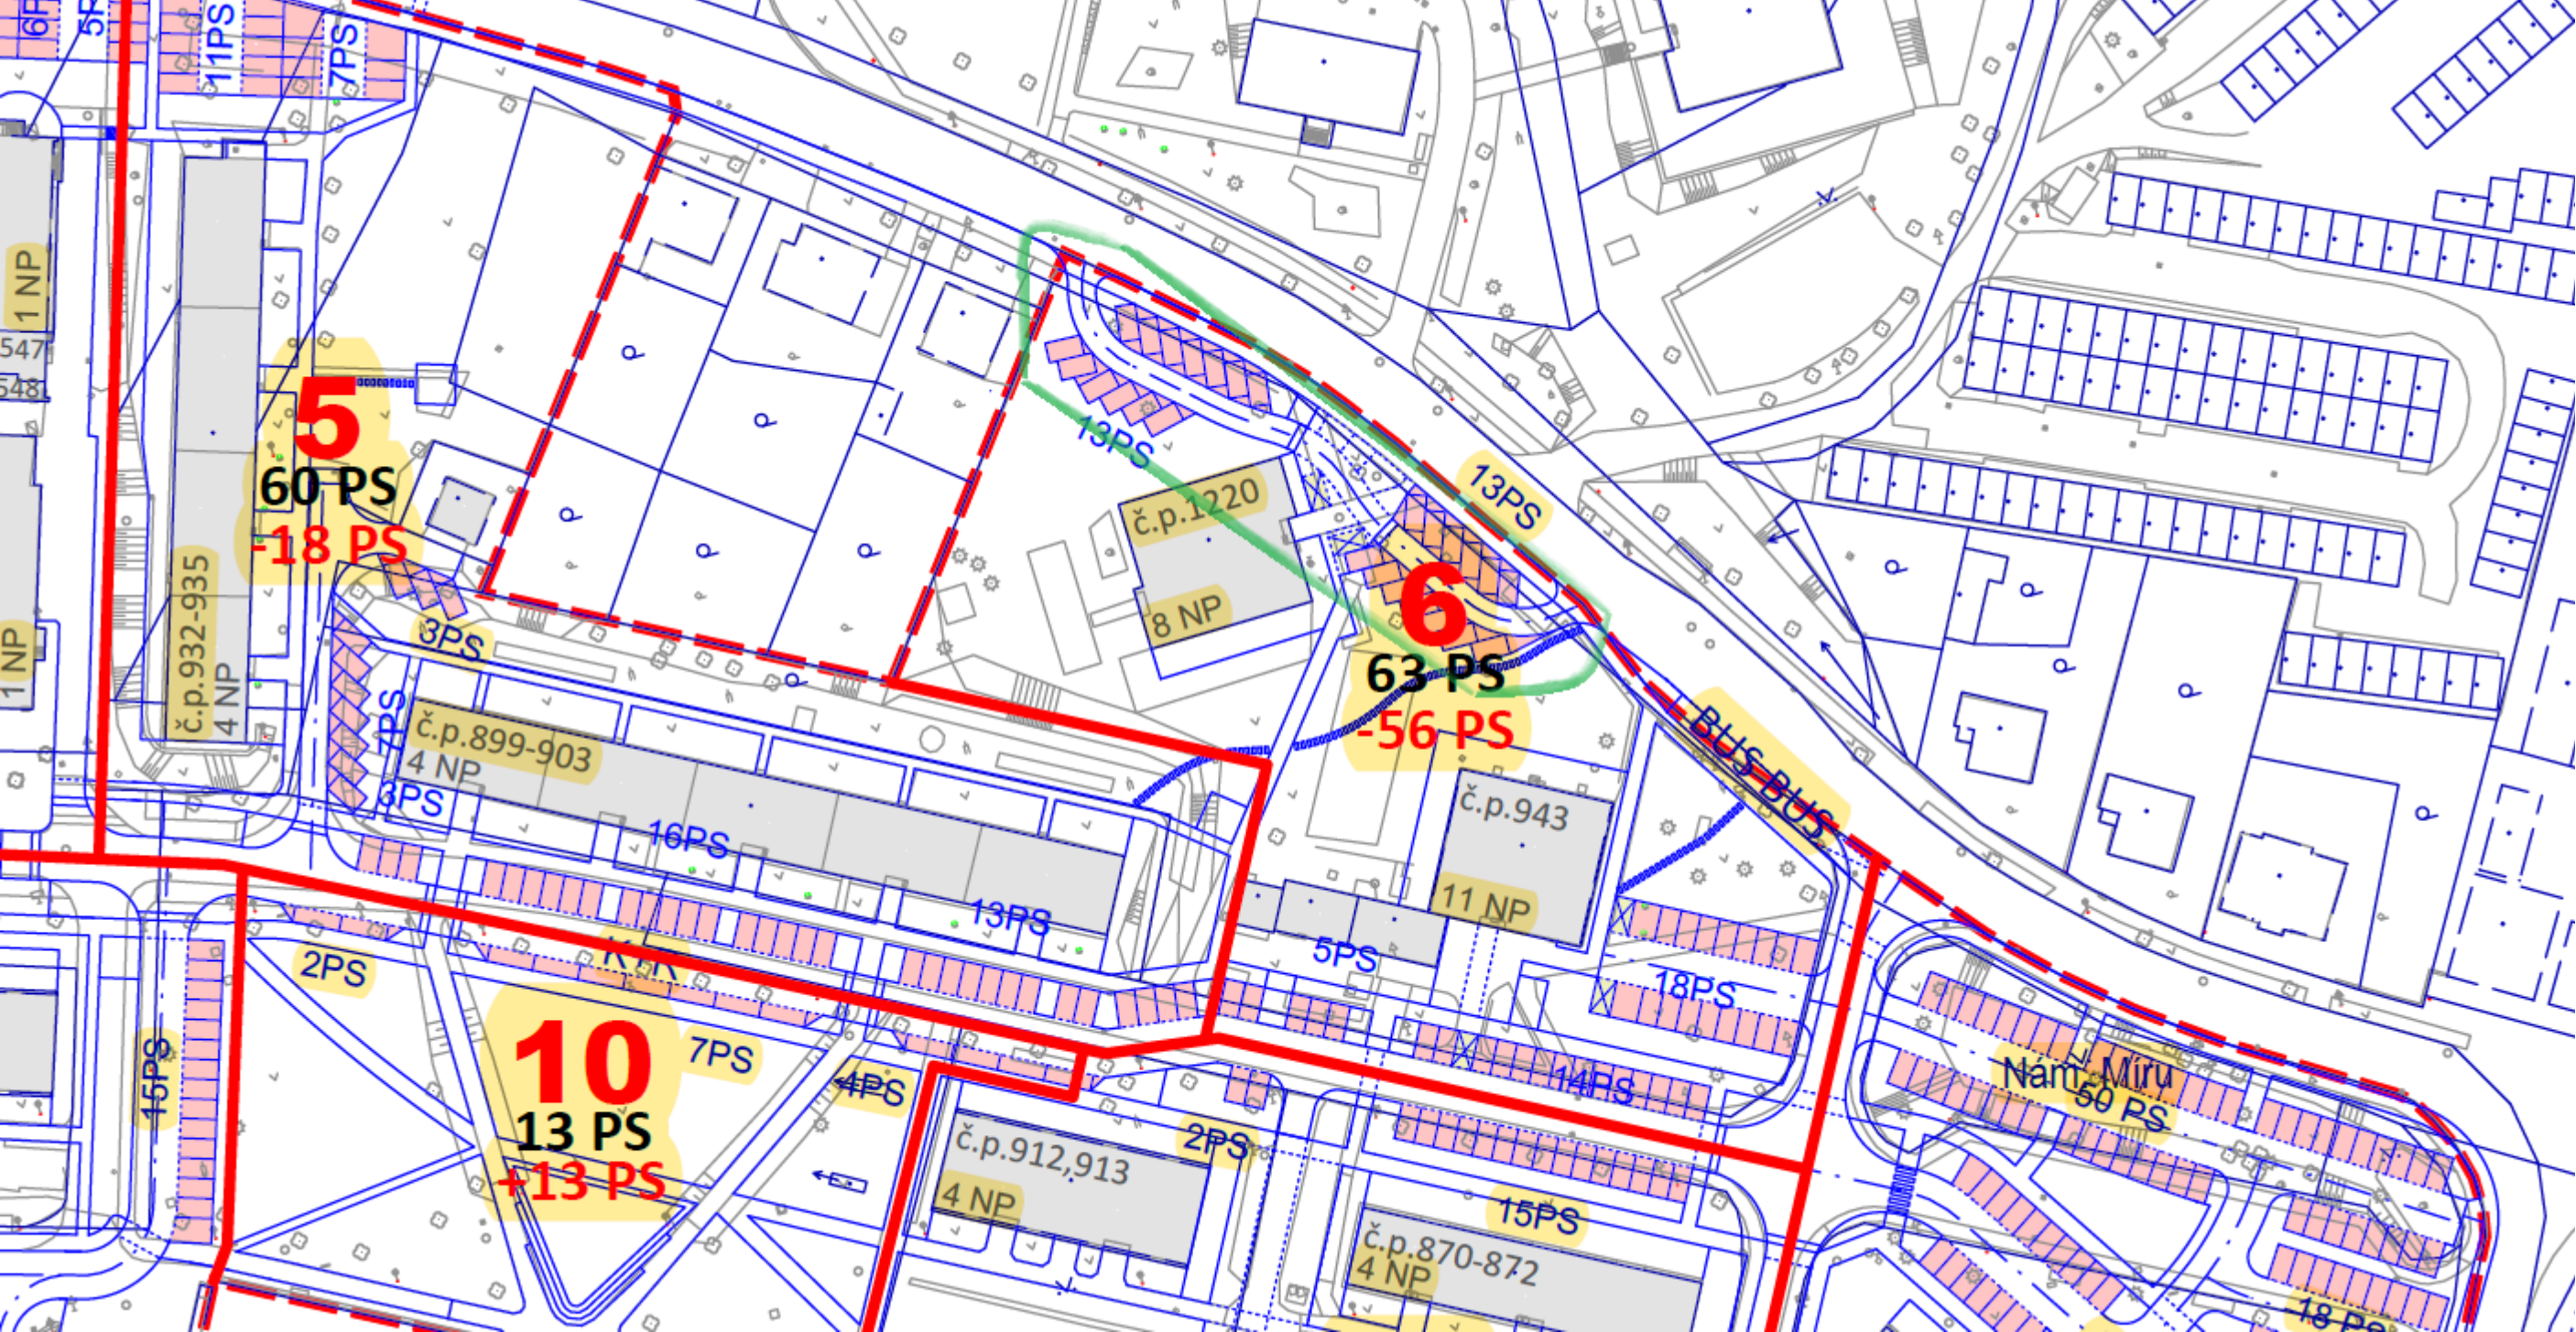

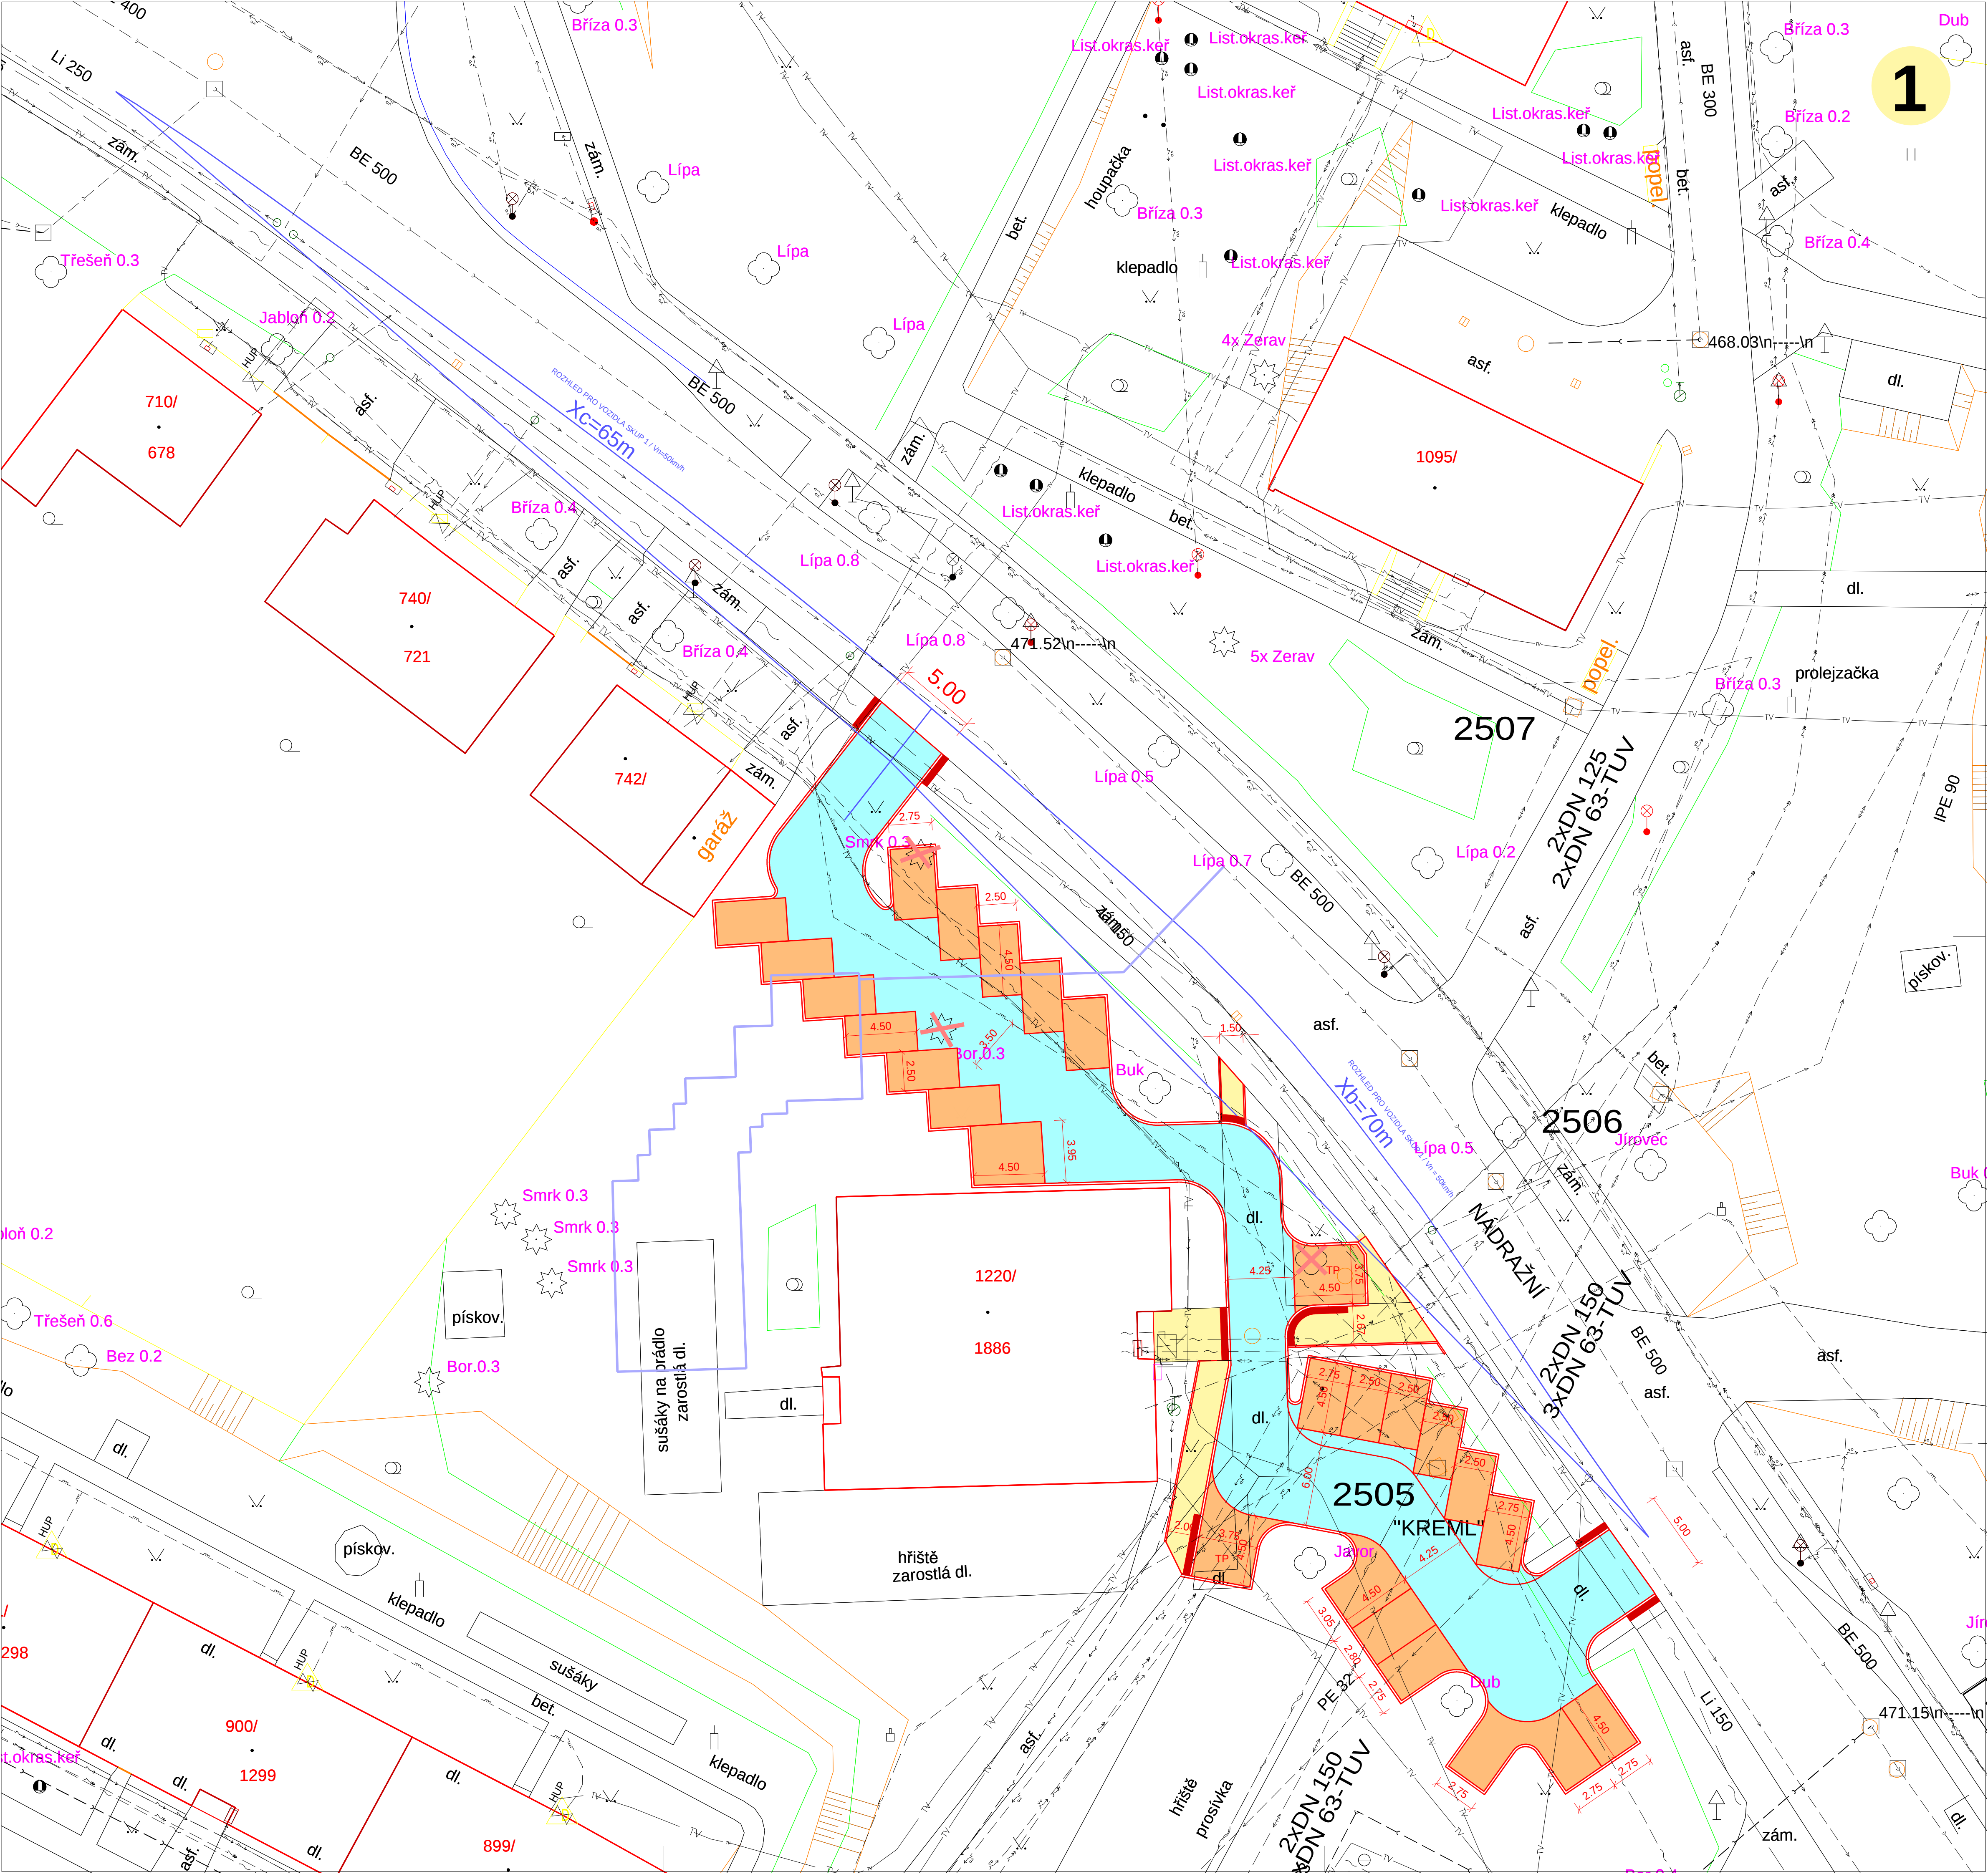

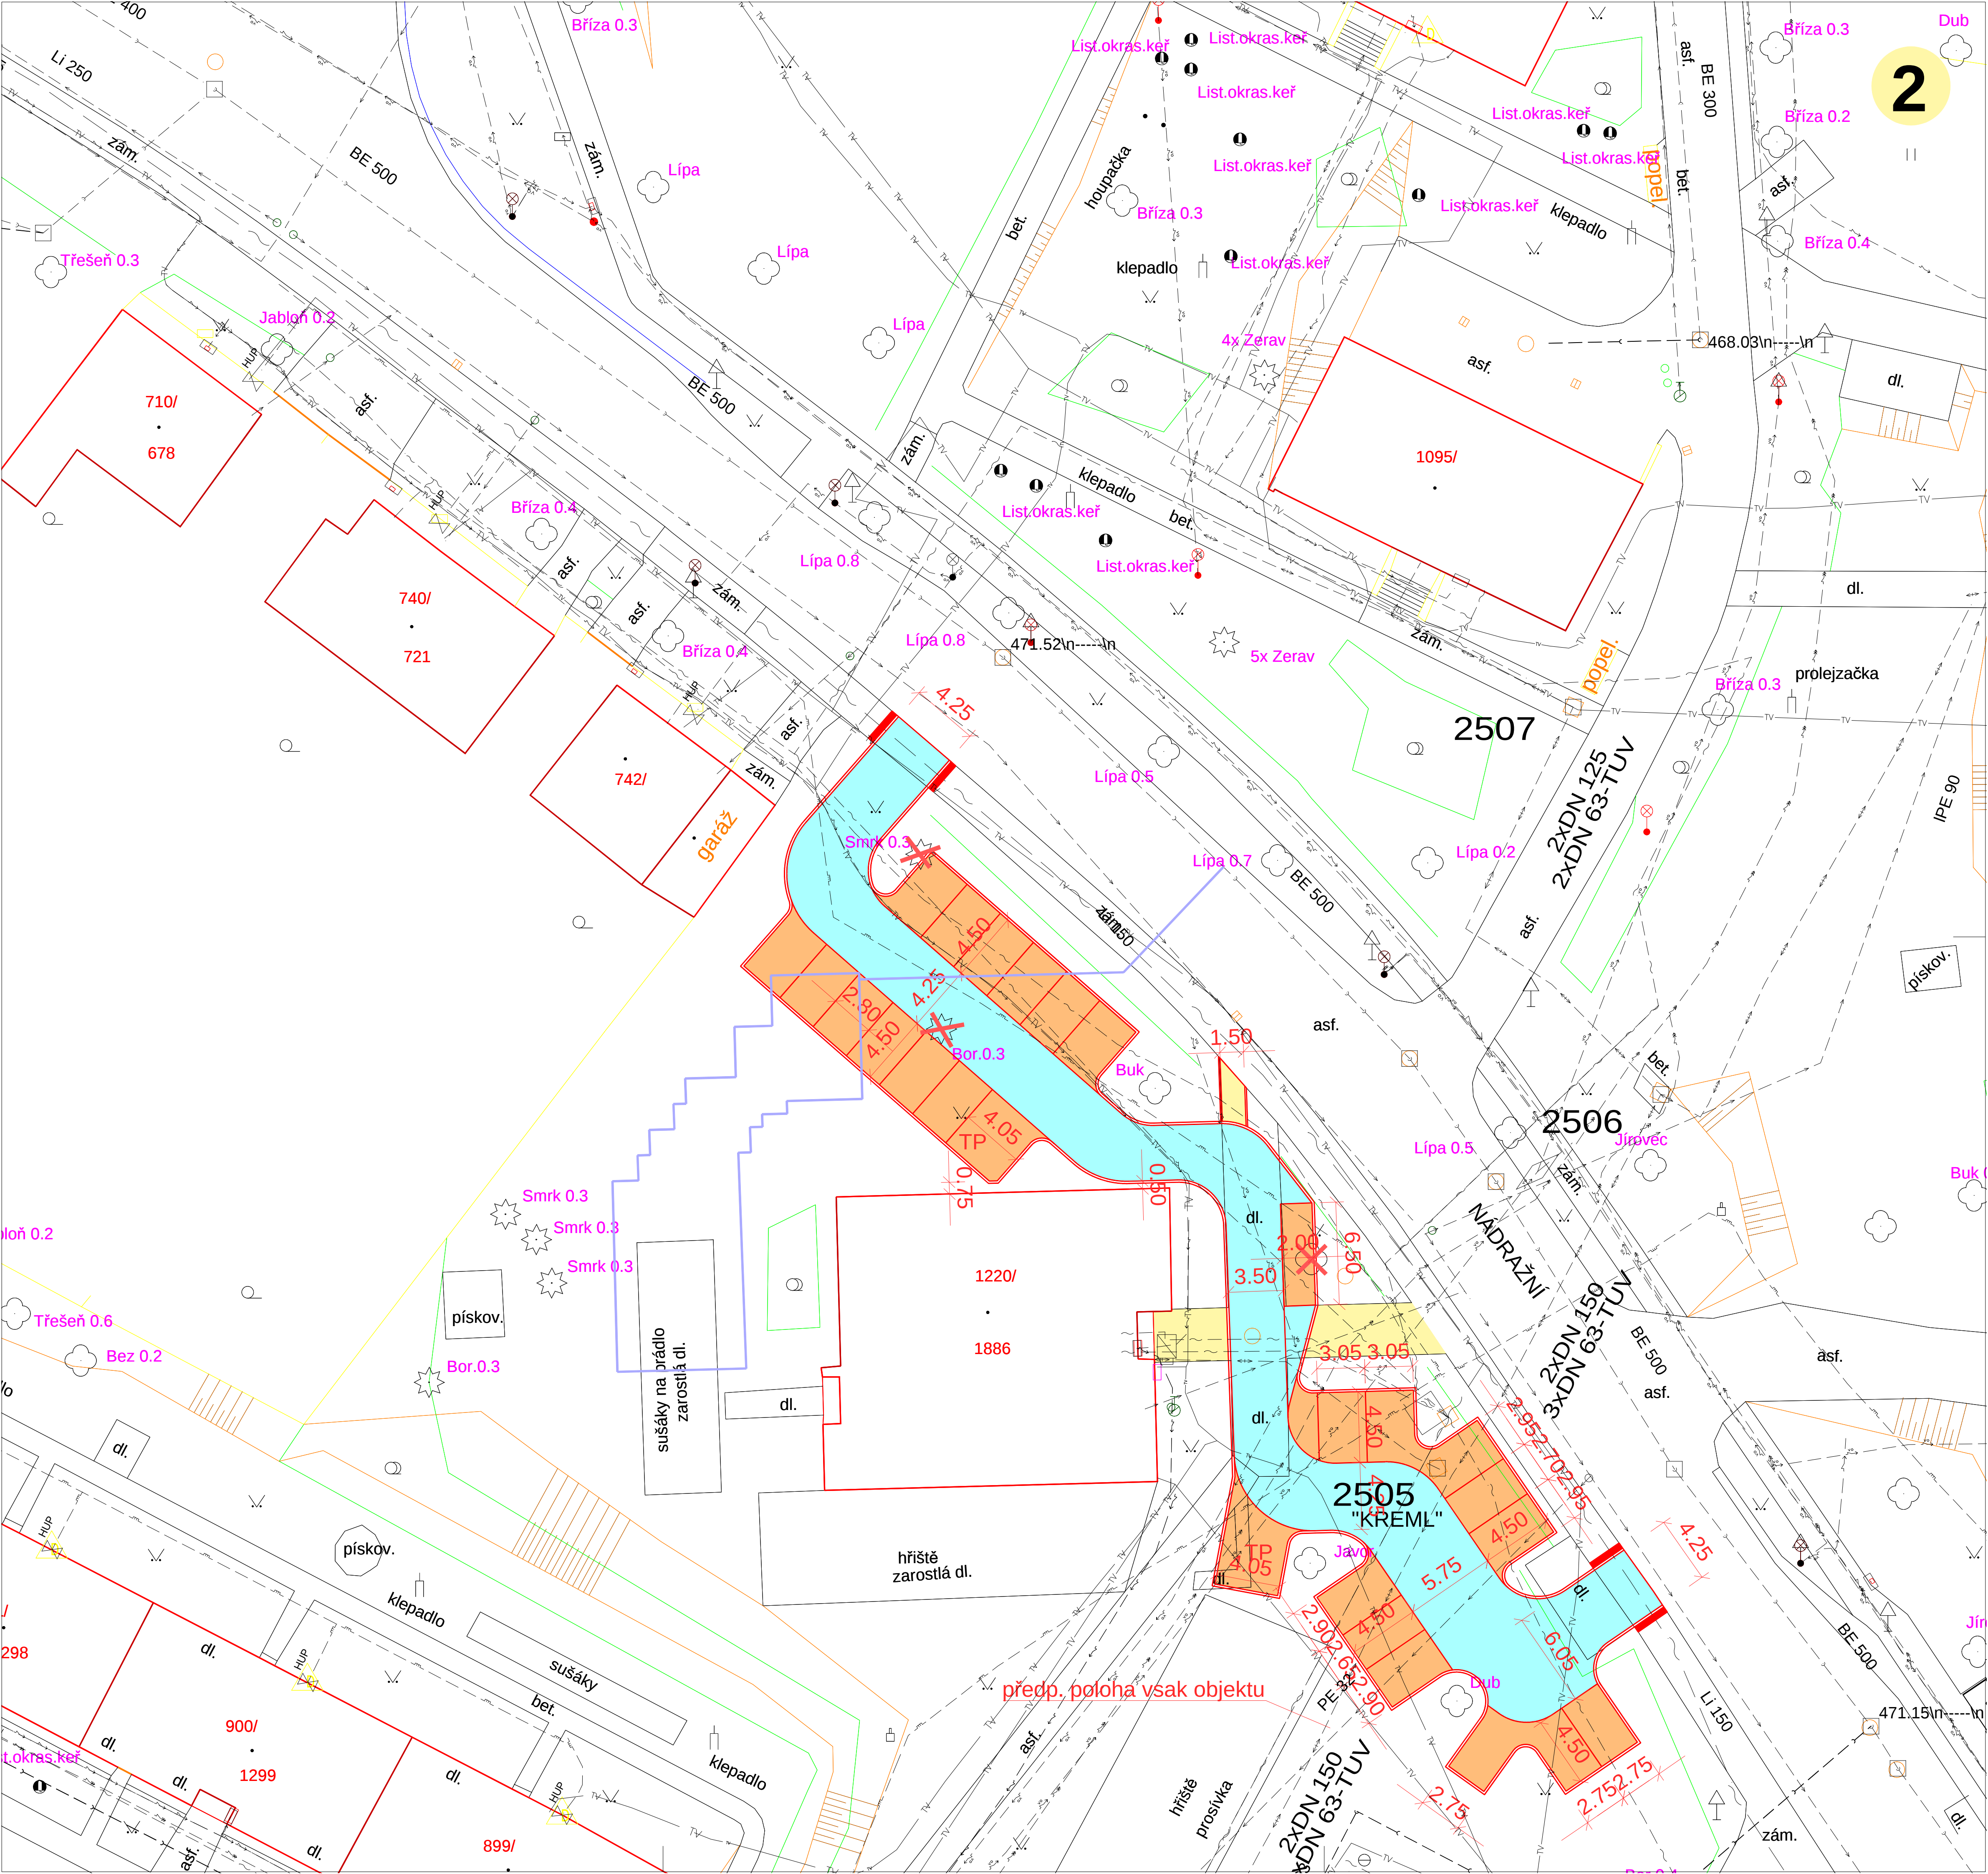


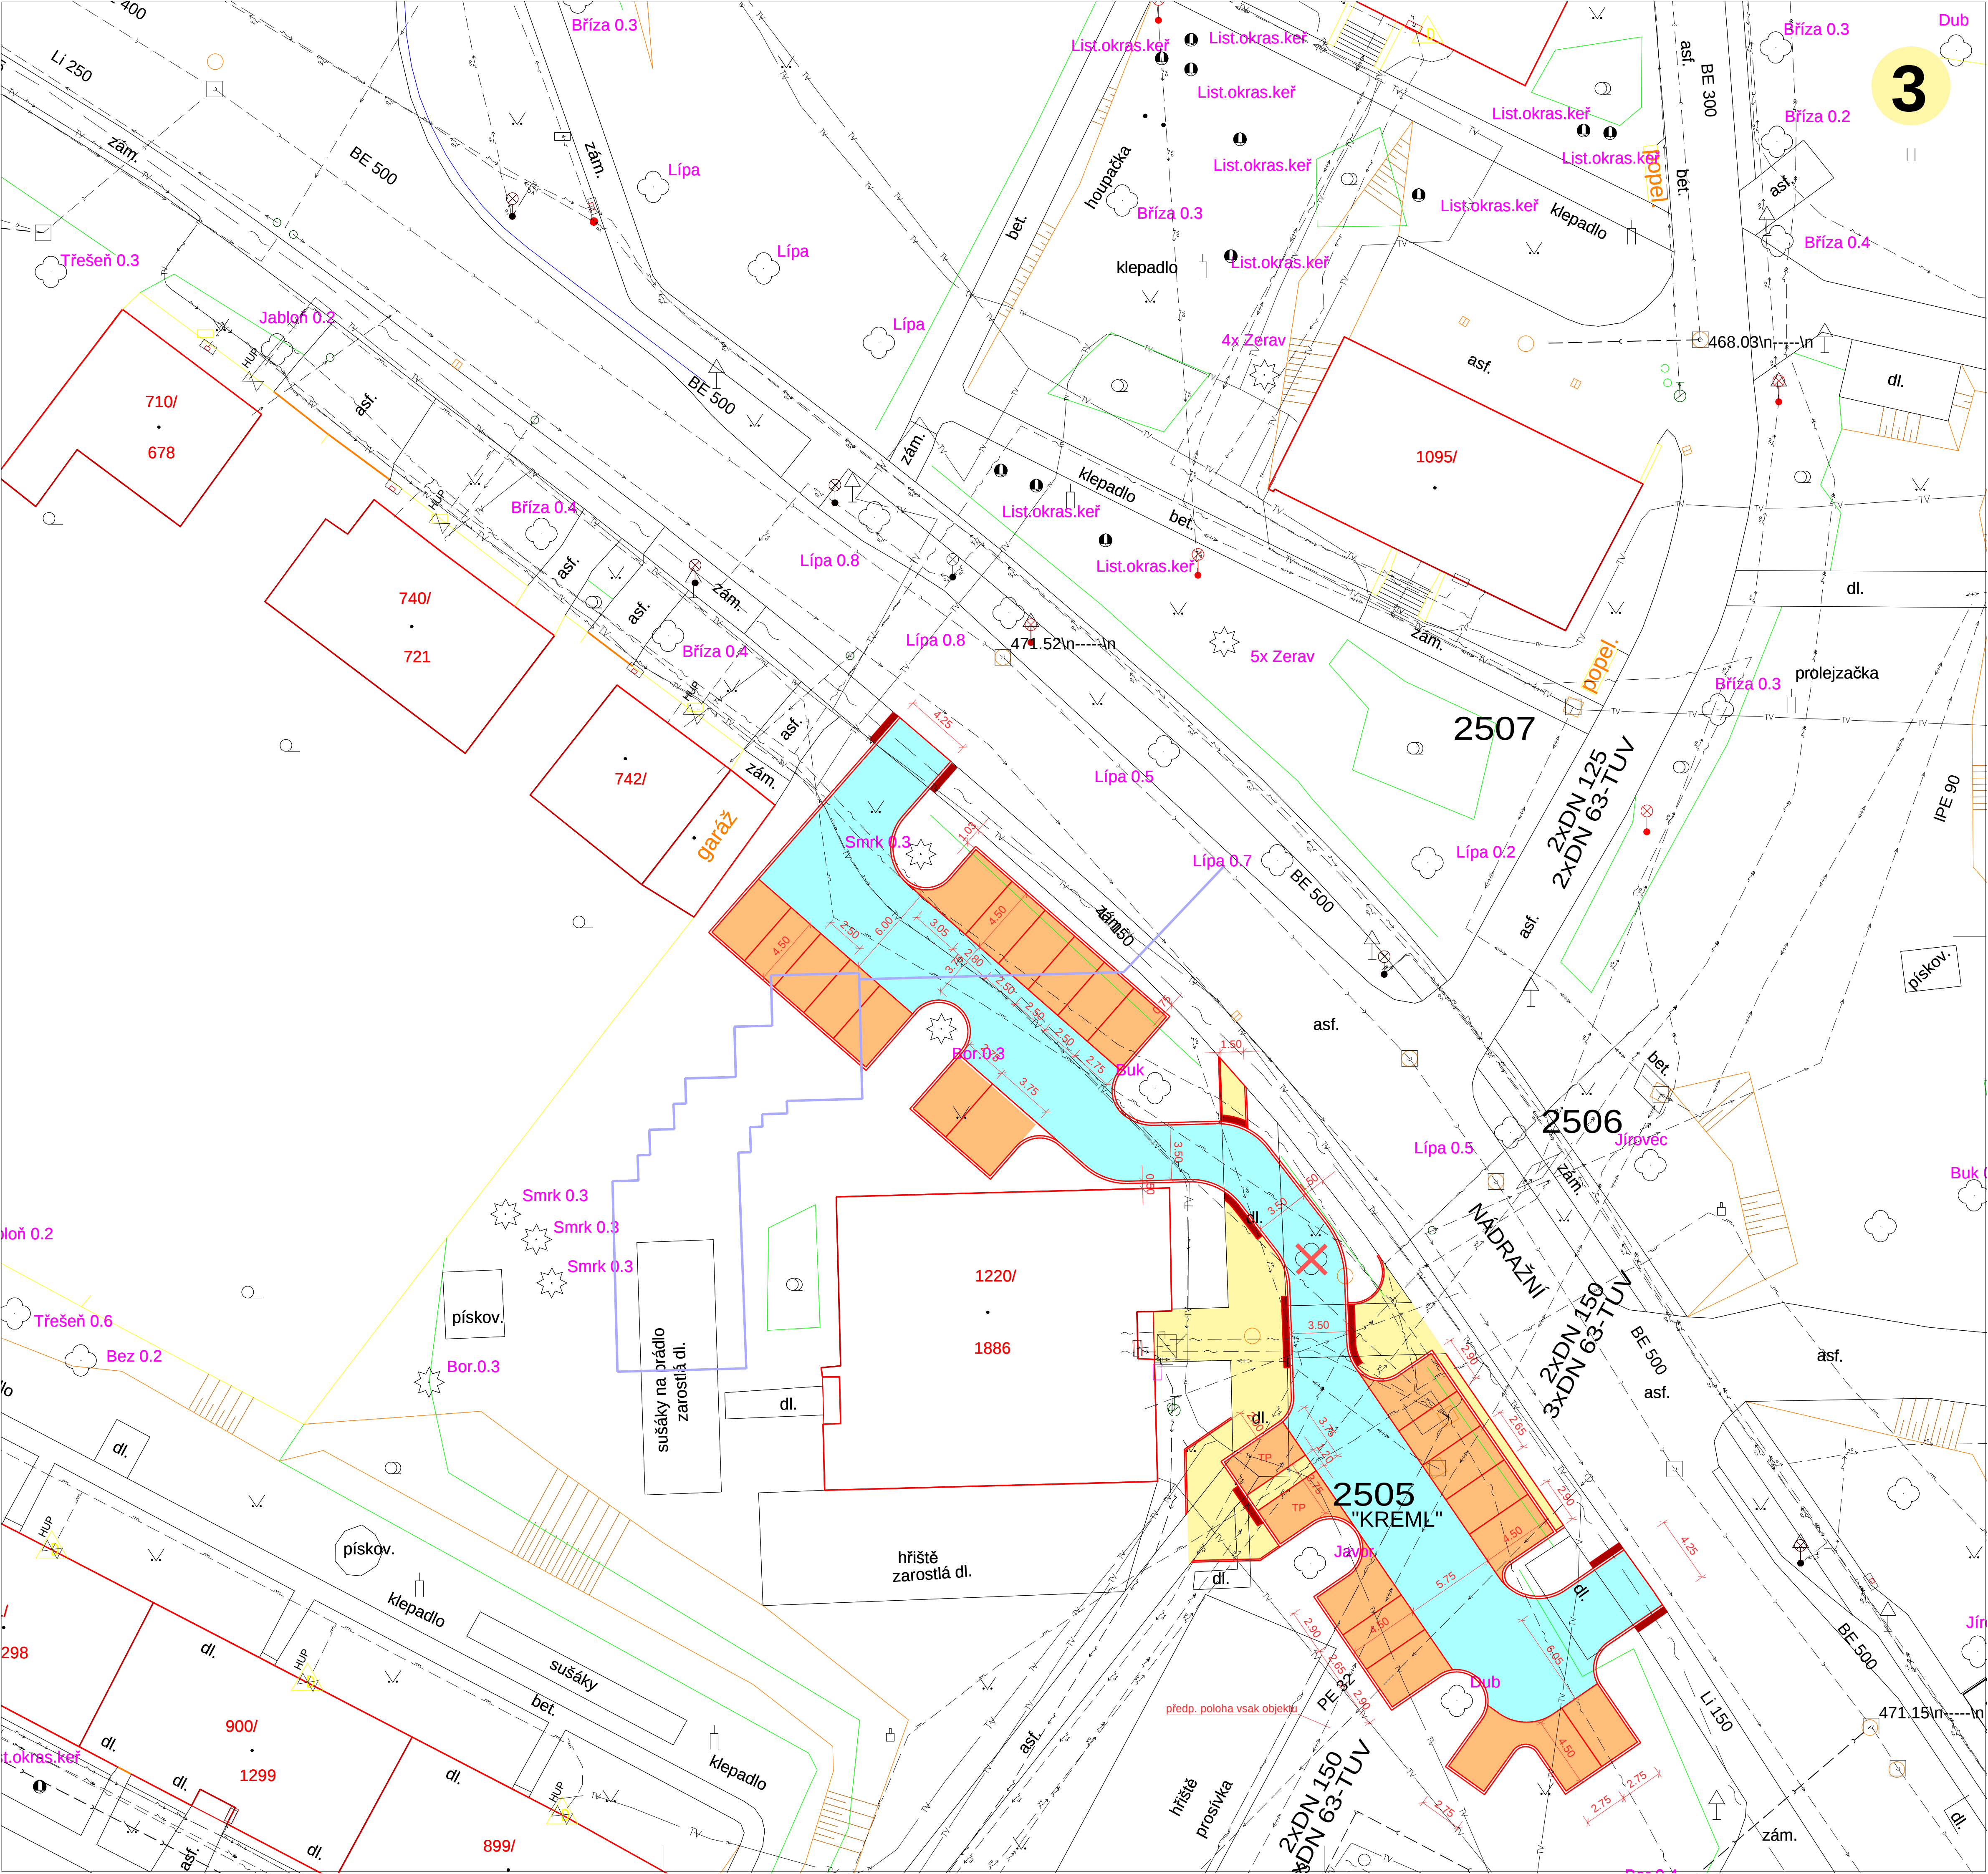


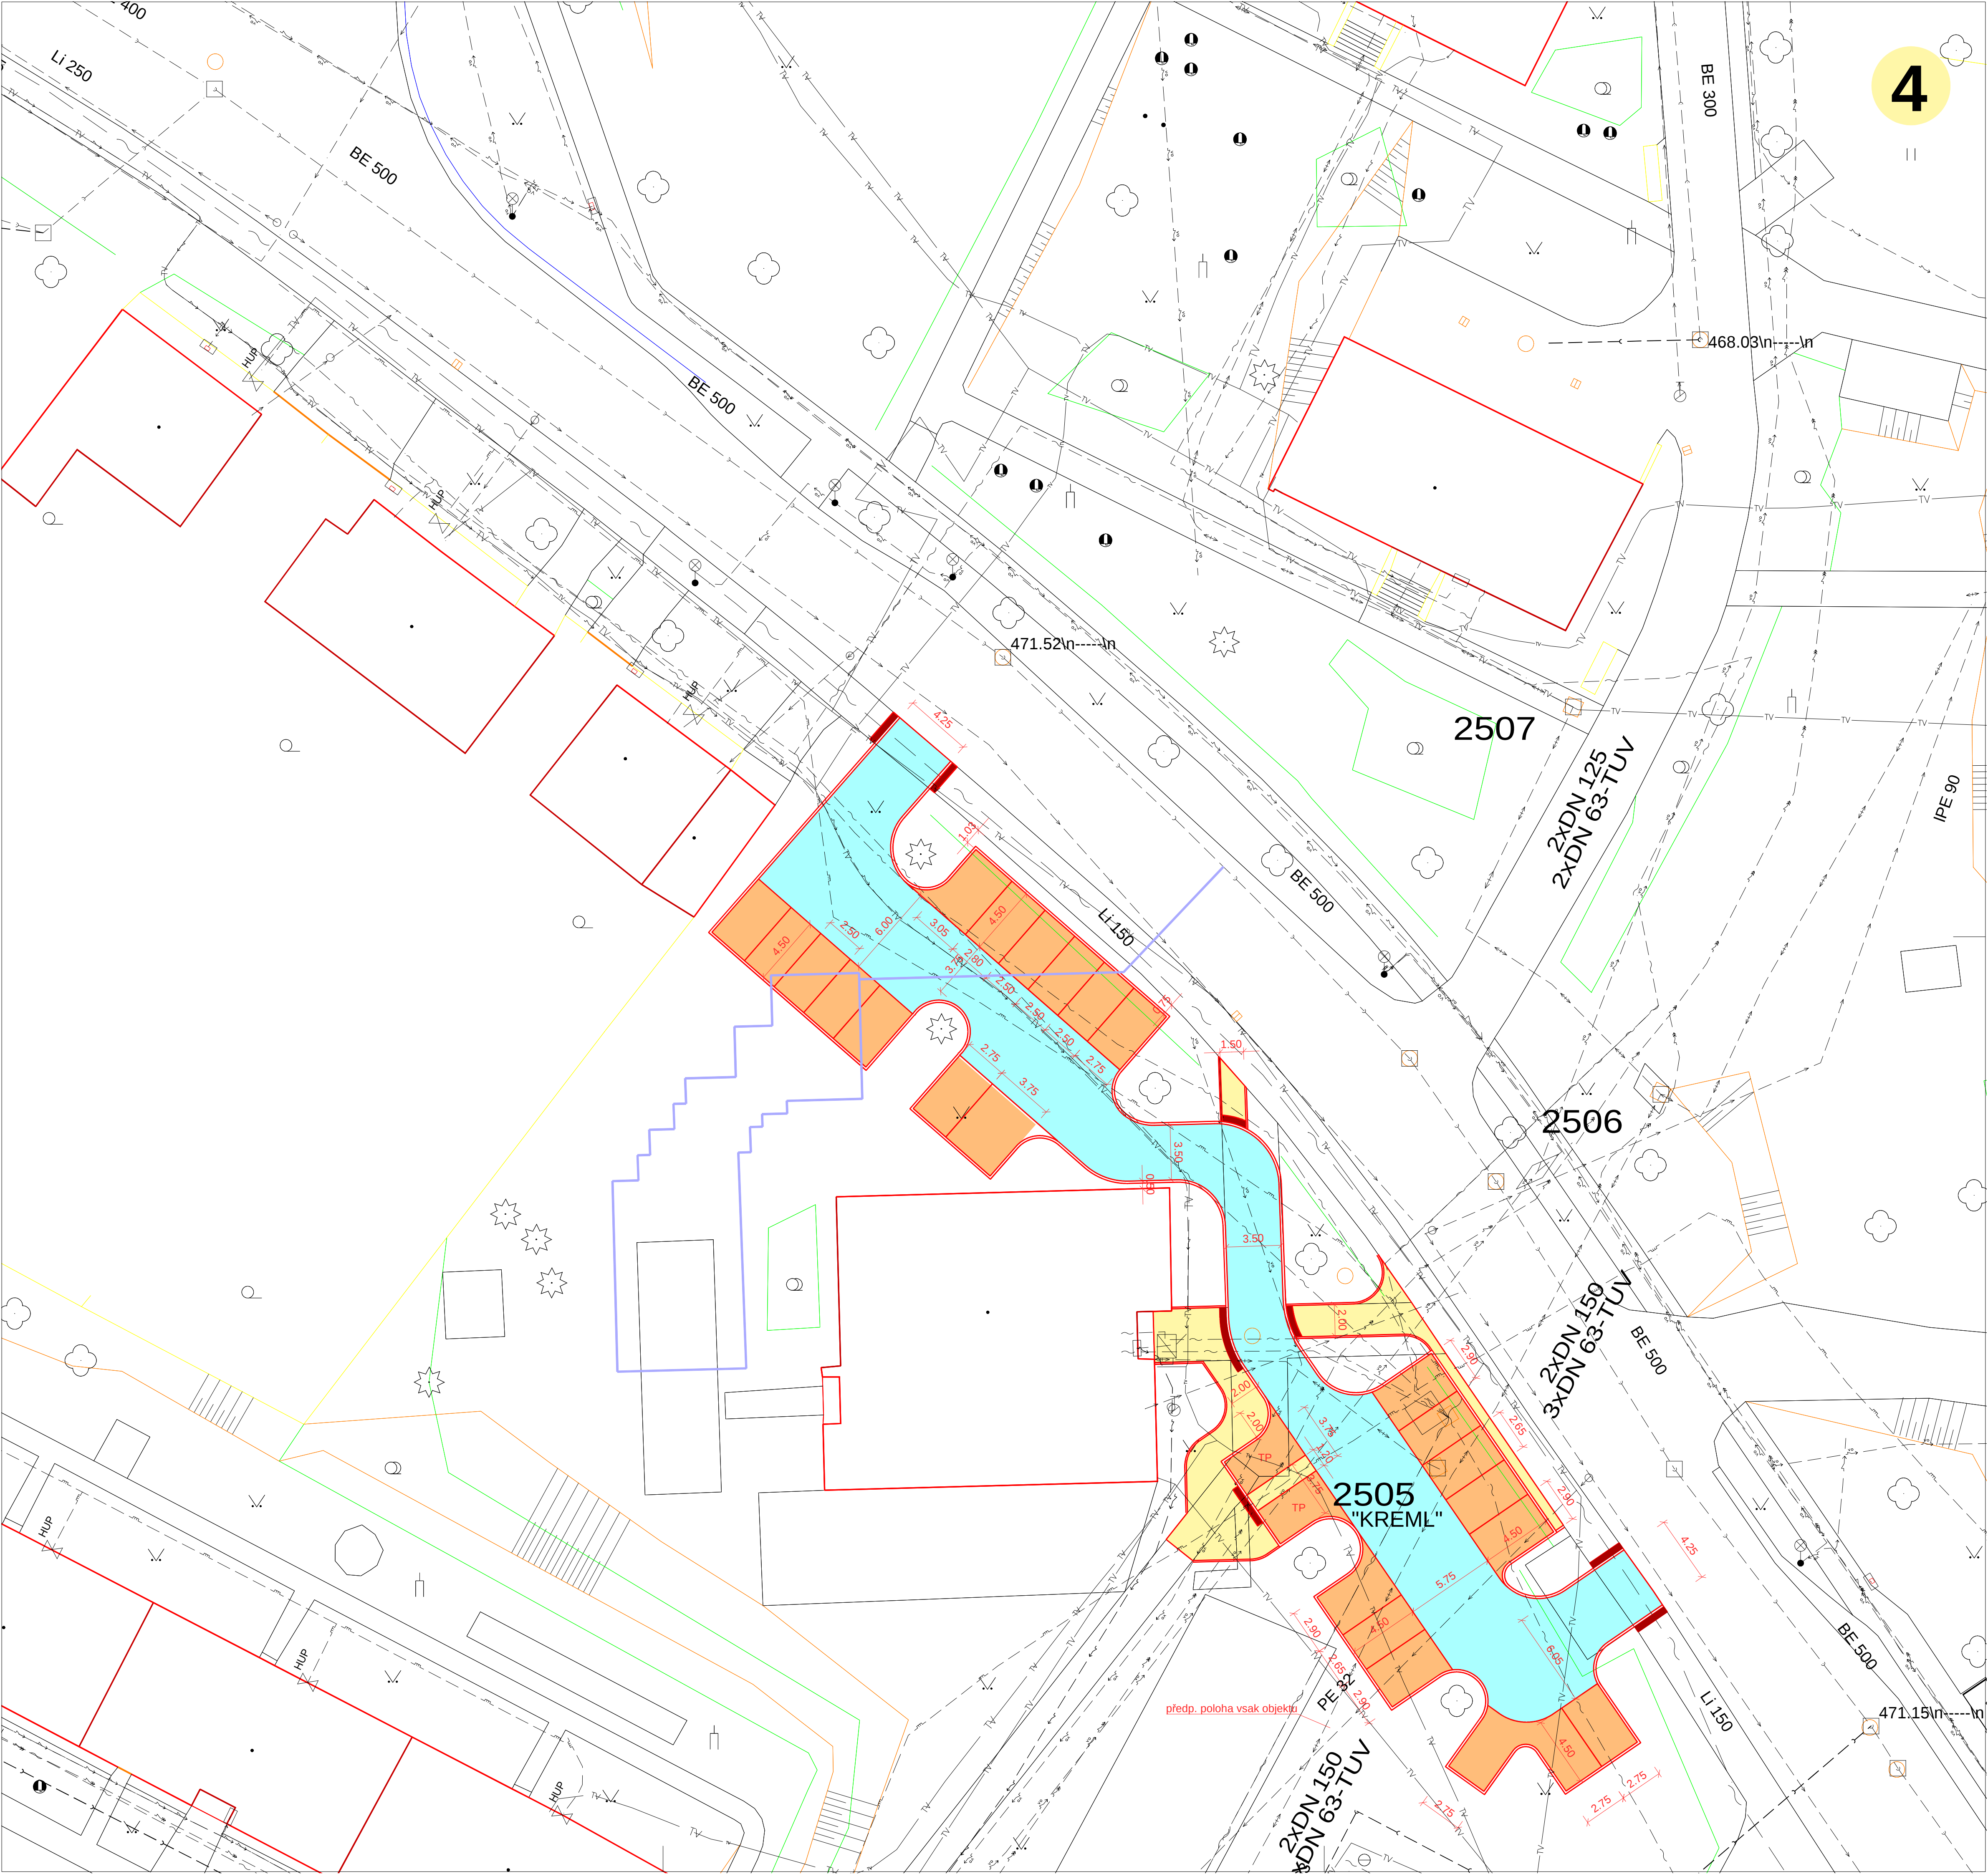

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU LOKALITY "U VĚŽÁKU"

NAVRHOVANÁ VARIANTA M 1:500

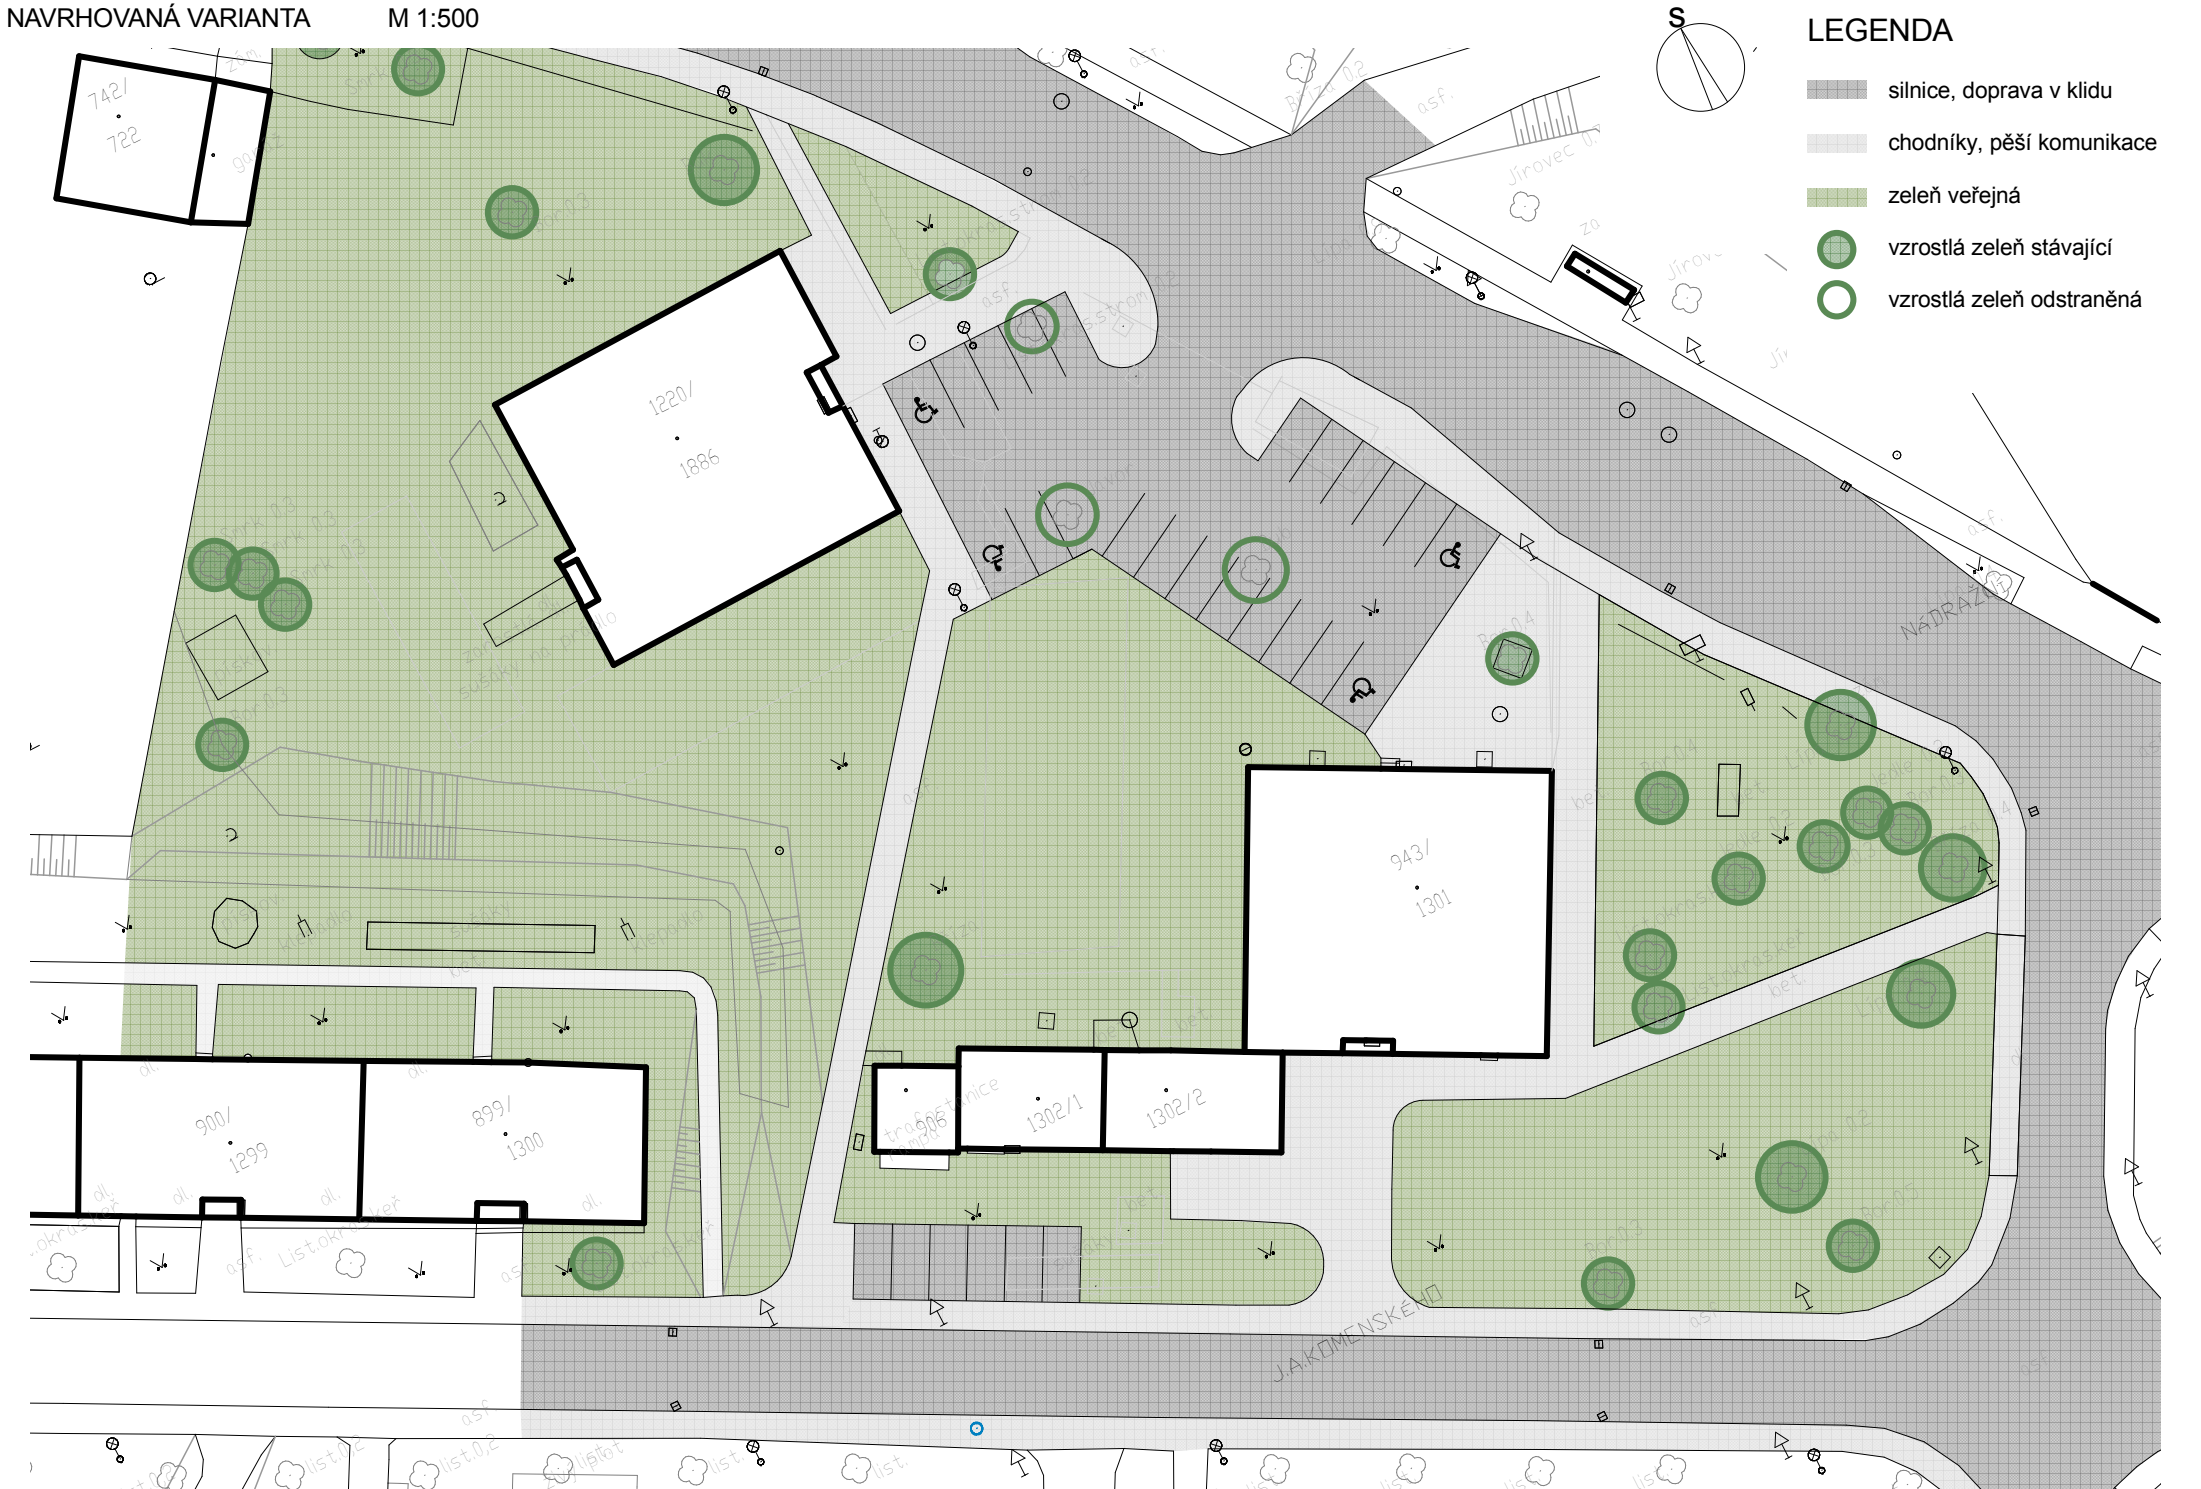

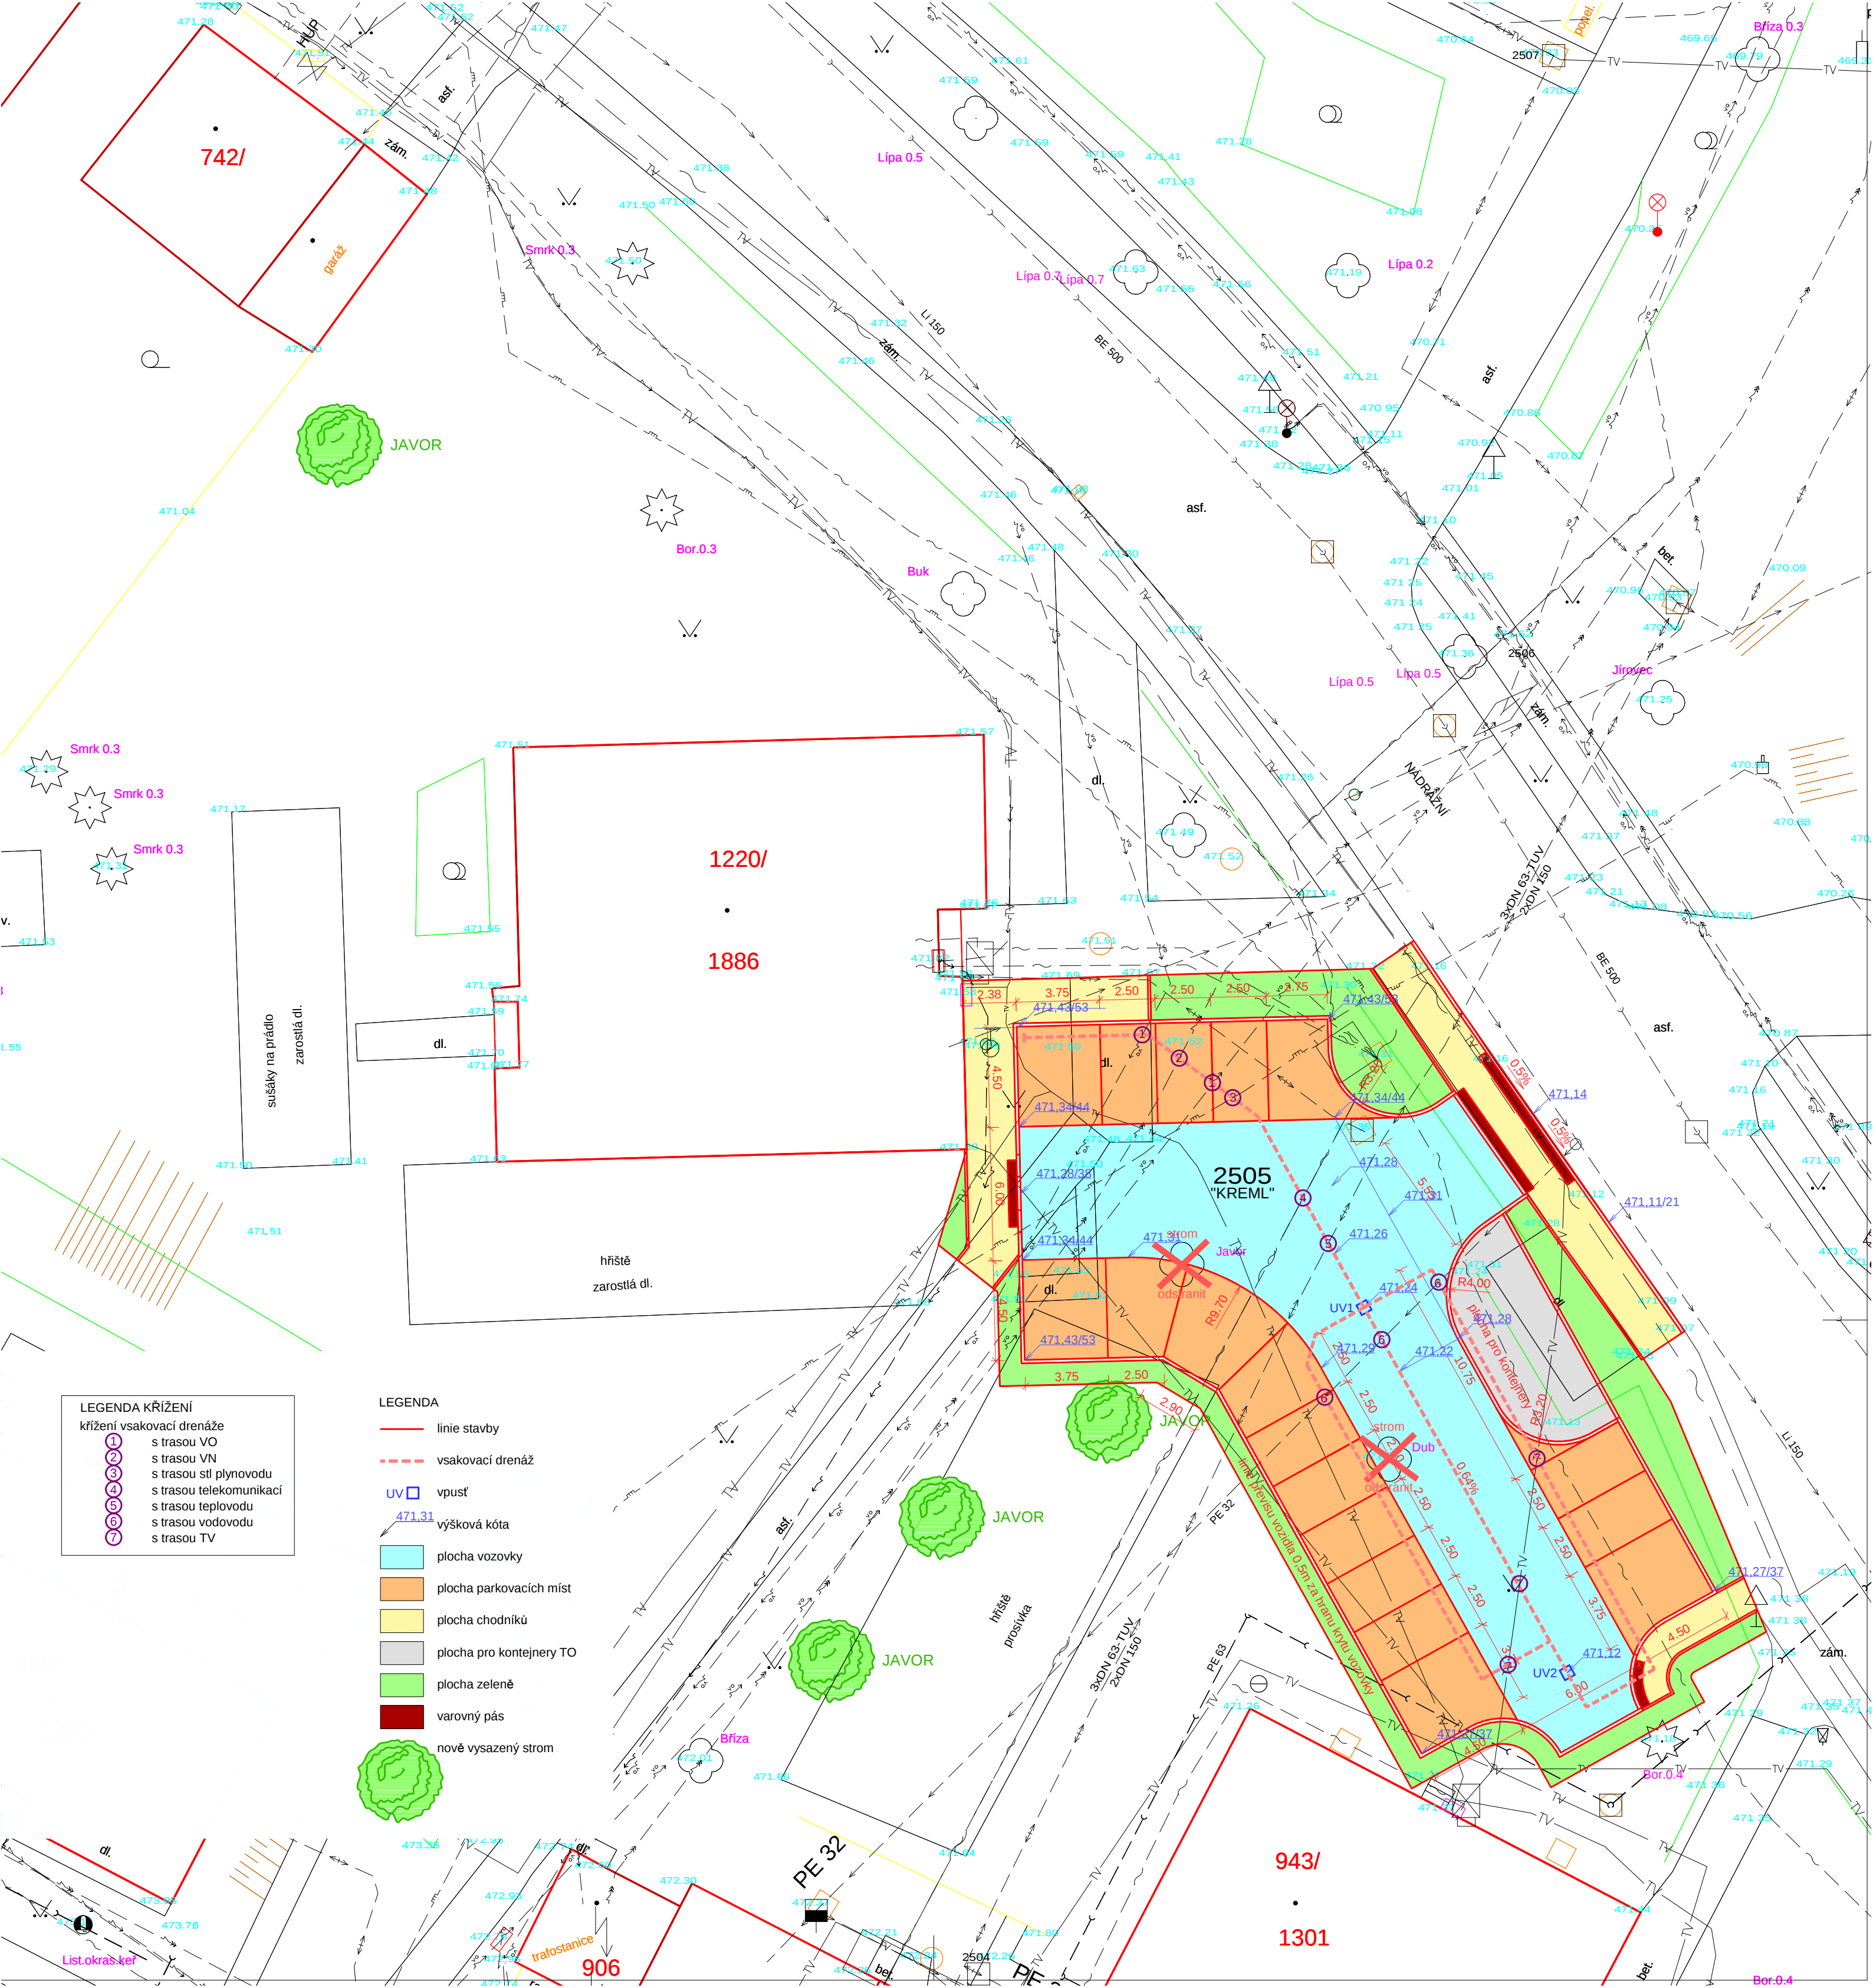

LEGENDA KŘÍŽENÍ
křížení vsakovací drenáže

- 1 s trasou VO
- 2 s trasou VN
- 3 s trasou stl plynovodu
- 4 s trasou telekomunikací
- 5 s trasou teplovodu
- 6 s trasou vodovodu
- 7 s trasou TV

LEGENDA

- linie stavby
- - - vsakovací drenáž
- UV □ vpust
- 471.31 výšková kóta
- plocha vozovky
- plocha parkovacích míst
- plocha chodníků
- plocha pro kontejnery TO
- plocha zeleně
- varovný pás
- nově vysazený strom

ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU LOKALITY "U VĚŽÁKU"
UPRAVENÁ VERZE K PROJEDNÁNÍ



LEGENDA

- silnice, doprava v klidu
- chodníky, pěší komunikace
- zeleň veřejná
- vzrostlá zeleň stávající
- vzrostlá zeleň odstraněná
- liniová zeleň nízká stávající
- vzrostlá zeleň navrhovaná



