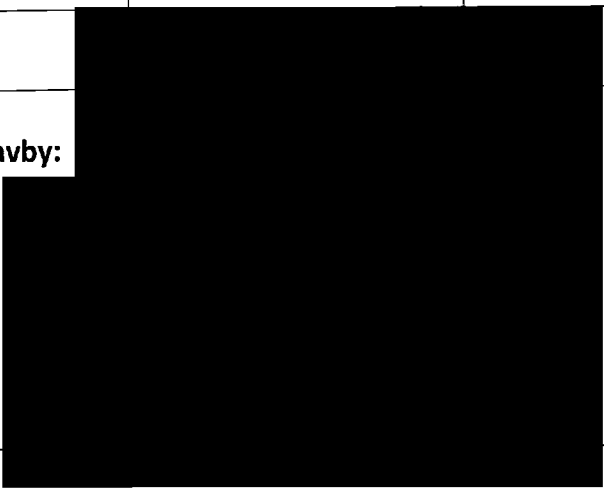



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	17.1.2021	
Předmět změny: Úprava otopného systému v kotelně Popis a zdůvodnění změny: Doplnění regulačních prvků (ventily, čerpadla, čidla) a úprava zapojení systému na základě zadání objednatele.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	167 950,19	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
167 950,19	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 21.2.2022	Datum: 21.2.2022 	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.		
Investor:	MOb Krásné Pole	Datum: 17.1.2022	
Název akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úprava otopného systému v kotelně Popis: Doplnění regulačních prvků (ventily, čerpadla, čidla) a úprava zapojení systému. Zdůvodnění změny: Změna se provádí na základě žádosti a zadání objednatele. Důvodem je úprava regulace topných okruhů. Kotelna totiž kromě školy vytápí i sportovní halu.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			

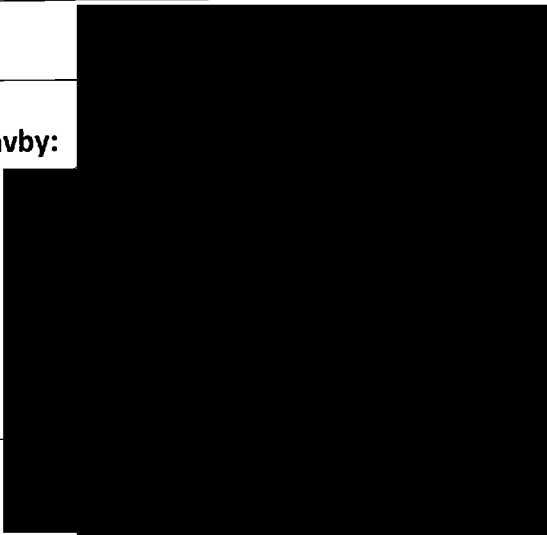
ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	17.1.2022	
Předmět změny: Vybourání stávající šachty, výkop pro novou kanalizaci, napojení a pokládka nové kanalizace Popis a zdůvodnění změny: z důvodu havarijního stavu kanalizace bude odbourána stávající šachtice před novou částí objektu a nahrazena novou plastovou kanalizační šachtou. Dále bude provedena kanalizace pod objektem přístřešku napojená na stávající kanalizační šachtici před objektem školy		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	76 884,23	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
76 884,23	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 21.2.2022	Datum: 21.2.2022	


OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.		
Investor:	MOB Krásné Pole	Datum: 17.1.2022	
Název akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nová kanalizace z uliční strany budovy Popis: Vybourání stávající šachty, výkop pro novou kanalizaci, napojení a pokládka nové kanalizace Zdůvodnění změny: z důvodu havarijního stavu kanalizace bude odbourána stávající šachtice před novou částí objektu a nahrazena novou plastovou kanalizační šachtou. Dále bude provedena kanalizace pod objektem přístřešku napojená na stávající kanalizační šachtici před objektem školy			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	17.1.2022	
Předmět změny: Provedení obnovy ležatého páteřního rozvodu teplé, studené, cirkulační a požární vody v 1.NP – propojení učebnového pavilonu s kuchyní a tělocvičnou. Popis: Plastové vodovodní potrubí, ocelové hydrantové potrubí, pěnová tepelná izolace, podpurné žlaby Zdůvodnění změny: chybné výměry v rozpočtu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	104 333,93	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
104 333,93	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 21.2.2022	Datum: 21.2.2022	

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.			
Investor:	MOB Krásné Pole	Datum: 17.1.2022		
Název akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Provedení obnovy ležatého páteřního rozvodu teplé, studené, cirkulační a požární vody v 1.NP – propojení učebnového pavilonu s kuchyní a tělocvičnou. Popis: Plastové vodovodní potrubí, ocelové hydrantové potrubí, pěnová tepelná izolace, podpůrné žlaby Zdůvodnění změny: chybné výměry v rozpočtu				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha: Položkový rozpočet				


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	17.1.2022	
Předmět změny: doplnění elektroinstalace podle požadavků budoucího uživatele v souvislosti s koordinací s projekty IT a vybavením Popis: Zásuvkové obvody navíc, napájení rolet, příprava kabelových tras (husí krky), doplnění a rozšíření rozvaděčů Zdůvodnění změny: Na základě požadavku INV budou doplněny elektroinstalace pro budoucí projekty (IT, nábytek..)		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	105566,07	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
105566,07	<u>Prodloužení o 10 dnů</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 21.2.2022	Datum: 21.2.2022	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.		
Investor:	MOB Krásné Pole	Datum: 11.2.2022	
Název akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: doplnění elektroinstalace podle požadavků budoucího uživatele v souvislosti s koordinací s projekty IT a vybavením Popis: Zásuvkové obvody navíc, napájení rolet, příprava kabelových tras (husí krky), doplnění a rozšíření rozvaděčů Zdůvodnění změny: Na základě požadavku INV budou doplněny elektroinstalace pro budoucí projekty (IT, nábytek..)			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	17.1.2022	
Předmět změny: změna řešení zábradlí na schodištích z 1.PP do vestibulu a z vestibulu do 1.NP, uzavření prostoru pod schodištěm z vestibulu do 1.NP Zdůvodnění změny: zábradlí Z12 a Z13 nebudou dodána a osazena, jejich funkci zastanou upravená pojezdová konstrukce schodišťových plošin Z15 a Z16. Osazení truhlářské stěny pod schodiště z vestibulu do 1.NP.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	67560,42	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-31223,58	<u>Bez vlivu</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 21.2.2022	Datum: 21.2.2022	

OZNÁMENÍ ZMĚNY			číslo OZ: 12	
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.			
Investor:	MOB Krásné Pole	Datum: 11.2.2022		
Název akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
		osobně ☒		
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: změna řešení zábradlí na schodištích z 1.PP do vestibulu a z vestibulu do 1.NP, uzavření prostoru pod schodištěm z vestibulu do 1.NP Zdůvodnění změny: zábradlí Z12 a Z13 nebudou dodána a osazena, jejich funkci zastanou upravená pojezdová konstrukce schodišťových plošin Z15 a Z16. Osazení truhlářské stěny pod schodiště z vestibulu do 1.NP.				
Počet připojených listů specifikací:		3		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Stanovisko projektanta stavby:				
Příloha: Položkový rozpočet				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	17.1.2022	
Předmět změny: doplnění odpadního potrubí pro odvod kondenzátu z rekuperační jednotky Popis: odvodní odpadní potrubí mezi rekuperační jednotkou a kanalizační stupačkou K1 v m.č. 2.05		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
	7196,82	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7196,82	Bez vlivu	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 21.2.2022	Datum: 21.2.2022	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 13	
Zhotovitel:	Stavos Stavba a.s.		
Investor:	MOB Krásné Pole	Datum: 11.2.2022	
Název akce: ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI, PŘÍSTAVBA DVOU SPECIALIZOVANÝCH TŘÍD A REKONSTRUKCE PRO POLYTECHNICKOU VÝUKU V ZŠ V KRÁSNÉM POLI			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: doplnění odpadního potrubí pro odvod kondenzátu z rekuperační jednotky Popis: odvodní odpadní potrubí mezi rekuperační jednotkou a kanalizační stupačkou K1 v m.č. 2.05 Zdůvodnění změny: v části ZTI potrubí neobsaženo			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Příloha: Položkový rozpočet			
