

490/22
(2945/21)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 28. 12. 2021

Revitherm s.r.o.

se sídlem: Marešova 643/6, 198 00 Praha 9
IČO: 24198820
DIČ: CZ24198820
zastoupená: Martin Burreiter, jednatel společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187898
(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]
(dále jako „objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 12. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava prostorů výdejny stravy v Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk, v rozsahu cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě a to z důvodů vymezených víceprací dle přílohy č. 1 k dodatku.
3. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že stávající článek II odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je stanovena ve výši 751 913,52 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

II.


1. Jelikož se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický

obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.

3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Přílohy

- Příloha č. 1** – Předávací protokol ze dne 15. 2. 2022 vč:
Přílohy č. 1 předávacího protokolu – Výdejna stravy,
Přílohy č. 2 předávacího protokolu – práce nad rámec rozpočtu ze dne 19.1 2021

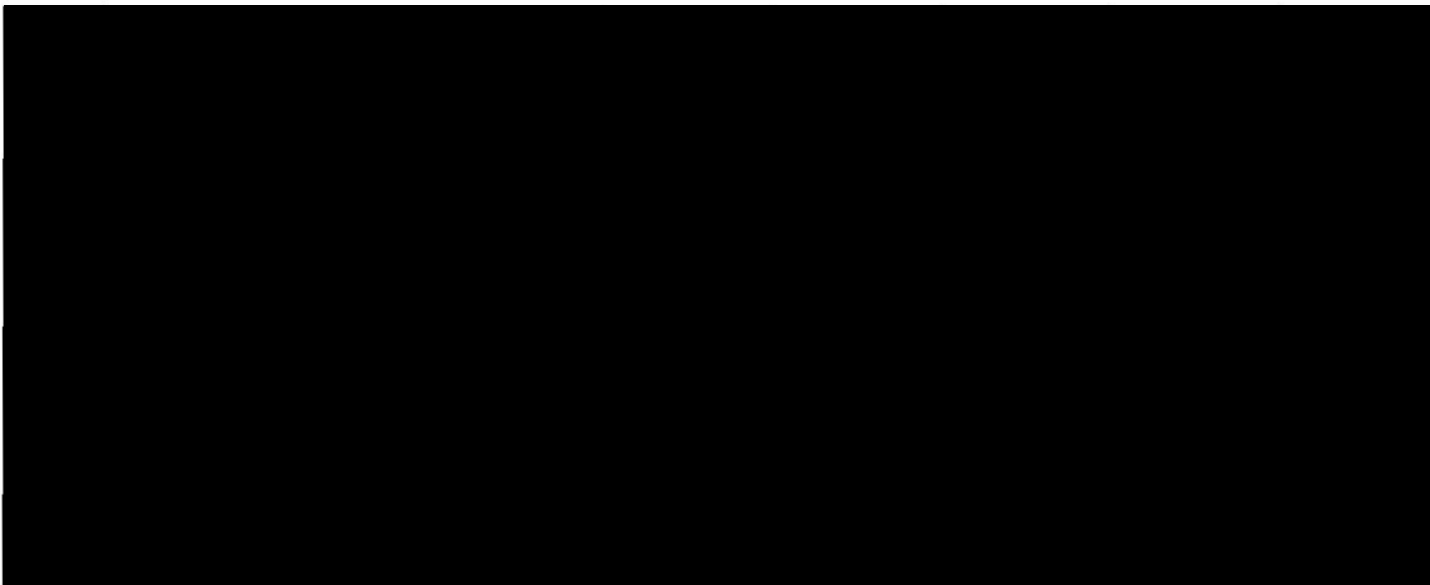

PŘEDÁVACÍ PROKOTOL

NÁZEV ZAKÁZKY: Výdejna stravy (6/OSUNRB/2021)

PŘEJÍMAJÍCÍ: Krajská zdravotní, a. s.
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Sídlo: Sociální péče 3316/13A, 401 13 Ústí nad Labem

PŘEDÁVAJÍCÍ: Revitherm s.r.o.
IČO: 24198820
DIČ: CZ24198820
Sídlo: Marešova 643/6, Praha

PŘEDMĚT PŘEDÁNÍ:

Oprava prostorů výdejny stravy v areálu nemocnice Rumburk (Pavilon I.), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk.

Převzato bez vad a nedodělků, se změnami a vícepracemi (viz. Přílohy č.1 a č.2 Předávacího protokolu).

Za Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o. z. – pracoviště Rumburk.

Příloha č. 1 předávacího protokolu – Výdejna stravy

Převzato s těmito změnami:

Kód	Cena	Popis změn
		Na návrh předávajícího byla místo repase dřevěných oken instalována nová plastová okna. Změna je bez vlivu na cenu za dílo. Souhlas přejímajícího.
		Odsouhlasené práce nad rámec rozpočtu – viz. příloha č.2

- K výdejně stravy bude dodána revizní zpráva k elektrotechnice s termínem do 18.2.2022.
- Dle smlouvy o dílo se zhotovitel (předávající) zavázal provést dílo do 21.1.2022 (článek III. Smlouvy), stavba byla předána 15.2.2022. Je třeba objektivně zkonstatovat, že předání bylo zpožděno přejímajícím o 10 dní z těchto důvodů: 5 dní – zpoždění podpisu smlouvy ze strany KZ, a.s. a 5 dní – upřesnění pozic zásuvek a světel ze strany KZ, a.s. Předání předávajícím se tedy zpozdilo o 6 pracovních dní.

Příloha č.2 předávacího protokolu PRÁCE NAD RÁMEC ROZPOČTU

Stavba: NEMRUM - Vzdělání lidí	Zpracoval: _____
Objekt: Nemocnice - Rumburk	Datum: 19.1.21
Objednatel: KZ, a.s.	
Zhotovitel: Revitherm s.r.o.	
Místo: a	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	34111030	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750L (CYKX) 3x1 5mm ²	bm	40,000		990,80
2	34111036	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750L (CYKX) 3x2 5mm ²	bm	100,000		4 046,00
3	34535015	Spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	ks	2,000		259,20
4	35622111	Jistič 1pólový-charakteristika B 16A	ks	3,000		514,08
5	35622109	Jistič 1pólový-charakteristika B 10A	ks	1,000		171,36
6	1	Instalační hlavní vypínač 80 A	ks	1,000		785,00
7	2	Jistič 80 A - 3pólový	ks	1,000		2 909,00
8	3	Propojovací lišta G-3L-1000/10C	m	2,000		996,00
9	4	Rozvodnice pod omítku ABB UK600 32M	m	1,000		1 498,00
10	5	Kabel instalační CYKY - J 5x16	m	6,000		1 630,00
11	6	Vodňe HOTV-LJ 4 žlutozelený	m	50,000		990,00
12	7	osazení a připojení elektrosvazdice	ks	1,000		9 500,00
13	8	montáž elektrosvodů	ks	1,000		12 560,00
14	9	dražkování kabelů	bm	90,000		8 100,00
15	10	Bourání betonové podlahy do tl. 100 mm + likvidace	m ²	6,000		3 600,00
16	11	Betonové mazaniny 60-100 mm - spádování	m ²	6,000		3 690,00
17	12	Vyroba a montáž ocelových úhelníků	ks	1,000		17 460,00
18	13	Havarijní oprava topení	ks	1,000		14 980,00
19	14	zásuvka interiérová 230V IP66	ks	2,000		1 330,00
20	15	revize elektroinstalace	ks	1,000		3 800,00
21	16	osazení rezez-kanálíku vč. Připojení na stávající kanalizační	ke	1,000		1 780,00

Celkem bez DPH - návrh Revitherm 92 369,44
Cena bez DPH po odeoutlaseení Jelinkem 27.1.2022 65 259,44
Cena bez DPH po odeoutlaseení Jelinkem 16.2.2022 82 719,44
