


Akce: **Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. etapa**

**ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM**

Podmíněné ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (předpokládaná doba zahájení 4.4.2022)  
 Zahájení prací: 240 dní od předání staveniště (28.11.2022)  
 Rozhodnutí o zkušebním provozu

1. uzelový bod  
 2. uzelový bod  
 3. uzelový bod  
 4. uzelový bod  
 5. uzelový bod  
 Specifikačních bodů s viz. List 1.2

19.06.2022  
 04.08.2022  
 05.10.2022  
 20.11.2022  
 28.11.2022

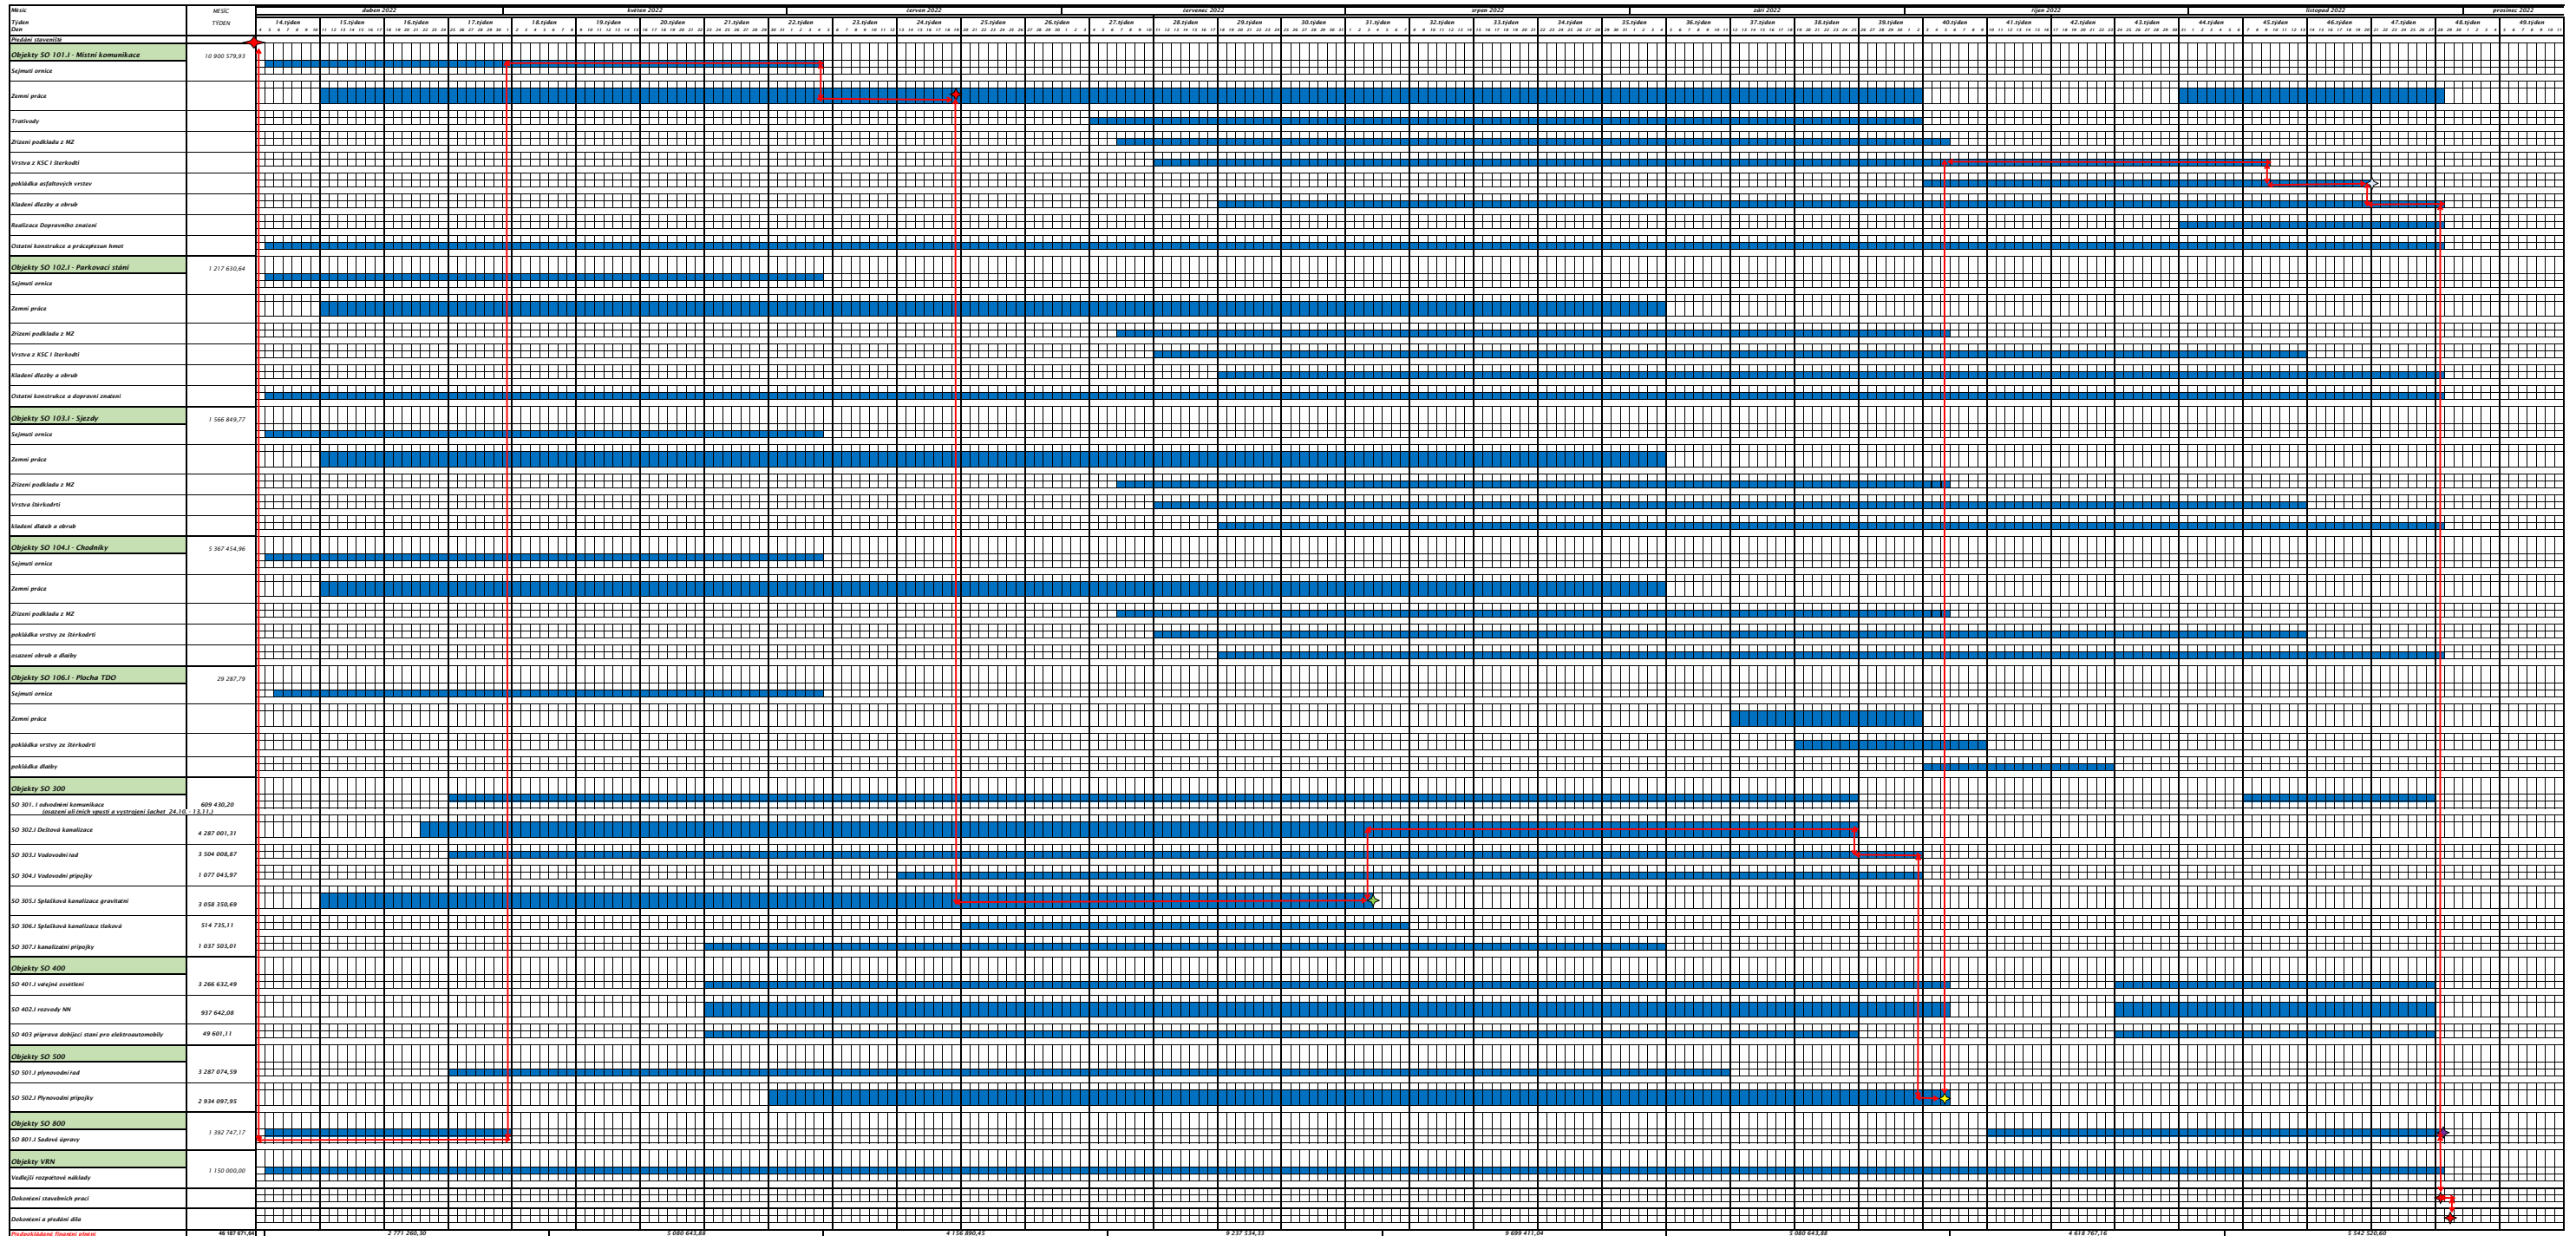

## Specifikace uzlových bodů

<b>1.uzlový bod - Dokončení přípravných prací :</b>	dokončení kácení zeleně dokončení sejmutí ornice dokončení přípravy uzemí pro výstavbu
<b>2.uzlový bod - Dokončení SO 305.1 Splašková kanalizace gravitační:</b>	Dokončení výkopových prací pro objekt SO 305.1 Dokončení montáže, pokládky kanalizačního potrubí včetně šachet pro objekt SO 305.1 Dokončení obsypů a zásypu pro objekt SO 305.1
<b>3. uzlový bod -Dokončení objektů SO 300, SO 400, SO 500 krom sloupu VO a nadzemní části dobíjecí stanice</b>	Dokončení výkopových prací pro veškeré objekty SO 300, SO 400, SO 500 mimo nadzemních částí Dokončení montáže, pokládky potrubí a kabelů včetně šachet pro veškeré objekty SO 300, SO 400, SO 500 mimo nadzemních částí Dokončení obsypů a zásypu pro veškeré objekty SO 300, SO 400, SO 500 mimo nadzemních částí
<b>4. uzlový bod - Dokončení konstr. Vrstev komunikace</b>	Dokončení výměny podloží štěrkořti Dokončení podkladní vrstvy ze štěrkořti 0-32 Dokončení podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem SC Dokončení konstrukčních vrstev ACP16 a ACO11 včetně postřiků
<b>5. Uzlový bod - Dokončeny sadové úpravy</b>	Dokončení výsadby stromů a křovin Dokončení výsadby sazenic včetně zalití Vysazení zeleně

Dne: 1.3. 2022





Akce: **Technická a dopravní infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Háje - I. Etapa**

**HARMONOGRAM FUNKČNÍCH ZKOUŠEK A REVIZÍ**

Podání stavebního povolení  
 Podání stavebního povolení  
 Zahájení prací  
 Dokončení stavebních prací  
 Rozhodnutí o zkušebním provozu

podmíněné ukončení zadávacího řízení a uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem (předpokládaná doba zahájení 04.04.2022)  
 stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy k převzetí  
 stavební práce (předpokládaná doba zahájení 04.04.2022)  
 240 dní od předání stavebního  
 do 60 dní od předání ukončeného díla

