

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 17/2022

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ 47539330
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 13903161/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – oprava povrchu chodníku v ul. Žitenická/Kaunického“ ze dne 31.01.2022

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

**čl. II.
Cena díla**

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. 5 smlouvy o dílo se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z částky:

Původní cena díla:

Cena dle SOD bez DPH	949 000,00 Kč
DPH 21 %	199 290,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1 148 290,00 Kč

Nová cena díla:

Cena bez DPH	1 037 434,70 Kč
DPH 21%	217 861,29 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH (dále jen "Cena za provedení díla")	1 255 295,99 Kč

**čl. III.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/122/2022 ze dne 23.03.2022.

V Čáslavi dne 29.3.2022

V Čáslavi dne 29.3.2022

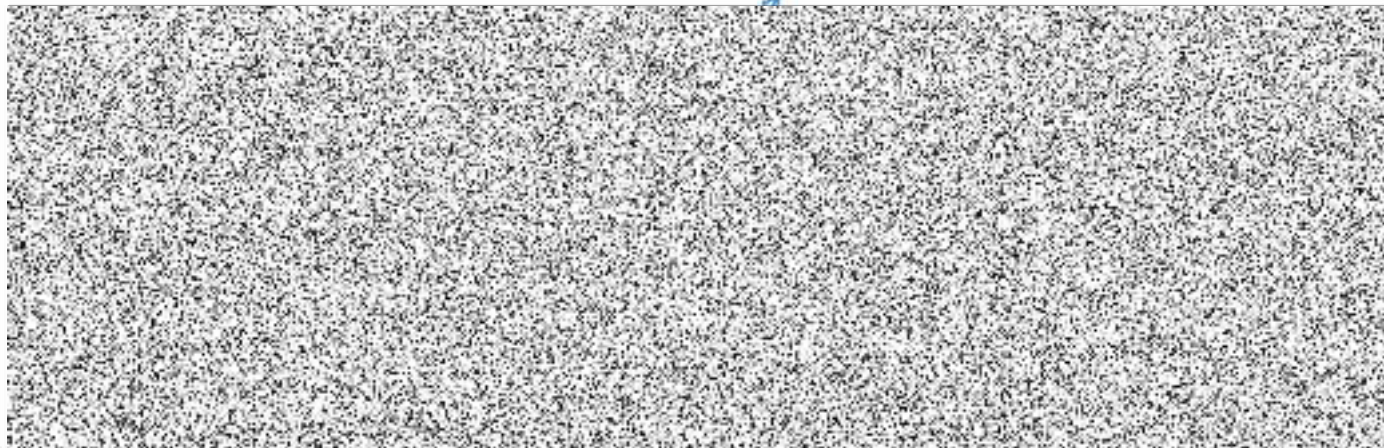

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav - oprava povrchu chodníku v ul. Žitenická/Kaunického

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Chodník

Popis změny:

- 1) Bourání a odstraňování betonových vrstev
- 2) Skutečné provedení stavby

Odůvodnění změny:

1) Při provádění zemních prací a odstraňování původního povrchu chodníku v ul. Žitenická došlo k odbourávání nadměrnému množství původního betonového podkladu (vrstvy) včetně naložení a uložení, které bylo nezbytné odstranit pro zachování předepsané nové podkladní vrstvy. Na základě kontroly způsobu prováděných prací byl tento způsob odsouhlasen. Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku skutečnosti, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny (MNP a VCP) činí 114 506,50 Kč bez DPH.

2) Na základě skutečného zaměření celkové plochy dokončené stavby bude upraven základní výkaz výměr dle skutečného provedení prací. Hodnota této změny (MNP a VCP) činí -26 071,80 Kč bez DPH.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Bude

Do časového plánu stavby:

Nebude

Do ceny stavby:

vícepráce

160 380,70 Kč

bez DPH

méněpráce

71 946,00 Kč

bez DPH

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele TES, spol. s r.o. : Jiří Pavlica

Méněpráce								-10 360,00 dle SoD
Bourání betonového podkladu v celém rozsahu								-10 360,00
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-59,200	66,00	-3 907,20	SoD
6	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-59,200	95,00	-5 624,00	SoD
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-59,200	14,00	-828,80	SoD
CELKEM méněpráce								-10 360,00

Vícepráce								124 866,50 cenová soustava
Bourání betonového podkladu v celém rozsahu chodníku								117 110,50
2	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	231,500	125,00	28 937,50	SoD, bylo pouze 13,5
NOVÁ	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně	m2	105,000	385,00	40 425,00	Úrs 2022/01
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	138,400	55,00	7 612,00	SoD
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 384,000	9,00	12 456,00	SoD
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	138,400	200,00	27 680,00	SoD
Odstranění dlažeb u vchodů do domů								7 756,00
NOVÁ	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	70,000	69,40	4 858,00	Úrs 2022/01
25	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	8,400	55,00	462,00	SoD
26	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	84,000	9,00	756,00	SoD
27	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,400	200,00	1 680,00	SoD
CELKEM vícepráce								124 866,50

ROZDÍL

114 506,50

Méněpráce								-61 586,00 dle SoD
Dle změření skutečnosti - kolečkem								-61 586,00
12	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-72,000	265,00	-19 080,00	SoD
13	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	-36,900	280,00	-10 332,00	SoD
14	M	59245013	dlažba zámková tvaru I klasiko 200x165x60mm žlutá	m2	-33,200	340,00	-11 288,00	SoD
15	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	-5,000	650,00	-3 250,00	SoD
16	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-8,000	240,00	-1 920,00	SoD
18	K	916331112	Osazení obrubníku zahradního do lože z betonu s boční opěrou	m	-24,000	180,00	-4 320,00	SoD
19	M	59217011	obrubník betonový zahradní 500x50x200mm	m	-24,000	82,00	-1 968,00	SoD
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-3,000	2 700,00	-8 100,00	SoD
21	K	919735112	Řezání živичného krytu do 150 mm	m	-8,000	63,00	-504,00	SoD
22	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	-8,000	25,00	-200,00	SoD
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	-8,000	78,00	-624,00	SoD
CELKEM méněpráce								-61 586,00

Vícepráce								6 630,00 cenová soustava
Výměna dlažby za žlutou nad schody								6 630,00
12	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	7,500	265,00	1 987,50	SoD
14	M	59245013	dlažba zámková tvaru I klasiko 200x165x60mm žlutá	m2	7,500	340,00	2 550,00	SoD
NOVÁ		113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	7,500	149,00	1 117,50	ÚRS 2022/01
NOVÁ			odvoz a likvidace původní dlažby, doplnění podsypu dle potřeby	m2	7,500	130,00	975,00	ÚRS 2022/01
								6 630,00

ROZDÍL

-54 956,00

Změnový list č. 001

Čáslav - oprava chodníku ul. Kaunického 2022

Měněpráce							0,00	dle SoD
Dle změřeni skutečnosti - kolečkem							0,00	
						0,00	SoD	
						0,00	SoD	
CELKEM měněpráce							0,00	

Vícepráce							28 884,20	cenová soustava
Dle změřeni skutečnosti - kolečkem							28 884,20	
14	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	18,880	265,00	5 003,20	SoD
15	M	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní	m2	16,000	335,00	5 360,00	SoD
16	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x80mm barevná	m2	3,040	750,00	2 280,00	SoD
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmel. cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m3	2,850	2 800,00	7 980,00	SoD
NOVÁ	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4	1 210,00	4 840,00	ÚRS 2022/01
NOVÁ	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,500	486,00	1 701,00	ÚRS 2022/01
NOVÁ	K	Ž 1	Odtokový žlab s pozinkovanou mříží 1,5t (130x120x1000mm)	kus	4	430,00	1 720,00	vlastní
CELKEM vícepráce							28 884,20	

ROZDÍL

28 884,20
