

Dodatek - Změnový list

Název díla: Rekonstrukce tramvajové tratě v Sadu B. Němcové Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Tramvajový svršek a spodek	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 11-01	Číslo změnového listu: <b style="font-size: 2em;">1
--	--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 23.7.2021	DOD20202396	21054/030113/01
Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 21, PSČ 779 00 Olomouc		

Technický dozor stavby/projektu: xxx	Cena díla dle SOD: 18 975 946,87 Kč
---	--

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně prací 2) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS 3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD 4) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Technický dozor stavebníka (TDS)</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednatel										
1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Autorský dozor (AD)										

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 Při bouracích pracích bylo zjištěno, že mocnost ŽB desky TT svršku je v tl. 0,3 m místo původního předpokladu PD 0,1 m.
 Na základě příznivých výsledků SZZ na ZP nebylo nutno provádět sanaci podloží v tl. 0,5 m
 Změna při zřízení kanalizační přípojky OVAK přes zelené plochy sadu, realizace v místě nástupiště k.č.1, změna polohy svodného a travodního potrubí z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řádem.
 Změna při odkopu a následné úpravě ZP, výkopu rýhy kanalizace a realizace sond ke zjištění polohy inženýrských sítí z důvodu přítomnosti únosné vrstvy z konsolidované strusky.
 Nerealizace tramvajového svršku v přechodové oblasti u Sokolské třídy.
 Předláždění chodníkových ploch nástupiště u k.č.2 mezi SVO 16 až SVO18 v rozsahu nad PD z důvodu sklonových poměrů - nutná úprava stávajícího stavu.

Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	ne
Dopad na PD	ne
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-2 732 958,20	-14,40%	2 006 285,32	10,57%	-726 672,88

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	xxx	20.01.2022		

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	IDS	xxx	20.01.2022		
Autorský dozor (AD):	IM-Projekt	xxx	20.01.2022		
Technický dozor (TD):	DPO	xxx	20.01.2022		
Veřejné zakázky (NR)	DPO	xxx	20.01.2022		
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO	xxx	20.01.2022		

Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

NABÍDKA

Dodavatel : TECHNOMA a.s.

Buničtá 1132
739 32 Vratimov

IČ : 61942715

DIČ : CZ61942715

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 4105

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 215680

Zakázka č. : MZ2022 OV

Platnost Do :

Telefon : [REDACTED]

Fax : 596 768 756 Ostrava, 543 521 393 Brno E-mail : [REDACTED]

Popis dodávky (místo určení) :

Ostrava-sad B.Němcové-rek. TT

Odběratel : IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc, a.s.

Albertova 21

779 00 Olomouc

Datum pořízení : 01.09.2021

Pozn. : K - Realizace

IČ : 25869523

DIČ : CZ25869523

řádek Popis dodávky
č.

Množství MJ


J. cena bez DPH

Celkem bez DPH

opěrná stěna PRAKTIK PK
PK

paleta dřevěná

Faktura vydaná - doprava

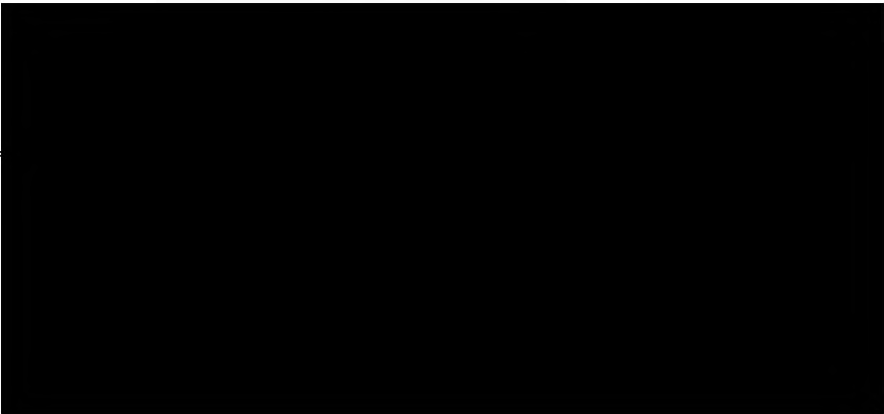

NABÍDKA**Dodavatel :** TECHNOMA a.s.

739 32 Vratimov

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 215680

Sklad : 001.00001

Obecné podmínky nabídky:

1) Cenová nabídka je v Kč a je platná do 30.11.2021 dní od data vystavení CN. V případě uzavření kontraktu do tohoto data je cena platná pro vývoz do 30.11. 2021 za podmínky, že nedojde ke změně kurzu Kč/EUR o více než 0,50Kč nebo ke změně cen vstupních

surovin pro výrobu nabízených výrobků o více jak 5% oproti úrovni platné v době kalkulace cen.

Cena představuje dodávku výše uvedeného zboží včetně dopravy(plně vytižené kamiony) od jednotlivých výrobců do místa stavby, pokud není uvedeno jinak.

Cena je garantována za předpokladu, že nedojde k navýšení ceny PHM a mýtného o více jak 3% od doby podání nabídky. V ceně není zahrnutá daň z přidané hodnoty.

2) Dodací lhůta stanoví prodávající s přihlédnutím k požadavkům kupujícího. Dodací lhůta jednotlivých výrobků uvedených v nabídce, bude upřesněna v oboustranně odsouhlaseném harmonogramu vývozu výrobků se zohledněním toho, zda jsou kupujícím předány úplné, čitelné, technicky jasné podklady, nutné k zahájení výroby.


3) Platební podmínky - dle dohody.

4) Nabídka je platná pouze při celkovém odběru zboží dle této nabídky.

5) Cenová nabídka je orientační a změní se dle přesného zadání.

6) Poskytovatel plnění poskytuje záruku za jakost v základní délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet od převzetí řádně dodaného zboží. Prodloužené záruky se řeší dodatečně, dle typu výrobce.

7) Sjednaný termín dodání zboží může být ze strany prodávajícího jednostranně prodloužen o přiměřenou nezbytně nutnou dobu v souvislosti s případným omezením jeho schopnosti dodat zboží kupujícímu včas, v důsledku karantén zaměstnanců či jiných omezení, která se u něj, nebo u jeho subdodavatelů (např. výrobců, apod.) či jiných na dodávce zboží spolupracujících subjektů (např. dopravců, apod.), vyskytnou v souvislosti s onemocněním způsobeným koronavirem COVID – 19 (dále jen „COVID – 19“), a to ať už omezení v důsledku rozhodnutí orgánů státní moci, tak v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců prodávajícího, jeho subdodavatelů nebo jiných spolupracujících subjektů, či v důsledku jiných relevantních důvodů s COVID – 19 souvisejících, které mají nebo budou mít reálný vliv na možnosti dodání zboží kupujícímu ze strany prodávajícího.



IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc

Prohlášení o likvidaci odpadů


Prohlašujeme, že odpad, který vznikl v období měsíce listopadu 2021 při stavební akci „**Rekonstrukce tramvajové tratě v místě zastávky Sad Boženy Němcové v Ostravě**“ byl odstraněn v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění prostřednictvím společnosti RIDERA BOHEMIA a.s.

Odpad kategorie „O“ – ostatní odpad (struska) byl převzat ke zpracování společností Ridera Bohemia a.s. v mobilním recyklačním zařízení.

CZT00363

kat. č. odpadu 10 09 03 pecní struska 96,57 t

Dne 15. 12. 2021 v Ostravě



IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc

Prohlášení o likvidaci odpadů

Prohlašujeme, že odpad, který vznikl v období měsíce října 2021 při stavební akci „**Rekonstrukce tramvajové tratě v místě zastávky Sad Boženy Němcové v Ostravě**“ byl odstraněn v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění prostřednictvím společnosti RIDERA BOHEMIA a.s.

Odpad kategorie „O“ – ostatní odpad (struska, směsi stavebních odpadů, zemina) byl převzat ke zpracování společností Ridera Bohemia a.s. v mobilním recyklačním zařízení.

CZT00363


kat. č. odpadu 10 09 03	pecní struska	150,13 t
kat. č. odpadu 17 01 07	směsi betonu, cihel	601,99 t
kat. č. odpadu 17 05 04	zemina a kamení	1000,24 t

Odpad kategorie „O“ – ostatní odpad (asfalty) byl převzat ke zpracování společností Ridera Bohemia a.s. v recyklačním zařízení.

CZT01661

kat. č. odpadu 17 03 02	asfaltové směsi	312,16 t
-------------------------	-----------------	----------

Dne 15. 12. 2021 v Ostravě



Ridera Bohemia a.s.
28.října 216
709 00 Ostrava

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229
779 00 Olomouc

V Ostravě dne 29.10.2021

Nabídka na uložení odpadů

Akce: Tramvajová trať B. Němcové, Ostrava
Odpad: pecní struska katal. číslo 100903
Množství: cca 300tun

████████████████████

Splatnost faktury 30dní od vystavení.

S přáním příjemného dne

████████████████████

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
77900 Olomouc - Nová Ulice, Albertova 229/21

Cenová nabídka:

Zasíláme Vám cenovou nabídku na likvidaci odpadu 10 09 03 „pecní struska“

Kód odpadu 10 09 03 – pecní struska – [REDACTED].

K odpadu je třeba doložit analýzu 10.1 a 10.2 dle zákona o odpadech č. 541/2020 sb.

S pozdravem

Jan Olšar

Jednatel

Realio Morava s.r.o.

3.11.2021




[REDACTED]

Od: [REDACTED] ▶
Odesláno: čtvrtek 16. prosince 2021 12:33
Komu: [REDACTED]
Předmět: Cenová nabídka - Pecní Struska

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na likvidaci kat. č. 10 09 03 Pecní struska za cenu [REDACTED] včetně dopravy.

S pozdravem



BERGASTO
environment

Please, think of the environment before printing this email.

Informace o důvěrnosti/Confidentiality Clause

Není-li v tomto e-mailu (včetně jeho obsahu a připojených příloh) - dále jen „e-mail“ - výslovně uvedeno jinak, není návrhem na uzavření smlouvy, přijetím nabídky ani jiným právním jednáním vyvolávajícím jakékoli právní následky tj. odesílatel nemá vůli být vázán obsahem emailu, pakliže by ze strany adresáta došlo k jeho jednostrannému a nepodmíněnému přijetí.

Adresát e-mailu bere na vědomí, že z e-mailu nelze vyvozovat povinnost odesílatele Bergasto a.s. uzavřít smlouvu, a že nemůže založit důvodné očekávání adresáta e-mailu v uzavření smlouvy, není-li v tomto emailu výslovně uvedeno jinak.


[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 9. února 2022 15:49
Komu: [REDACTED]
Předmět: CN

Dobrý den,

Dle poptávky posílám cenovou nabídku na likvidaci (uložení) odpadu kat. O *pecní struska kat. číslo 10 09 03*, cena [REDACTED] Tato cenová nabídka je platná pro období od 1.11.2021-30.12.2021.

S pozdravem [REDACTED]



Úsek technického ředitele

■ „Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové“ – stanovisko a posouzení ceny změn během výstavby – Změnový list č. 1

Změnový list řeší změnu rozsahu prací během výstavby.

Podkladní vrstvy.

Při demontážních pracích byla zjištěna tloušťka odstraňované železobetonové podkladní vrstvy 0,30 m oproti projektované tloušťce 0,10 m. Dále na základě výsledků SZZ bylo upuštěno od sanace aktivní zóny v plném rozsahu. V úseku podél nástupiště byla v podloží zjištěna vrstva únosné zpevněné strusky, kterou bylo dohodnuto ponechat. Pouze se upravila výška potřebná pro uložení prefabrikovaných L profilů.

Kanalizace.

Po odkrytí kolejiště byla dohodnuta změna přípojky kanalizace, kdy dle PD se měla použít k napojení stávající šachtice u ulice Mariánskohorská. Nově se kanalizace napojuje do stávajícího řádu přes šachtici v místě tramvajového nástupiště smě Hlučinská. Dále bylo dohodnuto přespádovat drenážní potrubí v úseku RŠ 01 – UV 02 a v daném úseku nerealizovat svodné potrubí. Z důvodu zlepšení odtokových poměrů přechodu pro pěší podél Mariánskohorské ulice bylo kolejiště osazeno 2 ks navíc kolejových odvodňovačů.

Změna železobetonových prefabrikovaných L profilů.

Z důvodu nedostatku na trhu navržených prefabrikovaných panelů tvaru L 400x300x100 mm, bylo dohodnuto použití jiného typu Praktik PK 400x245x400 mm, čímž došlo k finanční úspoře při zachování plné funkčnosti díla.

Přechodová oblast při výjezdu ze Sadu B. Němcové na Sokolskou třídu.

Změna byla vyvolána koordinací s probíhající stavbou Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové, kdy projektanti těchto staveb nepředpokládali v PD současně probíhající stavby. V rámci stavby Rekonstrukce TT v Sadu B. Němcové tak zhotovitel nemusel provádět montážní práce na železničním svršku přechodových polí při styku těchto dvou staveb.

Nástupiště.

V rámci zachování jednotného příčného spádu do zeleně podél nástupiště ve směru na centrum, bylo nutno předláždít část nástupiště mezi sloupy VO č. 16 – 18.

Stanovení cen víceprací je v souladu s ustanovením uzavřené smlouvy o dílo č. DOD20202396 čl. č. 6.4, kdy se pro položky víceprací použila nižší cena ze SOD nebo ceníku ÚRS 2021/II.

Souhlasím se změnovým listem.

V Ostravě dne 19. 11. 2021

XXX



Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2
OSTRAVA
702 00

VYŘIZUJE

NAŠE ZNAČKA

BRNO/DNE

22020

25.1.2022

Věc: PD – Rekonstrukce tramvajové tratě v sadu B. Němcové

Změnový list „SO 11-01 - Tramvajový svršek a spodek“ řeší změnu rozsahu prací během výstavby.

□ U „SO 11-01 – Tramvajový svršek a spodek“

Vícepráce spočívaly v rozsáhlejší demolici betonové desky v prostoru krytu a šterkového lože TT. Místo předpokládané tl. 100mm (v krytu TT), bylo nutné vybourat desku o tl. 300mm (tedy zasahující až do šterkového lože). Nutnosti odfrézování cca 1/3 vrstvy konsolidované strusky pro zajištění dostatečné výšky pro PJD a antivibrační rohože. Odkop celé vrstvy konsolidované strusky (se kterou nebylo v PD počítáno) pro zřízení rýhy pro kanalizaci a trativodní potrubí. Změna výškové polohy svodného a trativodního potrubí z důvodu kolize se stávajícím vodovodním řádem. Předlážďení chodníkových ploch nástupiště u k.č.2 mezi SVO 16 až SVO18 v rozsahu nad PD z důvodu sklonových poměrů - nutná úprava stávajícího stavu.

Méněpráce spočívaly ve zrušení sanace aktivní zóny tl. 0,5m z důvodu příznivých výsledků SZZ na zpevněné konstrukční vrstvě (konsolidovaná struska). Nerealizaci tramvajového svršku v přechodové oblasti u Sokolské třídy. Zapojení kanalizační přípojky do kanalizace OVAK v ose TT (nerealizována obnova kanalizační přípojky přes sad Boženy Němcové).

Souhlasím se změnovým listem.

V Brně dne 25. 01. 2022

autorský dozor



3

IM-Projekt,
inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO
Provozovna : Ohrazenická 169, 530 09 PARDUBICE
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: 2374640001/5500
banka: Raiffeisenbank, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.
