

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	V 2022							
								11.	18.	25.	02.	09.	16.	23.	30.
1			Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p.2470 Varnsdorf	392 dny	02.05. 22	31.10. 23									
2		Demolice příček, nosného zdiva, konstrukcí	75 dny	02.05. 22	12.08. 22		Bourání								
3			Burání příček a zdí	15 dny	02.05. 22	20.05. 22									
4			Bourání podlah	15 dny	23.05. 22	10.06. 22	3								
5			Otloukání omítek	10 dny	13.06. 22	24.06. 22	4								
6			Bourání dveřních zárubní	5 dny	27.06. 22	01.07. 22	5								
7			Demontáž rozvodů stávajících instalací	5 dny	04.07. 22	08.07. 22	6								
8			Bourání konstrukce střechy	10 dny	11.07. 22	22.07. 22	7								
9			Bourání věnců	10 dny	25.07. 22	05.08. 22	8								
10			Prořezávání strop. KCI pro výtah	5 dny	08.08. 22	12.08. 22	9								
11		Architektonicko stavební řešení	235 dny	13.06. 22	05.05. 23		Stavařina a instalace								
12			Ležatá kanalizace v objektu	10 dny	13.06. 22	24.06. 22	4								
13			Základy v 1.NP	10 dny	27.06. 22	08.07. 22	12								
14			Vodorovné konstrukce	20 dny	11.07. 22	05.08. 22	13								
15			Izolace proti vodě	10 dny	08.08. 22	19.08. 22	14								
16			Svislé konstrukce	30 dny	22.08. 22	30.09. 22	15								

Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	V 2022									
								11.	18.	25.	02.	09.	16.	23.	30.		
17		SO 01 - Dokončení nosného zdiva a železobetonové konstrukce	0 dny	30.09. 22	30.09. 22	16											
18		Konstrukce střechy a půda	40 dny	08.08. 22	30.09. 22	14											
19		Elektroinstalace - silnoproud	30 dny	03.10. 22	11.11. 22	16											
20		Elektroinstalace - slaboproud	30 dny	03.10. 22	11.11. 22	16											
21		Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace	20 dny	03.10. 22	28.10. 22	16											
22		Úpravy povrchů, podlahy	30 dny	31.10. 22	09.12. 22	21											
23		Výměna oken	15 dny	22.08. 22	09.09. 22	15											
24		Vzduchotechnika	10 dny	12.12. 22	23.12. 22	22											
25		Výtah	30 dny	12.12. 22	20.01. 23	22											
26		Podlahy lité	10 dny	31.10. 22	11.11. 22	21											
27		Topení	30 dny	14.11. 22	23.12. 22	26											
28		Dokončovací práce - obklady	30 dny	14.11. 22	23.12. 22	26											
29		Podlahy z dlaždic	30 dny	26.12. 22	03.02. 23	28											
30		Podlahy z litého teraca	15 dny	06.02. 23	24.02. 23	29											
31		Fasáda	40 dny	12.09. 22	04.11. 22	23											
32		SO 01 - Dokončení fasády objektu vč. Střechy, dokončení vnitřních stavebních úprav	0 dny	04.11. 22	04.11. 22	31											

Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	V 2022									
								11.	18.	25.	02.	09.	16.	23.	30.		
33		Dokončovací práce - malby a tapety	20 dny	27.02. 23	24.03. 23	30											
34		Podlahy povlakové	30 dny	27.03. 23	05.05. 23	33											
35		Kompletace elektro	10 dny	27.03. 23	07.04. 23	33											
36		Kompletace zdravotní technika	10 dny	27.03. 23	07.04. 23	33											
37		Připravenost pro zahájení komplexních zkoušek a prohlídek k převzetí stavby	0 dny	07.04. 23	07.04. 23	36											
38		Kompletace zdravotní technika	10 dny	27.03. 23	07.04. 23	33											
39		Venkovní úpravy - komunikace, oplocení, ostatní plochy	110 dny	01.03. 23	01.08. 23		Venky										
40		Zemní práce	20 dny	01.03. 23	28.03. 23												
41		Venkovní kanalizace	20 dny	29.03. 23	25.04. 23	40											
42		Zásypy	5 dny	26.04. 23	02.05. 23	41											
43		Komunikace pozemní	30 dny	03.05. 23	13.06. 23	42											
44		Dokončení venkovních terénních úprav	0 dny	13.06. 23	13.06. 23	43											
45		Oplocení	20 dny	14.06. 23	11.07. 23	43											
46		Připravenost pro kolaudaci – místní šetření	0 dny	11.07. 23	11.07. 23	45											

Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	V 2022								
								11.	18.	25.	02.	09.	16.	23.	30.	
47		Sadové úpravy	15 dny	12.07. 23	01.08. 23	45										
48		Závěrečné předání Díla	0 dny	01.08. 23	01.08. 23	47										

Projekt: HMG k SOD Datum: 21.04. 22	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

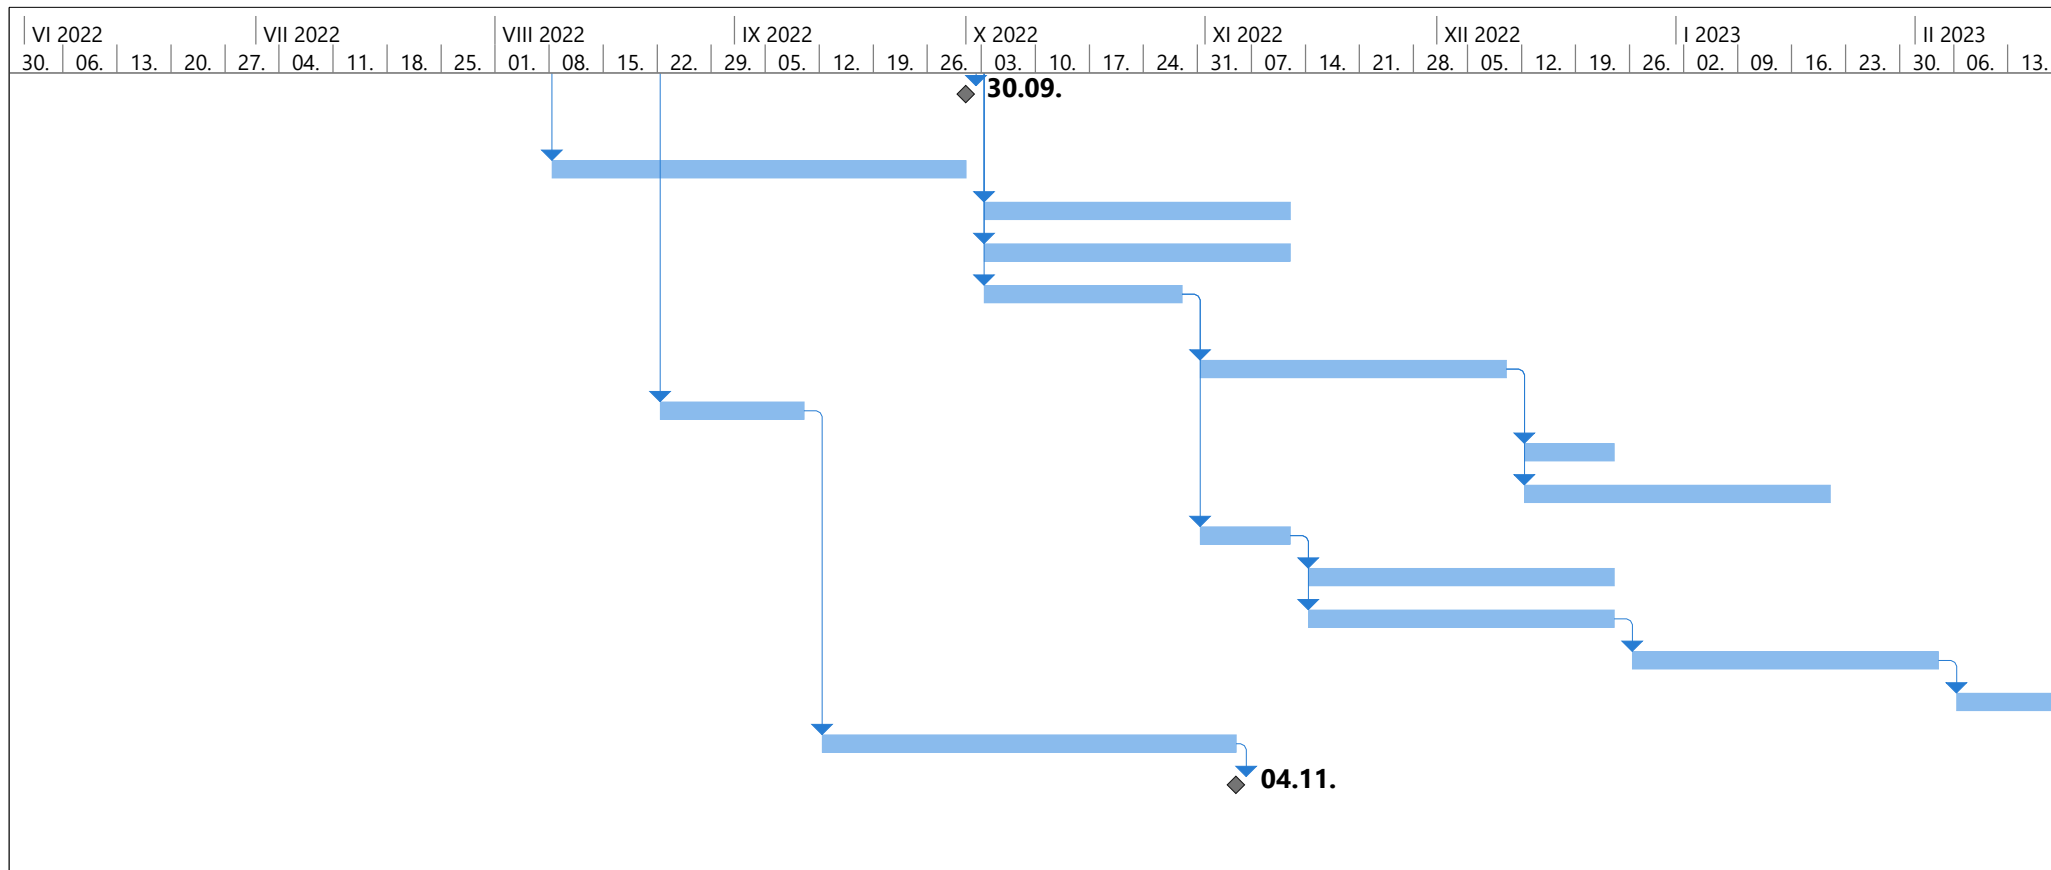


Projekt: HMG k SOD Datum: 21.04. 22	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			




Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG k SOD Datum: 21.04. 22	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			




Projekt: HMG k SOD Datum: 21.04. 22	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

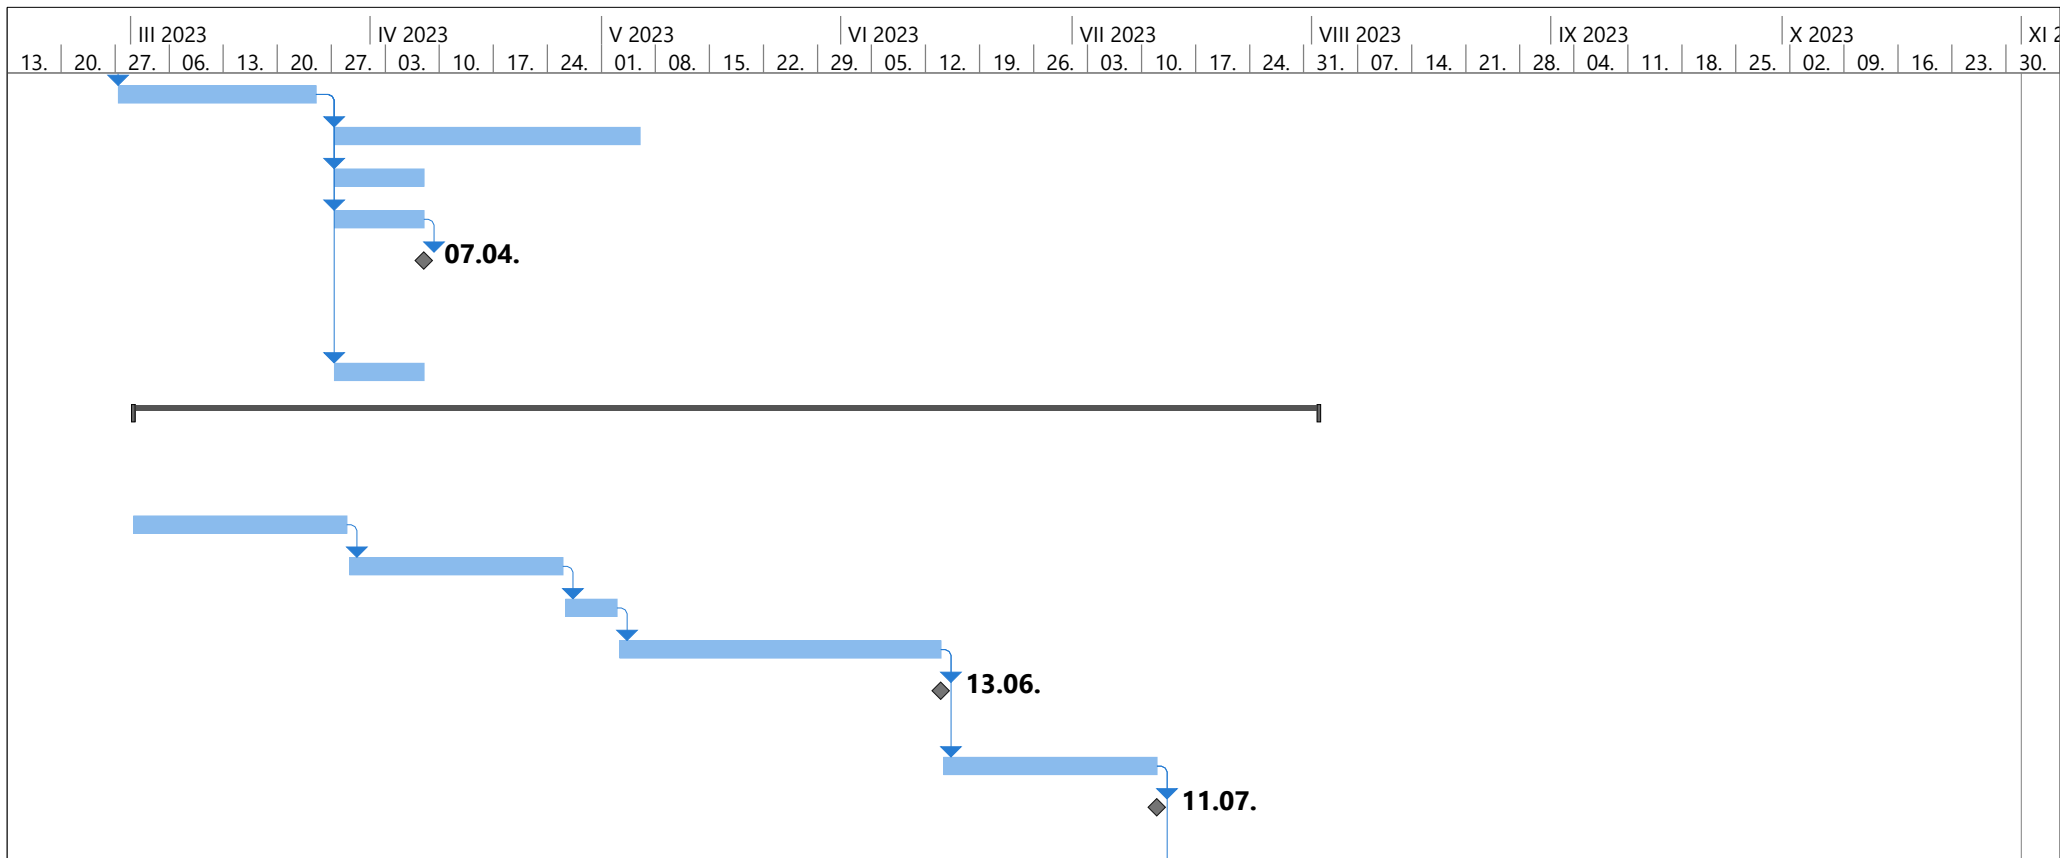

Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22




















Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			
























01.08.

Projekt: HMG k SOD
 Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			




Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG k SOD
Datum: 21.04. 22

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			
