

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
ev.č. objednatele – 2104060768
ev.č. zhotovitele – 2110116-21059-0
(dál jen jako „Dodatek“)

Uzavřený mezi

Smluvními stranami:

Fakultní nemocnice v Motole

státní příspěvková organizace

se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 00064203

DIČ: CZ00064203

(dále jen jako „objednatel“)

a

obchodní společnost: **ENESA a.s.**

se sídlem: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9

zastoupená: [REDACTED]

IČO: 27382052

DIČ: CZ27382052

Bankovní spojení: Komerční banka, [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 10200.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

- 1.1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 27. 8. 2021 Smlouvu ev.č. objednatele – 2104060768 ev.č. zhotovitele – 2110116-21059-0, (dále jen „**Smlouva**“) na základě, které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele Dílo, a to v rozsahu a za podmínek ve Smlouvě blíže uvedených. Objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu díla.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění čl. **IV. Termíny plnění**, a to za podmínek v tomto Dodatku uvedených.
- 1.3. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto Dodatku sjednaných je provedeno výlučně pro potřeby členění tohoto Dodatku. Ujednání obsažená v tomto Dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, článků či odstavců uvedených ve Smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními ve Smlouvě, mají přednost ujednání tohoto Dodatku před ujednáními ve Smlouvě.



Článek 2 Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění takto:
- 2.2. Mění se termín provedení díla dle odst. 2 článku IV. **Termíny plnění**, který nově zní:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v čl. VII. Smlouvy o Dílo nejpozději do 1. 8. 2022.“
- 2.3. Ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále platná a účinná.

Článek 3 Závěrečná a přechodná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní objednatel.
- 3.2. Dodatek lze měnit pouze písemně. Změna Dodatku jinou, než písemnou formou se nepřipouští.
- 3.3. Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. To neplatí v případě, že tento Dodatek byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha A – Žádost o posunutí termínu provedení Díla
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek důkladně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a uzavírají ho vědomy si všech jeho důsledků

Praha dne

Praha dne

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

Datum: 2022.04.26
11:35:22 +02'00'

Datum: 2022.04.13
20:42:58 +02'00'

Datum:
2022.04.13
16:58:48 +02'00'


ředitel Fakultní nemocnice v Motole



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Fakultní nemocnice v Motole
státní příspěvková organizace
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení Díla

„Modernizace zařízení Spalovny nebezpečných odpadů ve Fakultní nemocnici v Motole“

Náš subdodavatel, společnost SUNNYMONT s.r.o. nás informovala, na základě písemného oznámení od dodavatele hlavních komponentů řídicího systému SAUTER, o problémech s materiálem na výrobu těchto komponentů, které jsou stěžejní pro dokončení díla. Tyto komponenty byly z naší strany objednány v okamžiku podpisu smlouvy, ale bohužel nejsme schopni ovlivnit jejich rychlejší dodání. Obě oznámení zároveň přikládáme k této žádosti.

Tímto se na Vás obracíme se žádostí o prodloužení termínu dokončení Díla do 1. 8. 2022

Děkujeme za pochopení

Datum: 2022.04.13
20:44:00 +02'00'



OZNÁMENÍ O ZPOŽDĚNÍ DODÁVEK

tímto Vám oznamuje zpoždění v dodání komponentů pro akci „Řídící systém pro spalovnu FN Motol“. Komponenty byly objednány v okamžiku podpisu smlouvy, ale my jako smluvní partner firmy Sauter (výrobce ŘS) nejsme schopni ovlivnit dodávky od výrobce.

Na dodání komponentů pracujeme a budeme se snažit je dodat v nejbližším možném termínu.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

M. H. Loh




OZNÁMENÍ O ZPOŽDĚNÍ DODÁVEK

Tímto Vám oznamujeme zpoždění dodávek s komponenty pro akci řídicí systém spalovny FM Motol. Komponenty byly objednány v okamžiku podpisu smlouvy, ale díky covidové situaci v roce 2021 a návazné geopolitické situaci v roce 2022 dochází stále ke zpoždění dodávek.

Na dodání komponentů v nejbližším možném termínu pracujeme.

Děkujeme za pochopení

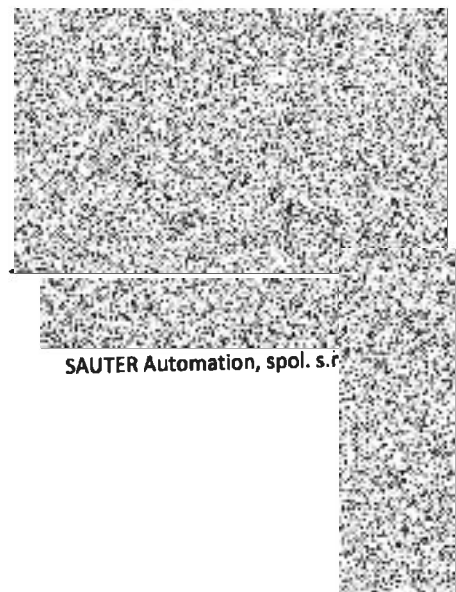

SAUTER Automation, spol. s.r.

