

Č. j. KRPS-84072-382/ČJ-2018-0100MN-VZ

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla „**RaŠZ Nový Hrádek modernizace areálu – stavba**“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-84072-222/ČJ-2018-0100MN-VZ (Identifikátor VZ: N006/20/V00008348), uzavřené dne 19. 08. 2020 (dále jen „**smlouva**“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

VALC, s.r.o.

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 1677

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Sídlo:

Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ:

75151481

DIČ:

CZ75151481

Bankovní spojení:

ČNB Praha

Číslo účtu:

507432881/0710

Telefon:

Fax:

e-mail:

(dále jen „**objednatel**“)

S ohledem na navýšení nákladů stavebních prací ve formě dodatečných, nepředvídaných stavebních víceprací a méněprací při zhotovení díla RaŠZ Nový Hrádek modernizace areálu – stavba, se smluvní strany, **v souladu s čl. XVI odst. 3 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

1. Mění se cena díla upravená v čl. V. smlouvy navýšená dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě. Cena za dílo se navyšuje o částku **3 895 573,16 Kč včetně DPH** (slovy: tři miliony osm set devadesát pět tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a šestnáct haléřů).
2. K navýšení ceny za dílo dochází v návaznosti na dílčí změny v předmětu plnění, jež jsou věcně, cenově a časově upraveny ve změnových listech č. 17 až č. 37, vyhotovených v souladu s článkem VIII smlouvy. Předmětné změnové listy, vztahující se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat částku **3 895 573,16 Kč včetně DPH** (slovy: tři miliony osm set devadesát pět tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a šestnáct haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** ode dne zveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.
4. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.


1. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 17 až č. 37, která se stává ze 110 stran textu.

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne viz elektronický podpis

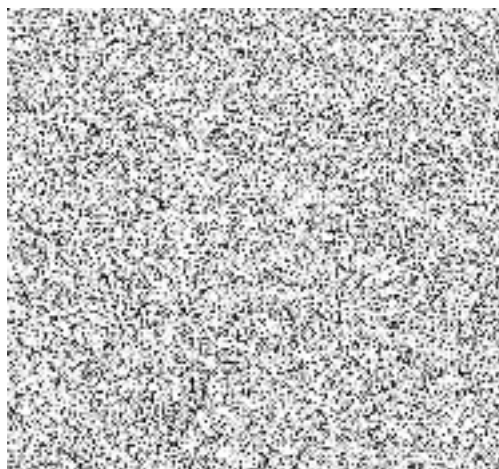

Za objednatele:


V Praze dne viz elektronický podpis

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	17.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Obklady a dlažby	
Část díla dotčená změnovým listem:	
S001 objekt č.5 – podlahové krytiny, obklady a dlažby	
Popis změny, popis technického řešení:	
Z důvodu chybné výměry ve VV a PD došlo k navýšení plochy obkladů a dlažeb.	
Podlaha bývalé kotelny, musela z důvodu celoplošné degradace betonu, být vybourána a nahrazena novým povrchem.	
Projekt neřešil revizní dvířka k uzávěrům potrubí a revizním kusům kanalizace.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: podlahová krytina PVC viz. projektová dokumentace, kde je tabulka místností s povrchy podlaha/stěna	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: chyby projektu a dodatečné zjištění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	233 358,19 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	4 299,75 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	229 058,44 Kč
DPH:	48 102,27 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	277 160,71 Kč
	
Upřesnění změn v ceně díla ze účasti na programu obnovy bydlení	
Datum:	

²⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005**

Název objektu **ZL17 - obklady a dlažby O05**

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel **Krajské ředitelství Středočeského kraje**

Projektant **KOPRIN s.r.o.**

Zhotovitel **VALC. s.r.o.**

Zpracoval

75151481	CZ75151481
45797030	CZ45797030
45537151	CZ45537151

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 587,22	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	29 306,35	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	96 224,65	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	97 940,22	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	liné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-5)		229 058,44	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 229 058,44

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	229 058,44	48 102,27

Cena s DPH 277 160,71

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL17 - obklady a dlažby O05

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 03. 01. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				34 893,57	
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 452,80	
1	011	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 n:m z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 25/30	m3	0,968	4 600,00	4 452,80	URS 2022/C1
			"místnost 1.08" (2*2+3*2,7)*0,08		0,968			
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 697,80	
2	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,210	3 480,00	4 222,90	URS 2022/01
			"místnost 1.08" (2*2+3*2,7)*0,1		1,210			
3	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	29,900	168,00	5 023,20	URS 2022/01
			"místnost 1.14" 29,9		29,900			
4	013	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru:	m2	149,500	76,60	11 451,70	URS 2022/01
			29,9*5		149,500			
997			Přesun sutě				8 323,97	
5	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	5,676	650,00	3 689,40	SOD
6	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost do 1 km;	t	5,676	230,00	1 305,48	SOD
7	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	135,024	7,00	945,17	SOD
			5,626*24 "Přepočtené koeficientem množství		135,024			
8	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 804	t	5,676	420,00	2 383,92	SOD
998			Přesun hmot				1 419,00	
9	R	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	5,676	250,00	1 419,00	SOD
PSV			Práce a dodávky PSV				194 164,87	
771			Podlahy z dlaždic				83 482,04	
10	771	771111011	Vysání podkladu	m2	29,900	15,00	448,50	URS 2022/01
11	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	29,900	56,20	1 680,36	URS 2022/01
12	771	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	29,900	362,00	10 823,80	URS 2022/01
			"místnost 1.14" 29,9		29,900			
13	771	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	23,100	122,00	2 818,20	URS 2022/01
14	597	59761275	sokl-dlažba keramická stínutá hladké do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	77,000	59,40	4 573,80	URS 2022/01
			70 * 1,1		77,000			
15	R	771574115	flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	34,060	1 085,40	37 002,78	SOD
			"1.08" 19,53		19,530			
			"1.15" 9,98		9,980			
			"2.05" 4,55		4,550			
			Součet		34,060			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL17 - obklady a dlažby O05

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 03. 01. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
16		59761432	dlažba keramická sklenutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25 ks/m2	m2	39,169	481,60	18 863,79	SOD
			34,06*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		39,169			
17	697	69752122	koberec čistící zóna: stříž, smyčka s příhy hrubé vlákno, vlákno i PA 670g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	1,120	1 890,00	2 115,80	URS 2022/01
18	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	783,281	6,58	5 153,99	URS 2022/01
776			Podlahy povlakové				-4 299,75	
19	R	176211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních, vč. soklových listů	m2	-4,550	450,00	-2 047,50	SOD
			"2,06 a 2,07" -4,55		-4,550			
20		69751050	koberec v rolích š 4m, vsívaná smyčka, vlákno PA, hm 550g/m2, PA, zátěž 33, hořlavost Bfl S1	m2	-5,005	450,00	-2 252,25	SOD
			-4,55*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,005			
781			Dokončovací práce - obklady				106 670,38	
21	R	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	99,620	540,60	53 794,80	SOD
			dle SOD					
			180-25		155,000			
			Skutečnost					
			254,62		254,620			
			ROZDíl					
			254,62-155		99,620			
22		59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	109,582	390,00	42 736,98	SOD
			99,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		109,582			
23	781	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	12,000	217,00	2 604,00	URS 2022/01
24	562	56245722	dvířka vanová bílá 200x300mm	kus	1,000	114,00	114,00	URS 2022/01
25	562	56245611	mřížka výtlačí hranatá plast se síťovinou 150x150mm	kus	8,000	109,00	872,00	URS 2022/01
26	562	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	3,000	92,00	276,00	URS 2022/01
27	781	781494111	Profilý rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	185,00	740,00	URS 2022/01
28	590	59054133	profi ukončovací pro vnější hrany obkladů dlažeb hliník leskle eloxovaný chromem 10x2500mm	m	5,000	411,00	2 055,00	URS 2022/01
29	781	998771202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 031,928	3,37	3 477,60	URS 2022/01
783			Dokončovací práce - nátěry				8 312,20	
30	783	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	29,900	153,00	4 574,70	URS 2022/01
31	R	783937151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednorázový epoxidový vodou ředitelný	m2	29,900	125,00	3 737,50	URS 2022/01
			"místenost 1,14" 29,9		29,900			

Celkem

229 058,44

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	18.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce FDS/SMVS "	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 153b, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/B4, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Cu krytina po zbouraném komínu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – bourání komínu a následná oprava střechy	
Popis změny, popis technického řešení: Z důvodu chybných (podhodnocených) výměr ve VV došlo k navýšení plochy opravovaného střešního pláště včetně Cu krytiny. PD a VV neobsahoval provedení a opracování prostupů VZT potrubí vyvedeného nad střechu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD neřešila	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: chyby projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	106 859,46 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 13 116,93 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	93 542,53 Kč
DPH:	10 643,93 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	113 186,46 Kč
Uložit změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:	
Datum:	

*) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL18 - Cu krytina po zbouraném komínu	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.01.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	524,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	21 583,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	46 521,53	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	24 912,29	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		93 542,53	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 93 542,53

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	93 542,53	19 643,93

Cena s DPH 113 186,46

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - S001 Rekonstrukce objektu 005
Objekt: ZL18 - Cu krytina po zbouraném komínu

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22 108,71

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 843,35

1	003	941121112	Montáž lešení řadového trubkového ležkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,5 do 1,8 m v přes 10 do 20 m	m2	64,000	149,00	9 536,00	URS 2022/01
4*12+4*2+2*2*2					64,000			
2	003	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	320,000	1,64	524,80	URS 2022/01
64*5					320,000			
3	003	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového ležkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 20 m	m2	64,000	90,20	5 772,80	URS 2022/01
4	R	962032231	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	-12,150	695,37	-8 448,75	SOD
-0,75 * 1,35 * 12					-12,150			
5	013	962032641	Bourání zdíva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	12,150	1 190,00	14 458,50	URS 2022/01
0,75 * 1,35 * 12					12,150			

997 Přesun sutě 265,36

6	R	997013152	Vnitrostavěbní oprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,185	650,00	120,25	SOD
7	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,185	230,00	42,55	SOD
8	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,552	7,00	24,86	SOD
0,148*24 "Přepočtené koeficientem množství					3,552			
9	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,185	420,00	77,70	SOD

PSV Práce a dodávky PSV 71 433,82

762 Konstrukce tesařské 5 010,07

10	R	762341210	Bednění a latování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60 s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32mm	m2	6,000	209,48	1 256,88	SOD
11		60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm, včetně impregnace	m3	0,180	6 000,00	1 080,00	SOD
3 * 0,03					0,180			
12	762	762341275	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 50° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	6,000	140,00	840,00	URS 2022/01
13	607	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	6,000	211,00	1 266,00	URS 2022/01
14	762	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	8,000	37,80	302,40	URS 2022/01
15	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	47,453	5,58	264,79	URS 2022/01

764 Konstrukce klempířské 65 335,40

16	764	764001621	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	8,000	180,00	1 440,00	URS 2022/01
17	764	764001911	Nápojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	10,000	262,00	2 620,00	URS 2022/01
18	764	764131433	Krytina střeš rovné drážkováním z tabulí z Cu piechu sklonu do 60°	m2	8,000	3 690,00	29 520,00	URS 2022/01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL18 - Cu krytina po zbouraném komínů

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:


Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
19	R	764141403	Krytina střechy z Tižn předzvětralého plechu otvor: pro komín	m2	-2,000	2 334,09	-4 668,18	SOD
			-2		-2,000			
20	764	764336425	Lemování ventilačních nástavců z Cu plechu na skládané krytině D přes 200 do 300 mm	kus	7,000	5 060,00	35 420,00	URS 2022/01
21	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	643,318	1,56	1 003,58	URS 2022/01
		765	Krytina skládaná					
								1 088,35
22	765	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	8,000	40,50	324,00	URS 2022/01
23	283	28329037	fólie kontaktní difúzně propustná pro dopiňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	8,800	80,60	709,28	URS 2022/01
			8 * 1,1					
								8,800
24	765	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	10,333	5,33	55,07	URS 2022/01
Celkem							93 542,53	

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	19.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RašZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMV5 ²⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: úprava štítu střechy k objektu bazénu	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – úprava délky střechy (zkrácení u štítové stěny)	
Popis změny, popis technického řešení:	
Ve VV není zahrnuto odstranění přesahu střechy nad štítovou stěnou objektu SO 01 a to z důvodu napojení nového objektu SO 02.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD neřešila	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: chyba projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DŠPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu: ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	37 165,40 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	37 165,40 Kč
DPH:	7 804,73 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	44 970,13 Kč



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval.
Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL19 - Úprava štítu střechy k objektu bazénu	LČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	03.01.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 367,20	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 14 747,16	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 9 562,78	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 12 488,26	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 37 165,40	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		37 165,40	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	37 165,40	7 804,73
		Cena s DPH		44 970,13	
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel			0,00
		Ribůzavá doložka			0,00
		Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL19 - Úprava štítu střechy k objektu bazénu

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	003	941121111	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000	142,00	8 520,00	URS 2022/01
10*6					60,000			
Součet					60,000			
2	003	941121211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	240,000	1,53	367,20	URS 2022/01
60*4					240,000			
3	003	941121811	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000	85,90	5 154,00	URS 2022/01
997			Přesun sutě					
4	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,439	1 630,00	715,57	URS 2022/01
5	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,439	230,00	100,97	SOD
6	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,320	7,00	72,24	SOD
0,43*24 "Přepočtené koeficientem množství					10,320			
7	R	997013931	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,439	420,00	184,38	SOD
PSV			Práce a dodávky PSV					
762			Konstrukce tesářské					
8	762	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	2,500	65,30	163,25	URS 2022/01
9	762	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	2,400	79,30	190,32	URS 2022/01
10	762	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	10,400	37,80	393,12	URS 2022/01
2*(5,2*1,0)					10,400			
Součet					10,400			
11	762	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	3,000	67,20	201,60	URS 2022/01
2*(1,5*1,0)					3,000			
Součet					3,000			
12	762	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%	9,483	5,58	52,92	URS 2022/01
764			Konstrukce klempířské					
13	764	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	16,080	180,00	2 894,40	URS 2022/01
2*(1,2*6,7)					16,080			
Součet					16,080			
14	764	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	8,000	123,00	984,00	URS 2022/01
4*4					8,000			
Součet					8,000			
15	764	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	7,500	157,00	1 177,50	URS 2022/01
16	764	764232404	Opiechování štítu závětnou lištou z Cu plechu řš 330 mm	m	13,400	980,00	13 132,00	URS 2022/01
17	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	4,000	176,00	704,00	URS 2022/01
18	764	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	287,00	574,00	URS 2022/01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL19 - Úprava štítu střechy k objektu bazénu

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 1. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
19	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	5,500	154,00	847,00	URS 2022/01
20	764	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000	110,00	220,00	URS 2022/01
21	764	764508136	Montáž odeseku kruhového svodu	kus	2,000	96,80	193,60	URS 2022/01
22	764	990764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klenbové v objektech v do 12 m	%	207,265	1,56	323,33	URS 2022/01


Celkem

37 165,40

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	20.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stžk - FKSP - RaSZ Diouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce FDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SDK v 1. a 2. NP	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – SDK v 1. a 2. NP (kapotáž potrubí + výlez na půdu)	
V PD nebylo řešeno opláštění (zakapotování) rozvodů vody, kanalizace a VZT. Ve VV není uvedena položka na výlez z chodby ve 2. NP do půdního prostoru.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD neřešila	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: chyba projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSP5	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	
ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	
ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	77 833,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	77 833,60 Kč
DPH:	16 345,06 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	94 178,66 Kč



Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:
Datum:

EDS/SMVS se rozursní moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RASZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

JKSO

Název objektu

ZL20 - SDK 1.NP a 2.NP dodatečné práce

EOO

Misto

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

ICO

DIČ

Projektant

KOPRIN s.r.o.

75151481

CZ75151481

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zpracoval

45537151

CZ45537151

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	77 833,60	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)			77 833,60	12 DN (ř. 8-11)			19 VRN (ř. 13-18)		0,00
20 HZS			0,00	21 Kompl. činnost		0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 77 833,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	77 833,60	16 345,06

Cena s DPH 94 178,66

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL20 - SDK 1.NP a 2.NP dodatečné práce

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

77 833,60

763 Konstrukce suché výstavby

77 833,60

1	R	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,500	828,00	35 190,00	URS 2022/01
			"Místnost 1 01" 42,5		42,500			
			Mezisoučet		42,500			
			Součet		42,500			
2	R	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,600	887,00	1 419,20	URS 2022/01
			"Místnost 1 07" 1,60		1,600			
			Mezisoučet		1,600			
			Součet		1,600			
3	R	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,600	64,10	102,56	URS 2022/01
4	R	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	12,000	570,00	6 840,00	URS 2022/01
			2.NP					
			12		12,000			
			Mezisoučet		12,000			
			Součet		12,000			
5	R	763164721	SDK obklad kol uzavřeného tvaru s do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	5,750	1 150,00	6 612,50	URS 2022/01
			1.NP					
			"1.06 VZT" 1,00		1,000			
			"1.11" 1,65		1 650			
			2.NP					
			2 04;2.17;2.25					
			3.10		3,100			
			Mezisoučet		5,750			
			Součet		5,750			
6	R	763164731	SDK obklad kol uzavřeného tvaru s do 1,6 m desky 1xA 12,5	m	3,000	1 510,00	4 530,00	URS 2022/01
			"Místnost 1.01" 3,00		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		3,000			
7	R	763R001	D+M slahovacíh zateplovacích pldních schodů JAP - viz. CN	kpl	1,000	21 973,98	21 973,98	CN
8	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	765,682	1,52	1 165,36	URS 2022/01

Celkem

77 833,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

RaŠZ Nový Hrádek

Objekt:

SDK

Místo:

DLOUHE RZY

Datum:

Zadavatel:


VALC. s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: UNI-GIPS s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 973,98
0	PSV		Práce a podávky PSV				21 973,98
0	763		Konstrukce suché výstavby				21 973,98
1	K	763R001	Montáž stahovacího zatepleného půdního schodu	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
Poznámka k položce:							
Cena obsahuje pomocný kořínkový materiál							
2	M	JAP	schody podní stahovací LUSO ZP-plech s vyřídlením zateplovací vložkou - rozměr 76(1109)x50(100)cm	kus	1,000	13 173,98	13 173,98
3	K	763R002	Přesun hmot, doprava a likvidace odpadu	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00

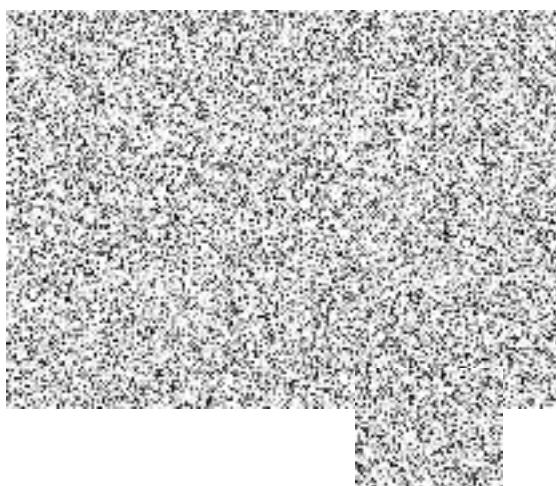

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	21.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Střek - FKSP - RašZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Kolárna	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – kolárna č. m. 1.14	
Prostor zrušené kotelny byl přebudován na kolárnu č. m. 1.14. Po celkovém vybourání dvou kotlů, vyřezání konstrukce pro zavážení uhlí a vyřezání zásobníků vody a všech rozvodů potrubí včetně odstranění povrchových elektrorozvodů byl zjištěn skutečný stavební stav stěn (omítek) a podlah. Celková sanace a následná oprava byla většího rozsahu, než se uvažovalo v projektu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD neřešila	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: dodatečné zjištění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	104 873,88 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	104 873,88 Kč
DPH:	22 023,51 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	126 897,39 Kč



Op. Prost. zmeřeno i stu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

⁹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005**

Název objektu **ZL21 - Kolárna**

JKSO

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel **Krajské ředitelství Středočeského kraje**

Projektant **KOPRIN s.r.o.**

Zhotovitel **VALC, s.r.o.**

Zpracoval

75151481

CZ75151481

45797030

CZ45797030

45537151

CZ45537151

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	37 860,26	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	67 013,62	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		104 873,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 104 873,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	104 873,88	22 023,51

Cena s DPH 126 897,39

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
Objekt: ZL21 - Kolárna

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

104 873,88

3

Svislé a kompletní konstrukce

5 150,88

1	014	310239211	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,876	5 880,00	5 150,88	URS 2022/01
			2,5*1,13*0,31		0,876			

4

Vodorovné konstrukce

3 522,90

2	011	433321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,552	4 100,00	2 263,20	URS 2022/01
			0,9*0,75*0,19+2,7*0,28*0,23+0,25		0,552			
3	011	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,292	814,00	1 051,69	URS 2022/01
			0,9*0,19+2,7*0,23+0,5		1,292			
4	011	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	1,292	161,00	208,01	URS 2022/01

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 769,84

5	R	612321341	Omrítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	92,880	270,00	25 077,60	SOD
6	011	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,392	4 470,00	10 692,24	URS 2022/01
			29,9*0,08		2,392			

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 758,38

7	013	935043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,990	3 490,00	10 435,10	URS 2022/01
			29,9*0,1		2,990			
8	R	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,600	500,00	800,00	SOD
			Bourání dveří vnitřních dřevěných 800/1970 - uhelna					
			1*0,8*2		1,600			
			Součet		1,600			
9	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	92,880	81,00	7 523,28	SOD
			(8,35*2+3,66*2)*4		96,060			
			-1,6*2		-3,200			
			Součet		92,880			

997

Přesun sutě

39 038,38

10	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	10,972	1 630,00	17 884,36	URS 2022/01
11	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,972	230,00	2 523,56	SOD
12	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	263,328	7,00	1 843,30	SOD
			10,572*24		263,328			
13	013	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	10,972	1 530,00	16 787,16	URS 2022/01

998

Přesun hmot

2 633,50

14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	10,534	250,00	2 633,50	SOD
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-----

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL21 - Kolárna

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Zpracoval:

Místo:

Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

104 873,88

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	22.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RašZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 001077/1, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: sauna č. m. 1.12	
Část díla dotčená změnovým listem:	
S001 objekt č.5 – sauna č. m. 1.12	
Projekt neobsahoval saunu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD neřešila	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: požadavek investora.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DŠPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		
ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu:		
ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	346 800,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	346 800,00 Kč	
DPH:	72 828,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	419 628,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:

Opisnost změnového listu za účastníka programu kontrolovat.

Datum:

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRADEK MODERNIZACE AREALU - Dodatek č.3 -
SO01 Rekonstrukce objektu 005

JKSO

Název objektu

ZL22 - Sauna

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	2							
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	3							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	4							
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	5	"M"	Dodávky	0,00	17	Jiné VRN	0,00	
5										6		Montáž	346 800,00	18	VRN z rozpočtu	0,00	
6										7	ZRN (ř. 1-6)		346 800,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
7				12	DN (ř. 8-11)		20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

346 800,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	346 800,00	72 828,00

Cena s DPH

419 628,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL22 - Sauna

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------


M Práce a dodávky M 346 800,00

1	R	M101	Sauna - dodávka a montáž vč.el.technologie viz samostatná nabídka	soub	1,000	346 800,00	346 800,00
---	---	------	---	------	-------	------------	------------

CN

Celkem 346 800,00

Cenová nabídka dodávky komerční saunové kabiny

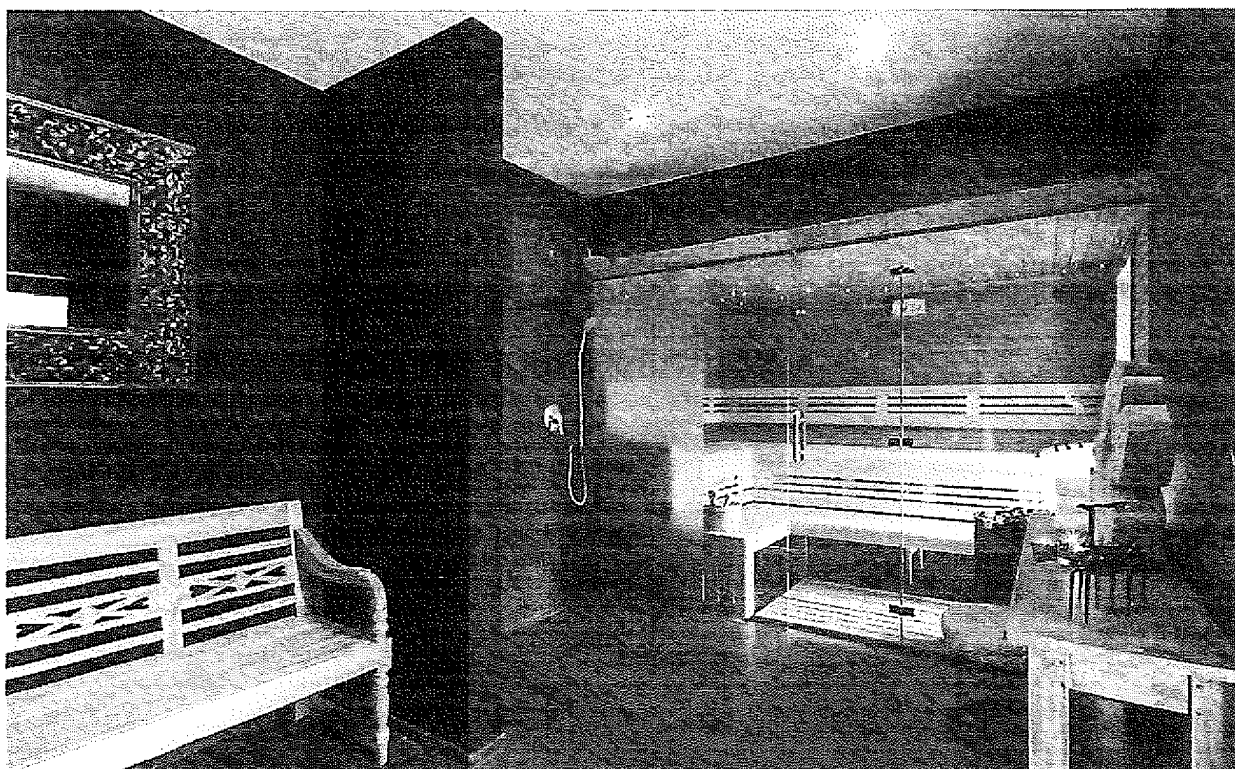

Zákazník

VALC, s.r.o.

Pražská 13 500 04, Hradec Králové



Platnost nabídky: 05.08.2021

Číslo nabídky: 2021901



DYNTAR



Specifikace dodávky saunové kabiny: 3250 x 3550 - v. 2200mm

Typ sauny: DYNTAR SAUNA FINLANDIA - obklad sev. smrk			
Popis	Cena bez DPH	DPH	Celkem s DPH
KABINA	281 429	59 100	340 529
EL. TECHNOLOGIE	65 371	13 728	79 099
NABYTEK, OCHLAZOVNA	0	0	0
CELKEM	346 800	72 828	419 628

VÝŠE UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE DOPRAVU A MONTÁŽ PO CELÉ ČR.



Saunová kabina DYNTAR SAUNA: 3250 x 3550 - v.2200mm

Panelová konstrukce D-SYSTEM: vnitřní, vnější obklad viz. cenová tabulka

Boční panel: vnitřní vodorovný obklad palubky profil 14 mm s prodí. perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad nepohledových stěn sololit, obložka dveří masiv, AL profil,

Stropní panel: vnitřní obklad palubky profil 14 mm s prodlouženým perem, parotěsná zábrana, minerální vata, vnější obklad – sololit,

Dveře s bezpečnostním magnetickým zavíráním: typ CELOSKLO čiré/kouřové, bezpečnostní sklo

Vybavení interiéru: 4 ks lavic, 4 ks podhlavníků, opěrky zad, kryt topidla, podlahový rošt – vše z osiky profil 28mm, 2 ks světlo s rohovým krytem,

Saunové doplňky: teploměr, přesýpací hodiny,


Elektroinstalace: Topidlo: EuroMax 15,0 kW/400V saunové samostojící topidlo pro náročný komerční provoz s možností polévání vodou-paních nárazů, akumulční kameny cca 60kg, topné spirály nejsou v přímém kontaktu s akumul. kameny = rychlejší natápění, delší životnost.

Regulace: DIDI power multifunkční digitální regulátor - ovládá dobu provozu, vnitřní teplotu, světlo,

Nadstandardní položky:





Doplňkové vybavení saunové kabiny (osvětlení):



Hvězdná obloha - velmi efektní osvětlení sauny pomocí 45 ks LED diod. Regulace osvětlení zajišťuje plynulou změnu barev nebo trvalý svit zvolené barvy. (Za příplatek 22.000,00 Kč bez DPH)



RAINBOW - LED duhové osvětlení = High-tec LED barevné osvětlení vytvářející jemné a uklidňující světelné nálady a efekty nabízí mimo bílého světla, brilantní a exotické barvy duhy – kompletní barevné spektrum se základními barvami červená / zelená / modrá a dalších 8 kombinací pevně naprogramovaných. 12 barev může svítit jednotlivě nebo se plynule měnit a může Vás tak podle navolené barvy přivést do nálady tajemných ročních období. (Za příplatek 20.000,00 Kč bez DPH)



D-WHITE – Ambientní LED bodové podsvícení zádoových – Ambientní LED bodové podsvícení DPH / m) opěrek (Za příplatek 3.000,00 Kč bez

Bodové stropní osvětlení nad topidlem – efektní nasvícení topidla (páry při polévání) 3ks speciálních bodovek za příplatek 5.605,- Kč bez DPH.

Kamenný nebo keramický obklad za topidlem příplatek 8.000,- Kč bez DPH / 1 stěna/, roh příplatek 12.000,- Kč bez DPH.

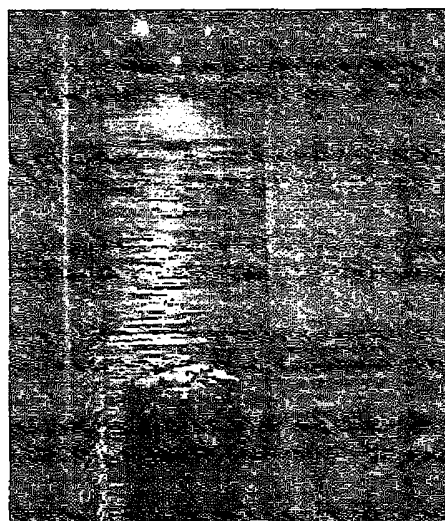


Podsvícení čelní hrany horních lavic LED páskem (příplatek 2.600,- Kč bez DPH / m)

Doplňkové vybavení saunové kabiny (ozvučení):

Sada vestavěných reproduktorů Pioneer s napojením na audio zdroj objednatele. (Za příplatek 2.360,00 Kč bez DPH)

DEXON - nástěnný přehrávač se zesilovačem a sadou speciálních reproduktorů do vlhkého prostředí - tento na trhu bezkonkurenční výrobek obsahuje nejenom zesilovač ve třídě D o výkonu 2x17 W, ale také FM tuner, Bluetooth konektivitu pro snadné přehrávání ze smartphonu nebo tabletu a dále Mp3 přehrávač, jež přehrává soubory z USB slotu. Uživatel tak získává nevidaný komfort přehrávače a zesilovače v jednom. To vše ještě umocňuje IR dálkové ovládání. Stačí připojit k napájení 230 V a kabeláží na reproduktory. Součástí nabízené audio soustavy jsou speciální reproduktory odolné vlhkému prostředí a vysokým teplotám. Magnet reproduktoru je kompletně uzavřen a membrána je polypropylenová. Cena této sestavy včetně instalace do saunové kabiny je 8.465,-Kč bez DPH.

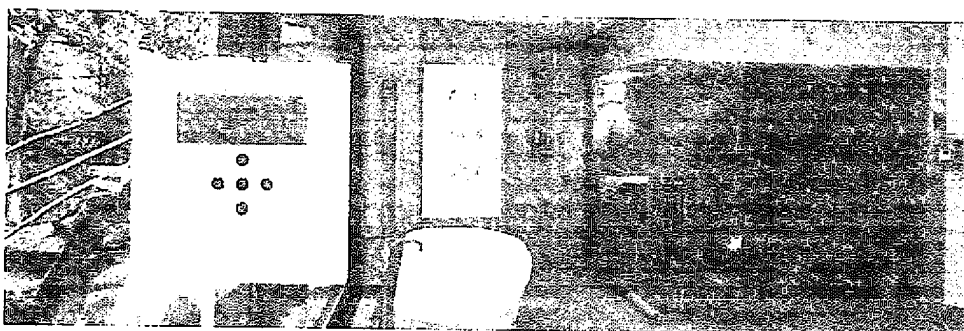

Obchodní podmínky, záruky stavební připravenost:


Platební a dodací podmínky: Saunu dodáváme od 20 týdnů po podpisu Smlouvy o dílo a po složení 50-ti % zálohy na náš účet, doplatek je realizován při předání saunové kabiny. V zimním období (saunové sezóně) jsou termíny dodání delší (dle domluvy). Přijetí nabídky s dodatky či odchylkami, včetně těch nepodstatných, bude považováno za novou nabídku, § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

Záruka: 36 měsíců

Stavební připravenost: Saunová kabina může být umístěna takřka kdekoli, ovšem vždy je potřeba nás seznámit s uvažovaným místem, abychom Vám mohli nabídnout nejlepší řešení i vhodnou techno-logii, obecně požadujeme - v místě sauny do roviny položenou keramickou dlažbu a do předpokládaného místa umístění sauny přiveden (cca ve výši 2m a ponechán ve smotku 3 m) kabel CyKy 5x4 jištěný 25A jističem s proudovým chráničem (z tohoto kabelu napojíme topidlo, regulaci i světlo), zvláštní požadavky na odvětrání nejsou – u vestavěných kabin je nutné zajistit možnost přívodu vzduchu v místě umístění topidla + otvor pro odtah, v případě dodávky topidla s parním vyvíječem příp. při intenzivním polévání kamen je vhodné umístění okna či ventilátoru pro odvětrání vzniklé vlhkosti - bližší informace naleznete v Podmínkách montáže, které jsou přílohou Smlouvy o dílo.




Orientační návrh saunové kabiny:

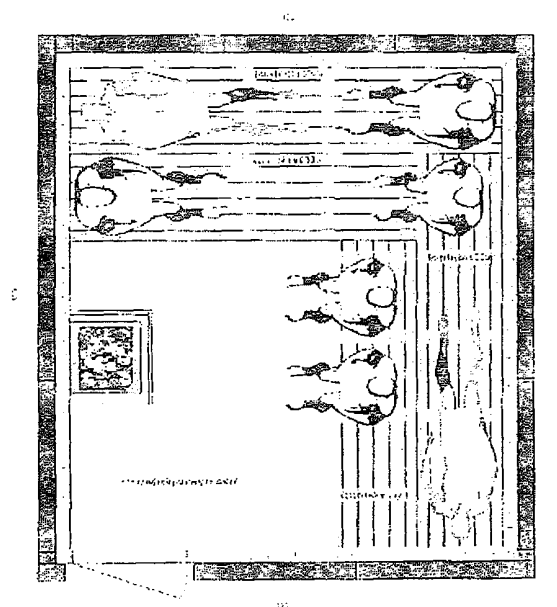

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	23.
identifikace akce:	
Název akce	KRP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS II	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: interiérové dveře, generální klíč.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO01 objekt č.5 – interiérové dveře do č. m. 1.04, generální klíč	
1. Do sprchy č. m. 1.04 bylo v PD uvažováno s obyčejnými interiérovými dveřmi. Vzhledem ke zvýšené vlhkosti a možnosti „polití vodou“ jsou dveře nahrazeny adekvátním typem (materiálem) do vlhkého prostředí. 2. Z provozních důvodů byly dveře doplněny o vložky systému generálního klíče.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: obyčejné interiérové dveře, generální klíč nebyl PD řešen	
Nové řešení: dveře vhodné do vlhkého prostředí viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.7.2021“	
Zdůvodnění změny: 1. dodatečné zjištění, 2. požadavek investora.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	30 316,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	30 316,00 Kč	
DPH:	6 366,36 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	36 682,36 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:



Úplnost zprávného listu za účastníka programu zkontroloval.
Datum:

⁹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RASZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL23 - interiérové dveře, generální klíč	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04.01.2022	
		CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	30 316,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		30 316,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 30 316,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	30 316,00	6 366,36
Cena s DPH			36 682,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL23 - interiérové dvoře, generální klíč

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			Práce a dodávky PSV				30 316,00
766			Konstrukce truhlářské				11 520,00
1	R	766R001	Vnitřní dveře 700/1970mm příplatek vložka odnímatelné provedení Neptun - viz CN	ks	2,000	5 760,00	11 520,00
767			Konstrukce zámečnické				18 796,00
2	R	767R001	D+M systému generálního klíče EVVA FPS - viz CN	kpl	1,000	18 796,00	18 796,00
			Celkem				30 316,00

MOINT s.r.o.

Pavla Hanuše 252, 500 02 Hradec Králové
IČO: 48150878 DIČ: CZ48150878



V Hradci Králové 3.1.2022

Cenová nabídka č. 222 RB

Akce: RaSZ Nový Hrádek modernizace areálu - stavba

A. Ubytovací část

6.	Vnitřní dveře 700/1970mm vlnitku odolně Neptun - č.m. 1.04 - příplatek	ks	2,000	5 760,00	11 520,00
	10 kusů dveří vlnitka 700/1970mm odolně Neptun - č.m. 1.04 - příplatek			5 760,00	

S pozdravem



Poptávající:

VALC, s.r.o.

Pražská třída 13/84

500 04 Hradec Králové



Název projektu: "Rehabilitační a školicí zařízení,
KŘP Středočeského kraje, Nový Hrádek,
modernizace areálu"

Datum zpracování nabídky: 10.11.2021

Věc: Cenová nabídka na dodávku a montáž nového patentního uzamykacího systému EVVA FPS
- třída bezpečnosti RC3 dle hodnocení příslušné normy - všechny klíče z kvalitní alpaky

Položka - systém EVVA FPS - cena po slevě	ks	Kč / ks	Celkem Kč
Cylindrická vložka FPS, rozměr DZ 27/36 mm	7	713	4 991
Cylindrická vložka FPS, rozměr DZ 36/51 mm	1	860	860
Cylindrická vložka FPS, rozměr DZ 41/61 mm	1	971	971
Cylindrická vložka FPS, rozměr DZ 46/61 mm	1	1008	1008
Vložka s knoflíkem FPS, rozměr KDZ 27/K36 mm	6	713	4 278
Klíče vlastní (samostatné) - systém FPS	2	116	232
Klíče hlavní - systém FPS	31	116	3 596
Klíče generální - systém FPS	5	116	580
Celkem cena hmotné dodávky FPS			16 516
montáž systému			2 280
doprava			0
Celková cena díla - systém EVVA FPS (vč. klíčů, montáže a dopravy po slevě bez DPH 21%)			18 796

Prodloužení cylindrické vložky FPS o 5mm je zpoplatněno navýšením o 40 Kč bez DPH.

V cenové nabídce je zahrnuto: 2 kusy vlastních klíčů, 31 kusů hlavních klíčů (3 klíče pro pokojskou, 4 klíče pro údržbu a 6 pokojů á 4 klíče) a 5 kusů klíčů generálních.

Ochrana cylindrických vložek proti odvrtání (MA) je v této nabídce zohledněna pro všechny dveře bez příplatku.

Cylindrické vložky EVVA FPS disponují standardně ochranou proti vyhmátnutí planžetou, proti odvrtání a proti SG metodě (bumping).

Všechny cylindrické vložky, hlavní a generální klíče budou označeny dle požadavku uživatele systému, resp. dle uzamykacího plánu.

Dodací podmínky jsou 2-3 týdny od zaměření uzamykacího systému, odsouhlasení uzamykacího plánu a potvrzení objednávky (výroba) + 1 den montáž (s ohledem na stavební připravenost).

Cenová nabídka vychází z konkrétního uzamykacího plánu a z fyzického přeměření dveří přímo na stavbě. Pro vnitřní dřevěné dveře je nutná specifikace od dodavatele včetně informace o tloušťce použitého rozetového kování.

Cenová nabídka je platná pro objednání nového systému do 30.11.2021

Za EVVA spol. s r.o. Praha



Systém EVVA FPS disponuje platnou
patentovou ochranou klíčů do roku 2026.



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	24.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: světlovody.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
S001 objekt č.5 – světlovody č. m. 2.01 a 2.06	
Světlovody navržené do č. m. 2.01 a 2.06 byly z provozních důvodů vypuštěny.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: světlovody dle PD a VV	
Nové řešení: ---	
Zdůvodnění změny: požadavek investora	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 151 050,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-151 050,00 Kč
DPH:	-31 720,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-182 770,50 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Za technický dozor stavby:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU



Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL24 - světlovody	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		04.01.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevně podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-151 050,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-151 050,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH		-151 050,00	
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem
		snížená	15,0	0,00	0,00
		základní	21,0	-151 050,00	-31 720,50
		Cena s DPH			-182 770,50
		E Přípočty a odpočty			
		Dodá zadavatel			0,00
		Klouzavá doložka			0,00
		Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

Objekt: ZL24 - světlovody

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	PSV				-151 050,00
		760	Výplně otvorů				-151 050,00
i	R	76080051	Světlovod DN 600 - dodávka a montáž	ks	-2,000	75 525,00	-151 050,00
			Celkem				-151 050,00

SOD

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	25.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RašZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bozén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilovo 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: VRN.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vedlejší rozpočtové náklady	
Z důvodu prodloužení termínu výstavby se poměrným dílem navyšuje položka na Vedlejší rozpočtové náklady na krytí nákladů spojených se zařízením staveniště a provozem stavby.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: vedlejší rozpočtové náklady	
Zdůvodnění změny: požadavek investora	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: žádné	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	150 000,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	150 000,00 Kč
DPH:	31 500,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	181 500,00 Kč
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	

*) EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 -
SO01 Rekonstrukce objektu 005

JKSO

Název objektu

ZL25 - VRN

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

05.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky			0,00	8	Práce přesčas			0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž			150 000,00	9	Bez pevné podf.			0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky			0,00	10	Kulturní památka			0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž			0,00	11				0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky			0,00						17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž			0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)				150 000,00	12	DN (ř. 8-11)				19	VRN (ř. 13-18)				0,00	
20	HZS				0,00	21	Kompl. činnost			0,00	22	Ostatní náklady				0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 150 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	150 000,00	31 500,00

Cena s DPH 181 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
Objekt: ZL25 - VRN

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

	VRN	VRN			150 000,00
--	------------	------------	--	--	-------------------

	1 - ZS	Zařízení staveniště			150 000,00
--	---------------	----------------------------	--	--	-------------------

1	R	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kp/	1,000	150 000,00	150 000,00
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------

"1. Zařízení staveniště - zřízení ... celkem 20 000,-"

"doprava ... 110kmx35,-/km = 3850,- x 4 jízdy = 15 400,-"

"dělník ... 287,50,-/hod x 16hod. = 4 600,-"

"2. Zařízení staveniště - odstranění ... celkem 20 000,-"

"doprava ... 110kmx35,-/km = 3850,- x 4 jízdy = 15 400,-"

"dělník ... 287,50,-/hod x 16hod. = 4 600,-"

"3. Zařízení staveniště - provoz / pronájem ... 30 000,-/ měsíc x 12 měsíců ... celkem 360 000,-"

"prodloužení díla o 5 měsíců provozu / pronájmu ... tj. 5 x 30 000,- = 150 000,-"

1

1,000

			Celkem		150 000,00
--	--	--	---------------	--	-------------------

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	26.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: Nátěry dřevěného podhledu.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 01 objekt č.5 – nátěry dřevěného podhledu přesahu střechy	
Přiznaná prkna podhledu přesahu střechy měla již degradovaný nátěr. Z důvodu prodloužení jejich životnosti a dále z estetického důvodu, bylo rozhodnuto o kompletní obnově nátěrů.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: dodatečně zjištění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DŠPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	61 967,55 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	61 967,55 Kč	
DPH:	13 013,19 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	74 980,74 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

⁹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 -
SO01 Rekonstrukce objektu 005

JKSO

Název objektu

ZL26 - Nátěry dřevěného podhledu

EČO

Misto

IČO

DiČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

07.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 308,08	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	8 932,29	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	15 353,26	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	31 373,92	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		61 967,55	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 61 967,55

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	61 967,55	13 013,19

Cena s DPH 74 980,74

E Přípočty a odpočty

Dodávatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL26 - Nátěry dřevěného podhledu

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 7. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **15 240,37**

9 **Ostatní konstrukce a práce, bourání** **15 240,37**

1	003	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	184,285	82,70	15 240,37	URS 2022/01
24,617*3+24,617*2+10,2*6					184,285			

PSV **PSV** **46 727,18**


783 **Dokončovací práce - nátěry** **46 727,18**

2	783	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,500	49,60	4 092,00	URS 2022/01
3	783	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,500	4,66	384,45	URS 2022/01
4	783	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	82,500	5,13	423,23	URS 2022/01
5	783	783252121	Lokální tmelení tesařských kcl přes 30 do 50 % pl polyesterovým tmelem	m2	82,500	142,00	11 715,00	URS 2022/01
6	783	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	82,500	123,00	10 147,50	URS 2022/01
7	783	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	82,500	242,00	19 965,00	URS 2022/01

Celkem **61 967,55**

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	27.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VAIC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: ZTI a ÚT.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 01 objekt č.5 – ZTI a ÚT	
V průběhu realizace ZTI a ÚT v SO 01 došlo z provozních důvodů ke spoustě změn. ZTI - Úprava tras splaškové kanalizace a úprava tras rozvodů studené a teplé vody (hlavně ve 2.NP). Z praktických důvodů došlo k úpravě hlavního přívodu vody do budovy a to včetně posunutí hlavního uzávěru. Ve VV nebyly uvedeny požární hydranty. Pro saunu byl doplněn žlábek pro odvod vody. V místnosti 1.15 bylo vypuštěno WC a umyvadlo. Bude zde umístěna pračka a sušička. V prostoru původní kotelny a jejího zázemí (č.m. 1.17, 1.18 a 1.19) došlo ke kompletní výměně potrubí a doplnění uzavíracích armatur z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Dále došlo k doplnění uzavíracích armatur na potrubí pro sousední budovu, která se nerekonstruovala. ÚT - Z provozních důvodů byly v koupelnách vypuštěny otopná tělesa desková. Náhradou jsou topné žebříky. Do topných žebříků byly dále doplněny topné elektrické patrony. U části deskových radiátorů byl změněn jejich rozměr. V prostoru původní kotelny a jejího zázemí (č.m. 1.17, 1.18 a 1.19) došlo ke kompletní výměně potrubí a tepelné izolace z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Dále došlo k doplnění uzavíracích armatur na potrubí pro sousední budovu, která se nerekonstruovala. V průběhu realizace došlo ke zjištění, že VV byl podhodnocen v metrech a kusech některých komponentů.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: Chyby projektu a dodatečná zjištění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	261 360,60 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	52 689,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	208 671,60 Kč	
DPH:	43 821,04 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	252 492,64 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

⁹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL27 - ZTI a ÚT	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VAIC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.01.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 208 671,60	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 208 671,60	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 208 671,60

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	208 671,60	43 821,04
Cena s DPH			252 492,64

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL27 - ZTI a ÚT

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 10. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					-20 980,00
1	R	725001001	Záchodová mísa vč. sedátka - dodávka a montáž	kus	-1,000	11 589,00	-11 589,00	SOD
2	R	725001005	Umývatko, vč. sifonu - dodávka a montáž	kus	-1,000	2 391,00	-2 391,00	SOD
3	R	725010001	Splachovací nádržka do stěny včetně ovládacího tlačítka a napojení - dodávka a montáž	kus	-1,000	7 000,00	-7 000,00	SOD
735			Otopná tělesa					229 651,60
4	R	735152151	Otopné těleso panel jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 205 W	ks	1,000	1 197,00	1 197,00	SOD
5	R	735152212	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 300/500mm výkon 275 W	ks	-5,000	1 287,00	-6 435,00	SOD
6	R	735152554	Otopné těleso deskové 500/700	ks	-3,000	2 267,00	-6 801,00	SOD
7	R	735152556	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900mm výkon 1307 W	ks	-4,000	2 526,00	-10 104,00	SOD
8	R	735152700	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400mm	ks	-1,000	6 329,00	-6 329,00	SOD
9	R	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	ks	-6,000	340,00	-2 040,00	SOD
10	R	R001	D+M ZTI a ÚT objekt 005 - dle nabídky	kpl	1,000	168 236,40	168 236,40	CN
11	R	R002	D+M ZTI a ÚT Kotelny - dle nabídky	kpl	1,000	91 927,20	91 927,20	CN
Celkem							208 671,60	

vodoinstalatérské a topenářské práce
 Pavlišov 53, 547 01 Náchod
 IČO: 13578201

VALC s.r.o.
 Hradec Králové

Nabídka: SO01 - 005 vícepráce soubor ZTI a ÚT

	mj	množství	cena za mj	cena celkem
žlábků pro potrubí:				
žlábek pro potrubí DN 32	m	8	99,60	796,80
žlábek pro potrubí DN 28	m	32	91,20	2918,40
žlábek pro potrubí DN 20	m	26	84,00	2184,00

2.NP ventily:

Ventil 1" vč. DG kov 32x1"	ks	2	394,80	789,60
Ventil 1/2" vč. DG kov 20x1/2"	ks	1	243,60	243,60

Místnost 2.19:

předělání a posunutí wc a odpadu	kpl	1	1200,00	1200,00
----------------------------------	-----	---	---------	---------

chybějící izolace

Izolace 18/20	m	108	57,60	6220,80
Izolace 26/10	m	150	62,40	9360,00
Izolace 32/10	m	56	66,00	3696,00

chybějící montáž potrubí ve výkazu

montáž potrubí z plast trub do DN 20	m	78	100,80	7862,40
--------------------------------------	---	----	--------	---------

Příprava pro žlábků u sauny:

vysazení odbočky DN 125	ks	1	660,00	660,00
Potrubí KG DN 100	m	4	319,20	1276,80

Venkovní kanalizace

Potrubí KG DN 100	m	11	319,20	3351,60
Potrubí KG DN 125	m	32	352,80	11289,60
Potrubí KG DN 150	m	15	468,00	6786,00

Hydranty

Hydrant D 25/20	ks	2	9540,00	19080,00
-----------------	----	---	---------	----------

Změna projektu:

Sifon AP	ks	2	186,00	372,00
Ventil na AP	ks	1	238,80	238,80
Potrubí KG DN 100	m	10	319,20	3192,00
Baterie sprchová – dodávka a montáž	ks	9	2724,00	24516,00

radiátory a potrubí navíc

Radik VK 11 500x400	ks	3	1448,40	4345,20
Radik VK 22 500x400	ks	2	2217,60	4435,20
Radik VK 33 900x1800	ks	1	8896,80	8896,80
Koupeľ radiátor 1820x750+tyč+termostat	ks	4	5850,00	23400,00
Koupeľ radiátor 1820x600+tyč+termostat	ks	2	5576,40	11152,80
Armatura připojovací ke koupel radk	ks	6	1662,00	9972,00

Celkem bez DPH

168 236,40 Kč



vodoinstalatérské a topenářské práce
 Pavlišov 53, 547 01 Náchod
 IČO: 13578201

VALC s.r.o.
 Hradec Králové

Nabídka: vícepráce kotelna 005

mj množství cena za mj cena celkem

hlavní uzávěr vody

Potrubí plast DN 40	m	8	634,80	5078,40
Ventil kulový 5/4"	ks	3	543,60	1630,80
Ventil kulový 1"	ks	1	394,80	394,80
Izolace tubex	m	8	55,20	441,60

odpady a voda

Potrubí plast DN 20	m	3	254,40	763,20
Nástěnka plast	ks	2	178,80	357,60
výpustka vodovodní	ks	2	118,80	237,60
Izolace tubex	m	3	50,40	151,20
Sifon AP	ks	2	186,00	372,00
Potrubí HT DN 50	m	15	271,20	4068,00

potrubí kotelna 005

Potrubí plast DN 40	m	40	634,80	25392,00
Potrubí plast DN 50	m	1	637,20	637,20
Potrubí plast DN 32	m	12	370,80	4449,60
Potrubí plast DN 25	m	24	309,60	7430,40
Potrubí plast DN 20	m	12	253,20	3038,40
Izolace potrubí DN 40	m	40	55,20	2208,00
Izolace potrubí DN 50	m	1	55,20	55,20
Izolace potrubí DN 32	m	12	55,20	662,40
Izolace potrubí DN 25	m	24	55,20	1324,80
Izolace potrubí DN 20	m	12	50,40	604,80
žlábký pro potrubí	m	89	67,20	5980,80
Zpětná klapka DN 6/4"	ks	1	648,00	648,00
Zpětná klapka DN 5/4"	ks	3	594,00	1782,00
Zpětná klapka DN 1"	ks	1	396,00	396,00
ventil zahradní 1/2"	ks	1	213,60	213,60
Nástěnka plast	ks	1	178,80	178,80
Výpustka vodovodní	ks	1	118,80	118,80
Potrubí HT DN 40	m	4	271,20	1084,80
HL 21	ks	1	626,40	626,40
Izolace na UT s AL 76 – stávající potrubí	m	10	403,20	4032,00
Izolace na UT s AL 2" stávající potrubí	m	12	358,80	4305,60
Izolace TUBEX DN40 stávající potrubí	m	12	50,40	604,80
Izolace TUBEX DN50 stávající potrubí	m	12	50,40	604,80
Izolace TUBEX DN25 stávající potrubí	m	4	50,40	201,60

Kotelna 005


Potrubí černé DN 20	m	5	271,20	1356,00
Ventil kulový přímý DN 20	ks	2	333,60	667,20
Teploměr kruhový DN100	ks	1	663,60	663,60
Vysazení t kusu pro pojistný ventil	ks	1	1030,80	1030,80
Potrubí HT DN 40	m	1	271,20	271,20

List1

Potrubí plast DN 40	m	2	512,40	1024,80
Pojistný ventil 1"	ks	1	1498,80	1498,80
Sifon A 21	ks	2	1078,80	2157,60
izolace potrubí – materiál zákazníka	m	16	67,20	3091,20
montáž armatur	ks	3	30,00	90,00

Celkem bez DPH

91 927,20 Kč



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	28.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SIMVS "	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: změna elektroinstalace v objektu 005.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 01 objekt č.5 – změna elektroinstalace	
Na základě požadavku investora došlo k úpravě dispozice – propojení WC s předsíněmi u WC. Tím došlo k redukci počtu svítidel a spínačů. V PD nebylo uvažováno s elektroinstalací pro saunu 1.12. Nainstaloval se přírodní kabel a upravil rozvaděč s novým jištěním. Nově se natahaly kabely pro topné patrony v útopných žebřících, infrazářič v koupelně 1.04, přívody pro sušáky lyžáků v místnosti 1.14, přívod pro pračku a sušičku v místnosti 1.15 a přívod pro ústřednu slaboproudu 1.02. To vše s úpravami rozvaděče a doplněním jištění. Dále byl z provozních důvodů přemístěn hlavní rozvaděč z m. č. 1.14 do 1.15.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: dodatečný požadavek.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	49 800,61 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 8 582,20 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	41 218,41 Kč
DPH:	8 655,87 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	49 874,28 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Za technický dozor stavby:	
Opinost zmíněného listu za účastníka programu zkontrolovat:	
Datum:	

*) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005

JKSO

Název objektu

ZL28 - Změna elektroinstalace objektu 005

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

Projektant

KOPRIN s.r.o.

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

12.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 4 806,60	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 36 411,81			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 41 218,41	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 41 218,41

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	41 218,41	8 655,87

Cena s DPH 49 874,28

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU – Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
Objekt: ZL28 - Změna elektroinstalace objektu 005

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
Zhotovitel: VALC, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2			Kabely včetně ukončení a prořezu v provedení dle PBŘ				10 603,90
1	R	741-2-001	Kabel CYKY 3x1,5mm2	m	45,000	21,70	976,50 SOD
			"odpočet světlidel a vypínačů" -15		-15,000		
			"posun umístění RH" 60		60,000		
			Součet		45,000		
2	R	741-2-005	Kabel CYKY 3Jx2,5mm2	m	324,000	28,50	9 234,00 SOD
			"přívod pro pračku a sušičku" 28		28,000		
			"přívod k topným el. žebříkům 2.NP" 74		74,000		
			"přívod pro ústřednu slaboproudu" 43		43,000		
			"přívod pro infrazářič" 43		43,000		
			"přívod pro sušáky bot" 61		61,000		
			"posun umístění RH" 75		75,000		
			Součet		324,000		
3	R	741-2-006	Kabel CYKY 5x4mm2	m	-14,000	64,90	-908,60 SOD
			"odpočet sauna" -14		-14,000		
4	R	741-2-007	Kabel CYKY 5Jx5mm2	m	15,000	86,80	1 302,00 SOD
			"posun umístění RH" 15		15,000		
3			barevné provedení a typ přístrojů bude upřesněn v rámci PD interiéru				1 189,90
5	R	741-3-001	Instalační krabice univerzální KJ, odbočná, přístrojová, pro vícenásobné rámečky	ks	5,000	25,20	126,00 SOD
			"přívod pro pračku a sušičku" 2		2,000		
			"přívod k topným el. žebříkům 2.NP" 5		5,000		
			"přívod pro infrazářič" 1		1,000		
			"přívod pro sušáky bot" 3		3,000		
			"odpočet světlidel a vypínačů" -7		-7,000		
			Součet		5,000		
6	R	741-3-002	Zásuvka jednonásobná do vícenásobných rámečků komplet 230V/16A, IP20	ks	5,000	193,40	967,00 SOD
			"přívod pro pračku a sušičku" 2		2,000		
			"přívod k topným el. žebříkům 2.NP" 6		6,000		
			"odpočet světlidel a vypínačů" -3		-3,000		
			Součet		5,000		
7	R	741-3-003	Zásuvka jednonásobná do vícenásobných rámečků komplet 230V/16A, IP44	ks	3,000	261,10	783,30 SOD
			"přívod pro sušáky bot" 3		3,000		
8	R	741-3-005	Spínač jednopólový 230V/10A, řazení 1, komplet - rámeček, přístroj, klapka, IP20	ks	-4,000	171,60	-686,40 SOD
4			Světidla				-6 987,20
9	R	741-4-003	Přisazené LED světlo s krytem 41W/5000lm, IP20	ks	-1,000	2 865,50	-2 865,50 SOD
10	R	741-4-007	Kruhové LED přisazené světlo s plastovým krytem 27W/2700lm, IP40	ks	-3,000	1 373,90	-4 121,70 SOD
M			Práce a dodávky M				36 411,81
21-M			Elektromontáže				36 411,81
11	R	R001	Úpravy rozvaděčů a kabeláž - viz cenová nabídka	kpl	1,000	36 411,81	36 411,81 CN
Celkem							41 218,41

Cenová nabídka víceprací



ELEKTRO MOSEV

5770-187-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,

R a ŠZ Nový Hrádek modernizace areálu

PČ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1 Přívod sauna

CYKY 5:x16	bm	29,0	228,01	6 612,35
Spojka na 5x16	ks	1,0	1494,00	1 494,00
Úprava rozvaděče a doplnění chrániče 20/C/3f	kpl	-1,0	1512,00	-1 512,00
Úprava rozvaděče a doplnění chrániče 63A a 50/C/3f	kpl	1,0	6290,4	6 290,40

2 Přívod pro infrazářič 1.04

Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	kpl	1,0	760,44	760,44
-----------------------------------	-----	-----	--------	--------

3 Přívod pro sušáky bot 1.14

Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	ks	3,0	810,72	2 432,16
-----------------------------------	----	-----	--------	----------

4 Posun kabeláže do jiného umístění RH

Cyky 5Jx16	bm	15,0	228,01	3 420,18
Spojky kabeláže	kpl	1,0	2950,32	2 950,32

5 Přívod pro pračku a sušičku INP

Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	kpl	2,0	760,44	1 520,88
-----------------------------------	-----	-----	--------	----------

6 Přívod k topným el. žebříkům ZNP

Úprava rozvaděče a doplnění 16/1f	ks	6,0	760,44	4 562,64
-----------------------------------	----	-----	--------	----------

7 Přívod pro ústřednu slaboproudu 1NP

Úprava rozvaděče a doplnění 10/1f	ks	1,0	880,44	880,44
-----------------------------------	----	-----	--------	--------


8	Doprava a podružný materiál	kpl	1,0	7000,00	7 000,00
---	-----------------------------	-----	-----	---------	----------

Ceikem

36 411,81

CELKEM bez DPH:

36 411,81 Kč



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	29.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčč - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelný, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: VZT	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 01 objekt č.5 – VZT	
V průběhu stavebních prací nad 2. NP v objektu č.5 došlo ke zjištění, že stropy jsou trámové s prkenným záklopem z obou stran. Z tohoto důvodu muselo VZT potrubí tyto trámy obcházet – došlo ke změně tras. Zvýšil se počet tvarovek (kolen) a prodloužilo se potrubí. Projekt počítal s betonovým stropem. Prostupy měly být vedeny přímo do půdního prostoru a to nejkratší cestou od ventilátorů.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace k 28.2.2021“	
Zdůvodnění změny: dodatečné zjištění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:		38 079,49 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		9 173,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		28 905,94 Kč
DPH:		5 070,25 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		34 976,19 Kč
Za zhotovitele:		Za projektanta: Za technický dozor stavby:



Opis přechodu zobrazeného foto ze systému programu zkoumá dovoz.

Datum:

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005	JKSO	
Název objektu	ZL29 - VZT	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC. s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	17.01.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	478,45		9	Bez pevně podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	28 427,49		11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		28 905,94		12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 28 905,94			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	28 905,94	6 070,25
						Cena s DPH 34 976,19			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO01 Rekonstrukce objektu 005
 Objekt: ZL29 - VZT

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC. s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 490,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 490,00

1	003	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových s přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	URS 2022/01
2	003	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových s přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,300	1 310,00	1 310,00	URS 2022/01

PSV Práce a dodávky PSV 25 415,94

751 Vzduchotechnika 28 427,49

3	R	R001	D+M - tepelná izolace kaučuk. tl 20mm - viz CN	kpl	1,000	28 280,43	28 280,43	CN
4	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	282,804	0,52	147,06	URS 2022/01

1 Zařízení č. 1 – Větrání wc, koupelen odvod -1 524,05

5	R	1A.022	Radiální ventilátor s filtrem, máj, IP44, ELEKTRODESIGN, EBB 250 T, Ne=100W, 230V, včetně doběhového relé, zpětná klapka mechanická	ks	-1,000	5 982,00	-5 982,00	SOD
6	R	1A.400	Jamely jsou pevné, maximální teplota okolí +70°C, maximální rychlost 12 m/s, ELEKTRODESIGN, PRG-160 W	ks	-1,000	1 524,00	-1 524,00	SOD
7	R	1A.955.1	Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=100mm	bm	-1,000	84,00	-84,00	SOD
8	R	1A.955.2	Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=125mm	bm	3,000	114,00	342,00	SOD
9	R	1A.955.3	Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, d=160mm	bm	-0,200	148,00	-29,60	SOD
10	R	1A.956.1	Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 100	bm	15,000	252,00	3 780,00	SOD
11	R	1A.956.2	Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 130	bm	6,000	340,00	2 040,00	SOD
12	R	1A.956.3	Tvarovky potrubí materiál pozinkovaný plech, Vinuté potrubí SPIRO, 160	bm	-0,150	443,00	-66,45	SOD

3 Zařízení č. 3 – Větrání zázemí 1.NP přívod -1 487,50

13	R	3.950	Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, Čtyřhranné potrubí skupiny I, se stranami do 250 mm	m2	-3,500	425,00	-1 487,50	SOD
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	-----

Celkem 28 905,94

LOMA KLIMA s.r.o.

LoMa Klima s. r. o., Na Kotli 1173/35, Hradec Králové

Pol.č.	Popis	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
POLOŽKOVÝ ROZPOČET				
	VCP 1			28 280,43 Kč
1	Zařízení č. 1 – Větrání wc, koupelen odvod Kolíze s trámy ve ZNP přesun potrubí do podkrovní doplnění izolace tepelná izolace kaučuk, tl 20mm	29,675	919,30	27 280,43 Kč
4	Montážní práce, doplňky			
4.2	Upevňovací a spojovací materiál	1,000	1 000,00	1 000,00 Kč



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	30.
Identifikace akce:	
Název akce	KRP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštílova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SDK podhled	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02. (bazén) – SDK podhled, akustické kazety	
V PD byl navržen SDK podhled, ale v klasickém provedení pro běžný provoz v obchodech, kancelářích, školách a podobně. Toto provedení je naprosto nevhodné do prostor s nadměrnou vlhkostí. Tím bazén a whirlpool je. V tomto prostředí je i zvýšený obsah chlóru, což má za následek zvýšenou agresivitu na kovové součásti nosné konstrukce. Z tohoto zákonitě muselo dojít ke změně celého provedení stropu. Rastr podhledu je v antikorozním provedení a stropní kazety jsou ve vlhku odolném provedení.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV – Sádrolanový kazetový strop	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“ – Akustický minerální kazetový strop a antikorozním rastroem	
TDI souhlasí se ZL z důvodu navržené nevhodného systému pro bazénové prostředí - vzhledem k navržené kci, by docházelo ke korozi profilů a degradaci SDK desek které do navrženého systému nepatří. Nelze zajistit jejich stabilitu a systémové ošetření detailu SDK. Jedná se o chybu ve VV a PD	
Zdůvodnění změny: chyba projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DOPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 039 971,73 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 303 219,48 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	736 752,25 Kč	
DPH:	154 717,97 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	891 470,22 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu	JKSO	
Název objektu	ZL30 - SDK podhled, akustické kazety	EČO	
		Místo	
		IČO	DiC
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo	One	CZ-CPV	
	17.01.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	21 598,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	28 381,35	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-234 558,64	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	921 330,74	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7 ZRN (ř. 1-6)			736 752,25	12 DN (ř. 8-11)				19 VRN (ř. 13-18)			0,00
20 IIZS			0,00	21 Kompl. činnost			0,00	22 Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 736 752,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	736 752,25	154 717,97

Cena s DPH 891 470,22

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu
 Objekt: ZL30 - SDK podhled, akustické kazety

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 17. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 49 980,15

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 49 980,15

1	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 13 m	m3	658,500	43,10	28 361,35	URS 2022/01
			6*10*1,5+3*3*1,5+10*18,5*3		658,500			
2	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použili	m3	13 170,000	1,64	21 598,80	URS 2022/01
			658,5*20		13 170,000			

PSV PSV 686 772,10

763 Konstrukce suché výstavby 686 772,10

3	R	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-273,190	353,60	-96 599,98	SOD
4		59030596	Voděodolný sádrokartonový podhled rastrový	m2	-185,000	748,00	-138 380,00	SOD
5		59030581	Sádrokartonový podhled rastrový	m2	-101,850	670,00	-68 238,50	SOD
6	R	763R001	D+M SDK akustického kazetového podhledu - viz CN	kpl	1,000	989 991,58	989 991,58	CN

Celkem 736 752,25

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PČR DLOUHÉ RZY

Objekt: PČR Nový Hrádek bazén akustika

Objednatel: VALC s.r.o.

Zhotovitel:

Místo: DLOUHÉ RZY

Zpracoval: UNI-GIPS s.r.o.

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

763

Konstrukce suché výstavby

989 991,58

1	763	763131451.KNF	SDK podhled D 112 deska 1xGREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	101,850	905,96	92 272,03
---	-----	---------------	--	----	---------	--------	-----------

Výměra vychází z původního VV

101,850

101,850

Mezisoučet

101,850

Součet

101,850

2	R	7639R001	D+M Akustického kazetového podhledu do bazénových prostor	m2	185,000	4 721,00	873 385,00
---	---	----------	---	----	---------	----------	------------

Výměra vychází z původního VV

V ceně není kalkulována případná úprava podhledu pro

osazení VZT a osvětlení

185,000

185,000

Mezisoučet

185,000

Součet


185,000

3	763	763131764.2	SDK likvidace odpadu	%	9 656,570	1,00	9 656,57
---	-----	-------------	----------------------	---	-----------	------	----------

4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9 656,570	1,52	14 677,99
---	-----	-----------	---	---	-----------	------	-----------

Celkem

989 991,58

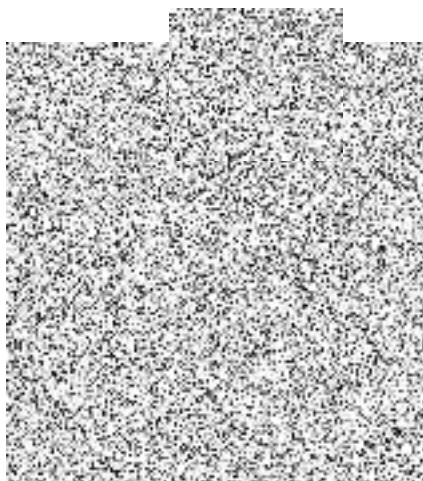

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	31.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stčk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 3/ 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 - VZT.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) – VZT	
1 – V PD nebylo počítáno s tepelnou izolací VZT potrubí. Vzhledem k nadměrné vlhkosti prostředí, by na potrubí docházelo ke kondenzaci vodních par a odkapávání kondenzátu na podhled. Proto je nutné celé potrubí polepit tepelnou (nenasákavou) izolací s povrchovou úpravou z klenikové fólie. 2 – Prostor mezi podhledem a monolitickým stropem je uzavřen, bez možnosti odvodu vlhkosti – vodních par obsahujících chlór. Z tohoto důvodu, bylo VZT potrubí (v mezistropním prostoru) doplněno o přívod a odvod vzduchu. Toto opatření zajistí provětrávání „mrtvého“ prostoru.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: chyba projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	392 583,28 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	392 583,28 Kč	
DPH:	82 442,49 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	475 025,77 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
Opinost změnového listu ze systému programu koordinován.		
Datum:		

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu	JKSO	
Název objektu	ZL31 - VZT - SO02	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	18.01.2022
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 510,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	388 073,28	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		392 583,28	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 392 583,28

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	392 583,28	82 442,49
Cena s DPH			475 025,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu
 Objekt: ZL31 - VZT - SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 1. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 490,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 490,00

1	C03	946111113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových s přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	2 180,00	2 180,00	URS 2022/01
2	C03	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových s přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	URS 2022/02

PSV Práce a dodávky PSV 389 093,28

751 Vzduchotechnika 388 073,28

3	R	751R001	Větrání bazénu a zázemí 1.NP - viz cenová nabídka	kpl	1,000	388 060,46	388 060,46	CN
4	751	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 17 m	%	3 870,804	0,52	2 012,82	URS 2022/02

2 Zařízení č. 2 – Větrání bazénu přívod 510,00

5	R	2.950	Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm	m2	1,200	425,00	510,00	SOD
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------	-----

2A Zařízení č. 2 – Větrání bazénu odvod 510,00


6	R	2A.950	Trouby rovné materiál pozinkovaný plech, čtyřhranné potrubí skupiny I., se stranami do 250 mm	m2	1,200	425,00	510,00	SOD
---	---	--------	---	----	-------	--------	--------	-----

Celkem 392 583,28

LOMA KLIMA s.r.o.

LoMa Klima s. r. o., Na Kotli 1173/35, Hradec Králové


Pol.č.	Popis	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
POLOŽKOVÝ ROZPOČET				386 060,46 Kč
2	Zařízení č. 2 – Větrání bazénu přívod			
	tepelná izolace kaučuk tl. 15mm samolepicí s Al polepem (vč. prořezu)	234,083	871,65	204 041,06 Kč
	regulační klapka ruční 200x200	1,000	1 740,57	1 740,57 Kč
	Krycí mřížka 200x200	1,000	718,82	718,82 Kč
	Stěrbinová vyúst' Série VSD35 s 35mm - příplatek za RAL9010	21,000	557,19	11 910,99 Kč
2A	Zařízení č. 2 – Větrání bazénu odvod			
	příplatek za tlumiče v hygienickém provedení	2,000	2 642,00	5 284,00 Kč
	tepelná izolace kaučuk tl. 15mm samolepicí s Al polepem (vč. prořezu)	72,675	871,65	63 347,16 Kč
	požární izolace	12,825	1 678,93	21 507,24 Kč
	příplatek za těsné potrubí (tmelené)	67,200	94,80	6 370,56 Kč
	regulační klapka ruční 200x200	1,000	1 740,57	1 740,57 Kč
	Krycí mřížka 200x200	1,000	718,82	718,82 Kč
	Mřížka odvodní pohledová 800x500 - příplatek za RAL9010	2,000	264,15	528,30 Kč
3	Zařízení č. 3 – Větrání zázemí 1.NP přívod			
	tepelná izolace kaučuk tl. 15mm samolepicí s Al polepem (vč. prořezu)	28,371	871,65	24 729,61 Kč
3A	Zařízení č. 3 – Větrání zázemí 1.NP odvod			
	tepelná izolace kaučuk tl. 15mm samolepicí s Al polepem (vč. prořezu)	45,829	871,65	39 947,07 Kč
	příplatek za těsné potrubí (tmelené)	36,663	94,80	3 475,69 Kč



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	32.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RašZ. Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Mědřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 - elektroinstalace.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) – elektroinstalace	
1 – V PD nebylo uvažováno se svítidly do agresivního prostředí – velmi zvýšená vlhkost s obsahem chloru. To vedlo ke změně svítidel (prostor bazénu a whirlpoolu m. 1.01) odpovídajících danému prostředí 2 – V PD nebyla řešena nouzová signalizace v sociálním zařízení pro invalidy, místnost 1.06. Tuto bylo nutno nainstalovat. 3 – Okna byla dodatečně opatřena venkovními žaluziemi. K nim bylo nutné dovést kabely pro jejich pohony a do rozvaděče vsadit jištění 4 – Prostory bazénu a šaten byly dodatečně ozvučeny (místnosti 1.01, 1.04, 1.07, 1.09, 1.10). Byla nainstalována kabeláž pro reproduktory	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: 1 a 2 chyba projektu, 3 a 4 požadavek objednatele	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	212 552,26 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 36 630,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	175 922,26 Kč
DPH:	36 943,67 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	212 865,93 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta: Za technický dozor stavby:



Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 -
S002 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL32 - Změna elektroinstalace objektu S002

EČO

Misto

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALCO, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -7 047,30	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 182 969,56			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 175 922,26	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 175 922,26

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	175 922,26	36 943,67
Cena s DPH			212 865,93

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu
 Objekt: ZL32 - Změna elektroinstalace objektu SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 1. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M Práce a dodávky M							175 922,26
21-M Elektromontáže							182 969,56
1	R	21R001	elektroinstalace - viz cenová nabídka	kpl	1,000	182 969,56	182 969,56
2 Kabely včetně ukončení a prořezu v provedení dle PBŘ							2 842,70
2	R	741-2-001	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2	m	131,000	21,70	2 842,70
"Doplnění přívodu pro žaluzie" 85					86,000		
"Ozvučení bazénu" 131					131,000		
3 provedení a typ přístrojů bude upřesněn v rámci PD interiéru							252,00
3	R	741-3-001	Instalační krabice univerzální KU, odbočná přístrojová, pro vícenásobné rámečky	ks	10,000	25,20	252,00
"Doplnění přívodu pro žaluzie" 7					7,000		
"Invalidní WC" 3					3,000		
Součet:					10,000		
4 Svítidla							-10 142,00
4	R	741-4-002	Vestavné LED svítidlo do minerálního podhledu 55W/5500lm, IP65	ks	-12,000	3 052,50	-36 630,00
5	R	741-4-003	Průmyslové LED prachotěsné svítidlo 32W/4400lm, IP65	ks	18,000	1 555,50	28 000,00
"1.NP a 1.PP" 16					16,000		
Celkem							175 922,26

R a ŠZ Nový Hrádek modernizace areálu

PČ	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1 Doplnění přívodu pro žaluzie SOO2

Průrazy do 30mm	kpl	1,0	1060,00	1 060,00 Kč
Úprava a doplnění rozvaděče 10/1t	kpl	1,0	880,4	880,44 Kč

2 Ožvučení bazénu -kabeláže SOO2 – 1NP

Průraz do 30mm	kpl	1,0	870,00	871,00 Kč
Kabel příchytky	ks	70,0	28,95	98,95 Kč
Úprava rozvaděče a doplnění 10/1t	ks	1,0	880,4	880,44 Kč

3 Doplnění sady pro invalidní osobu

Sada pro nouzovou signalizace	ks	1,0	8417,50	8 417,50 Kč
kabel UTP	bm	25,0	25,63	640,63 Kč
Trubka LPE16	bm	25,0	53,20	1 330,00 Kč
Sekání	kpl	1,0	4500,00	4 500,00 Kč

4 Svítidla do minerálního podhledu

LUZERNA AVANT UGR19;CRI >80,3000K, IP20-54, PS-diffuser DALI	ks	15,0	5 695,6	85 434,00 Kč
kompaktní napáječ DALI 64 mA	ks	1,0	8 743,0	8 743,00 Kč
minivstupní jednotka DALI	ks	3,0	3 889,6	11 668,80 Kč
Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5	m	35,0	38,4	1 344,00 Kč
DALI řízení	kpl	1,0	47 100,8	47 100,80 Kč

5 Ostatní


Napojení a zkouška zařízení	hod	4,0	500,0	2 000,00 Kč
Doprava a Podružný materiál	kpl	1,0	8 000,0	8 000,00 Kč

CELKEM bez DPH:**182 969,56 Kč**

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	33.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaSZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS "	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 – prostupy ŽB konstrukcí pro technologii.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) – prostupy monolitickými stěnami a stropy	
Prostupy monolitickými stěnami a stropy větších rozměrů byly uvedeny v projektu a prováděly se současně s šalováním při betonáži. Vzhledem k vysokému počtu potrubí a kabelů a nekoordinací jednotlivých profesí došlo k chybám v PD. Prostupy menších průměrů, pro některá potrubí a kabely, nebyly zahrnuty do PD.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: chyba projektu	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPŠ	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:		ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:		ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	20 338,74 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	20 338,74 Kč	
DPH:	4 271,14 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	24 609,88 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:



Datum:

¹⁾ EDS/SMVŠ se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 -
SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL33 - prostupy ŽB kci pro technologii

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

18.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	15 802,49	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	4 536,25	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 338,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 338,74

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	20 338,74	4 271,14

Cena s DPH 24 609,88

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Shodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - S002 Objekt krytého bazénu
Objekt: ZL33 - prostupy ŽB kcí pro technologii

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:


Datum: 18. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
HSV			Práce a dodávky HSV				20 338,74	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 960,00	
1	005	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,800	2 420,00	1 936,00	URS 2022/01
			4*0,2		0,800			
			Součet		0,800			
2	005	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	2,600	3 380,00	8 788,00	URS 2022/01
			13*0,2		2,600			
			Součet		2,600			
3	005	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,000	3 940,00	3 940,00	URS 2022/01
			5*0,2		1,000			
			Součet		1,000			
4	005	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,800	6 620,00	5 296,00	URS 2022/01
			4*0,2		0,800			
			Součet		0,800			
997			Přesun sutě				378,74	
5	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 8 do 9 m	t	0,258	650,00	167,70	URS 2022/01
6	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,258	230,00	59,34	URS 2022/01
7	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,192	7,60	43,34	URS 2022/01
			0,258*24 "Přepočtené koeficientem množství		6,192			
8	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,258	420,00	108,36	URS 2022/01
Celkem							20 338,74	

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	34.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěč - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVŠ ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 -- Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštjova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 – doplnění povrchové úpravy AL výplní.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) – doplnění povrchové úpravy AL výplní	
Hliníkové výplně otvorů do prostoru bazénu (m. 1.01) jsou v zásadě provedeny podle PD. Dodatečně bylo požadováno doplnění dveří o samozavírače 3x, padací práh 1x a barevné provedení RAL 8002 – není ve standardní škále dodávaných odstínů barvy.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: Al výplně v základní bílé barvě, bez samozavíračů a padacího prahu	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: dodatečný požadavek objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	ano
Připočty k ceně díla bez DPH:	35 250,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	35 250,00 Kč
DPH:	7 402,50 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	42 652,50 Kč

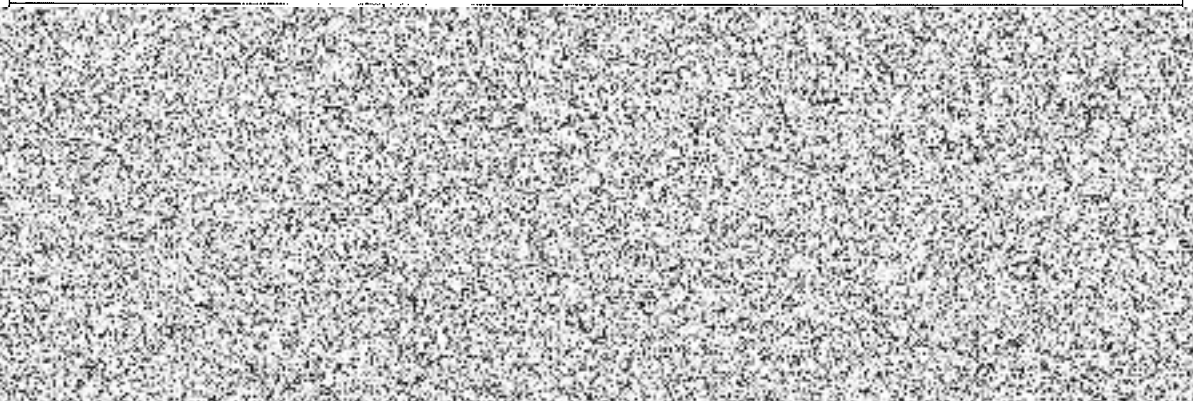

Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 -
SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL34 - doplnění povrchové úpravy AL výplní

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

18.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podi.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	35 250,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		35 250,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 35 250,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	35 250,00	7 402,50

Cena s DPH 42 652,50

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu

Objekt: ZI.34 - doplnění povrchové úpravy AL výplní

Objednatel: Krajské ředitelství Středoceskeho kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

	PSV	PSV					35 250,00
--	-----	-----	--	--	--	--	-----------

	760	Výplně otvorů					35 250,00
--	-----	---------------	--	--	--	--	-----------

1	R	760R001	Doplnění povrchové úpravy a prvků AL výplní - viz cenová nabídka	kpl	1,000	35 250,00	35 250,00	CN
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------	----

							Celkem	35 250,00
--	--	--	--	--	--	--	--------	-----------

CENOVÁ NABÍDKA

Akce: RaŠZ Nový Hrádek modernizace areálu - stavba


DODÁVKA: Dodávka a montáž hliníkových výplní otvorů - doplnění povrchové úpravy

Objednatel:	Zhotovitel:
VALC, s.r.o.	ALUFRONT s.r.o.
Pražská 13	Náchocká ulice 2101, PSČ 549 01
Hrádek Králové, 500 04	Nové Město nad Metují
IČO: 455 37 15	IČO: 60912910
DIČ: CZ455 37 151	DIČ: CZ 60912910

1.AL.výrobky

POZICE	ROZM.		KS	CENA DLE SOD
1 - dveře - příplatek za vnitřní RAL 8002, padací práh, samozavírač	2000	2850	1	6 450 Kč
2 - dveře - příplatek za oboustranný RAL 8002	1100	2050	1	2 600 Kč
3 - dveře - příplatek za oboustranný RAL 8002, samozavírač	900	2050	2	9 400 Kč
4 - okno - příplatek za vnitřní RAL 8002	2000	2250	10	16 800 Kč
				35 250 Kč

celkem spolu	35 250 Kč
--------------	-----------



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	35.
Identifikace akce:	
Název akce	KŘP Stěk - FKSP - RaŠZ Olouhě Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 -- Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 – ZTI a ÚT.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) – ZTI a ÚT	
1 – VV neobsahuje dodávku a montáž umyvadla, umyvadlové baterie, invalidního zrcadla, madla k umyvadlu a sedátka do sprchy v místnosti 1.06 -- sociální zařízení vozíčkářů 2 – VV neobsahuje sprchové baterie v místnostech 1.04, 1.07 a 1.06 3 – VV uvádí malé množství potrubí – podhodnocena skutečná metráž potrubí 4 – VV neobsahoval všechny komponenty potřebné pro montáž sběrače a rozdělovače ÚT a strojní vybavení technické místnosti ZTI a ÚT – m. 1.03	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: chyba projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín:	
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem
Vliv na cenu:	ano
Přípočty k ceně díla bez DPH:	106 263,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	106 263,30 Kč
DPH:	22 315,29 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	128 578,59 Kč
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:	
Datum:	

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu	JKSO	
Název objektu	ZL35 - ZTI a UT - SO02	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.01.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	87 178,80	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	19 084,50	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		106 263,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 106 263,30			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	106 263,30	22 315,29
				Cena s DPH			128 578,59
				Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu
Objekt: ZL35 - ZTI a UT - SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2022

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		PSV					106 263,30
001		ZTI a UT					87 178,80
1	R	001R001	chybějící ZTI a UT - viz cenová nabídka	kpl	1,000	87 178,80	87 178,80
733		Potrubí					11 148,00
2	R	733111316	Potrubí ocelové závitové svařované běžné v kolelních nebo strojvních DN 32	m	10,000	424,00	4 240,00
3	R	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	10,000	10,00	100,00
4	R	733222104	Potrubí z trubek měděných Ø 22/1,0	m	8,000	355,00	2 840,00
5	R	733223105	Potrubí z trubek měděných Ø 28/1,5	m	8,000	482,00	3 856,00
6	R	733291101	Zkoušky těsnosti z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	16,000	7,00	112,00
721		Vnitřní vodovod					7 936,50
7	R	722174022	Porubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) PN20 D20x3,4	m	2,500	150,00	375,00
8	R	722174024	Porubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) PN20 D 32x5,4	m	14,000	265,00	3 710,00
9	R	722174026	Porubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) PN20 D 50x8,4	m	1,000	527,00	527,00
10	R	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 20 mm	m	2,500	99,00	247,50
11	R	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 32 mm	m	14,000	99,00	1 386,00
12	R	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D do 50 mm	m	1,000	99,00	99,00
13	R	722181221	Ochrana potrubí epelně izolačními trubicemi tloušťka izolace 10 mm, DN do 22 mm	m	2,500	50,00	125,00
14	R	722181222	Ochrana potrubí epelně izolačními trubicemi tloušťka izolace 10 mm, DN do 42 mm	m	14,000	55,00	770,00
15	R	722181223	Ochrana potrubí epelně izolačními trubicemi tloušťka izolace 10 mm, DN do 62 mm	m	1,000	67,00	67,00
16	R	722290226	Zkoušky těsnosti závitového potrubí do DN 50 mm	m	17,500	18,00	315,00
17	R	722290234	mm	m	17,500	18,00	315,00
Celkem							106 263,30

VALC s.r.o. - a topenářské práce
 Pavlišov 53, 547 01 Náchod
 IČO: 13578201

VALC s.r.o.
 Hradec Králové

Nabídka: vícepráce ZTI a UT - SO02


	mj	množství	cena za mj	cena celkem
<u>Kotelna bazén</u>				
Izolace potrubí	m	26	50,40	1 310,40 Kč
Ventil kulový 1"	ks	5	364,80	1 824,00 Kč
ventil kulový 2"	ks	4	1320,00	5 280,00 Kč
Filtr 2"	ks	1	1144,80	1 144,80 Kč
jímka	ks	4	958,80	3 835,20 Kč
voda pro kotelnu:				
ventil kulový 5/4"	ks	2	513,60	1 027,20 Kč
Přechod DG 40x5/4"	ks	1	535,20	535,20 Kč
Potrubí HT DN 40	m	14	271,20	3 796,80 Kč
Pojistný ventil 3/4"	ks	2	627,60	1 255,20 Kč
Manometr 0-16bar	ks	1	663,60	663,60 Kč
Filtr 1"	ks	1	302,40	302,40 Kč
Ventil kulový 1"	ks	5	364,80	1 824,00 Kč
Sifon A 21	ks	2	1078,80	2 157,60 Kč
montáž armatur	ks	20	30,00	600,00 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>25 556,40 Kč</u>
<u>Invalidní umyvadlo</u>				
Umyvadlo invalidní	ks	1	4026,00	4 026,00 Kč
Baterie k invalidnímu umyvadlu s páčkou	ks	1	2546,40	2 546,40 Kč
Sifon pro invalidní umyvadlo	ks	1	1982,40	1 982,40 Kč
Zrcadlo invalidní	ks	1	4572,00	4 572,00 Kč
Madlo 60cm k umyvadlu	ks	1	2006,40	2 006,40 Kč
Sedačka do sprchy	ks	1	5546,40	5 546,40 Kč
Nástěnka plast DN 20 + výpustka vodovodní	ks	2	297,60	595,20 Kč
Vrtání díry do drátkobetonu+odnošení	ks	1	1800,00	1 800,00 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>23 074,80 Kč</u>
<u>chybějící baterie ke sprchám bazén</u>				
Baterie sprchová – dodávka a montáž	ks	5	2724,00	13 620,00 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>13 620,00 Kč</u>
<u>chybějící vrtání děr pro ZTI a UT</u>				
Vrtání děr	m	3,5	3900,00	13 650,00 Kč
vodorovné vrtání	ks	11	390,00	4 290,00 Kč
kotvení	ks	6	189,60	1 137,60 Kč
příprava pro vrtání, přístavení technologie	ks	5	630,00	3 150,00 Kč
práce vrtání	ks	5	420,00	2 100,00 Kč
filtr	ks	1	600,00	600,00 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>24 927,60 Kč</u>
<u>Cena celkem bez DPH</u>				<u>87 178,80 Kč</u>



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	36.
Identifikace akce:	
Název akce	KRP Stčč - FKSP - RašZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 – venkovní kanalizace a vodovod.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) -- venkovní kanalizace a vodovod	
1 -- PD venkovních kanalizací a vodovodu neodpovídá skutečnosti. Projektant vycházel z jakési dochované dokumentace, která ale není totožná se skutečností. Stávající vodovod je veden úplně jinou trasou. Bylo nutné ho vyhledat a nový vodovod je veden optimální trasou do objektu SO 02. VV vodovodní přípojku ani neuvádí. 2 -- PD nezpracovává část dešťové kanalizace a to včetně napojení na dešťové svody. Nová dešťová kanalizace je položena dle potřeby stavby. Dále byla nově doplněna šachta s mříží pro odvod povrchové vody z betonového žlabu, který odvádí povrchovou vodu za objektem SO 02. 3 -- PD počítala s napojením splaškové kanalizace z objektu SO 01 do nikdy neexistující venkovní kanalizace. Z tohoto důvodu se prodloužila nově navržená kanalizace odvádějící splašky z SO 02. Tím se zajistil odvod odpadních vod z SO 01. Délka a dimenze potrubí včetně počtu šachet se tedy změnila.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: chyba projektu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DS/PS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla:	ano, vše dle standardů a norem	
Vliv na cenu:	ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	481 835,77 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 55 142,00 Kč	
Čelkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	426 694,77 Kč	
DPH:	89 605,90 Kč	
Čelkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	516 300,67 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:



Datum:

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu	JKSO	
Název objektu	ZL36 - Venkovní kanalizace a vodovod	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel	Krajské ředitelství Středočeského kraje	75151481	CZ75151481
Projektant	KOPRIN s.r.o.	45797030	CZ45797030
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	CZ45537151
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		20.01.2022	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-55 142,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	481 836,77	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		426 694,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				426 694,77
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižovaná	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	426 694,77	89 605,90	
Cena s DPH			516 300,67	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Výhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu

Objekt: ZL36 - Venkovní kanalizace a vodovod

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		PSV	PSV					426 694,77
		000	Venkovní kanalizace a vodovod					481 836,77
1	R	000R001	Venkovní kanalizace a vodovod - viz cenová nabídka	kp!	1,000	481 836,77	481 836,77	CN
		7211	Přípojka kanalizace pro bazén					-15 687,00
2	R	7211001	Přípojka kanalizace DN 200 pro objekt bazén včetně montáže	m	-27,000	581,00	-15 687,00	SOD
		7212	Přeložka dešťové kanalizace pro bazén					-39 455,00
3	R	7212001	Přípojka dešťové kanalizace DN 200 pro objekt bazén včetně montáže	m	-65,000	607,00	-39 455,00	SOD
		Celkem						426 694,77

– vodoinstalatérské a topenářské práce
 Pavlišov 53, 547 01 Náchod
 IČO: 13578201

VALC s.r.o.
 Hradec Králové

Venkovní kanalizace a vodovod


	mj	množství	cena za mj	cena celkem
<u>šachty + dešťová a splašková kanalizace komplet vč. zadní části</u>				
šachta DN 600 včetně poklopu litinového	ks	5	19244,10	96 220,50 Kč
šachta DN 600 vč. litinové mříže	ks	1	22748,15	22 748,15 Kč
Sestavení šachet	ks	6	1150,00	6 900,00 Kč
Lapače střešních splavenin DN 125	ks	6	2745,56	16 473,36 Kč
Potrubí KG DN 100 dešťové	m	5	377,20	1 886,00 Kč
Potrubí KG DN 125 dešťové	m	18	572,70	10 308,60 Kč
Potrubí KG DN 150 splašková	m	3	380,65	1 141,95 Kč
Potrubí KG DN 200 dešťové	m	108	1082,15	116 872,20 Kč
Potrubí KG DN 250 dešťové	m	68	1403,00	95 404,00 Kč
Potrubí KG DN 125 splašková	m	2	288,65	577,30 Kč
Potrubí KG DN 200 splašková	m	90	566,95	51 025,50 Kč
Vpust kanalizační spodní DN 100	ks	1	2938,25	2 938,25 Kč
Tlaková zkouška potrubí	m	294	18,00	5 292,00 Kč
Napojení potrubí do DN 250	ks	4	1150,00	4 600,00 Kč
Roura tlaková DN 110/6m	ks	1	1221,30	1 221,30 Kč
Přírubová tvarovka DN 100 s hrdlem	ks	3	1434,60	4 303,80 Kč
T kus epoxid přírubová odbočka DN 100/100	ks	1	3612,00	3 612,00 Kč
Přesuvná spojka DN 100	ks	4	310,50	1 242,00 Kč
Těsnění ploché pryžové DN 100	ks	3	65,30	195,90 Kč
šrouby M16x75mm	ks	25	18,00	450,00 Kč
Matice M16	ks	25	5,00	125,00 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>443 537,81 Kč</u>

venkovní vodovod

Navrtávací pas Hawle 110x2"	ks	1	5273,1	5 273,10 Kč
Ventil přípojkový 2"-6/4"	ks	1	5453,28	5 453,28 Kč
Zemní souprava 2"-3/4" 1,5m	ks	1	1135,26	1 135,26 Kč
Tvarovka napojovací Hawle 40-6/4"	ks	1	797,58	797,58 Kč
Ventil kulový 5/4" venkovní voda	ks	1	782,46	782,46 Kč
Montáž	ks	1	7056	7 056,00 Kč
Potrubí PE vodovodní DN 40	m	50	270,9	13 545,00 Kč
Cyky vodič	m	50	27,72	1 386,00 Kč
Vrtání díry pro venkovní vodu	m	0,6	2790,9	1 674,54 Kč
Příplatek za vodorovné vrtání	ks	1	167,58	167,58 Kč
Příplatek za prodloužení délky nad 50mm	ks	1	167,58	167,58 Kč
Kotvení stojanu	ks	1	199,08	199,08 Kč
Paušální poplatek za přistavení technologie	ks	1	661,5	661,50 Kč
<u>Celkem bez DPH</u>				<u>38 298,96 Kč</u>


Cena celkem bez DPH

481 836,77 Kč



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	37.
Identifikace akce:	
Název akce	KRP Stěk - FKSP - RaŠZ Dlouhé Rzy - rekonstrukce ubytovny, úprava stávající kotelny, obj. 006 a krytý bazén
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V172000004
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové, IČ 455 37 151
Projektant:	KOPRIN s.r.o., Ploštilova 11, Praha 4, Modřany, 143 00, Číslo autorizace: 0010771, IČ: 457 97 030
Předmět změnového listu: SO 02 – těleso protiproudu.	
Část díla dotčená změnovým listem:	
SO 02 (bazén) – těleso protiproudu	
PD bazénové technologie obsahuje kompletní přípravu pro montáž protiproudu. To je čerpadlo protiproudu a příslušné potrubí. Ve výkazu ale úplně schází vlastní těleso protiproudu a to včetně příslušenství.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: zadávací PD a VV	
Nové řešení: viz přepracovaná PD projektantem „Revize dokumentace“	
Zdůvodnění změny: dodatečné zjištění.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: k předání dokončené stavby bude zhotovena DSPS	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: veškeré změny jsou odsouhlaseny investorem v zápisech z kontrolních dnů	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	

Vliv na termín:		
Vliv na kvalitu díla: ano, vše dle standardů a norem		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	66 374,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	66 374,00 Kč	
DPH:	13 938,54 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	80 312,54 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavby:
		
Datum:		

¹⁹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu

JKSO

Název objektu

ZL37 - Protiproud v bazénu SO02

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Krajské ředitelství Středočeského kraje

75151481

CZ75151481

Projektant

KOPRIN s.r.o.

45797030

CZ45797030

Zhotovitel

VALC, s.r.o.

45537151

CZ45537151

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

21.01.2022

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	66 374,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		66 374,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 66 374,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižena	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	66 374,00	13 938,54

Cena s DPH 80 312,54

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Výhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: RAŠZ NOVÝ HRÁDEK MODERNIZACE AREÁLU - Dodatek č.3 - SO02 Objekt krytého bazénu

Objekt: ZL37 - Protiproud v bazénu SO02

Objednatel: Krajské ředitelství Středočeského kraje

Zhotovitel: VALC, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 1. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV			PSV				66 374,00
000			Bazénová technologie				66 374,00
1	R	R001	U+M těleso protiproudů Taifun Duc včetně čela, madla a piezospínače do bazénu - viz CN	ksl	1,000	66 374,00	66 374,00
Celkem							66 374,00



VALC, s.r.o.



Naše značka:

33/21

Vaše značka

Vyřizuje:



Datum:

23.9.2021

Cenová nabídka

Předkládáme Vám nabídku na dodávku a montáž tělesa protiproudu Taifun Duo, včetně čela, madla a piezospínače do plaveckého bazénu v Novém Hrádku v celkové výši **66.374,- Kč bez DPH.**

Termín dodání

Termín dodání bude upřesněn

Platnost nabídky

Nabídka má platnost 2 měsíce od data vystavení.

Doufáme, že naše nabídka odpovídá Vaším představám a v případě jakýchkoli dotazů jsme Vám rádi kdykoli k dispozici.

S přáním pěkného dne

