



DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.03.2021

ve znění dodatku č. 1

ev č. S/015/2021/OMBI

Městská část Praha 13

Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 158 00
Zastoupený: Petrem Zemanem, místostarostou
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc
Zastoupený: Monika Šebková, prokuristka společnosti
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 15099

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

I. Předmět dodatku

A/ Smluvní strany se dohodly na změnách v článku I. Předmět smlouvy takto

Předmět plnění Zhotovitele (dílo) se doplňuje o související **dodatečné změny stavebních prací a dodávek**. Rozsah těchto dodatečných stavebních prací a dodávek je specifikován v příloze tohoto Dodatku, který se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tato změna díla je realizována v souladu s čl. 1.7. a 4.4.Smlouvy o dílo.

B/ Smluvní strany se dohodly na změnách v článku IV. Cena díla takto:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy o dílo vč. jejich dodatků, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

20 818 048,94 Kč



4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 15 % činí částku

3 122 707,34 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně celkem (součet čl. 4.1.1. + 4.1.2)

23 940 756,28 Kč

z čehož

a) celková nabídková cena dle nabídky podané zhotovitelem v rámci veřejné zakázky činí:

- nabídková cena v Kč bez DPH 20 436 657,00.Kč
- výše DPH (sazba 15 %) 3 065 498,55 Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 23 502 155,55 Kč

b) cena víceprací (cenový nárůst) dle změnových listů činí:

- **nabídková cena v Kč bez DPH 381 391,94 Kč**
- **výše DPH (sazba 15 %) 57 208,79 Kč**
- **nabídková cena v Kč vč. DPH. 438 600,73 Kč**

C/ Smluvní strany se dohodly na změnách v článku II. Doba plnění takto:

V souvislosti s prováděním dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění takto:

- V Článku II. (Doba plnění) odst. 2.2.2. se vypouští slova:

„2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 14 kalendářních měsíců od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy“

a nahrazují slovy:

„2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 30.6.2022.“

- Příloha č. II. Harmonogram plnění se nahrazuje aktuálním harmonogramem č. II/B – Harmonogram plnění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah Smlouvy o poskytování služeb vč. tohoto Dodatku nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o



svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí MČ Praha 13.

Příloha:

změnové listy

č. II/B - Harmonogram plnění

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. UR 0155/2022 Rady MČ Praha 13 ze dne 25.04.2022.

V Praze dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis

za Objednatele
Petr Zeman
místostarosta

za Zhotovitele
Monika Šebková
prokuristka

Monika Šebková Digitálně podepsal
Monika Šebková
Datum: 2022.04.29
08:38:40 +02'00'

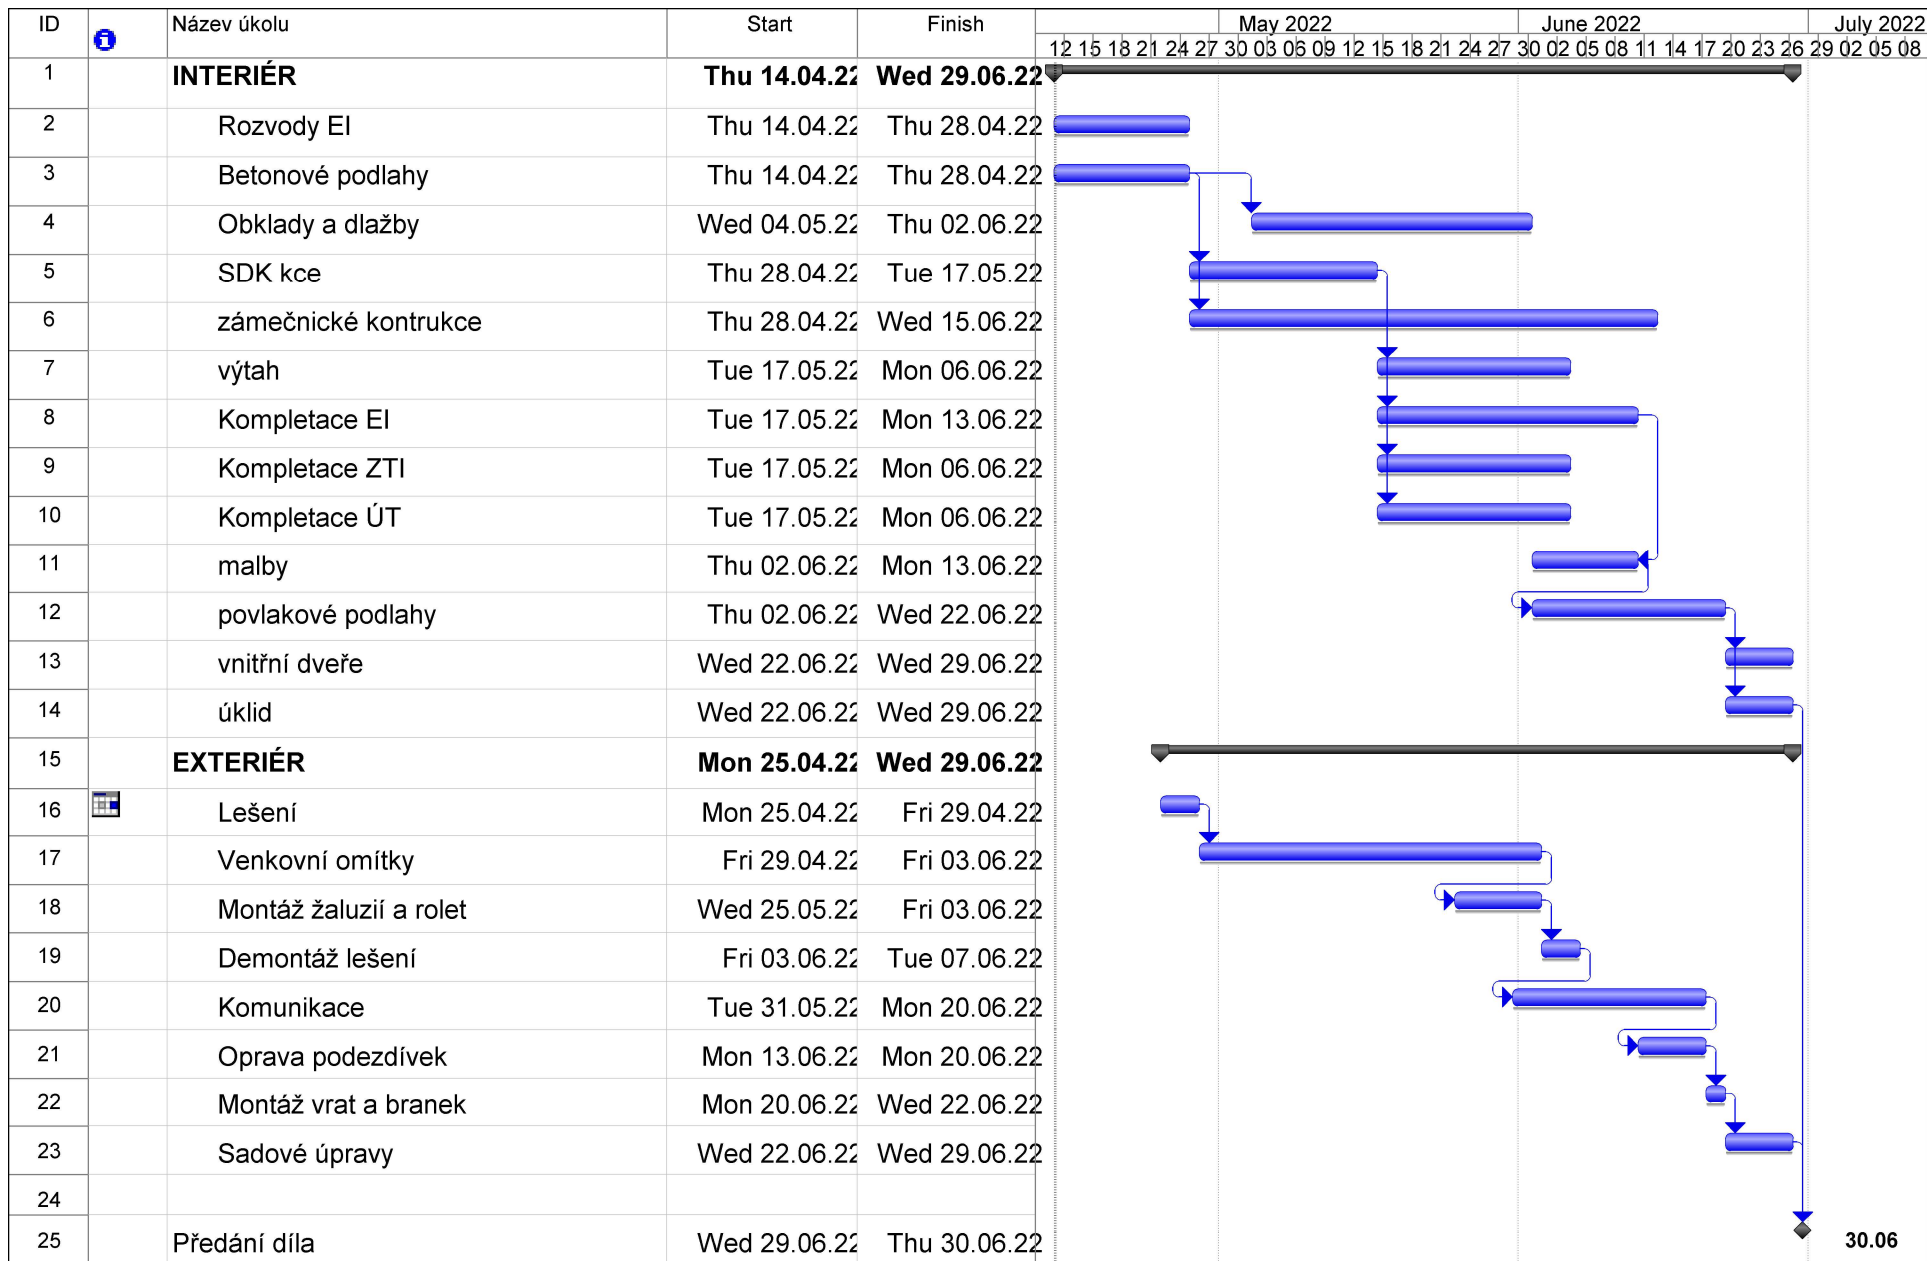
Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Petr Zeman
Organizace, OJ:	Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.:	11976237
Vydavatel cert.:	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	04.05.2022 09:28:18
Důvod:	podpis dodatku č. 2
Místo:	usn. č. UR 0155/2022 z 25.04.2022

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Petr Zeman
Organizace, OJ:	Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.:	11976237
Vydavatel cert.:	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	04.05.2022 09:22:44
Důvod:	podpis doložky, schváleno v RMČ P13
Místo:	usn. č. UR 0155/2022 z 25.04.2022

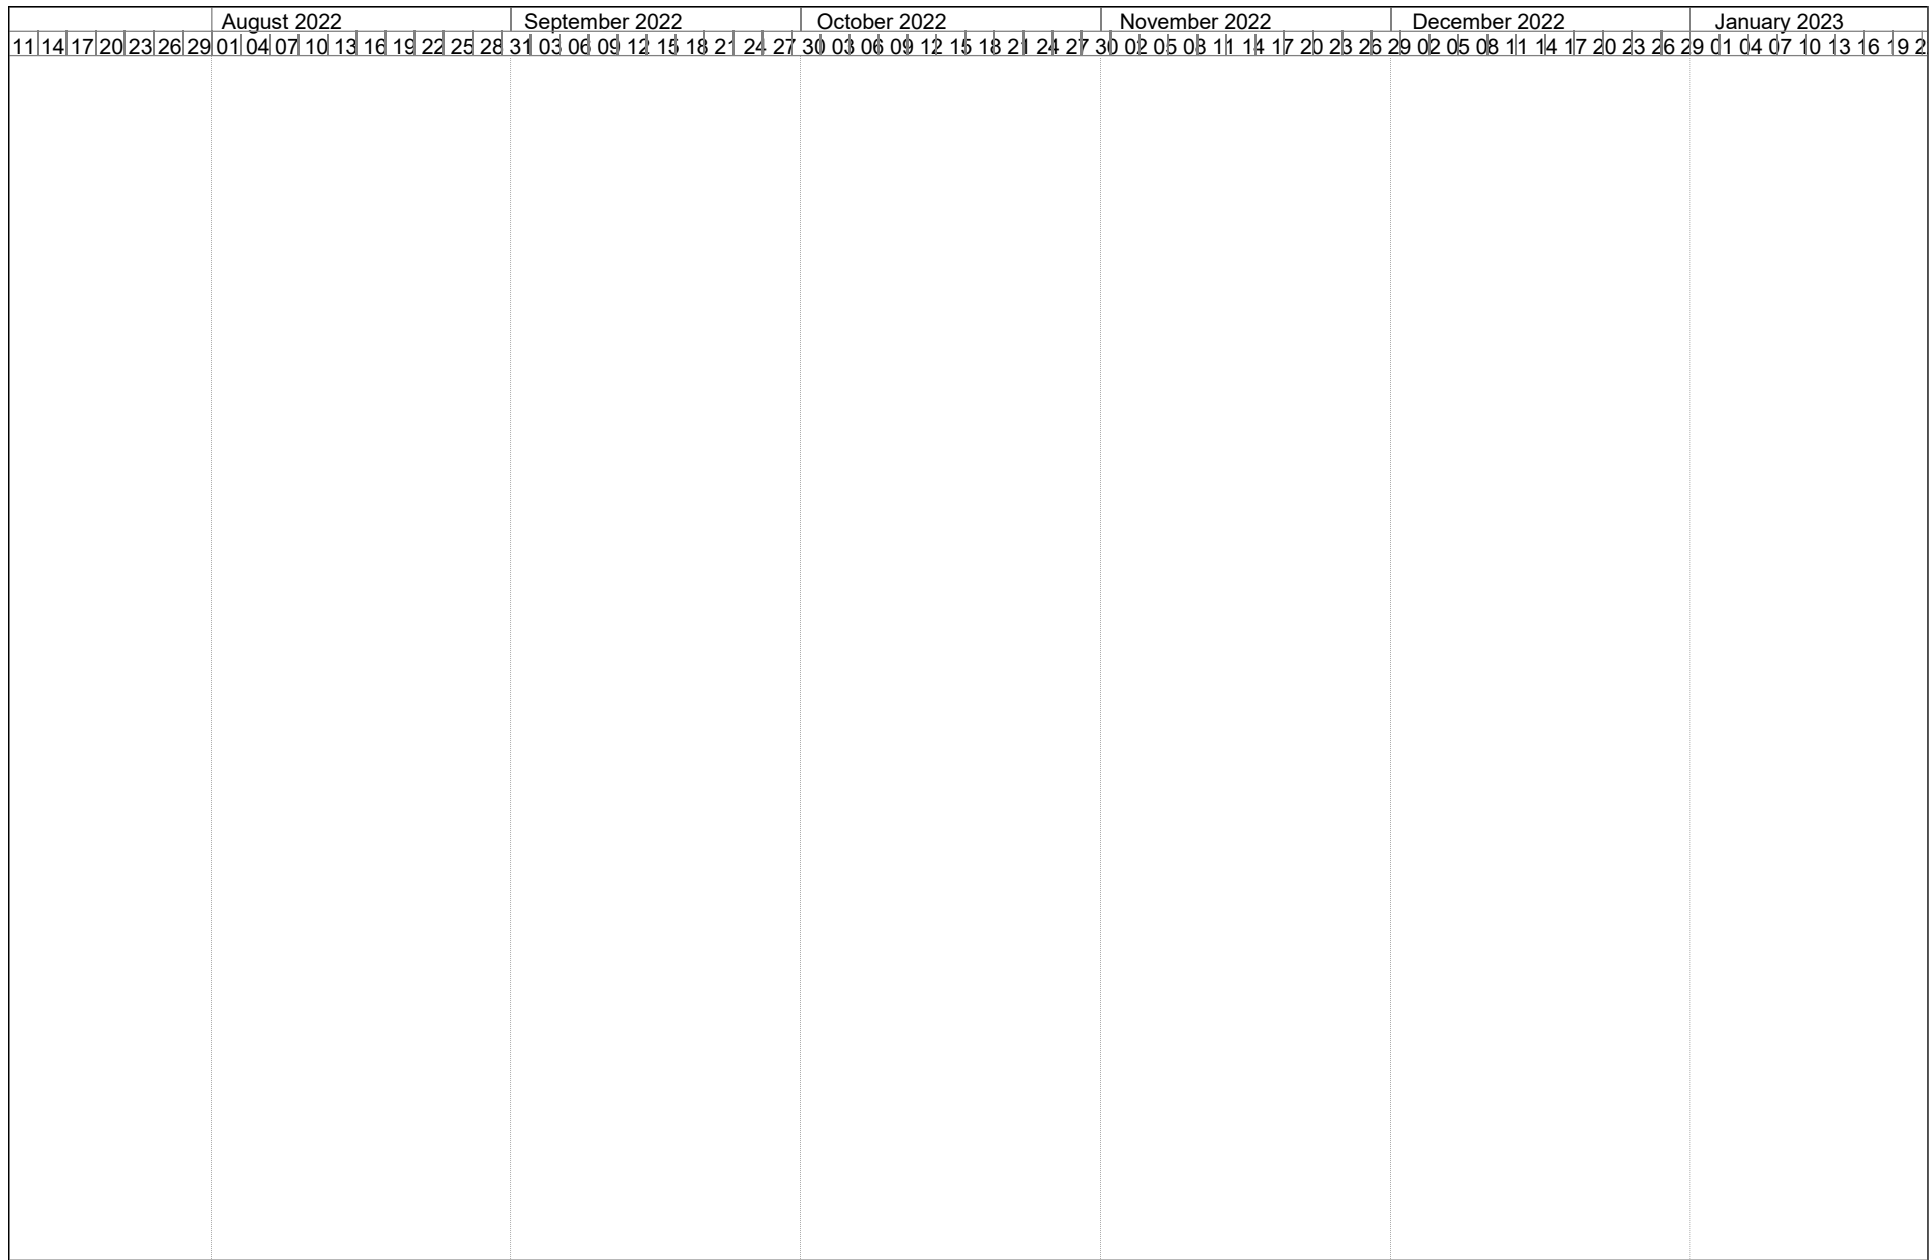
Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	RNDr. Marcela Plesníková
Organizace, OJ:	Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.:	11911813
Vydavatel cert.:	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	04.05.2022 10:36:26
Důvod:	podpis doložky
Místo:	schváleno v RMČ P13 č. UR 0155/2022




***PŘÍLOHA ČÍSLO II./B SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ***



Projekt: harmonogram prací dodatek1 Datum: Thu 14.04.22	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	







Projekt: harmonogram prací dodatekII Datum: Thu 14.04.22	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	


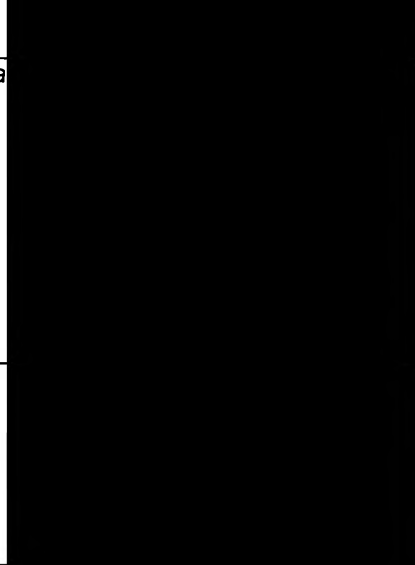


Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		1
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna betonu základové pasy		
Odůvodnění Změna vyvolaná technologickou potřebou. Základové pasy a patky byly navrženy z betonů rozdílné pevnostní třídy. Bylo by nutné pásy a patky v průběhu realizace bednit, což by vyvolalo marný náklad. Bylo rozhodnuto zvýšení třídy betonu základových pasů, aby mohly být vylité společně s patkami.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 9 051,98 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		2
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Trnování základů + změny ve výztuži ŽB kcí		
Odůvodnění ZL řeší doplnění tonáže výztuže potřebné k provedení spojení základových konstrukcí v místech, kde nebylo možné provedení v jedné etapě pomocí kovových trnů. Dále výkresy výztuže stropů obsahovaly chyby a statik rozhodl o přidání výztuže. Bylo nutné upravit armaturu u ŽB sloupů v 1.NP, byl zde rozpor ve výkresech. Výkres výztuže stěn výtahové šachty neřešil provázání Kari sítí k sobě, aby držely požadovaný tvar, bylo nutné doplnit distanční prvky z ocelového drátu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 17 661,80 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího Podpis, razítko		Vyjádření projektanta Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) Podpis, razítko		Vyjádření investora Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		3
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Bourání a likvidace betonů		
Odůvodnění Pod stávajícím hřištěm byla provedena betonová plocha, která měla být v rámci projektu zbourána. PD uvažovala s tloušťkou desky do 150 mm. Skutečná tloušťka však byla 250 – 300 mm. ZL řeší bourání větší tloušťky desky včetně likvidace zvýšeného množství odpadu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
Celkové navýšení		106 258,98 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací - Fotodokumentace 		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)		Vyjádření investora
Podpis, razítko		Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		4
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Svislá hydroizolace, obvod 1.NP		
Odůvodnění ZL řeší doplnění svislé hydroizolace na sokl objektu v úrovni přechodu zdiva (oken) na základovou desku. Práce nebyly popsány v PD, nejsou tedy obsaženy ve smluvním rozpočtu. Práce jsou nutné k funkčnosti objektu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 13 568,68 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího Podpis, razítko		Vyjádření projektanta / / Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) Podpis, razítko		Vyjádření investora Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		5
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna obvodového zdiva 1.NP		
Odůvodnění Změna řeší záměnu obvodového zdiva u místnosti zahradního skladu. Dle PD byla navržena tl. 300 mm. Do této tloušťky nejde osadit systémový roletový překlad. Bylo rozhodnuto o provedení této stěny v tloušťce 380 mm jako ostatní obvodové zdivo		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 17 791,34 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		7
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Chráničky k bráně		
Odůvodnění ZL řeší požadavek objednatele na provedení 2 ks rezervních chrániček od rozvaděče směrem k bráně. Chráničky byly provedeny pod základovou deskou.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 2 322,34 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		8
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Odbourání ŽB základu v místě výtahové šachty		
Odůvodnění V místě výtahové šachty bylo nutno pro založení této šachty odbourat železobetonový základ přilehlého stávajícího objektu, jež půdorysně zasahoval do stěny projektované šachty. Tento bylo nutné zbourat. ZL řeší dopočet nákladů na tyto práce.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 4 633,65 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího Podpis, razítko		Vyjádření projektanta Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) Podpis, razítko		Vyjádření investora Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		9
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změny dispozic v 1.NP		
Odůvodnění ZL řeší změny dispozic v 1.NP vyvolané z požadavku objednatele.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 53 830,43 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		11
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Odvětrání střechy sousedního domu		
Odůvodnění ZL řeší nutnost provedení nového odvětrání dvouplášťové střechy stávající budovy SSS. Původní průvětrník byl v místě, kde je k objektu přistavěna výtahová šachta. Nově jej bude nutné zřídit za rohem objektu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 6 971,49 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		13
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Zakrytí rozvodů ÚT, VZT, TUV a odkapů kondenzátu		
Odůvodnění ZL řeší sádrokartonových zákrytů a podhledů v místech, kde by jinak pod stropem bylo přiznané potrubí. PD ani rozpočet tyto práce neobsahovaly.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 54 274,18 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		14
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Oizolování výdechů VZT + revize výměr kiosků a folie		
Odůvodnění ZL řeší rozdíly v rozpočtem udané výměře střešní folie vzhledem ke skutečnosti. Dále byla provedena dodatečná tepelná izolace střešních výdechů VZT z cetris desek		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Řiha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 17 992,38 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		17
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna elektroinstalace		
Odůvodnění ZL řeší požadavky objednatele na doplnění či změnu dodávek rozvodů a zařízení elektroinstalace silno i slaboproudé. ZL dále řeší návrh zhotovitele na beztlačítkové ovládání světel na chodbách.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 95 527,17 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		19
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změny ZTI (1.NP + kuchyňky)		
Odůvodnění ZL řeší revizi dodávky zdravotně technických instalací po provedení změny dispozice 1.NP a dispozic kuchyňek.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové ponížení		Cena bez DPH - 48 531,74 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozora objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		20
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Přizdívky WC		
Ozdůvodnění Dle PD mají být všechna WC v objektu provedena jako závěsná na podomítkové konstrukce. Tyto je však před obložení obездít plynosilikátovou příčkou. Tyto konstrukce nejsou uvedeny v PD a ani rozpočet je nobsahuje. ZL řeší doplnění nákladů na tyto nutné práce.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 14 400,32 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		21
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změny VZT (změna 1.NP) Odůvodnění ZL řeší revizi výkazu výměr po provedení změny dispozice 1.NP.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové ponížení		Cena bez DPH - 21 604,06 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího Podpis, razítko		Vyjádření projektanta Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) Podpis, razítko		Vyjádření investora Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		23
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna dvířek k vodoměrům		
Odůvodnění ZL řeší změnu dvířek k vodoměrům. Dle PD a rozpočtu měly být nerezová 150x150 mm. Do takto velkých by se dva vodoměry nevešly. Byla domluvena záměna za plechová lakovaná dvířka 300x300 mm se zámkem.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
Celkové navýšení		2 230,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora) 		Vyjádření investora 
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		24
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna vodoměrů na dálkově odečitatelné		
Odůvodnění ZL zohledňuje požadavek objednatele na záměnu vodoměrů za vodoměry s možností dálkového odečtu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 35 013,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko
