



Pomáhat a chránit

PCR19ETRpo30184266

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

KRPK-69430-13/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 3. května 2022
Přílohy: 1/1

Úřední záznam

Dodatek ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-74331-11/ČJ-2021-1900VZ

Dne 2. května 2022 byla vystavena na OSNM od zhotovitele firmy Ervín Opitz, IČO 10662243 se sídlem Tyršova 509, 356 01 Sokolov, žádost o prodloužení termínu výše uvedené smlouvy, a to do 30.6.2022, přičemž termín byl původně stanoven na 31.5.2022. Zároveň zhotovitel žádá o navýšení ceny díla o 71.941,60 Kč bez DPH (87.049,30 Kč s DPH). Jako důvod zhotovitel uvádí mrazivé počasí a komplikace spojené s demontáží mříží, kterou provádělo naše oddělení OPÚM a dlouho dodací lhůty epoxidových nátěrových hmot (izolace kotců proti agresivním látkám-močoviny, výkaly)


Podanou žádost akceptujeme a byl telefonicky upřesněn následující postup.

Ukončené práce budou od zhotovitele převzaty neprodleně po zlepšení povětrnostních podmínek, nejpozději však do 30.6.2022. Na základě vzájemné dohody bylo provedeno v prosinci 2021 dílčí finanční plnění ve výši 300 000,00 Kč vč. DPH.


Celá akce bude dokončena nejpozději do 30.6.2022. Dílo bude převzato po dokončení epoxidové izolace aplikované na vyzrálé betonové podklady a následně bude vystavena faktura na zbývající částku, která je ve výši 139.181,00 Kč vč. DPH + 87.049,30 Kč vč. DPH = **226.230,30 Kč vč. DPH.**

Žádáme tímto o vyhotovení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-74331-11/ČJ-2021-1900VZ, který bude akceptovat výše uvedené požadavky.

Zpracoval:

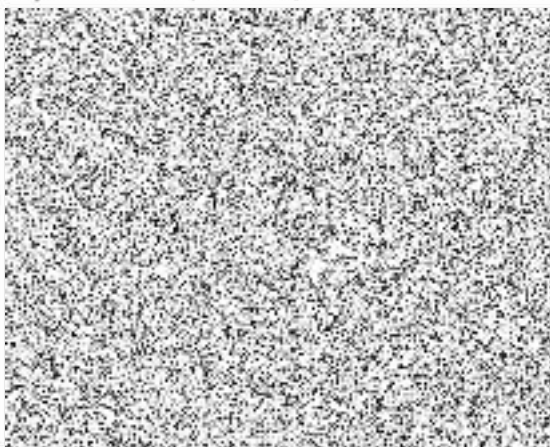

Schválila



Vážený pan

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého
majetku
Dobrovského 1935
356 04 Dolní Rychnov



Ervín OPITZ

PSV – řemeslné práce
Tyršova 509, 356 01 Sokolov
IČ: 10662243,

Vaše značka
KRPK-74331-
11/ČJ-2021-
1900VZ

Naše značka
058_2021

Vyřizuje

Linka

V Sokolově dne:
02.05.2022


Věc: Žádost o prodloužení termínu a navýšení ceny díla

Vážená pane

obracím se na Vás se žádostí o prodloužení původního smluvního termínu dokončení díla do 31.5.2022 ve smlouvě č.j. KRPK-74331-11/ČJ-2021-1900VZ o 4 týdny, tj. nový termín dokončení a předání díla do 30.6.2022.

Dále Vás žádám o navýšení původní ceny díla 439 181,-Kč včetně DPH o částku provedených víceprací ve výši 87 049,30,-Kč, včetně DPH. Soupis a kalkulace víceprací je uveden níže.

Odůvodnění požadavku – dlouhodobě nevyhovující klimatické podmínky (teploty pod nulou), komplikace spojené s demontáží mříží, kterou provádělo Vaše oddělení a v neposlední řadě prodloužená dodací lhůta od dodavatele epoxidového materiálu o cca 4 týdny.

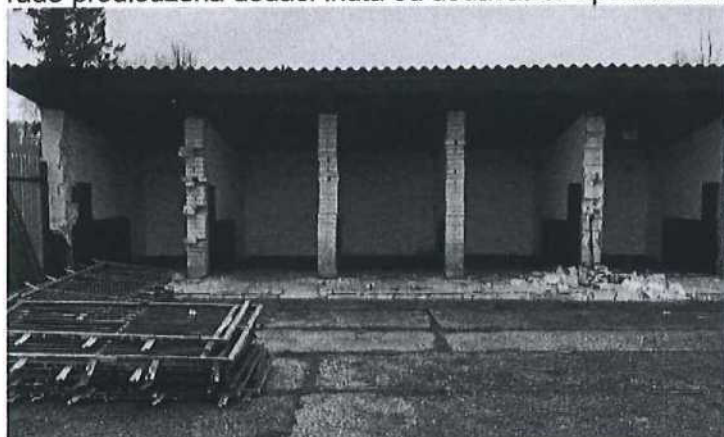

Telefon/Phone

Internet/ E-mail

www.psv-remeslnep prace.cz.cz

IČ/DIČ/ Identification

10662243

Bankovní spojení/ Bank/Konto No.:

Zapsán v Živnostenském rejstříku MÚ Sokolov pod číslem jednacím MUSO/22514/2021/OPŽU/JAZA

Ervín Opitz PSV- řemeslné práce
F-S 5-1/ 4, změna 0, vydání 01.10.2021


Strana 1/ 2



Vícepráce-058-2021

Datum:	01.05.2022	Revize:	1	
Položka	Mj	Počet Mj	Jednotková cena	Položková cena
Vybourání 2 poškozených sloupů (utržený Ytong)	kpl.			
Likvidace odpadu (odpad z poškozených sloupků, odebrané cihly odceteny)	t			
Sanace poškozených sloupů (2 krajní a jeden prosřední)	kpl.			
Beton na podlahy (rozdíl oproti zadání)	m3			
Vysprávková cementová malta, cihly	kpl.			
Vyspravení patního zdiva přiček (příprava, bednění, zalévání, očištění, zábrus)	bm			
Dozdění mezery mezi příčkami a novými sloupy (Ytong, lepidlo, práce)	ks			
VRN	kpl.			
Součet			71 941,6 Kč	
DPH 15%			0,0 Kč	
DPH 21%			15 107,7 Kč	
GENA CELKEM s DPH			87 049,3 Kč	

S přátelským pozdravem



Telefon/Phone

Internet/ E-mail

www.psv-remeslneprace.cz.cz

IČ/DIČ/ Identification

10662243

Zapsán v Živnostenském rejstříku MÚ Sokolov pod číslem jednacímu MUSO/22514/2021/OPŽÚ/JAZA

Ervín Optiz PSV-řemeslné práce
F-S 5-1/4, změna 0, vydání 01.10.2021
