



TSKRP00AMURK

DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 – stavební údržba objektu“

číslo smlouvy objednatele: 3/21/4056/064

PID: TSKRP00AMURK

číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS210049

I.

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richt, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

SMP CZ, a.s. (správce společnosti)

se sídlem: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Lucií Zimovou, místopředsedkyní představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 24277665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.08.2021 na akci: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je:
 - a) změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ – která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.
 - b) změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ - nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele.
3. Jedná se o následující změnu: U mostního objektu Most P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, Praha 11 v rámci II. Etapy (vnitřní jízdní pruhy) byly po odfrézování živičného krytu na mostě a jeho předpolí a odkopání stávající skladby konstrukce včetně přechodových oblastí zjištěny jiné konstrukční skladby oproti předpokladům ze Zadávací dokumentace.

Rozdílné skladby konstrukce včetně tlouštěk se liší v následujících položkách: Vozovkové souvrství; a Betonová skladba podloží, která je v rozdílu oproti Zadávací dokumentaci. Jedná se o rozdíl ve výměrách plochy a skladby přechodových oblastí včetně jejich podbetonování a izolace. V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo ke změnám objemů jednotlivých prací.
4. Smluvní strany se tímto dále dohodly na změně čl. 2.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 („Doba realizace“), kdy se prodlužuje termín ukončení realizace stavby do 31.08.2022 z důvodu, že veškeré práce v ochranném pásmu horkovodu je možné provádět až mimo topnou sezónu na základě požadavku správce horkovodu, společnosti Pražská teplárenská a.s.
5. Smluvní strany tímto Dodatkem napravují zřejmou chybu v psaní v Dodatku č. 1 Smlouvy, kdy v čl. III. odst. 1 Dodatku č. 1 byla hodnota za dílo v celkové ceně za dílo včetně Dodatku č. 1 uvedena chybně. Konečná částka za dílo dle Dodatku č. 1 se tímto opravuje z chybně uvedené hodnoty 16 545 024,00 Kč bez DPH na 16 546 024,01 Kč bez DPH a hodnota víceprací v přehledu změn stavby z hodnoty 2 826 414,22 Kč bez DPH na hodnotu 2 827 414,22 Kč bez DPH..
6. Příloha č. 1 Smlouvy se tímto mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu a zákresu změn, kalkulace, zápisů z KD, fotodokumentace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy (včetně chyby v psaní, jak uvedeno výše).

III. Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	13 998 224,55 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	16 546 024,01 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

3 601 045,27 Kč

Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku č. 2 bez DPH:

20 147 069,28 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy;

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list s přílohami Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého – Augustýnova, PRAHA 11 – úprava ceny (méněpráce, vícepráce dle Dodatku č. 2 Smlouvy).
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za společníky sdružené ve společnosti
Společnost SMP – Santech alfa:

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.05.20 13:20:51
+02'00'

ING. Lucie Zímová
Podpsal ING. Lucie Zímová
DN: cn=ING. Lucie Zímová, c=CZ,
o=SMP CZ, a.s., ou=8053,
email=zimova@smp.cz
Datum: 2022.05.17 19:34:09
+02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Lucie Zímová
místopředsedkyně představenstva
SMP CZ, a.s.

ING. Pavel Kameník Digitálně podepsal ING, Pavel Kameník
Datum: 2022.05.17 11:17:58 +02'00'

.....
Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

Michal
Pustějovský

Digitálně podepsal Michal
Pustějovský
Datum: 2022.05.17 07:32:53
+02'00'

.....
Michal Pustějovský
jednatel
Santech alfa s.r.o.

Smlouva o dílo	03/21/4056/064 číslo zhotovitele:		
Předmět díla:	Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu		
Objekt:	Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11		
Objednatel:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice		
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4		
TDI:	Petr Mai, Contract Management		
Vypracoval:			

Popis změny:
 Etapa II. a III. : Po odfrézování živičného krytu na mostě a jeho předpolí a odkopání stávající skladby konstrukce včetně přechodových oblastí byly zjištěny jiné konstrukční skladby oproti předpokladům ze Zadávací dokumentace: Rozdílné skladby konstrukce včetně tloušťek se liší v následujících položkách: Vozovkové souvrství, Betonová skladby podloží, která je v rozdílu oproti Zadávací dokumentaci, Rozdíl ve výměrách plochy a skladby přechodových oblastí včetně jejich podbetonování a izolace a Změna termínu dokončení díla z důvodu možnosti provádět práce v ochranném pásmu horkovodu mimo topnou sezónu.

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDI.

Dále dle místního šetření, dodacích listů od betonu, zakreslení skutečného stavu bylo stanoveno skutečné množství.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Investor na základě dodavatelem odhalených stávajících konstrukcí.	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	X
		změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ LM V009 - Vícepráce	
		dodatek k PD	
	dokumentace skut. provedení		
	jiné (zakreslení skutečnosti v PD, fotodokumentace, RDS)	X	

údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Petr Valdman	
	Měměpráce celkem		- Kč
	Vícepráce celkem		3 601 045,27 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		3 601 045,27 Kč
	DPH celkem		756 219,51 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		4 357 264,78 Kč

termíny	Termín realizace změny:	31.08.2022
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Petr Valdman - vedoucí projektu (za zhotovitele)	25.4.2022	
	Ing. Pavel Novák - vedoucí projektu (za objednatele)	26.4.2022	
	Petr Mai - technický dozor investora	26.4.2022	
	Ing. Dušan Drahoš - autorský dozor investora	26.4.2022	

přílohy	Přílohy:
	Zápisy z KD, dokumentace změn, fotodokumentace, sken zápisu Stavebního deníku

Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, Praha 11 - stavební údržba objektu**POPIS ZMĚN**

Etapu 2 (vnitřní jízdní pruhy):

Po odfrézování živičného krytu na mostě, jeho předpolí a odkopání stávající skladby konstrukce včetně přechodových oblastí byly zjištěny jiné konstrukční skladby oproti předpokladům ze Zadávací dokumentace: Rozdílné skladby konstrukce včetně tloušťek se liší v následujících položkách: Vozovkové souvrství, Betonová skladba podloží, která je v rozdílu oproti Zadávací dokumentaci, Rozdíl ve výměrách plochy a skladby přechodových oblastí včetně jejich podbetonování a izolace. V souvislosti s těmito skutečnostmi došlo ke změnám objemů jednotlivých prací.

1. Vozovkové souvrství: Po odfrézování vozovkového souvrství na mostě a jeho předpolí byla zjištěna rozdílná tloušťka vrstev, než byl předpoklad v Zadávací dokumentaci, kde se předpokládalo s tloušťkou 120 mm. Ve skutečnosti byla tloušťka vozovkového souvrství v průměru 340 mm ve směru Chodov, 290 mm ve směru Rozptyly. Tato skutečnost je doložena fotodokumentací, zákresem ploch – výměry a výpočtem.

2. Betonová skladba podloží: Po odfrézování vozovkového souvrství byla nalezena rozdílná skladba konstrukčních vrstev, než bylo předpokládáno v Zadávací dokumentaci, kde bylo předpokládáno vrstva SC v tloušťce 200 mm. Skutečná nalezená skladba byla: prostý beton o průměrné tloušťce 270 mm ve směru Chodov, 260 mm směr Rozptyly a 1 000 mm ve středovém dělicím pásu.

3. Přechodové oblasti: Při odtěžování přechodových oblastí objektu byly odhaleny přechodové desky, jejichž skutečná plocha přesahovala plochu předpokládanou v Zadávací dokumentaci. Pod přechodovými deskami za pomoci sond byly nalezeny dvě kaverny neznámého původu, které byly následně vyplněny popílkobetonem. Dále byly odstraněny odlomené kusy přechodových desek a z prostého betonu byly vytvořeny nové linie podél krajů přechodových desek z důvodu proveditelnosti plynulého napojení izolace do drenáže a tím zabezpečeno řádné odizolování a odvodnění objektu. Trhliny, který byly nalezeny v přechodových deskách byly vyplněny materiálem na bázi cementu pomocí gravitační injektáže a současně byly do celé plochy mostu a přechodových oblastí navrtány trny do hloubky 100mm a o průměru 16 mm a to z důvodu fixace stávajících trhlin a zamezení vzniku nových. Tato skutečnost je doložena fotodokumentací, zákresem a zápisem ve SD ze dne 22.3.2022.

Etapu 3 (Ochranné pásmo horkovodu):

Změna termínu dokončení díla je vyvolána skutečností, že možnost provádět jakékoliv výkopové práce v ochranném pásmu horkovodu je možné mimo topnou sezónu, kdy se snížena teplota topného media.

4. Změna termínu dokončení díla: Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení realizace stavby do 31.08.2022 z důvodu, že veškeré práce v ochranném pásmu horkovodu je možné provádět mimo topnou sezónu na základě požadavku správce horkovodu Pražské teplárenské.

Kalkulace

Změnový list

2

Strana kalkulace

2

Akce: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	0,00 Kč
2	Vícepráce celkem	3 601 045,27 Kč
	Změnový list celkem	3 601 045,27 Kč

Kalkulace

Změnový list

2

Strana

2

Akce: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu

KALKULACE MÉNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH					0,00

Kalkulace

Změnový list

2

Strana

3

Akce: Most, P585, RYŠAVÉHO, Ryšavého - Augustýnova, PRAHA 11 - stavební údržba objektu

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem	dle §222 odst. 4	dle § 222 odst. 6
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	505,1350	303,23	153 173,60	153 173,600	
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	246,0040	413,49	101 718,54	101 718,540	
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	218,1300	771,85	168 363,64	168 363,640	
11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	72,6860	3 652,50	265 500,23		265 500,230
131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	229,6070	1 075,07	246 846,82	246 846,820	
17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	229,6070	385,92	88 611,09	88 611,090	
17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	324,8170	48,25	15 672,57	15 672,570	
17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	253,6610	1 103,21	279 840,25	279 840,250	
26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM	M	3,0000	4 382,35	13 147,05		13 147,050
285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	944,0000	557,27	526 062,88	526 062,880	
28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	530,2550	344,58	182 716,99	182 716,990	
421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	23,1800	21 693,21	502 848,61	146 400,000	356 448,610
457314	VÝROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	7,3800	9 852,27	72 709,75		72 709,750
711452	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČÍ VRSTVOU	M2	230,7550	815,20	188 115,55	188 115,550	
967158	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	111,1820	6 783,84	754 227,33		754 227,330
451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 výplňový beton - kaverny pod přechodovými deskami, podkladní beton pod drenáž	M3	5,7600	7 203,19	41 490,37		41 490,370
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					3 601 045,27	2 097 521,93	1 503 523,34

Výpočet objemů jednotlivých položek Změnového listu č. 2

Mořt. PS95, RYŠÁVEHO, Ryšávého - Augustýmova, PRAHA 11

Objekt: Stavební údržba objektu

Objekt: Stavbní úroveň objektu

	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	Množství	Cena	Cena celkem
1	014102	POBÍLY ZA SKLADU	T	1 432,000	303,23	440 289,96	1 957,150	303,23	593 483,58
	Všechny položky z 1. úrovně celkem Z.Ú. 593 483,58								
2	014101	POBÍLY ZA SKLADU	T	250,580	413,48	103 622,58	466,590	413,48	205 138,12
	Všechny položky z 2. úrovně celkem Z.Ú. 103 622,58								
Všechny položky z 1. a 2. úrovně celkem Z.Ú. 1 682,580									
3	141102	POBÍLY ZA SKLADU	T	161,700	771,85	124 806,15	379,830	771,85	293 176,95
	Všechny položky z 3. úrovně celkem Z.Ú. 124 806,15								
Všechny položky z 1. a 3. úrovně celkem Z.Ú. 1 807,280									
4	1132	PRŮMYŠLENÝCH PLOCH KAPALIN	M3	105,000	3 652,50	385 512,50	178,210	3 652,50	653 812,03
	Všechny položky z 4. úrovně celkem Z.Ú. 385 512,50								
Všechny položky z 1. a 4. úrovně celkem Z.Ú. 2 192,780									
5	1712	VLIZENÍ SYSTÉMU DNÍ	M3	770,000	315,80	243 186,00	856,800	315,80	270 748,80
	Všechny položky z 5. úrovně celkem Z.Ú. 243 186,00								
Všechny položky z 1. a 5. úrovně celkem Z.Ú. 2 436,780									
6	1712	VLIZENÍ SYSTÉMU DNÍ	M3	853,000	48,25	41 195,25	1 726,700	48,25	83 821,75
	Všechny položky z 6. úrovně celkem Z.Ú. 41 195,25								
Všechny položky z 1. a 6. úrovně celkem Z.Ú. 2 477,930									
7	1715	OSYPOVACÍ SYSTÉMU DNÍ	M3	770,000	1 103,21	851 477,70	1 023,650	1 103,21	1 129 311,95
	Všechny položky z 7. úrovně celkem Z.Ú. 851 477,70								
Všechny položky z 1. a 7. úrovně celkem Z.Ú. 2 629,930									
8	2014	VLIZENÍ SYSTÉMU DNÍ	M3	9 000	4 382,35	39 441,15	6 000	4 382,35	26 294,10
	Všechny položky z 8. úrovně celkem Z.Ú. 39 441,15								
Všechny položky z 1. a 8. úrovně celkem Z.Ú. 2 669,380									
9	2014	VLIZENÍ SYSTÉMU DNÍ	M3	18 000	557,27	10 030,86	172,000	557,27	95 856,14
	Všechny položky z 9. úrovně celkem Z.Ú. 10 030,86								
Všechny položky z 1. a 9. úrovně celkem Z.Ú. 2 769,380									
10	2014	VLIZENÍ SYSTÉMU DNÍ	M3	150,000	344,58	51 687,00	718,250	344,58	248 556,50
	Všechny položky z 10. úrovně celkem Z.Ú. 51 687,00								
Všechny položky z 1. a 10. úrovně celkem Z.Ú. 2 919,380									

72	42133	WSTUPNÍ NOKOVÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	21 693,21	2 148 651,65	122,2000	21 693,21	2 550 910,26	M3	23,48	31 693,21	502 448,91
II. Etapa výstavby: etapa 1 - podkladní železobetonová konstrukce												
89	45714	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	42,820	9 852,27	50,3020	9 852,27	484 580,55	M3	7,3000	9 852,27	72 770,75
II. Etapa výstavby: etapa 2 - výstavba železobetonové konstrukce												
117	75142	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	619,20	419 528,60	745,7500	619,20	607 943,35	M3	256,7050	619,20	188 115,35
II. Etapa výstavby: etapa 3 - výstavba železobetonové konstrukce												
125	267132	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	238,6000	6 793,84	349,8020	6 793,84	7 332 987,23	M3	115,18	6 793,84	754 227,35
II. Etapa výstavby: etapa 4 - výstavba železobetonové konstrukce												
131	45714	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	42,820	9 852,27	50,3020	9 852,27	484 580,55	M3	7,3000	9 852,27	72 770,75
II. Etapa výstavby: etapa 5 - výstavba železobetonové konstrukce												
137	75142	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	619,20	419 528,60	745,7500	619,20	607 943,35	M3	256,7050	619,20	188 115,35
II. Etapa výstavby: etapa 6 - výstavba železobetonové konstrukce												
143	267132	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	238,6000	6 793,84	349,8020	6 793,84	7 332 987,23	M3	115,18	6 793,84	754 227,35
II. Etapa výstavby: etapa 7 - výstavba železobetonové konstrukce												
149	45714	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	42,820	9 852,27	50,3020	9 852,27	484 580,55	M3	7,3000	9 852,27	72 770,75
II. Etapa výstavby: etapa 8 - výstavba železobetonové konstrukce												
155	75142	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	619,20	419 528,60	745,7500	619,20	607 943,35	M3	256,7050	619,20	188 115,35
II. Etapa výstavby: etapa 9 - výstavba železobetonové konstrukce												
161	267132	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	238,6000	6 793,84	349,8020	6 793,84	7 332 987,23	M3	115,18	6 793,84	754 227,35
II. Etapa výstavby: etapa 10 - výstavba železobetonové konstrukce												
167	45714	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	42,820	9 852,27	50,3020	9 852,27	484 580,55	M3	7,3000	9 852,27	72 770,75
II. Etapa výstavby: etapa 11 - výstavba železobetonové konstrukce												
173	75142	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	619,20	419 528,60	745,7500	619,20	607 943,35	M3	256,7050	619,20	188 115,35
II. Etapa výstavby: etapa 12 - výstavba železobetonové konstrukce												
179	267132	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	238,6000	6 793,84	349,8020	6 793,84	7 332 987,23	M3	115,18	6 793,84	754 227,35
II. Etapa výstavby: etapa 13 - výstavba železobetonové konstrukce												
185	45714	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	42,820	9 852,27	50,3020	9 852,27	484 580,55	M3	7,3000	9 852,27	72 770,75
II. Etapa výstavby: etapa 14 - výstavba železobetonové konstrukce												
191	75142	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	619,20	419 528,60	745,7500	619,20	607 943,35	M3	256,7050	619,20	188 115,35
II. Etapa výstavby: etapa 15 - výstavba železobetonové konstrukce												
197	267132	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	238,6000	6 793,84	349,8020	6 793,84	7 332 987,23	M3	115,18	6 793,84	754 227,35
II. Etapa výstavby: etapa 16 - výstavba železobetonové konstrukce												
203	45714	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	42,820	9 852,27	50,3020	9 852,27	484 580,55	M3	7,3000	9 852,27	72 770,75
II. Etapa výstavby: etapa 17 - výstavba železobetonové konstrukce												
209	75142	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	619,20	419 528,60	745,7500	619,20	607 943,35	M3	256,7050	619,20	188 115,35
II. Etapa výstavby: etapa 18 - výstavba železobetonové konstrukce												
215	267132	VÝSTUPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE	M3	238,6000	6 793,84	349,8020	6 793,84	7 332 987,23	M3	115,18	6 793,84	754 227,35

Evidenční číslo: 15/03/2022/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den				
číslo	9	konaný dne	15.3.2022	
Účastníci				
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina				

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcí sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zkresleno, zhotovitel předloží správcí sítě.	ano
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	po dobu výstavby

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	zemní práce II. etapa, vrtání a lepení kotev zábradlí, osazování zábradlí na římse
předpoklad prací	zemní a bourací práce na II. etapě
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Stav BOZP a PO

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Most P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM	
15/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3	

Datum konání příštího KD 22.3.2022 v 10,00 hod.

Zapsal

Jméno a funkce

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku o 3 stranách.

Výtisk číslo	Adresát	Datum
1	TDS	15.3.2022

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 15/03/2022/PM

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	9	konaný dne	15.3.2022
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce		
	TSK Praha		
	Contract Management a.s. TDS		
	Contract Management a.s. KOO BOZP		
	SMP CZ		
	SMP CZ		
	SMP CZ		
	SMP CZ		
	STATICITY AD		

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
15/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

Evidenční číslo: 22/03/2022/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	10	konaný dne	22.3.2022
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcí sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zakresleno, zhotovitel předloží správcí sítě. Po projednání se zástupcem dodavatele potrubí, bylo schváleno pouze toto řešení: Odkrytí potrubí v tomto místě lze provádět pouze mimo topnou sezonu. Z tohoto důvodu ve vámi navrženém termínu s odkrytím tepelného napáječe nesouhlasíme. S navrženým postupem prací souhlasíme, při snížené teplotě topného média. Ukončení topné sezóny odhadujeme na konci května. Navrhované řešení tj. postupné odkrývání a zasypávání horkovodu po 4 metrových částech s překrytím cca 20 cm pro napojení izolace podchodu. Z tohoto důvodu bude muset být řešen dodatek na prodloužení doby výstavby.	řeší se
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	po dobu výstavby

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	zemní a bourací práce na II. etapě
předpoklad prací	bourání vyrovnávací desky, odstranění izolace, začištění hran přechodových desek, sanace části schodiště, armování nové vyrovnávací desky, bednění vyrovnávací desky.
fotodokumentace	prováděna průběžně


Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Stav BOZP a PO

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
22/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3


Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
10/01	spáry v přechodových deskách	po odbourání vyrovnávací desky se objevily trhliny v přechodových deskách. AD navrhne řešení ošetření těchto trhlin.	AD zhotovitel	do 25.3.2022

Datum konání příštího KD	29.3.2022 v 10,00 hod.
--------------------------	------------------------



Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník		
Vyhотовeno v 1 výtisku o 3 stranách.		
Výtisk číslo	Adresát	Datum
1	TDS	22.3.2022



CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
22/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3

Počet stran	1
Počet výlisků	1
Výtisk číslo	1

CM

Kontrolní den stavby			
číslo	10	konaný dne	22.3.2022
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
22/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	11	konaný dne	29.3.2022
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcem sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zkresleno, zhotovitel předloží správcem sítě. Po projednání se zástupcem dodavatele potrubí, bylo schváleno pouze toto řešení: Odkrytí potrubí v tomto místě lze provádět pouze mimo topnou sezónu. Z tohoto důvodu ve vámi navrženém termínu s odkrytím tepelného napáječe nesouhlasíme. S navrženým postupem prací souhlasíme, při snížené teplotě topného média. Ukončení topné sezóny odhadujeme na konci května. Navrhované řešení tj. postupné odkrývání a zasypávání horkovodu po 4 metrových částech s překrytím cca 20 cm pro napojení izolace podchodu. Z tohoto důvodu bude muset být řešen dodatek na prodloužení doby výstavby.	řeší se
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	po dobu výstavby
10/01	spáry v přechodových deskách	po odbourání vyrovnávací desky se objevily trhliny v přechodových deskách. AD navrhne řešení ošetření těchto trhlin. Návrh řešení od AD. Spáry zainjektovány, vyrovnávací deska bude spřažena přes trny.	ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	bourání vyrovnávací desky, odstranění izolace, začistění hran přechodových desek, sanace částí schodiště, armování nové vyrovnávací desky, bednění vyrovnávací desky.
předpoklad prací	betonáž vyrovnávací desky, ošetřování vyrovnávací desky, sanace schodiště
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušební plánu

Stav BOZP a PO

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
29/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Datum konání příštího KD 5.4.2022 v 10,00 hod.

Zapsal Petr Mal TDS
Jméno a funkce

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník			
Vyrobeno v 1 výtisku o 3 stranách.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	Podpis
1	TDS	29.3.2022	

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM	
29/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3	

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 29/03/2022/PM

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	11	konaný dne	29.3.2022
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce		Telefon, e-mail
			Podpis

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM	
29/03/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3	

Evidenční číslo: 05/04/2022/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	12	konaný dne	5.4.2022
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcem sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zakresleno, zhotovitel předloží správcem sítě. Po projednání se zástupcem dodavatele potrubí, bylo schváleno pouze toto řešení: Odkrytí potrubí v tomto místě lze provádět pouze mimo topnou sezónu. Z tohoto důvodu ve vámi navrženém termínu s odkrytím tepelného napáječe nesouhlasíme. S navrženým postupem prací souhlasíme, při snížené teplotě topného média. Ukončení topné sezóny odhadujeme na konci května. Navrhované řešení tj. postupné odkrývání a zasypávání horkovodu po 4 metrových částech s překrytím cca 20 cm pro napojení izolace podchodu. Z tohoto důvodu bude muset být řešen dodatek na prodloužení doby výstavby.	řeší se
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	po dobu výstavby

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	betonáž vyrovnávací desky, ošetřování vyrovnávací desky, sanace schodiště
předpoklad prací	izolace vyrovnávací desky, ochrana izolace, sanace schodiště
fotodokumentace	prováděna průběžně


Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Stav BOZP a PO

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
05/04/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
12/01	obrázky v podchodu	na příští KD bude pozván ředitel školy a zástupce MÚ, aby došlo k domluvě jak budou opraveny malby v podchodu	objednatel	12.4.2022
12/02	ZBV	zhotovitel dodá podklady k ZBV a nároku na prodloužení času výstavby	zhotovitel	19.4.2022

Datum konání příštího KD	12.4.2022 v 10,00 hod.
--------------------------	------------------------



Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník			
Vyrobeno v 1 výtisku o 3 stranách.			
Výtisk číslo	Adresát	Datum	P
1	TDS	5.4.2022	

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU		
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MİR	CMCM	
05/04/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3	


Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 05/04/2022/PM

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	12	konaný dne	5.4.2022



CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
05/04/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

Evidenční číslo: 12/04/2022/PM

Počet stran 3

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne

Most P585, Ryšavého, stavební údržba objektu

Kontrolní den			
číslo	13	konaný dne	12.4.2022
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	teplovod	Zhotovitel provede výkopové práce, dle vydaného prohlášení správce sítě. Bude svolána schůzka se správcem sítě, kde se bude hledat cesta, jak provést stavební práce v prostoru teplovodu. Zhotovitel ve spolupráci s projektantem předloží návrh pažení horkovodu ke schválení správcem sítě. Správce sítě souhlasí s odkrytím v max. délce 4m. Bylo zakresleno, zhotovitel předloží správcem sítě. Po projednání se zástupcem dodavatele potrubí, bylo schváleno pouze toto řešení: Odkrytí potrubí v tomto místě lze provádět pouze mimo topnou sezónu. Z tohoto důvodu ve vámi navrženém termínu s odkrytím tepelného napáječe nesouhlasíme. S navrženým postupem prací souhlasíme, při snížené teplotě topného média. Ukončení lopné sezóny odhadujeme na konci května. Navrhované řešení tj. postupné odkrývání a zasypávání horkovodu po 4 metrových částech s překrytím cca 20 cm pro napojení izolace podchodu. Z tohoto důvodu bude muset být řešen dodatek na prodloužení doby výstavby.	řeší se
02/01	vícepráce	Veškeré vícepráce budou zdokumentovány (fotodokumentace, zaměření SV).	po dobu výstavby

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	aktualizovaný HMG vyskladněn
popis provedených prací	izolace vyrovnávací desky, ochrana izolace, sanace schodiště
předpoklad prací	provádění hutněního zásyvu, pokládka ŠD, pokládka sil. obrub, pokládka SC, sanace schodiště
fotodokumentace	prováděna průběžně


Kontrola kvality	
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušební plánu	

Stav BOZP a PO	
----------------	--

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
12/04/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3


Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
12/01	obrázky v podchodu	na příští KD bude pozván ředitel školy a zástupce MÚ, aby došlo k domluvě jak budou opraveny malby v podchodu	objednatel	19.4.2022
12/02	ZBV	zhotovitel dodá podklady k ZBV a nároku na prodloužení času výstavby	zhotovitel	19.4.2022

Datum konání příštího KD	19.4.2022 v 10,00 hod.
--------------------------	------------------------



Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník		
Vyrobeno v 1 výtisku o 3 stranách.		
Výtisk číslo	Adresát	Datum
1	TDS	12.4.2022



CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
12/04/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/3

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 12/04/2022/PM

Počet stran 1
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1

CM


Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
Číslo	113	konaný dne	12.4.2022


CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P585, RYŠAVÉHO, STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
12/04/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

2


ASFALTY

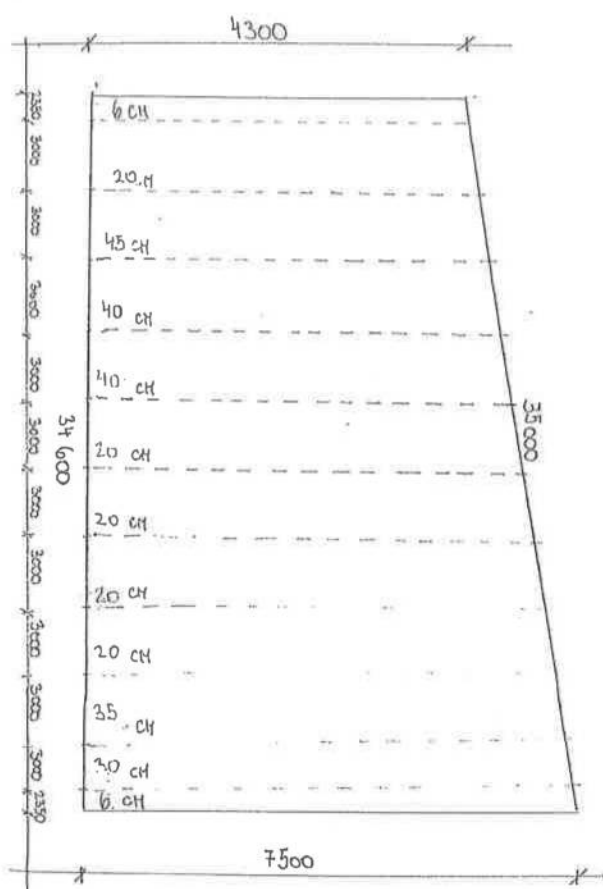


- ASFALT
- BETON
- ŽEMINA
- VYROVNÁVACÍ DESKA
- IZOLACE
- NOSNÍKY PODCHODU




①


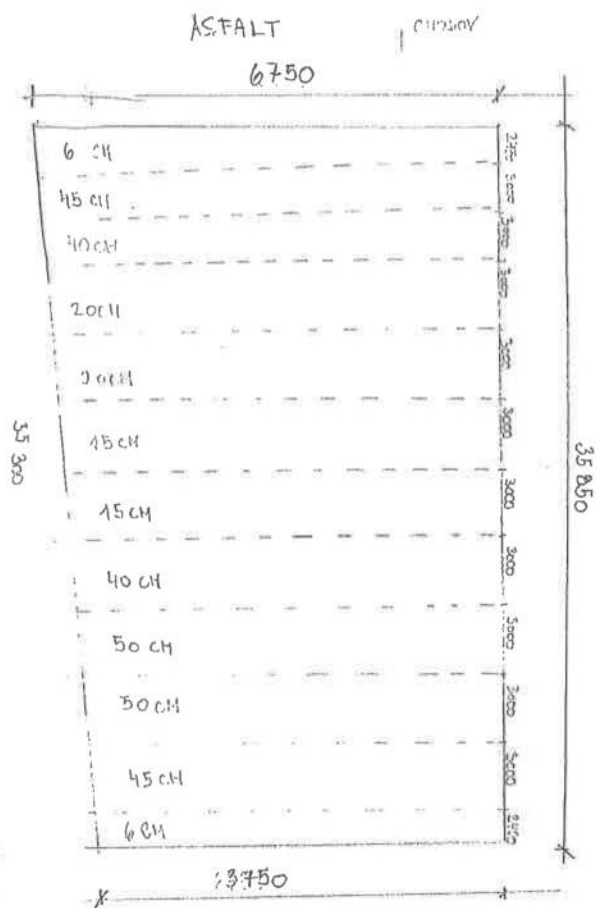


ASfalt
BETON
ŽEMINA
VYROVNÁVACÍ DESKA
IZOLACE




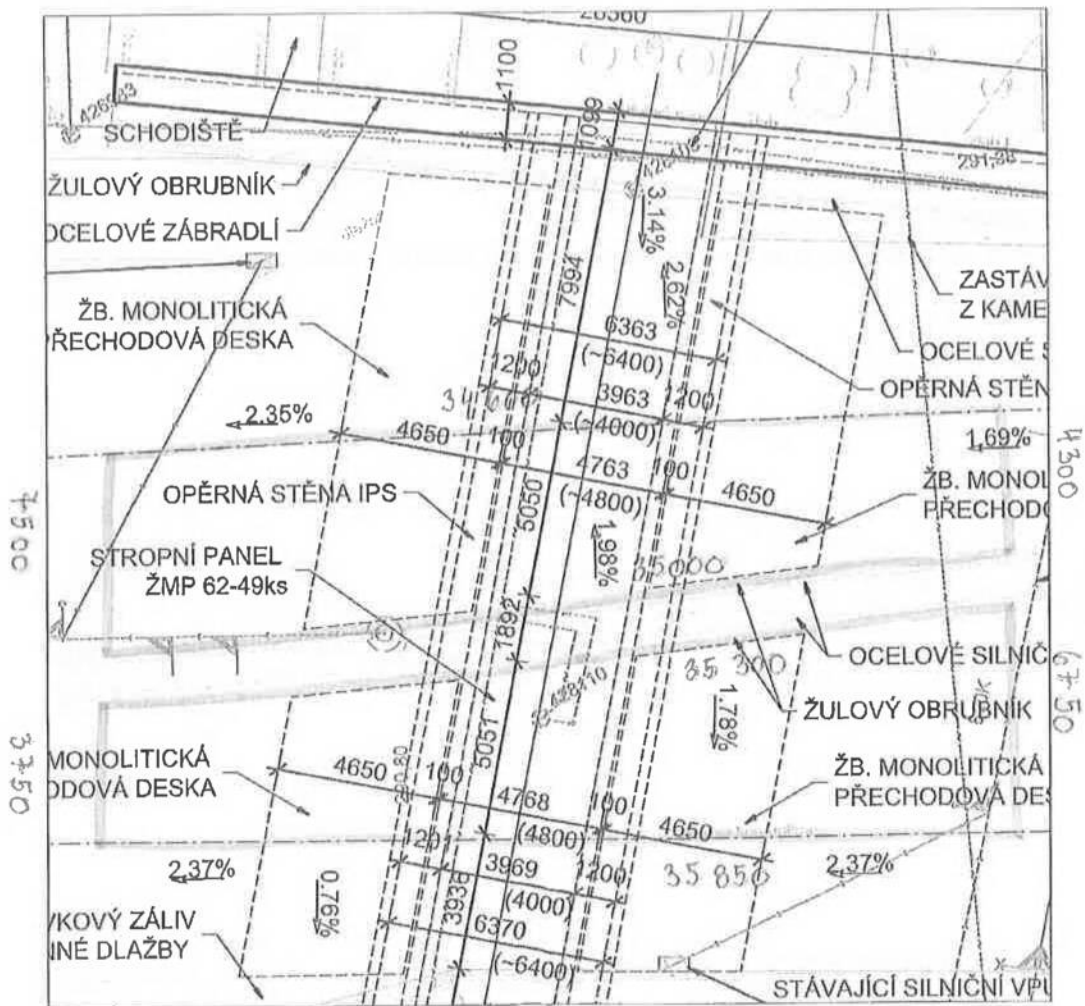


c) STŘEDNÍ VĚLÍČÍ PAB = BETONY

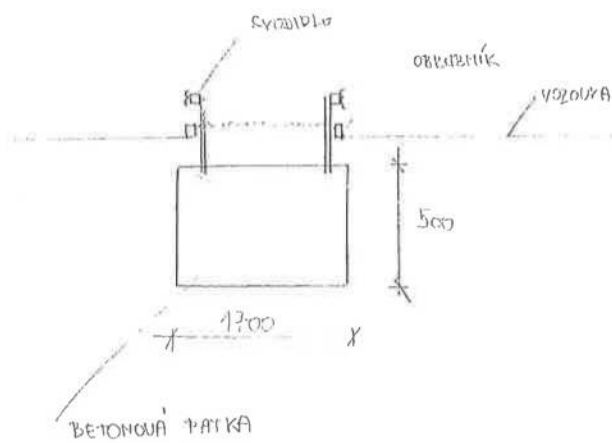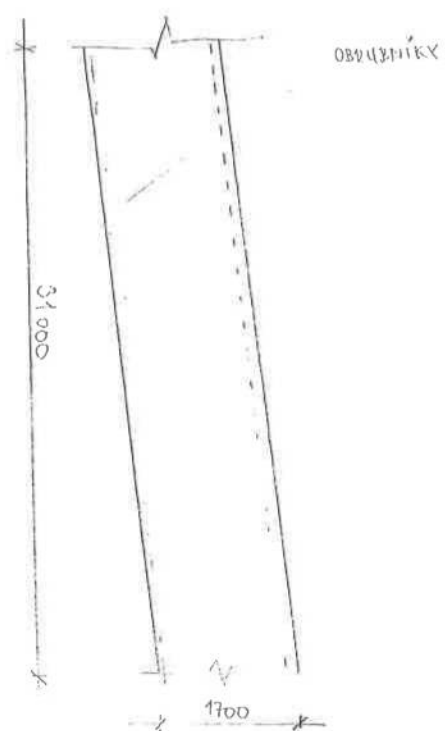

BETONY

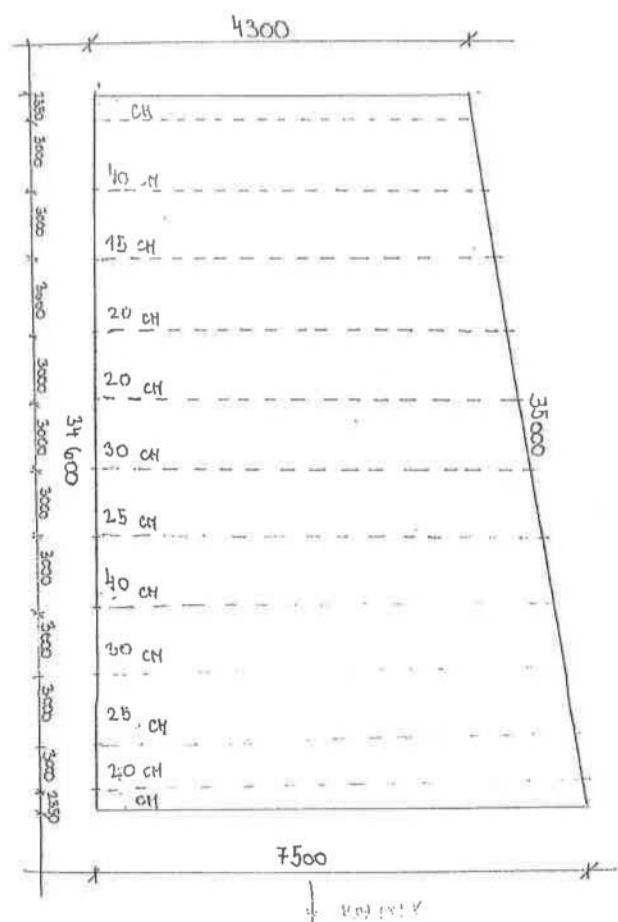


- ASFALT
- BETON
- ZEMINA
- VYROVNÁVACÍ DESKA
- IZOLACE
- NOSNÍKY PODCHODU




BETON

1000

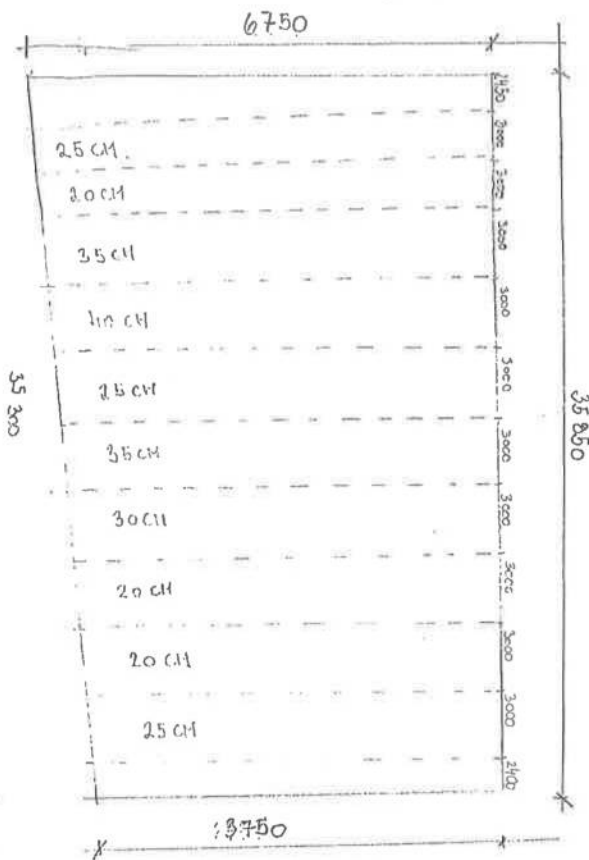

ASFALT
BETON
ŽEHINA
VYROVNÁVACÍ DESKA
IZOLACE



(10)

VRTÁNÍ + LEPENÍ TR NÚ⁰

12750


4 KS/m² - Ø 16 mm - 100MM HL. VRTU



$$S = 2,35,9 \text{ m}^2$$

18500

3. ETAPA - 2024

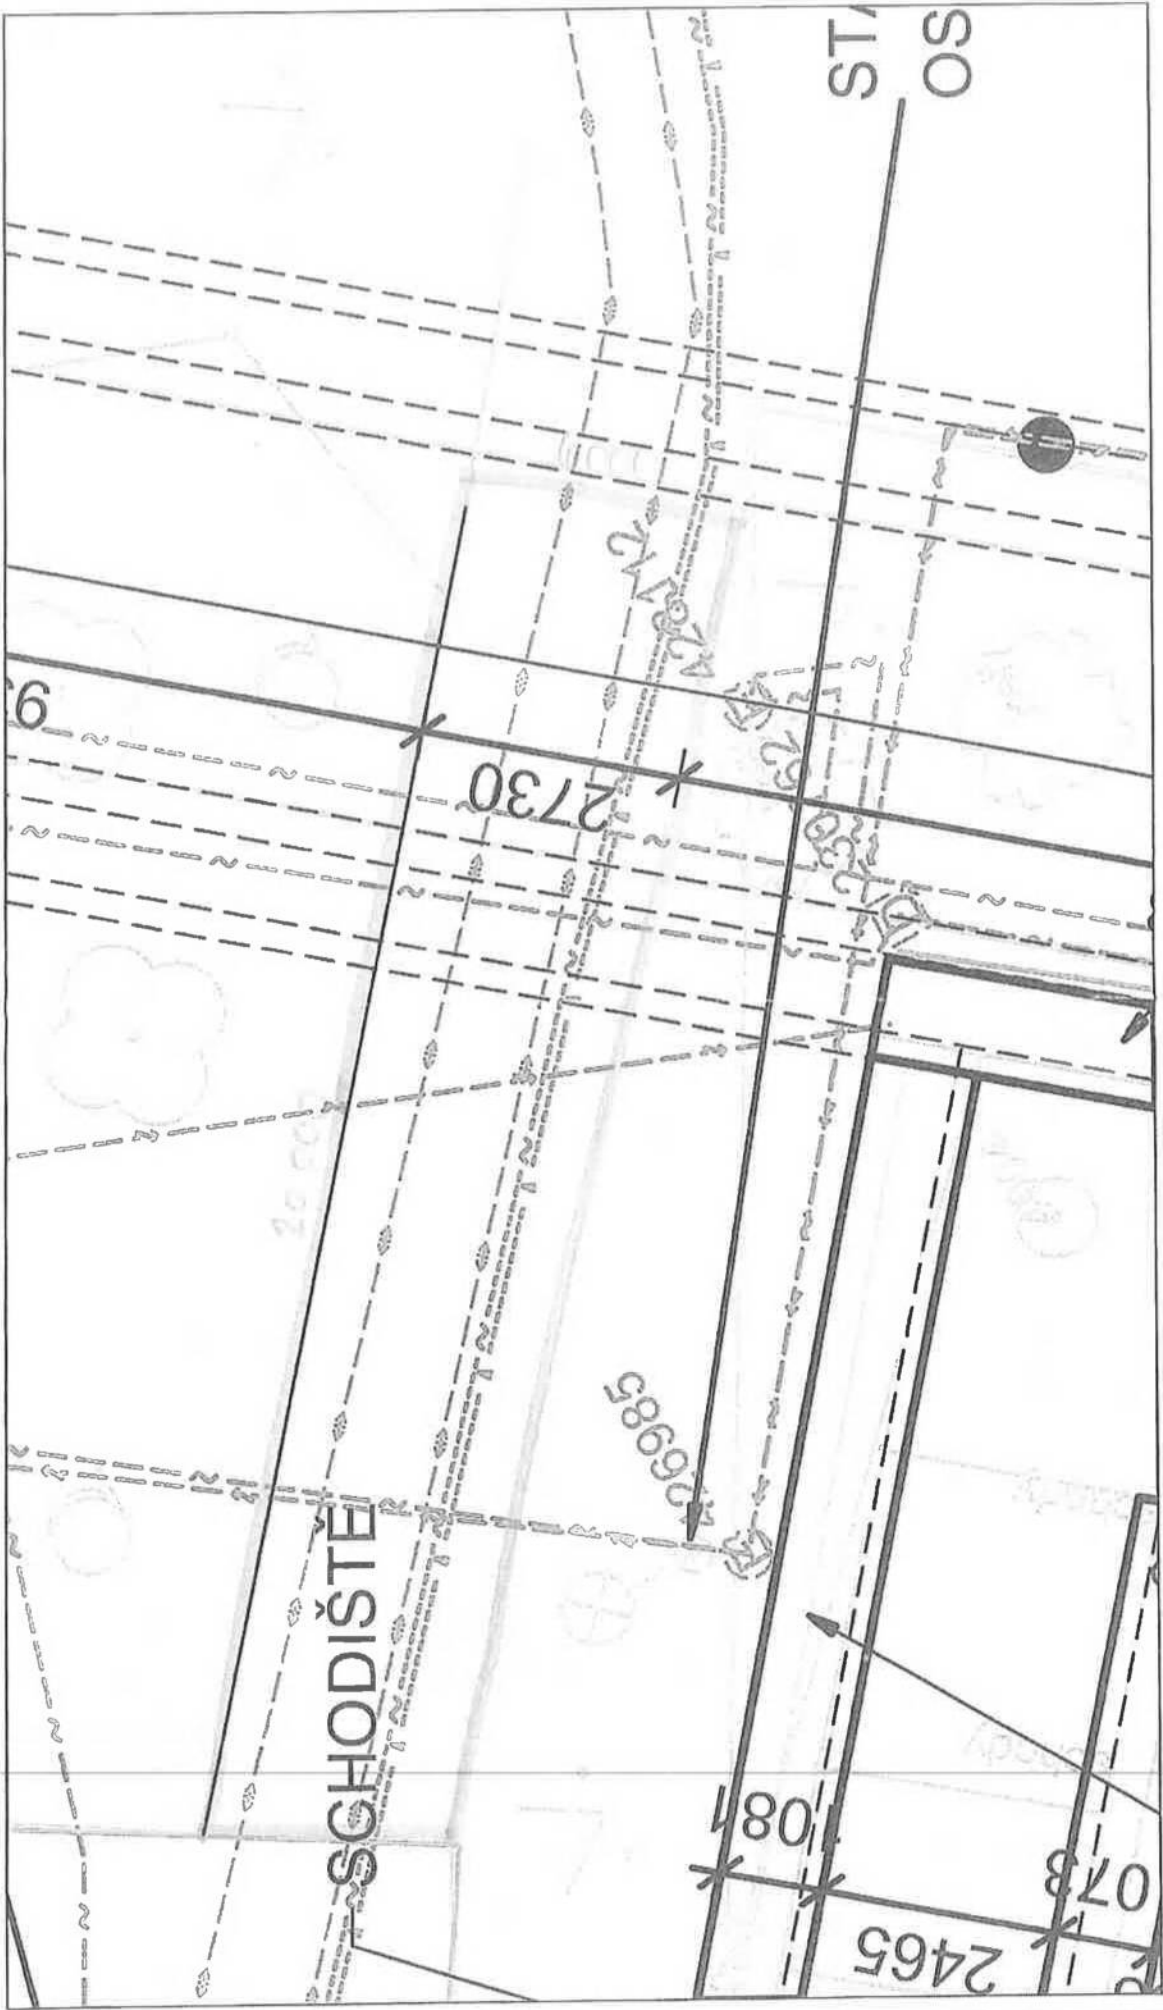

Datum	Denní záznamy stavby
24.3.22	POČASI: 9-13°C
ČT	PRACOVNÍ DOBA: 7-17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: THP, 4 SMP, 2 LGS
	PRÁCE: - UPLÁNÍ + LEPENÍ TRNU ⁰ 4kg/1m ²
	- BEDNENÍ OBL PŘECHODOVÝCH DESK
	- INDEKTAŽ PRASKLIN V PŘECHODOVÝCH DESKÁCH
	PO OVEŘENÍ, ŽE POD PŘECHODOVÝMI DESKAMI JSOU DUTINY, JE BLÍŽE NUTNÉ VYPLNIT POPÍLKOBEROUMEM JAKO V I. ETAPĚ.
24.3.22	
zápis IDS	bude řešeno a zdokumentováno jako v I. etapě.
25.3.22	POČASI: 9-14°C
PA	PRACOVNÍ DOBA: 7-17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: 2 THP, 4 SMP, 3 LGS
	PRÁCE: - BETONÁŽ DUTIN POD PŘECHODOVÝMI DESKAMI,
	- INDEKTAŽ TRAILIN V PŘECHODOVÝCH DESKÁCH
	- LEPENÍ TRNU ⁰

Datum	Denní záznamy stavby
24.3.21 zápis TDS	Drušního dne plošný KD stavby viz samostatný zápis.

29.3.22 zápis kot. BOP	Kontrola stavby.
---------------------------	------------------

ZÁTK ZHODNUTÍ:

Z PŮVODNÍ NEUKOUVENNÉHO STAVU, HORKOVODU OD PRÁVKÉ TEPLÁRENSKÉ V MÍSTĚ PODCHOPU BYLO UVEDENO STANOVISKO SE ZAKÁZKOU ODKRIT HORKOVOD V TOPNÉ SEZONĚ. TUDÍŽ BUDE NUTNÉ ČÁST PODCHOPU V MÍSTĚ HORKOVODU PŘESKOCIT DO III. ETAPY, ČIMŽ VZNIKAVÍ DALŠÍ NÁKLADY NAUČE.

30.3.22	POČASÍ: 4-7°C
ST	PRÁCOVNÍ DOBA: 7-17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: 2 THP, 4 SMT, 3 LGP, 2 VURMA
	PRÁCE: - ARMOVÁNÍ UVEDNÁVACÍ DESKY
	- SANACE SCHODIŠTĚ
	- ČISTĚNÍ PRÁCOVNÍ SPÁRY
	- PILATACE U KANALU

Datum	Denní záznamy stavby
	II. ETAPA
10.3.22	POČASÍ: 1-3°C
ČT	PRACOVNÍ DOBA: 7-17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: 1 THP, 4 SHP, 10 PENAK, 2 ŠLEHOFER, HRADAN
	PRÁCE: - OSAZENÍ ZNAČENÍ NA DIO
	- DEMONTÁŽ SVODIDEL
	- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
	- ČIŠTĚNÍ VOZOVKY
11.3.22	POČASÍ: 2-4°C
PA	PRACOVNÍCI: 2 THP, 4 SMP, 2 HRABANEK
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PRÁCE: - FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
	- POURÁNÍ ZBYTKU ASFALTU
	- BOURÁNÍ BETONU (STABILIZACE)
	- ODVOZ NA SKLADKU
12.3.22	POČASÍ: 2-4°C
SO	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: 1 THP, 2 SHP
	PRÁCE: - BOURÁNÍ ZBYTKU ASFALTU
	- BOURÁNÍ BETONU
	- DEMONTÁŽ OBRUB
	PO ODFRÉZOVÁNÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE TLouSTKY ASFALTOVÝCH VRSTEV JSOU MNOHEM VĚŠÍ NEŽ PŘEDPOKLÁDAL PROJEKT (Ø AŽ 50 CM)

Datum	Denní záznamy stavby
	II. ETAPA
10.3.22	POČASÍ: 1-3°C
CT	PRACOVNÍ DOBA: 7-17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: 1 THP, 4 SMP, 10 P ENAK, 2 PLEHOFER, HRADAN
	PRÁCE: - OSAZENÍ ZNAČENÍ NA DIO
	- DEMONTÁŽ SVOIDEL
	- FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
	- ČISTENÍ VOZOVKY
11.3.22	POČASÍ: 2-4°C
PA	PRACOVNÍCI: 2 THP, 4 SMP, 2 HRABANEK
	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PRÁCE: - FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY
	- BOURÁNÍ ZBYTKU ASFALTU
	- BOURÁNÍ BETONU (STABILIZACE)
	- ODPAD NA SKLADKU
12.3.22	POČASÍ: 2-4°C
SO	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
	PRACOVNÍCI: 1 THP, 2 SMP
	PRÁCE: - BOURÁNÍ ZBYTKU ASFALTU
	- BOURÁNÍ BETONU
	- DEMONTÁŽ OBRUB
	PO OPFRÉZOVÁNÍ BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE TLUMÍTKY
	ASFALTOVÝCH VRSTEV BOU MNOMEM VERT NEŽ
	PŘEDPOKLÁDAL PROJEKT (Ø AŽ 50 CM)

Datum	Denní záznamy stavby
	2. A. D. S. AD: řešená trhlina v přechod. desce: - provedení b-s kopaných sond pro vyčištění kaveru, v příp. nálezu vyplnit popl. betonem - vybourání desky v místě vstupu trhliny a opětovné dobetonování C30/37 XF2 - gravitací injektáž tuhlin směsí náboží cementu, zhotovitel doloží TL výrobků. - navržená trn $\varnothing 16$ 3500b do hl. 100 mm; 4 ks/m² v celé ploše mostu a přech. desky, krytí min. 40 mm. - provedení spádové desky a izolace dle RDS.

23.3.22

počasí: 7-14°C

ST

PRACOVNÍ DOBA: 7-17⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1 THP, 4 SMP, 3 LGS, 4 ŠUKMA, 1 HRADANEK

PRÁCE: - DLE UYTADŘENÍ AD VYTÁNÍ KOTELNÍCH TRNŮ $\varnothing 16$ 4 ks/m²; AL. 10 CM

- DLE POŽADAVKŮ AD, RUČNÍ SONDY DO PŘECHODOVÝCH DESK, ABY SE ZUKTLO ZDA NEJSOLÍ VE VEDLICHU JAKO U I. ETAPY.

- MONTÁŽ BLKŮ ZAŠTAUKY DO PŮVODNÍHO STAVU.

- DVOUOZ IZOLACE NA ŠKADKLI.

NA ŽÁDOST AD BYLO NUTNÉ KOPANÝMI SONDAMI 8x (30x30 CM) OVERT ZDA POD PŘECHODOVÝMI DESKAMI NEJSOLÍ NUTNÝ.

Datum

Denní záznamy stavby

2. AD/18 AD: Řešení trhlin v přechod. desce:

- provedení 6-8 kopaných sond pro vytažení kavenin, v příp. nálezu vyplnit popl. dobetonem
- vybourání desky v místě vstřevu trhliny a opětovné dobetonování C30/37 XF2
- gravitací injektáž tuhlin směsí uhoří cementu, zhotovitel dovozí TL výrobků.
- navrtání trnů $\varnothing 16$ 3500b do hl. 100 mm, 4 ks/m² v celé ploše mostu a přech. desce, kvy h. min. 40 mm.
- provedení spádové desky a izolace na DD

23.3.22

POČASÍ: 7-14°C

ST

PRACOVNÍ DOBA: 7-17⁰⁰

PRACOVNÍCI: 1 THP, 1 SMP, 3 LGS, 4 ŠIKMIA, 1 HRACANĚK

PRÁCE: - PLE UYTADŘENÍ AD VRTÁNÍ
KOPANÝCH TRNŮ $\varnothing 16$ 4 ks/m²; hl.
10 cm

- PLE POŘADAVKY AD, RUČNÍ SONDY
DO PŘECHODOVÝCH DESK, ABY SE
ZOKOTLO ZDA NEVŠOLÍ VE VEDLECHU
JAKO LI I. ETAPY.
- MONTÁŽ BLS ZAŠTAVKY DO PŘÍRODNÍHO
STAVU.
- NDVOZ IZOLACE NA SKLADKY.

NA ŽÁDOST AD BYLO NUTNÉ KOPANÝMI
SONDAMI 8x (30x30 cm) OVERT ZDA POD
PŘECHODOVÝMI DESKAMI NEVŠOLÍ NUTNÝ.



Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664

199 00 Praha Letňany CZE
IČ: 60471778, DIČ: CZ60471778

Zapsána v OŘ vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č. 25984

Výkaz čerpadla č. 22113-105-000069

UPLNUTIN

Provozovna Praha - Chodov Na Jelenách 141 00 Praha Praha 4 - Chodov CZE		Datum a čas / DUŽP 25.03.2022 08:00
		Počet výtisků 1
Zákazník SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle CZE IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147 KÓD: 20-33557 / 20-000-34004 ERP: 20-33557 / 20-000-34004 Smlouva č. SO12203015 1M1350220027	Stavba Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Ryšavého 148 00 Praha Chodov CZE GPS: / Vzdálenost 3,0 km	Kontakty Stavba Provozovna Dispečink čerpání Řidič Zdeněk Jaroš
Platební podmínky Faktura		Vozidlo GA13187 / Čerpadlo 24 m

Přehled provedených prací

Plánovaný objem: 40,00 m³

Příjezd na stavbu (h:mm)	Odjezd ze stavby (h:mm)	Výkon stroje (l/h:mm)	Mytí a manipulace (ano/ne)	Čerpaný drátkobeton (m ³)
1:30	12:00	4,5	ANO	
Přístavní/odstavné (km)	Ocelové přídavné potrubí (m)	Gumové přídavné potrubí (m)	Najetí přísadou	Likvidace beton
				NE
				Čerpaný beton (m ³)
				18,0

Poznámka

Za tímto výkazem podpisem dodavatele stojí, že:
 1. osoba podepsaná jako zákazník/poskytelská osoba je osobou pověřenou k převzetí zboží, že
 2. nůžně psané hodnoty (např. příjezd na stavbu, konec výtisků, vodo na stavbě) budou použity při výpočtu celkové částky, že
 3. přídatné hodnoty (přídavné potrubí na stavbě, přídatná zátěžová zařízení, že
 4. potvrzuje se shodou s dokumentem: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK POZP V AREÁLU BETONÁŘNY, že
 5. se dodávky zboží a služeb POUŽÍVAJÍ K ÚČELU DODACÍHO FUNKČNÍHO DODAVATELE, že
 6. zákazník zodpovídá za poskytnutí potřebných informací a souhlasí s tím, že všechny informace jsou poskytnuty v souladu s
 7. a číselníky k označení a jejich výstřední - pokud by k označení výjezdu dopravních prostředků ze stavby došlo.



Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664
199 00 Praha Letňany CZE
IČ: 60471778, DIČ: CZ60471778
Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. č. 25984

Dodací list č. 22113-101-001247

Provozovna Praha - Chodov Na Jelenách 141 00 Praha Praha 4 - Chodov CZE	Certifikační orgán	Datum a čas / DUZP 25.03.2022 10:11
Zákazník SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle CZE IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147 KÓD: 20-33557 / 20-000-34004 ERP: 20-33557 / 20-000-34004 Smlouva č. SO12203015 1M1350220027	Stavba Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Ryšavého 148 00 Praha Chodov CZE GPS: 50,034632 / 14,481362  Vzdálenost 3,0 km Doprava Ano Hmotnost nákladu 12,60 t Vozidlo 8AY5867	Kontakty Stavba Provozovna Dispečink čerpání Čechy: 739 501 932 Řidič Jiří Baumruk 948,00
Platební podmínky Faktura		

Množství Produkt Kód produktu Receptura
6,00 m3 zálivka PCS 1
Poplícementová suspenze

	DMAX	Obsah CL	V/C	Teplota ovzduší	Teplota betonu	Obsah vzd.	Doba zpracovatelnosti
	---		0,87	18,8 °C			

Kameniva Cement & příměsí
CEM II/A-M 42,5 R
poplíek
Přísady
Voda

#	Druh plnění	Skupina	Množství MJ	Cena/MJ	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
1.	zálivka PCS 1	Produkty	6,00 m3				
2.	Doprava betonu	Doprava	6,00 m3				

Sdělení pro zákazníka

Poplícementová suspenze

Příjezd na stavbu 10 20	Začátek vykládky 10 25	Konec vykládky 11 00	Doba vykládky 40'	Počet čekaček 3	Souhlas odběratele
Voda na stavbě (l)/m3	Přísady na stavbě (l)/m3	Vráceno (m3)	Počet čekaček		
			do 60 min.	nad 60 min.	zdarma
			3	0	2

Vystavil Lukáš Kment	Řidič	Ostatní na stavbě	Převzal
Prohlášení zákazníka Zákazník svým podpisem dodacího listu souhlasí, že 1. osoba podepsaná jako zákazník/pověřená osoba je osobou a pověřenou 2. uveřejněné hodnoty (např. příjezd na stavbu, konec vykládky, voda na stavbu, přísady na stavbu, vráceno, počet čekaček) jsou správné a odpovídají skutečnosti 3. příslušným vozy či vozidly je příslušná příloha na stavbě předložena předem za kladu, že 4. potvrzuje technická dokumentace (IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A HODNOCENÍ RIZIK BOJE V ARÉNU BEZPEČNOSTI, že 5. souhlasí s tímto dodáním a dodacími podmínkami dodavatele, že 6. zákazník zodpovídá za zaplacení příslušného povolení a označení záboru veřejné komunikace pro bezpečnou vykládku, za čistotu komunikace a jejích výhledů - pokud by k nečistotám výhledů došlo prostřednictvím ze strany dodávky.			



Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664

199 00 Praha Letňany CZE
IČ: 60471778, DIČ: CZ60471778

Zapsána v OR vedeném u Městský soud v Praze, odd. C, vl. č. 25984

Dodací list č. 22113-101-001237

Provozovna Praha - Chodov Na Jelenách 141 00 Praha Praha 4 - Chodov CZE	Certifikační orgán	Datum a čas / DUZP 25.03.2022 08:15
Zákazník SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle CZE IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147 KÓD: 20-33557 / 20-000-34004 ERP: 20-33557 / 20-000-34004 Smlouva č. SO12203015 1M1350220027	Stavba Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Ryšavého 148 00 Praha Chodov CZE GPS: 50,034632 / 14,481362	Kontakty Stavba Dispečink čerpaní Řidič Lenka Jellinková 948,00
Platební podmínky Faktura	Vzdálenost 3,0 km Doprava Ano	Hmotnost nákladu 12,60 t Vozidlo 7AHB103

Množství Produkt

6,00 m3 zálivka PCS 1

Poplkekocementová suspenze

Kód produktu

Receptura

000S52.210878

	DMAX	Obsah CL	V/C	Teplota ovzduší	Teplota betonu	Obsah vzd.	Doba zpracovatelnosti
	---		0,87	15,8 °C			

Kameniva

Cement & příměsí
CEM I/A-M 42,5 R
poplkek

Přísady

Voda

- # Druh plnění
- zálivka PCS 1
 - Doprava betonu

Skupina
Produkty
Doprava

Množství M J
6,00 m3
6,00 m3

Cena/M J Sazba DPH

DPH Celkem s DPH

Sdělení pro zákazníka

Poplkekocementová suspenze

Příjezd na stavbu gso	Začátek vykládky gso	Konec vykládky gso	Doba vykládky	Počet čekaček 2	Souhlas odběratele hůlkovým písmem/podpis
Voda na stavbě (l)/m3	Přísady na stavbě (l)/m3	Vráceno (m3)	Počet čekaček do 60 min. nad 60 min. zdarma 2		
Vystavil Lukáš Kment	Řidič	Ostatní na stavbě			Převzal hůlkovým písmem/podpis

Prohlášení zákazníka

Zákazník svým podpisem dodávku tímto souhlasí, že:
1. osoba podepisující jako řidič vozidla je osobou pověřenou k převzetí zboží, že
2. měřené množství zboží, příjezd na stavbu, konec vykládky, voda na stavbě jsou v souladu s fakturou, že
3. příslušné vody či tekutiny přiložené prostředky v souladu s předloženými doklady, že
4. požaduje souhlas s dodáním materiálu v souladu s předloženými doklady, že
5. se dohodl na všech technických a dodacích podmínkách dodavatele, že
6. zákazník zodpovídá za zaplacení příslušného povolení a osazení zábrany veřejné komunikace pro bezpečnou vykládku, za čistotu komunikace a její vyčištění - pokud by k nežádoucímu výjezdu dopravního prostředku ze stavby došlo.

Dodací list č. 22113-101-001240

Provozovna Praha - Chodov Na Jelenách 141 00 Praha Praha 4 - Chodov CZE	Certifikační orgán	Datum a čas / DUZP 25.03.2022 09:16
		Počet výtlsků 2
Zákazník SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566 140 00 Praha 4, Michle CZE IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147 KÓD: 20-33557 / 20-000-34004 ERP: 20-33557 / 20-000-34004 Smlouva č. SO12203015 1M1350220027	Stavba Oprava mostu P585 Ryšavého – Augustýnova, Ryšavého 148 00 Praha Chodov CZE GPS: 50,034632 / 14,481362	Kontakty Stavba Provozovna Dispečink čerpání Ridič 948,00 Václav Ratman
Platební podmínky Faktura	Vzdálenost 3,0 km Doprava Ano	Hmotnost nákladu 12,60 t Vozidlo 4SU7625

Množství	Produkt
6,00 m3	zálivka PCS 1
	Popliskocementová suspenze

Kód produktu Receptura
****000S5**2.210878**

	D _{MAX}	Obsah CL	V/C	Teplota ovzduší	Teplota betonu	Obsah vzd.	Doba zpracovatelnosti
	0,0		0,87	14,8 °C			

Kameniya

Cement & příměsi
CEM III/A-M 42,5 R
popílek

Přísady

Voda


#	Druh plnění	Skupina	Množství	M J	Cena/M J	Sazba DPH	DPH	Celkem s DPH
1.	závlivka PCS 1	Produkty	6,00	m3				
2.	Doprava betonu	Doprava	6,00	m3				

Sdělení pro zákazníka

Poplko cementová suspenze

Popliskorementová suspenze				Souhlas odběratele	
Příjezd na stavbu	Začátek vykládky	Konec vykládky 9:50	Doba vykládky	Počet čekaček	
Voda na stavbě (l)/m3	Přířady na stavbě (l)/m3	Vráceno (m3)	Počet čekaček		 hůtkovým písmem/podpis
			do 60 min.	nad 60 min.	
				zdarma	2
Vystavil		Řidič	Ostatní na stavbě		Převzal
..... Lukáš Kment					
Prohlášení zákazníka Zákazník vyjádřil podnětem ústřednímu úřadu, že 1. osoba předepsaná jako zřízatel/pověřená osoba je osobou pověřenou k převzetí zboží, že 2. osoba předepsaná jako zřízatel/pověřená osoba je osobou pověřenou k převzetí zboží, že 3. přílohy vody či teploty vody či přílohy na stavbě přetáhla zkontrola, že 4. potvrzení o zavedení a odeslání do BENTONITACE PŘÍLOHY A HODNOCENÍ BENTONITACE V ANEALU BETONOVÝCH, že 5. že dodávky zboží a služeb BENTONITACE PŘÍLOHY A HODNOCENÍ BENTONITACE V ANEALU BETONOVÝCH, že 6. zákazník souhlasí s tím, že přílohy na stavbě povolení a omezení zřízení veřejné komunikace pro bezpečnou vykládku, že 7. tato komunikace a její přílohy – pokud by k zřízení veřejné komunikace povolení zřízení veřejné komunikace, že					

1. Frézování vozovkové souvrství

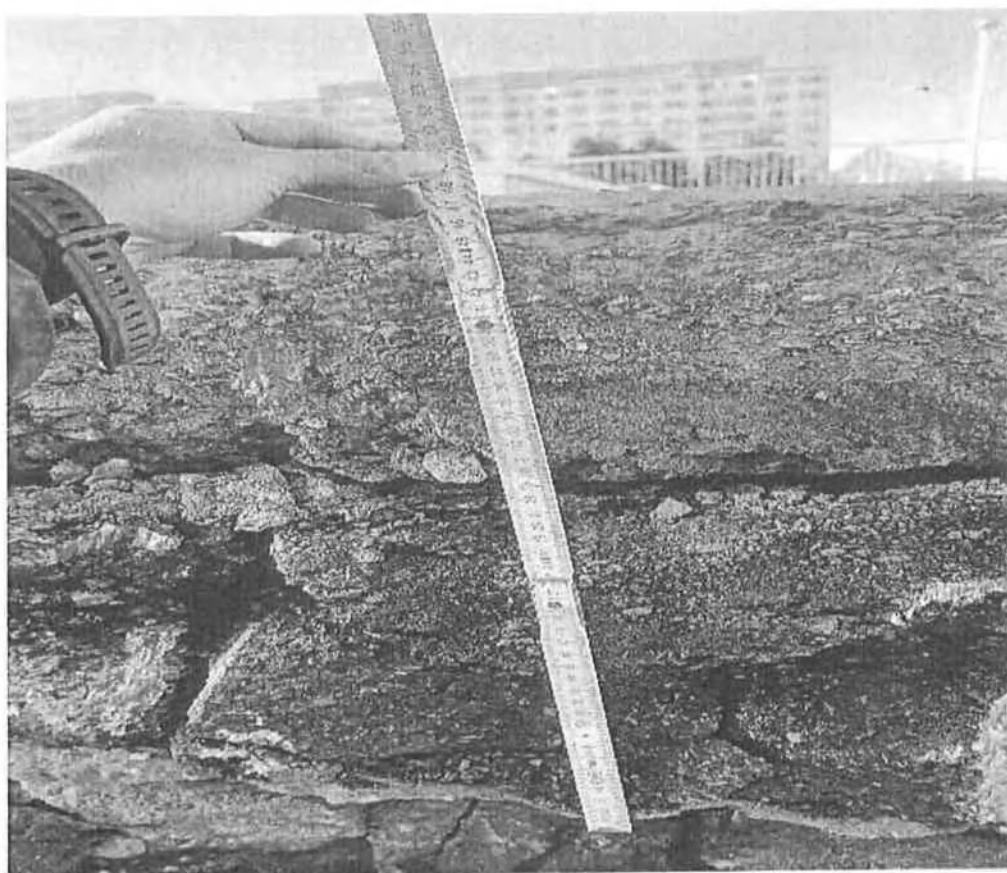

2. Betonová skladba podloží







3. Přechodové oblasti - bourání přebetonávek




4. Vrtání a vlepení trnů

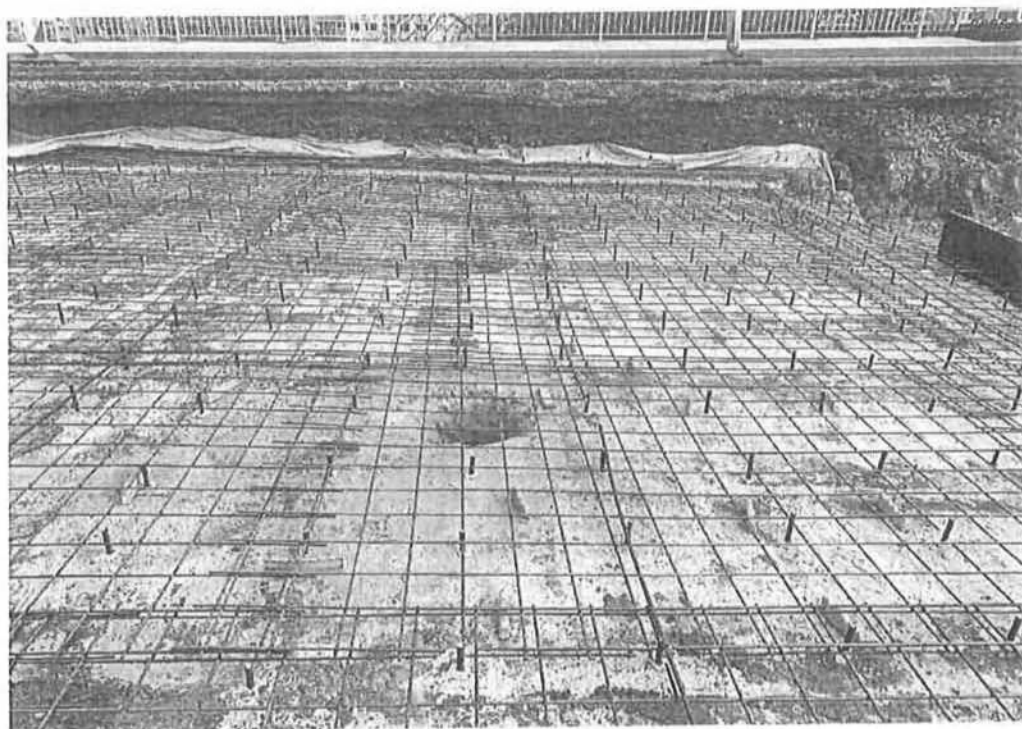

5. Kaverny pod přechodovými deskami

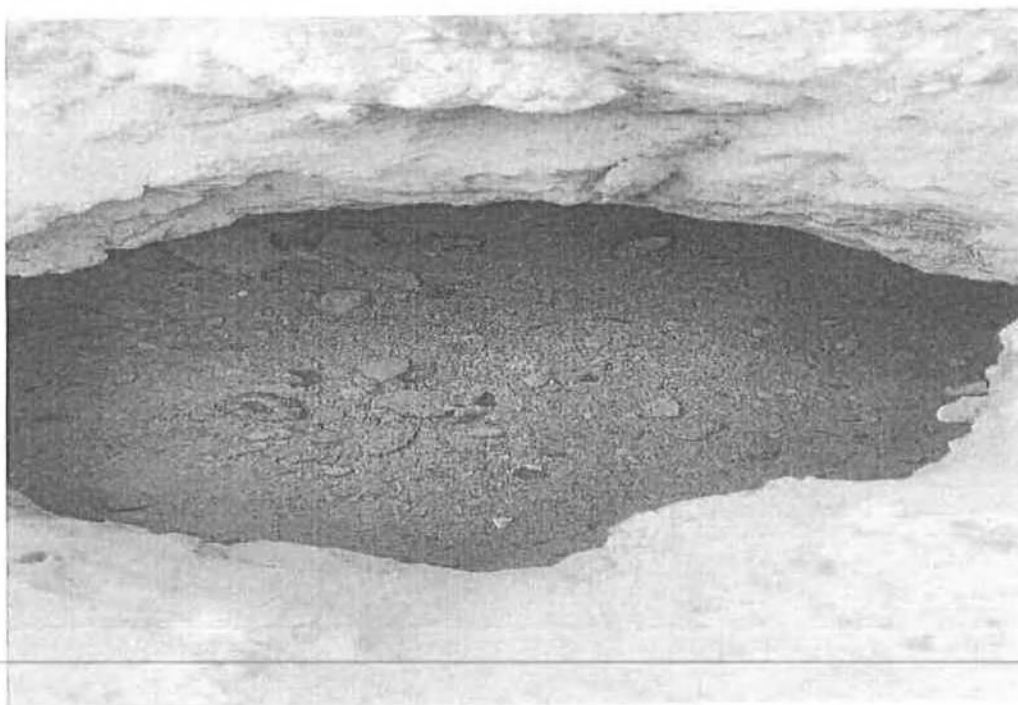

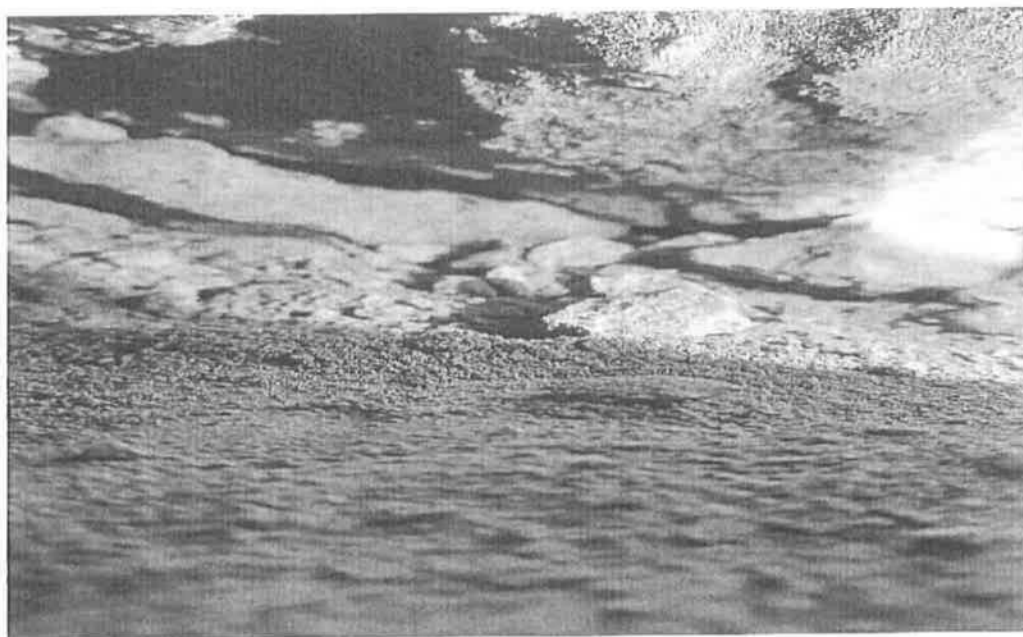

PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

[illegible]

formal) and information channels in 1979 were the same, although the latter channel had been established in 1974 and the former in 1975. The channels have been maintained

Poznámka:

Michal Pustějovský
Digitálně podepsal
Michal Pustějovský
Datum: 2022.05.17
07:38:32 +02'00'

ING. Pavel Kameník

ING. Lucie Zímová
Podatelka PČJ, tiskárna Zimov-3
DIČ: CZ01-1434143414, IČ: CZ01-1434143414
P-ŠUP CZ a.s. Hřest 1003
zima@zimov-3.cz
Datum: 2012.05.17 15:34:41
+02:00
