

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 1. 4. 2021
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Objednatel: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

Se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

IČ: 00209775

DIČ: CZ 00209775

Zastoupený: Doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Baláš – náměstek pro ekonomiku a HTS

Odpovědný zástupce ve věcech technických: Josef Morava, MBA

Bankovní spojení: Česká národní banka, čú: 88634621/0710

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně v oddíle B, vložce 7272

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

Zastoupený: Ing. Tomášem Kubíčkem, MBA, předsedou představenstva

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“
nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. 102080_U.4945_01_2021. Vzhledem k vývoji probíhající stavby došlo k nutnosti změny v provádění díla s ohledem na nutnost provést změnu stavby před jejím dokončením, a to rozšířením předmětu díla o některé vícepráce či naopak k vypuštění některých stavebních prací, což nebylo možné jakkoli předem předvídat. Uvedené změny jsou změnami závazku ze Smlouvy a nepředstavují dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ podstatnou změnu závazku.
2. Smluvní strany se v souladu s článkem XXI odst. 3 Smlouvy dohodly prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1. na níže uvedených změnách, které nahrazují, resp. mění práva a povinnosti smluvních stran.

Článek II.
Změna Smlouvy

Článek IV. Předmět smlouvy

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy pro jeho předmět.

Článek V. Doba plnění

v odst. 1 se první věta mění a nahrazuje ustanovením následovně:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést ve dvou etapách: 1. etapa – Dostavba výtahu ve lhůtě do 28. 1. 2022 a 2. etapa – dokončovací práce ve lhůtě do 30.7.2022.

Článek VII. Cena díla

se v odst. 1 upravuje a mění takto:

Cena díla za díla se upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy pro jeho předmět, takto:

Původní celková cena díla ve znění dle smlouvy o dílo ve výši 23 889 735,00 Kč bez DPH se zvyšuje o částku ve výši 3 052 711,12 Kč bez DPH, tedy na částku ve výši 26 942 446,12 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny díla:

Cena bez DPH (Kč) dle smlouvy o dílo	23 889 735,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle jeho přílohy)	3 052 711,12 Kč
Cena celkem bez DPH dle smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1	26 942 446,12 Kč Slovy: dvacet šest milionů devět set čtyřicet dva tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých, dvanáct haléřů

Článek XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla článek XIX. Pojištění a bankovní záruka

se upravují a doplňují takto:

Smluvní strany konstatují, že na dílo v rozsahu 1. etapy začíná běžet záruční doba ke dni předání této 1. etapy a na dílo v rozsahu 2. etapy začíná běžet záruční doba ke dni předání této 2. etapy.

Článek XIX. Pojištění a bankovní záruka



Ve vztahu k článku XIX. Pojištění a bankovní záruka, odst. 3 smluvní strany konstatují, že povinnost zhotovitele zajistit bankovní záruku za řádné provedení díla ve vztahu k předmětu díla dle smlouvy o dílo byla splněna poskytnutím bankovní záruky s platností do data 28.2.2022 s tím, že od 15.4.2022 zajistí zhotovitel bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny za provedení změn dle dodatku č. 1 (tj. z ceny 3 052 711,12 Kč) s platností do 30.7.2022.

Ve vztahu k článku XIX. odst. 5 smluvní strany konstatují, že povinnost zajistit bankovní záruku na záruční dobu dle odst. 5 a 6 byla zhotovitelem splněna předáním záruční listiny - bankovní záruky č. [REDAKCE], kterou vystavila Komerční banka, a.s. dne 31. ledna 2022.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má pravost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Brně dne

18.1.2022

V Brně dne

18.1.2022

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Doc. MUDr. P. [REDAKCE]
ředitel CKTCH

Ing. Tomáš Kubíček, MBA,
předseda představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4945** **CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**

Objednatel: **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie** IČO: **00209775**
Brno DIČ: **CZ00209775**
Pekařská 664/53
60200 **Brno-Staré Brno**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 960 218,12 CZK
Základní DPH	21 %	621 645,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 581 863,93 CZK**

v Brně dne 28.1.22


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Dostavba výtahu v budově A3	0,00				100
Celkem za stavbu		0,00				100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				0
4	Vodorovné konstrukce	HSV				0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0
96	Bourání konstrukcí	HSV				0
97	Prorážení otvorů	HSV				0
711	Izolace proti vodě	PSV				0
713	Izolace tepelné	PSV				0
766	Konstrukce truhlářské	PSV				1
767	Konstrukce zámečnické	PSV				9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0
772	Kamenné dlažby	PSV				0
776	Podlahy povlakové	PSV				0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				0

783	Nátěry	PSV				1
784	Malby	PSV				0
M33	Montáže dopravních zařízení - výtahy	MON				77
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				0
ON	Ostatní náklady	ON				3
VN	Vedlejší náklady	ON				6
Cena celkem					2 960 218,12	100

Položkový rozpočet

S:	U4945	CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
O:	SO 01	Dostavba výtahu v budově A3
R:	02	Změna stavby před dokončením - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,08000		
		změna :				
		1.NP : 0,35*2,2			0,77000	
		2.NP : 0,35*2,2			0,77000	
		3.NP : 0,35*2,2*2			1,54000	
2	310239211	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,50500		
		změna :				
		1.PP : 1,0*2,02*0,25			0,51000	
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
3	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	5,00000		
		Z7 : 5			5,00000	
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00000		
		přizdívky ostění : 4			4,00000	
5	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	168,55200		
		výtahová šachta : 17,7*(2,4+2,7)*2			180,54000	
		-1,35*2,22*4			-11,99000	
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
6	631311121	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,07156		
		Z1 :				
		2.NP : 0,25*1,35*0,056			0,02000	
		3.NP : 0,25*1,35*0,056			0,02000	
		Z2 :				
		1.NP : 0,25*1,35*0,05			0,02000	
		3.NP : 0,25*1,35*0,05			0,02000	
7	63242115RT5	Samonivelační stěrka vyztužená minerál.vláknky tl.2 mm	m2	0,67500		
		Z1 :				
		2.NP : 0,25*1,35			0,33750	
		3.NP : 0,25*1,35			0,33750	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
8	943943222	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	114,69600		
		výtahová šachta : 2,4*2,7*17,7			114,70000	
9	943943291	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	114,69600		
		114,696			114,70000	
10	943943292	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	114,69600		
		114,696			114,70000	
11	943943822	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m	m3	114,69600		
		114,696			114,70000	
12	943955141	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	58,32000		
		2,7*2,7*8			58,32000	
13	943955191	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	58,32000		
		58,32			58,32000	
14	943955841	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	58,32000		
		58,32			58,32000	

Položkový rozpočet

S:	U4945	CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
O:	SO 01	Dostavba výtahu v budově A3
R:	02	Změna stavby před dokončením - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl.110 mm, M12, malta 2slož	kus	10,00000		
		1/Z.1 : 10				10,00000
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny nad 20 cm	m3	2,26800		
		změna : 2,4*2,7*0,35				2,27000
17	965043321	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,08175		
		Z4 :				
		1.PP : 1,0*0,25*0,055		0,01000		
		Z2 :				
		2.NP : 1,7*0,25*0,06		0,03000		
		3.NP : 1,7*0,25*0,06		0,03000		
		Z3 :				
		3.NP : 1,7*0,25*0,04		0,02000		
18	965081712	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	0,25000		
		Z4 :				
		1.PP : 1,0*0,25		0,25000		
19	965082922	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,02927		
		Z4 :				
		1.PP : 1,0*0,25*0,015		0,01000		
		Z3 :				
		1.NP : 1,7*0,25*0,015		0,01000		
		3.NP : 1,7*0,25*0,015		0,01000		
		Z2 :				
		2.NP : 1,7*0,25*0,015		0,01000		
		3.NP : 1,7*0,25*0,015		0,01000		
20	965200013	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	0,64800		
		Z5 :				
		1.PP : 2,7*2,4*0,1		0,65000		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
21	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	5,00000		
		Z7 :				
		4.NP : 5		5,00000		
Díl: 711		Izolace proti vodě				
22	711130101	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	1,95000		
		Z4 :				
		1.PP : 1,0*0,25		0,25000		
		Z3 :				
		1.NP : 1,7*0,25		0,43000		
		3.NP : 1,7*0,25		0,43000		
		Z2 :				
		2.NP : 1,7*0,25		0,43000		
		3.NP : 1,7*0,25		0,43000		

Položkový rozpočet

S:	U4945	CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
O:	SO 01	Dostavba výtahu v budově A3
R:	02	Změna stavby před dokončením - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						
23	713100811	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl.do 2 cm	m2	1,95000		
		Z4 :				
		1.PP : 1,0*0,25		0,25000		
		Z3 :				
		1.NP : 1,7*0,25		0,42500		
		3.NP : 1,7*0,25		0,42500		
		Z2 :				
		2.NP : 1,7*0,25		0,42500		
		3.NP : 1,7*0,25		0,42500		
24	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	1,35000		
		Z1 :				
		2.NP : 0,25*1,35		0,34000		
		3.NP : 0,25*1,35		0,34000		
		Mezisoučet		0,68000		
		Z2 :				
		1.NP : 0,25*1,35		0,34000		
		3.NP : 0,25*1,35		0,34000		
		Mezisoučet		0,68000		
25	713191100	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	1,35000		
26	63151435.A	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 30 mm	m2	0,70875		
		Z2 : 0,675*1,05		0,71000		
27	63151436	Deska z minerální plsti ISOVER N tl. 40 mm	m2	0,70875		
		Z1 : 0,675*1,05		0,71000		
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
28	766023	D+M vnitřní dřevěné dveře plné 800x1970 mm,zárubeň EI30 DP3-SC3,vč.kování,dle popisu v PD	kus	1,00000		
		1/T.1 : 1		1,00000		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
29	767251111	Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu	kg	237,18750		
		1/Z.1 : 2,3*2,5*41,25		237,19000		
30	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	2 207,50000		
		1/Z.1 : 259,0		259,00000		
		2/Z.1 : 412,25*4		1 649,00000		
		3/Z.1 : 299,5		299,50000		
31	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,02516		
		3/Z.1 : 23,3*1,08/1000		0,03000		
32	13611228	Plech hladký jakost S235 10x1000x2000 mm	t	0,03910		
		1/Z.1 : 5,9*1,08/1000		0,01000		
		2/Z.1 : 12,6*1,08/1000		0,01000		
		3/Z.1 : 17,7*1,08/1000		0,02000		
33	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 4 mm	t	1,94292		
		1/Z.1 : 240,8*1,08/1000		0,26000		
		2/Z.1 : 1558,2*1,08/1000		1,68000		
34	13384340	Tyč průřezu U 160, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,25175		
		3/Z.1 : 233,1*1,08/1000		0,25000		
35	13640745	Plech lístkový DIN 59220/83 10x1000x2000 mm	t	0,25616		
		1/Z.1 : 237,1875*1,08/1000		0,26000		

Položkový rozpočet

S:	U4945	CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
O:	SO 01	Dostavba výtahu v budově A3
R:	02	Změna stavby před dokončením - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
36	767017	Lemování portálů výtahů 2350x950 mm dle popisu v PD	kus	4,00000
		změna : 4		4,00000
37	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 843,09880
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
38	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	1,10000
		Z3 :		
		1.PP : 1,1		1,10000
39	597642410	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	4,00000
		Z3 : 4		4,00000
Díl: 772		Kamenné dlažby		
40	772401123	Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm	m	0,35000
		Z4 :		
		1.NP : 0,35		0,35000
41	772511111	Dlažba z kamene pórov.do tl.3cm,pravoúhlá,do tmele	m2	0,85000
		0,85		0,85000
42	772501111	Rozebrání dlažeb kamenných	m2	0,85000
		Z3 :		
		1.NP : 1,7*0,25		0,42500
		3.NP : 1,7*0,25		0,42500
43	58386162	Sokl rovný leštěný v. 10 cm tl. 3 cm žula	m	0,35700
		0,35*1,02		0,36000
44	998772103	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m	t	0,01480
Díl: 776		Podlahy povlakové		
45	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	1,05000
		Z5 :		
		2.NP : 0,35		0,35000
		3.NP : 0,35*2		0,70000
46	776511810	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	0,85000
		Z2 :		
		2.NP : 1,7*0,25		0,43000
		3.NP : 1,7*0,25		0,43000
47	776521100	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	1,01250
48	28412223R	Podlahovina PVC Forbo SafeSTEP R12 tl. 2,0 mm 20 m protiskluzná, nášlapná vrstva 0,7 mm, oblast použití 34-43	m2	1,06313
		změna : 1,0125*1,05		1,06000
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot		
49	777615213	Nátěry podlah betonových 2x Saduritem Z 1	m2	6,48000
		změna :		
		1.PP : 2,4*2,7		6,48000
50	777611901	Epoxidová penetrace S 1300	m2	6,48000
		změna :		
		1.PP : 2,4*2,7		6,48000
51	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	0,00745

Položkový rozpočet

S:	U4945	CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
O:	SO 01	Dostavba výtahu v budově A3
R:	02	Změna stavby před dokončením - přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 783		Nátěry		
52	783222100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	56,54080
		změna :		
		U100 : 1,1*2*0,372		0,82000
		U160 : 3,1*4*0,546		6,77000
		TPU 100x100x5 : 0,1*4*16,5*4		26,40000
		0,1*4*2,5*16		16,00000
		0,1*4*1,1*2		0,88000
		0,1*4*2,5*2		2,00000
		0,1*4*2,2*2		1,76000
		0,1*4*1,3		0,52000
		0,1*4*1,1		0,44000
		0,1*4*1,23		0,49000
		0,1*4*0,9		0,36000
		0,1*4*0,25		0,10000
53	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	56,54080
		změna : 56,5408		56,54000
54	783832111R00	Protiprašný nátěr stěn	m2	138,57000
		1.PP :		
		od v. 1,75 m - výtah.šachta : (16,5-1,75)*(2,4+2,7)*2		150,45000
		-1,35*2,2*4		-11,88000
55	783812102R00	Protiolejový nátěr stěn	m2	10,20000
		změna :		
		do v. 1,0 m - výtahová šachta : 1,0*(2,4+2,7)*2		10,20000
Díl: 784		Malby		
56	784161701R00	Penetrace podkladu nátěrem Hetline Forte, 1 x	m2	22,44000
		bývalá strojovna : 2,2*(2,4+2,7)*2		22,44000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
57	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	5,37429
58	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,37429
59	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	10,74856
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,37429
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	48,36853
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,37429
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,74856
64	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,37429
65	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	5,37429
Díl: VN		Vedlejší náklady		
66	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000
Díl: ON		Ostatní náklady		
67	1	neobsazeno		
68	2	Prostorové lešení na schodišřových ramenech	kpl	1,00000
69	3	Úklid	kpl	1,00000
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení - výtahy		
70	M33-1	KONE TranSys DX"; s nosností 1275 kg / 17 osob; zdvih 9,32 m; počet stanic: 4	kpl	1,00000
Celkem				

Rozdílový rozpočet - FNUSA

rozpočet


částka

Stavební část

ELEKTRO

CELKEM

3 052 711,12

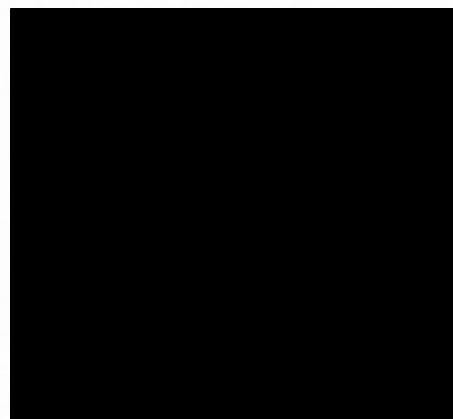

Rozpočet Z2 - Přípočty

Ceny neobsahují DPH

Materiál nosný kusový + montáž

Nazev

Pocet J

Cena mat.

Cena mont.

Celkem mat.

Celkem mon.

Přípočet

Komunikační modul MaR

Software MaR pro jeden datový bod

komunikační kabel MaR

Kabel Cu

1 ks

15 ks

50 m

20 m

2x2x0.8

5x4

B2caS1d1 Cu


B2caS1d1 Cu

Celkem materiál délkový

Celkem montáž

52525,00

39968,00



Rozpočet Z2 - Přípočty

Ceny neobsahují DPH

Material nosný kusový + montáž

Nazev

Pocet J

Cena mat.

Cena mont.

Celkem mat.

Celkem mon.

Přípočet

Komunikační modul MaR

1 ks

Software MaR pro jeden datový bod

15 ks

komunikační kabel MaR

2x2x0.8

B2caS1d1 Cu

50 m

Kabel Cu

5x4

B2caS1d1 Cu

20 m

Celkem materiál délkový

52525,00

Celkem montáž

39968,00

