

Stavba: CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO

Objekt: Stávající Pavilon G část A, 1.PP

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: Projektant		
	Popis změny: Kapotáže SDK rozvodů kanalizace, které neblo možné v celé tloušťce zainstalovat do SDK stěn.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bude v DSKP		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
	ve formě kompletní rozpočet stavby		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	Vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky k ZL 014 , ASŘ D 1.01.1 PK	115.959,38 Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	115.959,38 Kč	
	snížení:		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 1		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 3/2020	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	03 2020		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bude v DSKP, termín předání návrhu ZL 03/2020		
	Termín realizace změny: v plánovaném termínu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu na konečný termín celého díla		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: příloha 01 položkový rozpočet grafická příloha		
	Datum		

**Příloha 01 pro ZL 019 - kastliky SDK kolem instalaci**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK




D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem VCP	typ položky	Cen. soustava / platnost
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>115 959,38</b>		
nová	342267111	Obklad ZTI svodů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	37,10000	940,00	34 874,00	nová	RTS 20/I
nová	342267112	Obklad ZTI svodů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	18,70000	1 235,00	23 094,50	nová	RTS 20/I
nová	713131130	Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce	m2	32,71000	83,50	2 731,29	nová	RTS 20/I
nová	63151401	Deska z minerální vlny ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	35,99100	97,00	3 490,16	nová	RTS 20/I
164	342266111RT1-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, CW 75, dvojitě opláštěno, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, mineral tl. 5 cm	m2	24,75000	1 026,10	25 395,98	SoD	SoD
nová	763182314	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,5 m	m	11,40000	388,00	4 423,20	URS 20/I	URS 20/I
406	34701321Rpol	Předstěna SDK, tl.50mm,1xocel.kce CD,1x deska 12,5mm	m2	10,00000	667,10	6 671,00	SoD	SoD
343	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	3,66206	340,80	1 256,25	SoD	SoD
276	941955002	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	52,00000	50,00	2 600,00	SoD	SoD
nová	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	18,00000	474,50	8 541,00	nová	RTS 20/I
nová	Pol_0013	Revizní dvířka plastová, rozměr 200x200 mm	kus	18,00000	160,00	2 880,00	nová	R-pol.
		<b>Cena celkem VCP/MNP</b>				<b>115 959,38</b>		
		<b>Cena celkem bilance</b>				<b>115 959,38</b>		

*KM*

✶

PRÍLOHA K ZL. 19




④ HYDANT PŘEVNUTÍ,  
ZATÍM NEPROVEDENO




⑥ ŽALUZIE  
V. 3000




⑦ ŽALUZIE  
V. 3000

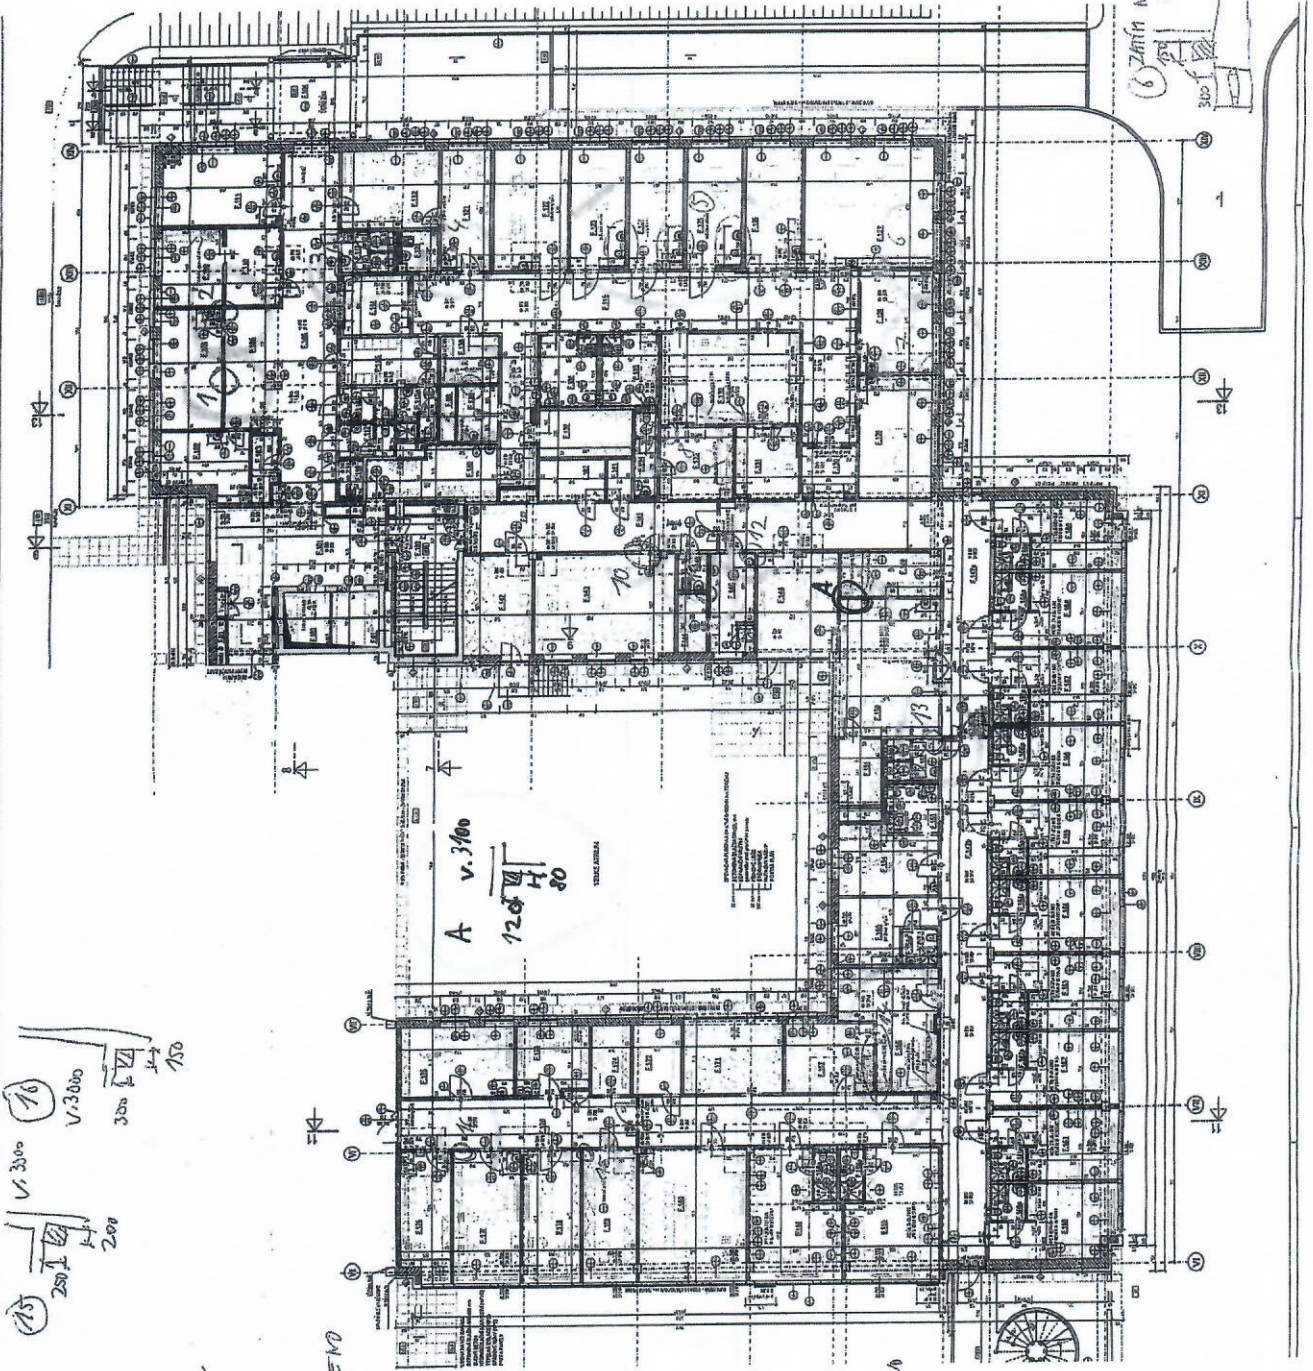

⑧ ŽALUZIE  
V. 3000




⑨ ŽALUZIE  
V. 3000




⑪ NEPROVEDENO






⑫ NEPROVEDENO





⑬ NEPROVEDENO







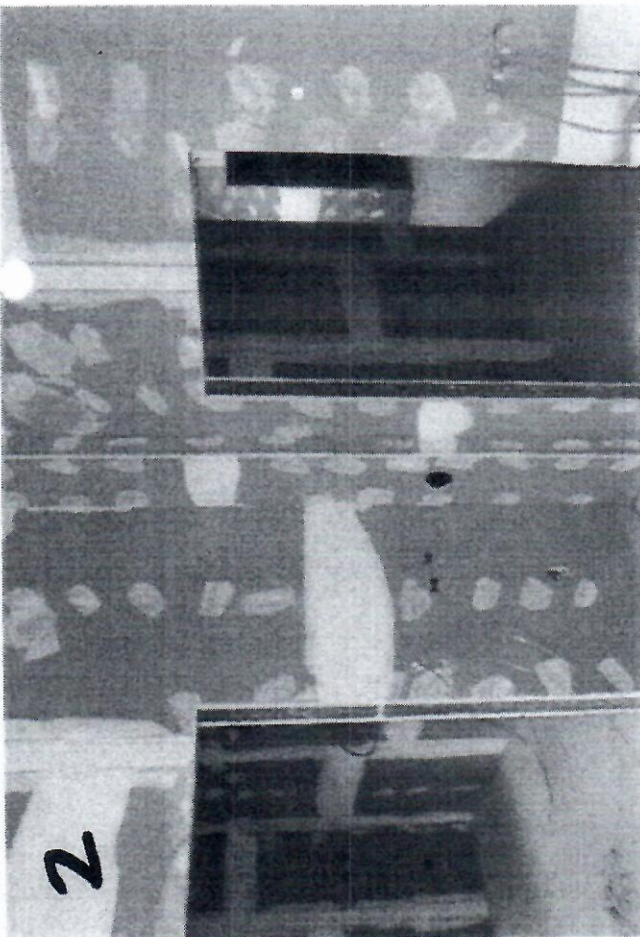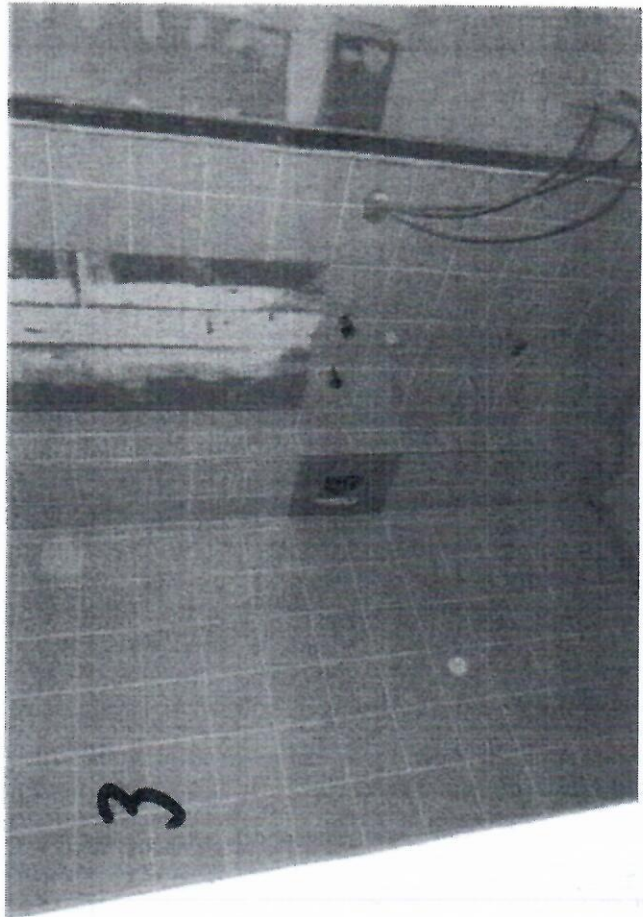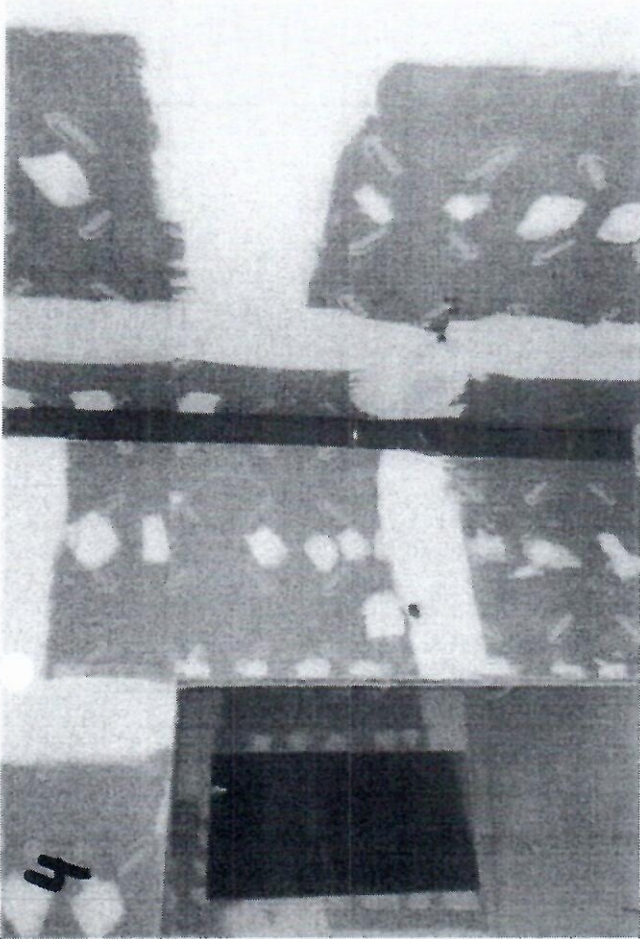

PRÍLOHA KE ZL019

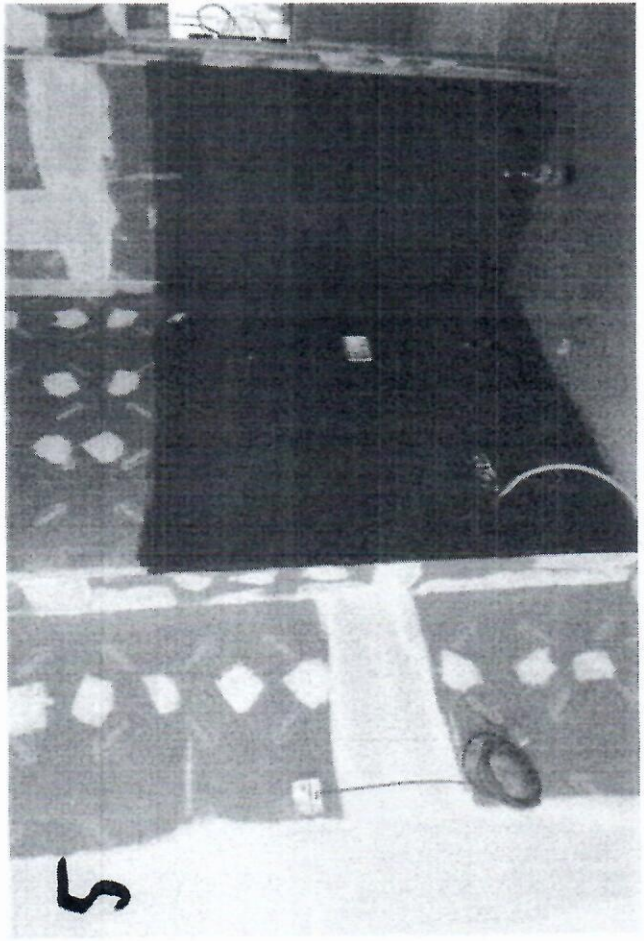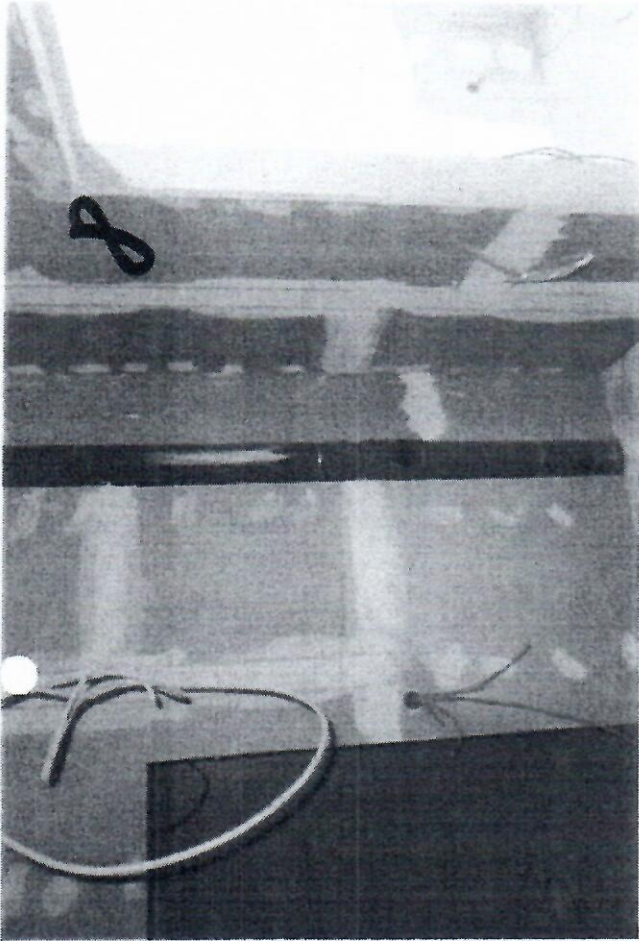




FRILOMA KE ZLOPS

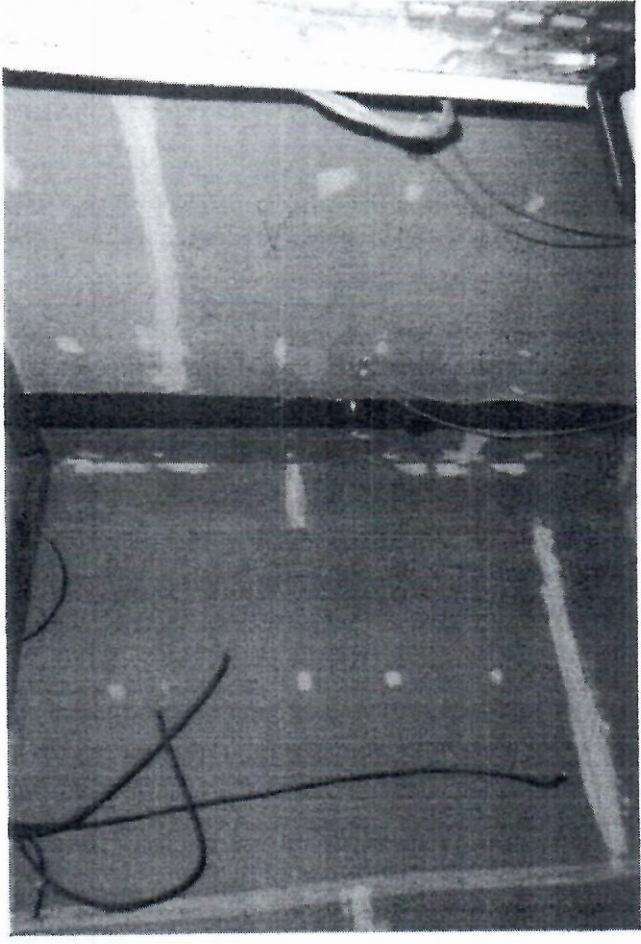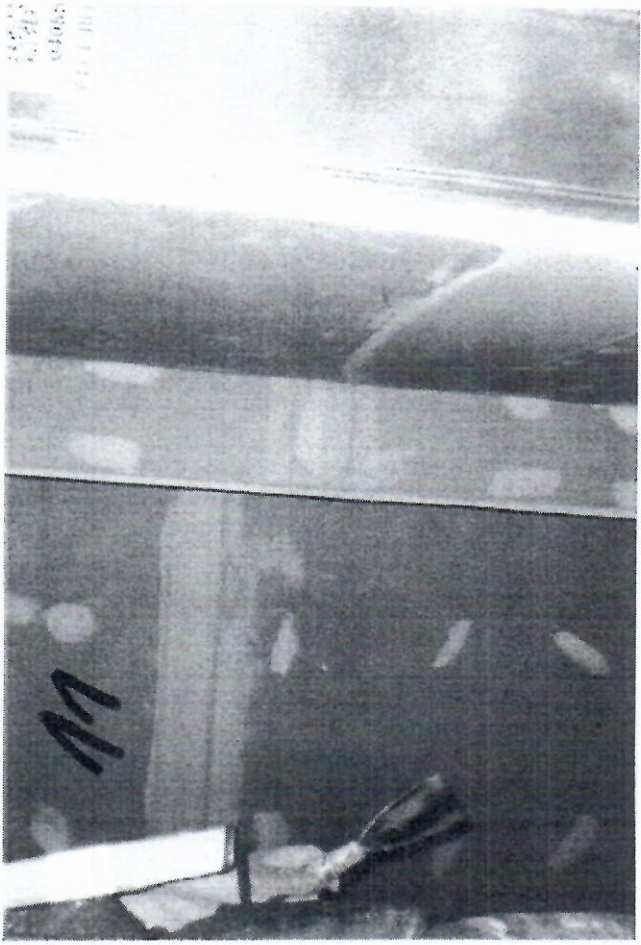

10



9

PELLOHA KE 2018

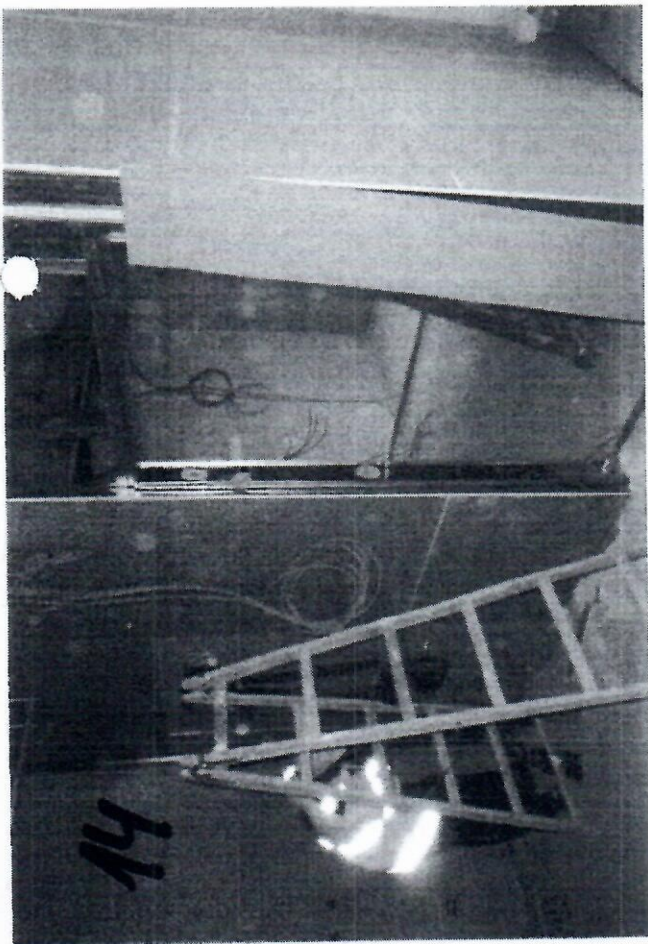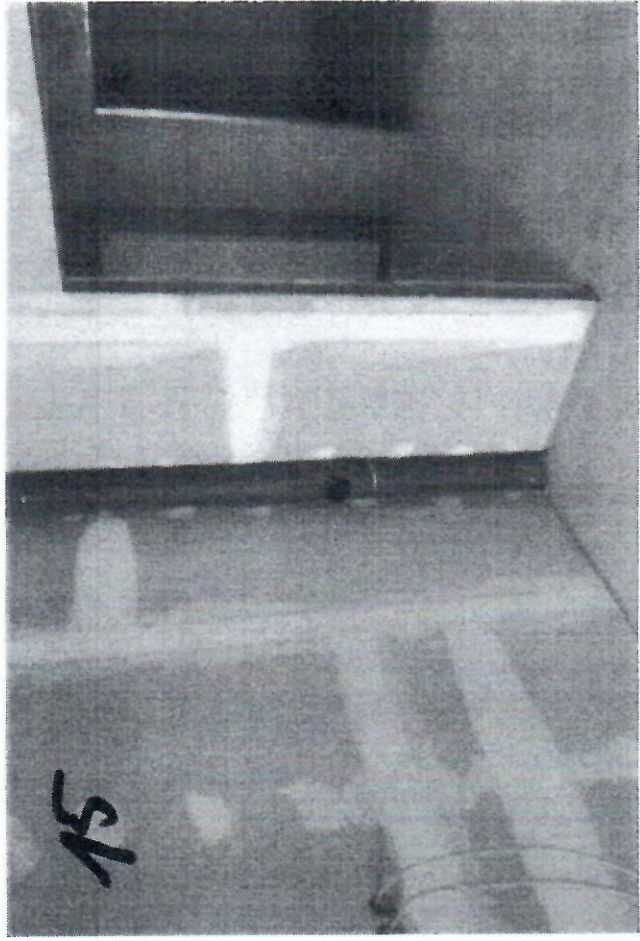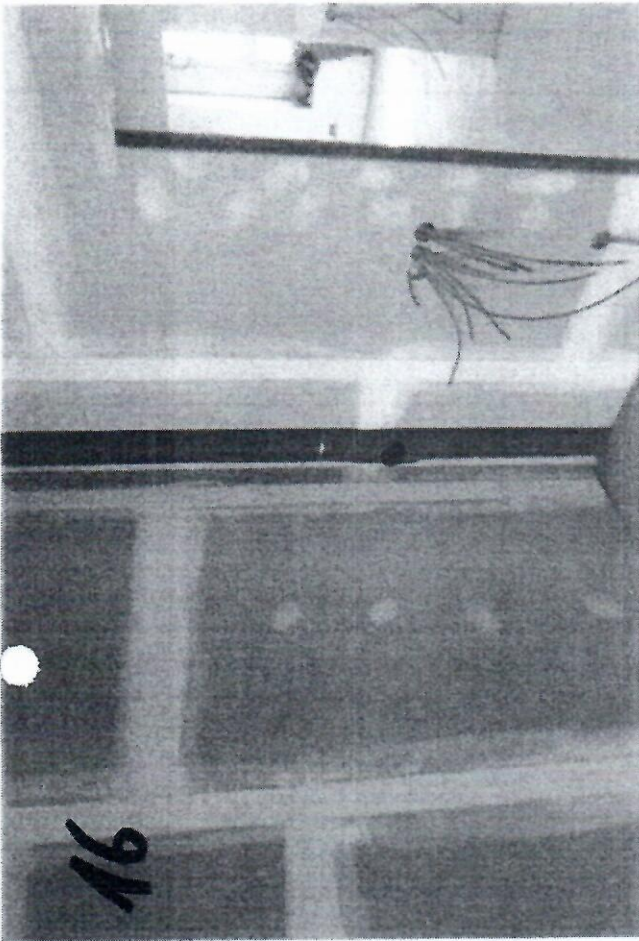




PELOHA KE ZLOIS

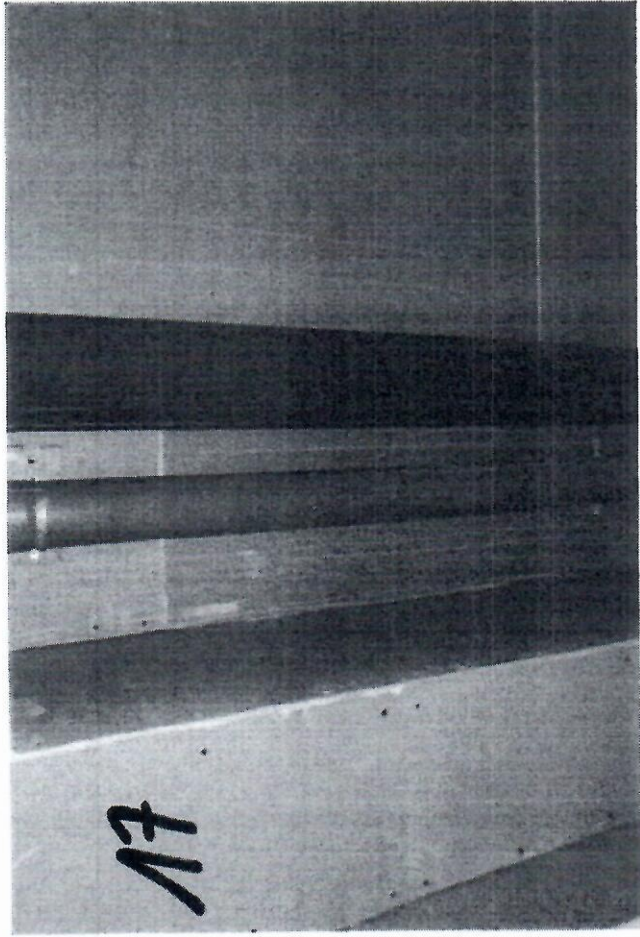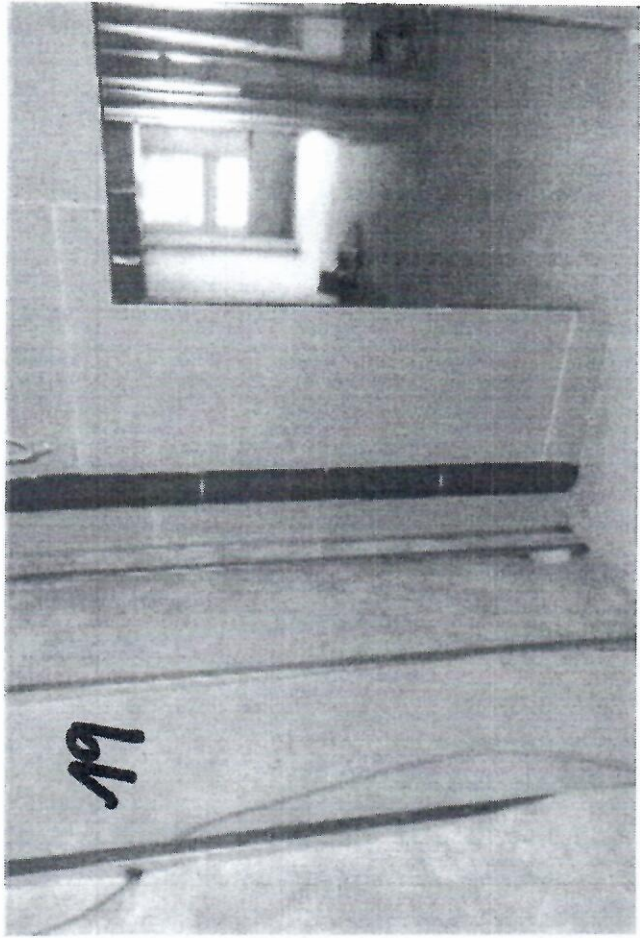

21

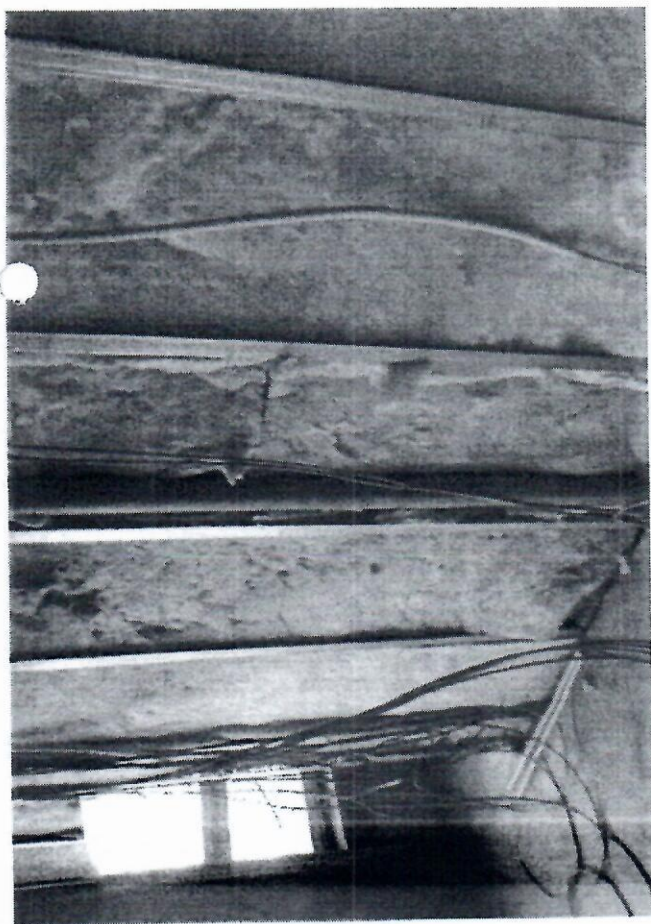

21

