



DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 03.03.2021

ve znění dodatku č. 1 a č.2

ev č. S/015/2021/OMBI

Městská část Praha 13

Sídlo: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5, 158 00
Zastoupený: Petrem Zemanem, místostarostou
IČO: 00241687
DIČ: CZ00241687
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlem: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 - Liboc
Zastoupený: Monika Šebková, prokuristka společnosti
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 15099

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

I. Předmět dodatku

A/ Smluvní strany se dohodly na změnách v článku I. Předmět smlouvy takto

Předmět plnění Zhotovitele (dílo) se doplňuje o související **dodatečné změny stavebních prací a dodávek**. Rozsah těchto dodatečných stavebních prací a dodávek je specifikován v příloze tohoto Dodatku, který se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Tato změna díla je realizována v souladu s čl. 1.7. a 4.4.Smlouvy o dílo.

B/ Smluvní strany se dohodly na změnách v článku IV. Cena díla takto:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. smlouvy o dílo vč. jejich dodatků, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

21 764 510,34 Kč



4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 15 % činí částku

3 264 676,55 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně celkem (součet čl. 4.1.1. + 4.1.2)

25 029 186,89 Kč

z čehož

a) celková nabídková cena dle nabídky podané zhotovitelem v rámci veřejné zakázky činí:

- nabídková cena v Kč bez DPH 20 436 657,00 Kč
- výše DPH (sazba 15 %) 3 065 498,55 Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 23 502 155,55 Kč

b) cena víceprací (cenový nárůst) dle změnových listů dodatku č. 2 činí:

- nabídková cena v Kč bez DPH 381 391,94 Kč
- výše DPH (sazba 15 %) 57 208,79 Kč
- nabídková cena v Kč vč. DPH. 438 600,73 Kč
-

c) cena víceprací (cenový nárůst) dle změnových listů dodatku č. 3 činí:

- **nabídková cena v Kč bez DPH 946.461,40 Kč**
- **výše DPH (sazba 15 %) 141 969,21 Kč**
- **nabídková cena v Kč vč. DPH. 1 088 430,61 Kč**

C/ Smluvní strany se dohodly na změnách v článku II. Doba plnění takto:

V souvislosti s prováděním dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na změně doby plnění takto:

- V Článku II. (Doba plnění) odst. 2.2.2. se vypouští slova:

„2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 14 kalendářních měsíců od zahájení provádění díla podle odst. 2.2.1. této smlouvy“

a nahrazují slovy:

„2.2.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) nejpozději do 18.7.2022.“

- Příloha č. II. Harmonogram plnění se nahrazuje aktuálním harmonogramem č. II/C– Harmonogram plnění.

II. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytování služeb tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah Smlouvy o poskytování služeb vč. tohoto Dodatku nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění tohoto Dodatku nebo jeho části ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí MČ Praha 13.

Příloha:

změnové listy

č. II/C- Harmonogram plnění

DOLOŽKA:

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 13 č. UR 0235/2022 ze dne 06.06.2022.

V Praze dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis

za Objednatele
Petr Zeman
místostarosta

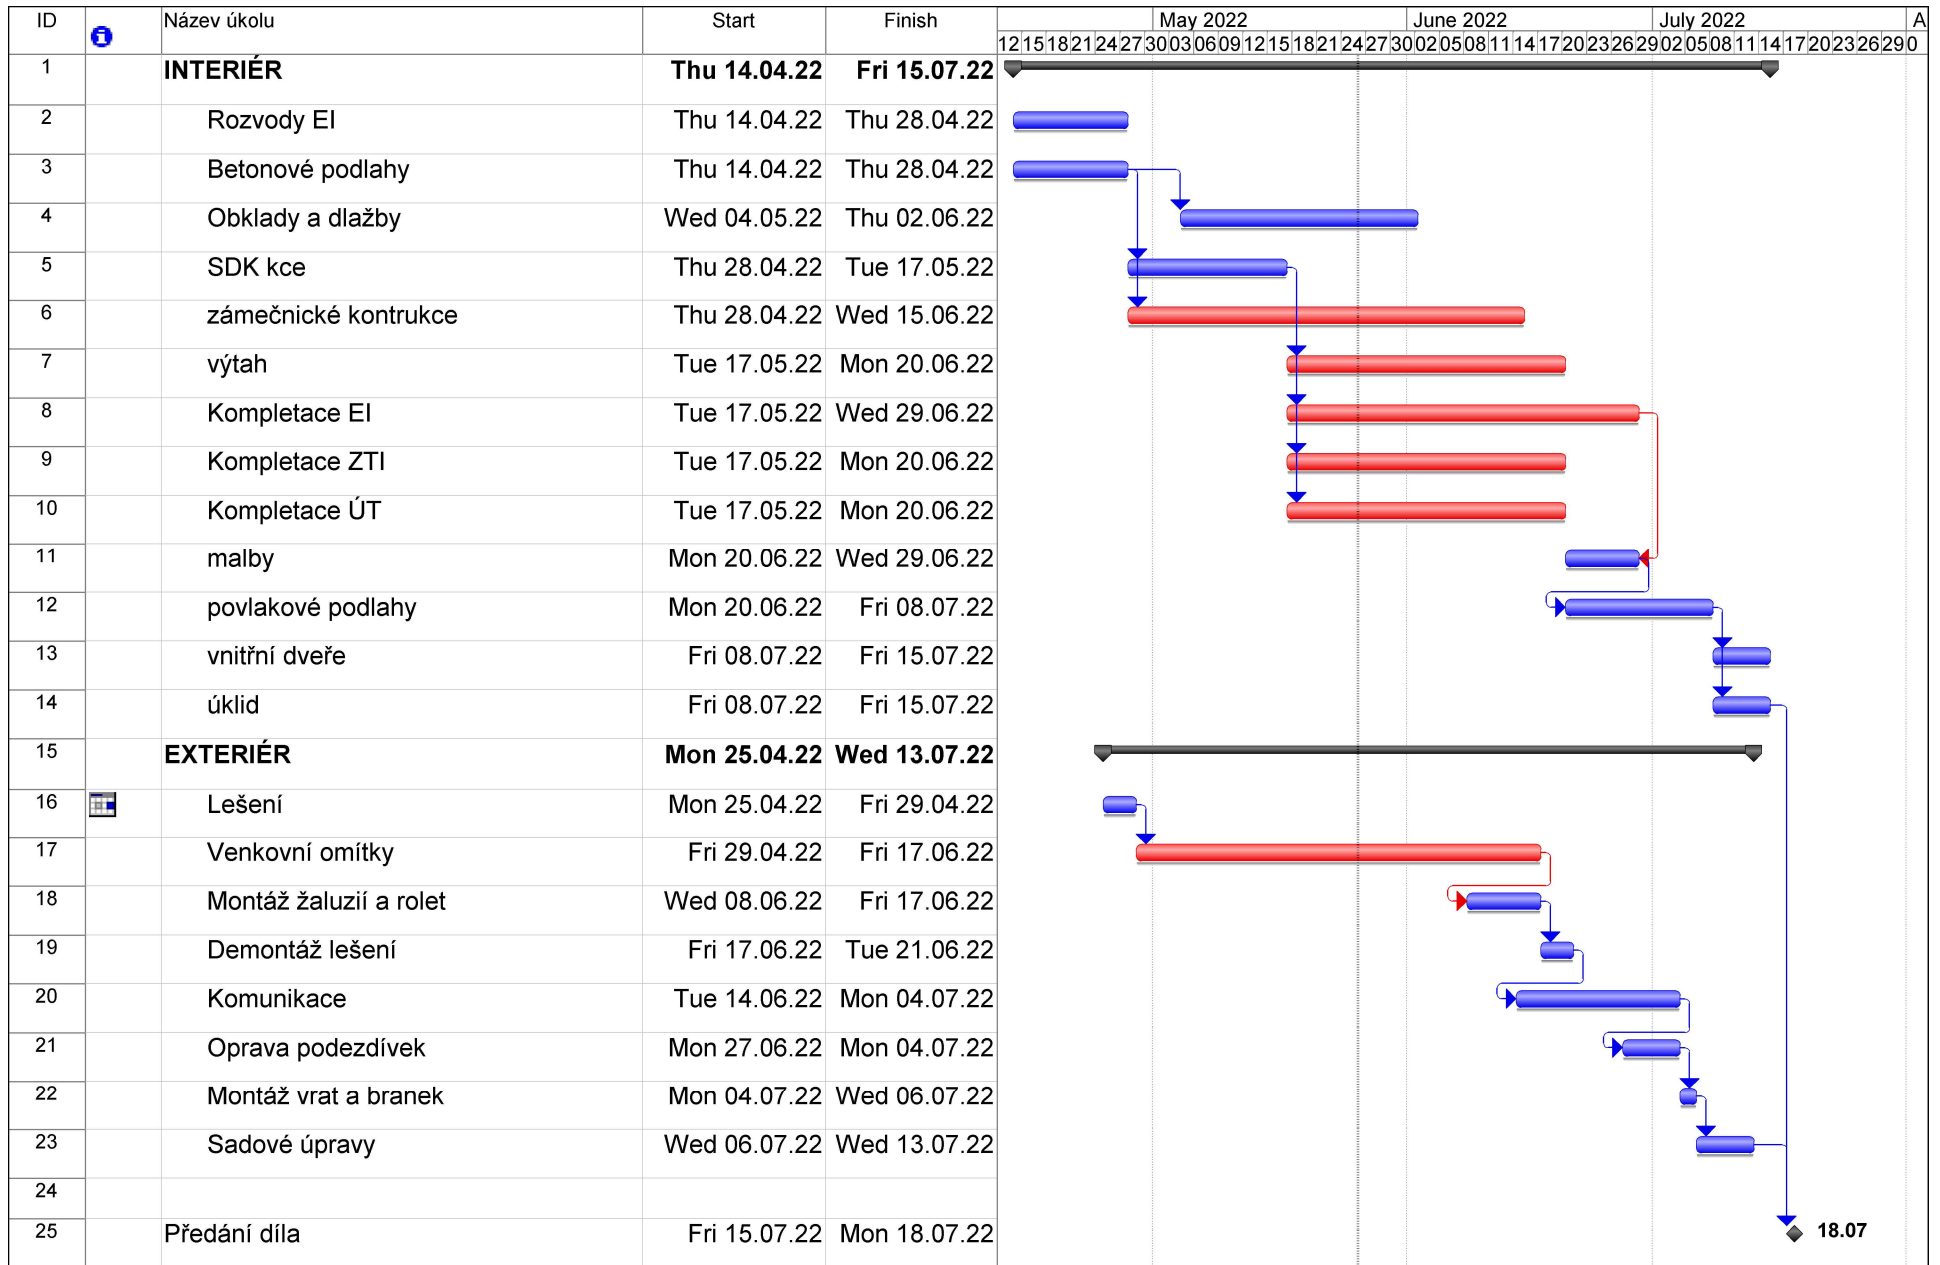
za Zhotovitele
Monika Šebková
prokuristka

Monika Šebková Digitálně podepsal
Monika Šebková
Datum: 2022.06.08
14:25:25 +02'00'

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Petr Zeman
Organizace, OJ:	Úřad městské části Praha 13
Sériové č. cert.:	11976237
Vydavatel cert.:	I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016
Datum a čas:	10.06.2022 10:30:30
Důvod:	podpis
Místo:	












***PŘÍLOHA ČÍSLO II./C SMLOUVY O DÍLO
HARMONOGRAM PLNĚNÍ***



Projekt: harmonogram prací dodatekII Datum: Thu 26.05.22	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	






Stránka 1

August 2022							September 2022							October 2022							November 2022							December 2022							January 2023							February 2023							March 2023																													
01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22	25	28	31	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20

Projekt: harmonogram prací dodatekII Datum: Thu 26.05.22	Úkol		Milník		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
	Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	






Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		6
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Okna (kotvy na desku, podkladní izolační profily, těsnění přípojovací spáry)		
Odůvodnění ZL řeší nutnost osazení vstupních dveří v 1.NP, které mají být osazeny v líci fasády, před líc základové desky. Je nutné okenní sestavy usadit na ocelové prvky. V 1.NP je nutné okna a dveře osazené na podlaže prodloužit o skladbu podlahy (220mm). V rozpočtu vykázána čistý rozměr prvku. Bylo provedeno systémovým prvkem z materiálu PURENIT. Dle PD i norem má být okenní přípojovací spára dotěsněná vnitřní a vnější parotěsnou páskou. Rozpočet tyto práce neobsahuje, neboť dle ceníku ÚRS nejsou tyto práce uvažovány rozpočtovou položkou. Zhotovitel požaduje úhradu alespoň 50% nákladů		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor [REDACTED]
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 44 093,11 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího [REDACTED]		Vyjádření projektanta [REDACTED]
Podpis, raz [REDACTED]		Podpis, razítko [REDACTED]
Vyjádření t [REDACTED]		Vyjádření investora [REDACTED]
Podpis, raz [REDACTED]		Podpis, razítko [REDACTED]
Zpracovate		

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		10
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Obvodová dilatace podlahových desek		
Odůvodnění ZL řeší doplnění obvodové pěnové dilatace podlahových desek. Tyto práce nejsou uvedeny v PD ani ve smluvním rozpočtu, avšak dílo bez nich nebude řádně fungovat. Bez tohoto prvku bude docházet k přenosu kročejového hluku do stěn a zřejmě by byl problém s akustikou v objektu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 18 671,99 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího		Vyjádření projektanta
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech.		Vyjádření inves
		Podpis, razítko
Zpracovatel:		

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		12
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		<i>Číslo smlouvy</i>
<i>Zhotovitel</i> DEREZA s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 13
<i>Předmět změny</i> Ukončení atik <i>Odůvodnění</i> ZL řeší provedení vyrovnávacího betonového podkladu, který zároveň slouží k ukotvení OSB desek na atikách. ZL dále řeší změnu provedení horního líce atik z TiZn plechu na mPVC folii.		
<i>Generální dodavatel</i> Jan Hladovec		<i>Generální projektant</i> Ing. Miroslav Frantes
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Jan Říha		<i>Investor</i> 
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		<i>Cena bez DPH</i> 4 657,69 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i>  <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření projektanta</i>  <i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.dozoru objednatele (investora)</i>  <i>Podpis, razítko</i>		<i>Vyjádření investora</i>  <i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel: J.HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.






Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		16
<i>Název stavby</i> Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		<i>Číslo smlouvy</i>
<i>Zhotovitel</i> DEREZA s.r.o.		<i>Investor</i> MČ Praha 13
<i>Předmět změny</i> PVC + dřevěné podlahy – revize výkazu výměr <i>Odůvodnění</i> ZL řeší změnu dřevěných podlah na zátěžové PVC. Dále je zde změna podlahy v jednom ze sálů z běžného na zátěžové PVC. ZL dále reviduje výměru soklíků PVC, které byly v rozpočtu nesprávně kalkulovány a jsou vněm dopočítány doplňující práce na PVC podlahách, které jsou nutné k dokončení díla, avšak nejsou obsaženy v rozpočtem popsaných a zpočítaných pracích.		
<i>Generální dodavatel</i> Jan Hladovec		<i>Generální projektant</i> Ing. Miroslav Frantes
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i> Jan Říha		<i>Investor</i> 
<i>Finanční rekapitulace</i> Celkové navýšení		PH 61 921,66 Kč
<i>Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu</i> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
<i>Vyjádření stavbyvedoucího</i> A1 		<i>Vyjádření projektanta</i> 
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>
<i>Vyjádření tech.</i> SOKHLADY 		<i>Vyjádření investora</i> 
<i>Podpis, razítko</i>		<i>Podpis, razítko</i>

Zpracovatel: J.HLADOVEC






ZMĚNOVÝ LIST




DEREZA s.r.o.		17e
Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova	Číslo smlouvy	
Zhotovitel DEREZA s.r.o.	Investor MČ Praha 13	
Předmět změny Změny SLP elektroinstalace dle požadavků		
Odůvodnění ZL řeší požadavky objednatele na doplnění či změnu dodávek rozvodů a zařízení elektroinstalace slaboproudé..		
Generální dodavatel Jan Hladovec	Generální projektant Ing. Miroslav Frantes	
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha	Investor	
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 83 198,46 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací -		
Vyjádření stavbyvedoucího Podpis, razítko	Vyjádření projektanta Podpis, razítko	
Vyjádření tech. Seu-Hl Podpis, razítko	Vyjádření investora Podpis, razítko	






Zpracovatel: J.HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		18
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Profily - KZS + vnější omítky		
Odůvodnění ZL řeší náklad spojený s osazením fasádních profilů na vnějších omítkách a kontaktním zateplovacím systému. Použití profilů je technologicky nutné, avšak tyto nejsou popsány v PD a tedy ani vyčísleny v rozpočtu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		ena bez DPH 54 089,04 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta 1  Podpis, razítko
Vyjádření tech. o SOUHLAS  Podpis, razítko		Vyjádření investor  Podpis, razítko




Zpracovatel: J.HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		22
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Magnetické kontakty do oken		
Odůvodnění ZL řeší náklad spojený s osazením integrovaných dvoubodových magnetických kontaktů do oken a vnějších dveří v rozsahu dle PD. Jsou odpočteny původně uvažované přisazené kontakty z dodávky EZS a připočteny kontakty skryté osazené při výrobě výplní vnějších otvorů.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		na bez DPH 18 514,80 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření investora  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko




Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		25
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna skladby fasády měny dispozic v 1.NP		
<p><i>Odůvodnění</i></p> <p>Dle vyjádření technologů společností (BAUMIT a WEBWER), kteří se zabývají dodávkou fasádních systémů je projektem uvažovaná skladba nefunkční a nebude ji možné provést v požadované kvalitě a se zárukou. Bylo předepsáno opatření všech ořechodůl materiálů armovací tkaninou. Dále bylo stanoveno provedení celopološného přetažení jádrové vrstvy omítky vrtvou tmelu s armovací sítkou. Dodavatel materiálů dále zmínil nutnost provedení podkladního spojovacího můstku. Zhotovitel navrhl provedení finální vrstvy v zrnitosti 1,5 mm namísto 3 mm uvedených v projektu. Je to levnější varianta. ZL řeší výše uvedené práce.</p>		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 141 872,18 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech. <i>SEMLA</i>		Vyjádření investora
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		<h1 style="font-size: 2em;">26</h1>
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna umístění rozvaděče EI		
Odůvodnění Z důvodu zvětšení rozvaděče nebylo možné tento ponechat v původní pozici, kde pro něj byla připravena nika. Po zvětšení kolidoval se schodišťovým ramenem. Bylo nutné vybourat otvor na jiném místě a původní zazdít.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		na bez DPH 649,06 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Vyjádření technického <i>SEUTII</i> 		Vyjádření investora 






Zpracovatel: J.HLADOVEC






Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		27
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Dražší materiál obklady (změna formátu)		
Odůvodnění Z důvodu architektem požadované změny formátu obkladů z rozpočtem uvažované velikosti 200x200 mm na formát 200x400 a 100x100 a z důvodu změny dlažby v koupelnách z formátu 300x300 mm na formát 200x200mm došlo k navýšení nákupní ceny tohoto materiálu, neboť zvolené výrobky jsou dražší. Nárůst ceny dokládáme přiloženým výpisem ceníkových cen. Výsledná cena byla stanovena jako nabídková cena plus rozdíl ceníkových cen zvoleného a zadávací dokumentací uvedeného materiálu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		bez DPH 37 676,98 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací - Srovnání ceníkových cen obkladů a dlažeb 		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech. o. Souhlas		Vyjádření investo
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Zpracovatel: J.HLADOVEC




Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		28
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna materiálu podlahových desek		
Odůvodnění Vzhledem k potřebě zkrácení doby vysychání litých podlah, bylo domluveno, že podlahové desky budou provedeny ze zavlihlého betonu ZL řeší finanční vyrovnání.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové ponížení		Cena bez DPH -3 418,05 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 		Vyjádření projektanta 
Podpis, razítko		Podpis, razítko
Vyjádření tech. Souhlas		Vyjádření invest.
Podpis, razítko		Podpis, razítko

Zpracovatel: J.HLADOVEC





Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		30
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna zařizovacích předmětů		
Odůvodnění Na základě požadavku objednatele budou namísto PD uvažovaných sprchových závěsů osazeny sprchové pevné zástěny. Dále vzhledem k provedení sprch bez vaniček, je nutné osadit na hranu spádiště spádový profil. ZL dále řeší odpočet nedodávaných sprchových madel a dodávku přebalovacího pultu.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 128 456,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. dozorce  Podpis, razítko		Vyjádření investora  Podpis, razítko

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		31
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna materiálu zábradlí		
Odůvodnění Vzhledem ke špatné dostupnosti nerezového materiálu navrhl zhotovitel změnu zábradlí na Ocel opatřenou práškovou barvou. Dále odchází ke změně tvaru zábradlí oproti PD. ZL řeší vypořádání této změny		
Generální dodavatel Jan Hladovec	Generální projektant Ing. Miroslav Frantes	
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha	Investor	
Finanční rekapitulace		Cena bez DPH
Celkové navýšení		-10 349,86 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu		
<ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací - Schéma zábradlí 		
Vyjádření stavbyvedoucího	Vyjádření projektanta	
		
Podpis, razítko	Podpis, razítko	
Vyjádření technika	Vyjádření investora	
SOUHLASÍ 		
Podpis, razítko	Podpis, razítko	

Zpracovatel: J. HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		32
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Doplnění elektroinstalace		
Odůvodnění ZL řeší požadavky objednatele na provedení dodatečných kabeláží k PTZS, tablu dveří, připojení Čerpadla v jímce		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor 
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 34 917,21 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko		Vyjádření projektanta  Podpis, razítko
Vyjádření tech. d. SOUHLASA Podpis, razítko		Vyjádření inves Podpis, razítko






Zpracovatel: J.HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		33
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změny ovládání žaluzií a rolet		
Odůvodnění ZL řeší požadavek na provedení elektromotorů u rolet a žaluzií. Při této změně dochází ke sloučení menších žaluzií do větších. Tento ZL řeší odpočet původních položek a přípočet dle skutečnosti.		
Generální dodavatel Jan Hladovec	Generální projektant Ing. Miroslav Frantes	
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha	Investor 	
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		Cena bez DPH 73 565,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího 	Vyjádření projektanta 	
Podpis, razítko	Podpis, razítko	
Vyjádření tech. d. SOUHLAS	Vyjádření investora 	
Podpis, razítko	Podpis, razítko	

Zpracovatel: J.HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		34
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Změna materiálu klempířských výrobků a doplnění meziobjektové dilatace		
Odůvodnění ZL řeší změnu materiálu klempířských prvků z TiZn plechu na lakovaný pozinkovaný ocelový plech. ZL dále řeší doplnění meziobjektové dilatace, která nebyla řešena v PD.		
Generální dodavatel Jan Hladovec		Generální projektant Ing. Miroslav Frantes
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha		Investor [REDACTED]
Finanční rekapitulace Celkové navýšení		[REDACTED] a bez DPH 12 474,49 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací - Schéma provedení		
Vyjádření stavbyvedoucího [REDACTED]		Vyjádření projektanta [REDACTED]
Podpis, razítko [REDACTED]		Podpis, razítko [REDACTED]
Vyjádření tech. [REDACTED]		Vyjádření investora [REDACTED]
Podpis, razítko [REDACTED]		Podpis, razítko [REDACTED]

Zpracovatel: J.HLADOVEC

Průvodní komentář k předloženému změnovému listu č.		36
Název stavby Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova		Číslo smlouvy
Zhotovitel DEREZA s.r.o.		Investor MČ Praha 13
Předmět změny Čistící rohož před vstupem do objektu		
Odůvodnění ZL řeší požadavek objednatele na provedení čistících zón před vstupy do objektu. Čistící zóny nebyly PD uvažovány.		
Generální dodavatel Jan Hladovec	Generální projektant Ing. Miroslav Frantes	
Tech. dozor objednatele (investora) Jan Říha	Investor 	
Finanční rekapitulace Celkové navýšení	- 49 -	Cena bez DPH 31 977,42 Kč
Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu - Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací		
Vyjádření stavbyvedoucího  Podpis, razítko	Vyjádření projektanta  Podpis, razítko	
Vyjádření tech.doz.  Podpis, razítko	Vyjádření investora  Podpis, razítko	

Zpracovatel: J.HLADOVEC
