

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) mezi těmito smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

E-mail:

Tel.: +42

E-mail:

Tel.: +42

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Čmiel, ředitel oblasti

oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Čmiel, ředitel oblasti

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2021/02/067/Li, uzavřené dne 29.09.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 27.03.2022 (dále jen „**smlouva**“) na realizaci stavby s názvem „**Nadjezd Závodní**“.
2. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele. Soupis těchto změn (soupis víceprací a méněprací) je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce budou, nebo měly být realizovány. O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla tak, že cena díla je tímto dodatkem navýšena o 437.606,72 Kč bez DPH.

II. Změna smlouvy

1. V článku II. **Doba a místo plnění** se nahrazuje původní text odst. 2 tímto zněním:
 - „*Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu nejpozději do 14.09.2022. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.*
2. V článku III. **Cena díla** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

Cena díla bez DPH

76.583.386,92 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 113. schůzi Rady města Třince dne 09.05.2022 usnesením č. 2022/3669, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci


za objednatele



primátorka

V Praze

za zhotovitele

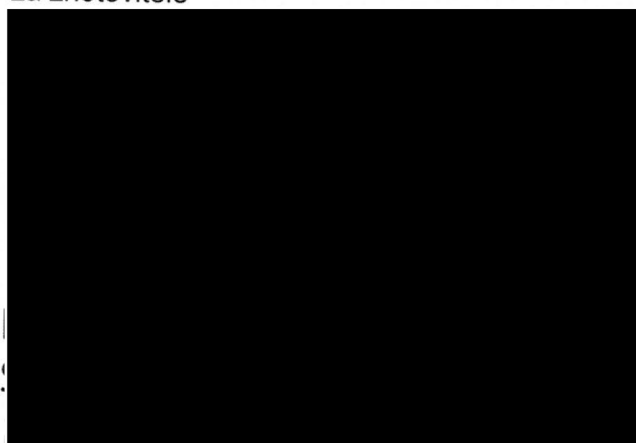

Ing. Marek Steiner
místopředseda představenstva

Přílohy:

1. Změnový list č. 2, Změnový list č. 3
2. Harmonogram prací

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	28.04.2022
Název akce:	NADJEZD ZÁVODNÍ		
Předmět změny: Předmětem změny je zastižení rozdílné skladby vrstev v příčném profilu nad NK mostu. PDPS předpokládala následující skladbu souvrství nad NK mostu: a) úsek OP1 – P8(nosníková část) -asfaltový beton tl. 80mm -litý sfalt tl. 30mm -izolace tl. 10mm -vyrovnávací asfaltový beton tl. 50 – 120mm b) úsek P8 – OP2(ŽB deska) -asfaltový beton tl. 80mm -litý asfalt tl. 30mm -izolace tl. 10mm -vyrovnávací asfaltový beton tl. min. 50mm Po odstranění svrchních vrstev asfaltového betonu bylo zjištěno, že se pod izolací nachází betonová spádová deska proměnlivé tloušťky v rozsahu celého mostu(OP1 – OP2). Byly provedené sondy v úžlabí a ose na obou typech NK. Z provedených sond vyplývá, že tloušťka desky, i vzhledem k průběhu nivelety a obrysu nosníků, je různá – od 50 mm do 190mm na nosníkové části a od 20 do 80mm na ŽB části a je nevyztužená. Předmětnou betonovou spádovou desku bude nutné odstranit v maximálním možném rozsahu tak, aby bylo možné zrealizovat novou ŽB spádovou desku s projektovanou niveletou a požadované minimální tloušťky. Odstranění v ploše bude realizované odfrézováním silniční frézou. Po odfrézování budou ručně dočištěny/odstraněny betonové části s nízkou přidržitostí k nosníkům/ŽB desce. Části ve vzdálenosti do 1,0m od vnější hrany krajních nosníků, kolem dilatačních závěrů a dalších vložených ocelových prvků budou odstraněny ručně/strojně. V průběhu odstraňování spádové desky bude probíhat geodetické sledování pro dosažení požadované úrovně odbourání. Vzhledem k závislosti následných činností na odstranění předmětné vrstvy nelze provádět práce na dalších částech mostu – ŽB deska, izolace, odvodnění, dilatační závěry, římsy, zábradlí, vozovka, atd. Předpokládán časový dopad této změny je 14 dnů.			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: -124 529,40 Kč		Cena víceprací bez DPH: 914 267,59 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 789 738,19 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 14.9.2022	
Cena dle SOD bez DPH: 76 145 780,20 Kč		Nová cena bez DPH: 76 935 518	
<u>schválil (Dodavatel):</u> Ing. Tomáš Čmiel <u>podpis:</u> 			
<u>schválil (Supervize):</u> Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D. <u>podpis:</u> 			
<u>schválil (TDS):</u> Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Twardzik <u>podpis:</u> 			
<u>schválil (AD):</u> Ing. Martin Řehulka <u>podpis:</u>			
<u>schválil (Objednatel):</u> Bc. Alexandra Lipowská <u>podpis:</u>			

Změnový list č.02

Stavba: NADJEZD ZAVODNI

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	Odstranění betonové spádové desky	914 267,59 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		914 267,59 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	Neodstranění asfaltobetonové spádové desky	- 124 529,40 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 124 529,40 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		19 Kč
-----------------------------------	--	-------

Dodavatel: Ing. Tomáš Čmíel

9.5.22

Supervize: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

9.5.2022

TDS: Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Twardzik

9.5.2022

AD: Ing. Martin Řehulka

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

9.5.2022

ZL 02

Nadjezd Závodní - SoD

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		S: NADJEZD ZÁVODNÍ				
		ZL 02: Dodatek č. 3				
		02 U: Všeobecné položky				
		0: Všeobecné konstrukce a práce				
25	SUB	02910a) OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL			789 738,19
						789 738,19
						45 000,00
						45 000,00
						45 000,00
						744 738,19
		201 U: Rekonstrukce nadjezdu v Trinci na ulici Závodní				22 721,64
		0: Všeobecné konstrukce a práce				-37 669,79
3	SUB	014122) POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T			60 391,43
5	SUB	014122a) POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) BETON	t			
						236 264,31
		1: Zemní práce				-86 859,61
11	SUB	11372) FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			97 040,60
29	SUB	113155123) Frézování betonového krytu tl. 50 mm pruh š. přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2			226 083,31
30	SUB	113155324) Frézování betonového krytu tl. 100 mm pruh š. přes 0,5 do 1 m přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2			
						242 102,13
		6: Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				242 102,13
114	SUB	628195001) Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započatím oprav ručně	m2			
						243 650,12
		9: Ostatní konstrukce a práce				85 971,99
175	SUB	96616) BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3			126 965,52
183	SUB	997211511) Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t			30 712,61
184	SUB	997211519) Přilátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t			

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 3

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Investor:

Statutární město Třinec

Datum:

28.04.2022

Název akce:

NADJEZD ZÁVODNÍ

Předmět změny:

Předmětem změny je změna délek a množství mikropilot OP1 na základě skutečně zastížených podmínek.

Zadávací dokumentace uvažovala s realizací mikropilot v 3 řadách na základě předpokládaných geologických podmínek:

zadní řada - 8ks 6,5m/5,0m

střední řada - 7ks 6,5m/5,0m

přední řada - 8ks 6,0m/5,0m (poze v případě nezastížení přední řady stávajících pilot cca 450mm)

Po demolici základu OP1 a odkopu základové spáry bylo zjištěno, že se v přední řadě nacházejí piloty 400mm - 500mm. Tyto piloty byly i v oblasti pod křídly.

Zastížený stav byl geodeticky zaměřen a tyto podklady byly zaslány na autorského dozora. Autorský dozor zpracoval návrh realizace nových mikropilot viz. příloha.

zadní řada - 5ks 6,0/5,0

střední řada - 4ks 4,0m/3,0m

Potvrzená změna rozsahu díla:

Cena méněprací bez DPH:

-352 131,47 Kč

Cena víceprací bez DPH:

0,00 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH:

-352 131,47 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

14.9.2022

Cena dle SOD bez DPH:

76 935 518,39 Kč

Nová cena bez DPH:

76 583 386,92 Kč

schválil (Dodavatel):

Ing. Tomáš Čmiel

podpis:

3.5.22

schválil (Supervize):

Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

podpis:

6.5.2022

schválil (TDS):

Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Twardzik

podpis:

15.7.2022

schválil (AD):

Ing. Martin Řehulka

podpis:**schválil (Objednatel):**

Bc. Alexandra Lipowská

podpis:

Změnový list č.03

Stavba: NADJEZD ZÁVODNÍ

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ			
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ			
		Změna délek a množství mikropilot	- 352 131,47 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH			- 352 131,47 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

Dodavatel: Ing. Tomáš Čmíel

9.5.22

Supervize: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

6.5.2022

TDS: Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Twardzik


9.5.2022

AD: Ing. Martin Řehulka

Objednatel: Bc. Alexandra Lipowská

9.5.2022

Nadjezd Závodní - SoD



[illegible]
