



Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“ ze dne 18. 2. 2020

Objednatel:

Správa služeb hlavního města Prahy

příspěvková organizace

se sídlem Kundratka 19, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 70 88 96 60

zastoupená Mgr. Tomášem Stařeckým, ředitelem
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

zastoupená Ing. Vítem Dobner, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 219173
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany, nebo jednotlivě „smluvní strana“)

uzavřely dodatek v tomto znění:

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 čl. 5) odst. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zdůvodnění dodatečně požadovaných prací ve zhotovitelem předloženém dokumentu „Ohlášení změn stavby 6“ dohodly na změnách smlouvy uvedených v tomto dodatku.

II.

- 1) Předmět smlouvy (rozsah prací) se mění podle přílohy č. 1 (Ohlášení změn stavby 6) a přílohy č. 2 (Rožpočet) tohoto dodatku.
- 2) Cena díla se mění podle přílohy č. 1 tohoto dodatku (Ohlášení změn stavby 6). Celková cena díla tak odpovídá součtu původní ceny díla včetně dodatků číslo 1, 2, 3, 4 a 5 (36 999 376,45 Kč bez DPH) a ceny dodatečně požadovaných prací (22 171,31 Kč bez DPH) a činí 37 021 547,76 Kč bez DPH.

III.


- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách a předmětu dodatku.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona a udělují svolení k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne*12.6.*..... 2022

V Praze dne 2022

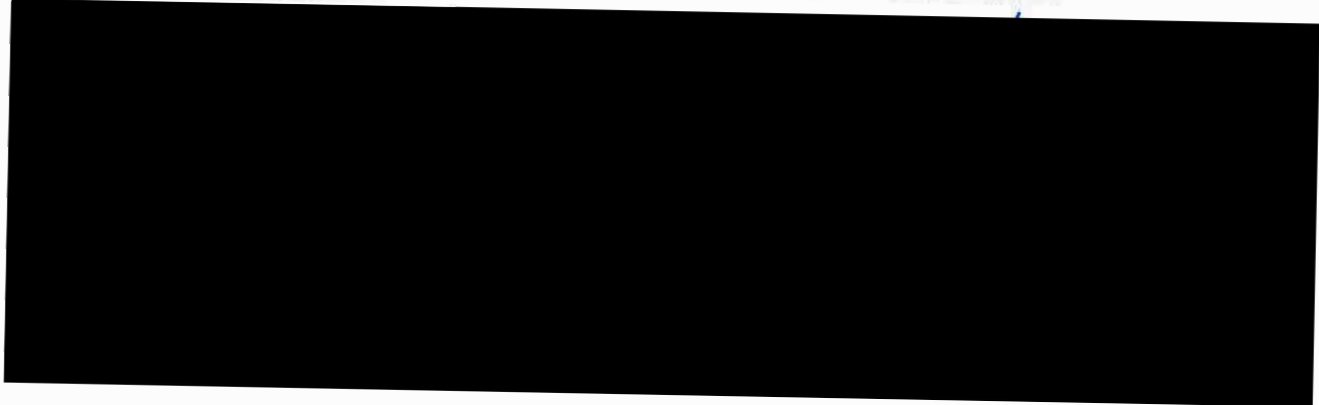

Přílohy :

1. Ohlášení změn stavby 6
2. Rozpočet

OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 6
„Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt“
ZBV 6
(Změna během výstavby)

Určeno: Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň

Číslo SoD: SoD ze dne 18. 02. 2020

Termín plnění	: 04. 04. 2022
Cena díla dle základní SOD	: 32 534 517,80 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV1	: 34 410 702,18 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV2	: 35 827 852,56 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV3	: 36 183 856,57 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV4	: 36 598 590,63 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. ZBV5	: 36 999 376,45 Kč bez DPH
Cena víceprací dle ZBV 6	: 22 171,31 Kč bez DPH

Celková cena díla včetně ZBV1, ZBV2, ZBV3, ZBV4, ZBV5 a ZBV6 : 37 021 547,76 Kč bez DPH

Zhotovitel:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ: 02414864

Oprávněná osoba

Telefonní spojení

Popis předmětu změny:

Na základě smlouvy o dílo jsou prováděny stavebně montážní práce na stavbě **Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt**. Práce jsou prováděny podle projektové dokumentace stavby zpracované společností AND spol. s r.o. a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zjištění:

1. **ZL23** Odpočet nákladů za nerealizovanou telefonní přípojku - 15 605,78 Kč bez DPH
2. **ZL24** Odpočet za jeden nerealizovaný chrlič - 1 341,78 Kč
3. **ZL25** Frézování vozovky, vodící čára - 41 118,87Kč
4. **ZL26** Odpočet nákladů za bankovní záruku – 2 000 Kč
5. **Celkem** 22 171,31Kč

ZL 23 – Odpočet nákladů za nerealizovanou telefonní přípojku

Telefonní přípojka se nerealizovala. Objekt bude napojen na veřejnou telefonní síť prostřednictvím MW spoje.

ZL 24 – Odpočet nákladů za jeden nerealizovaný chrlič

Nebyl realizován jeden chrlič ze střechy nad 2.NP z důvodu jeho nevhodného umístění nad terasou.

ZL 25 – Frézování vozovky a vodící čára

Na základě požadavku TSK bylo nutné zajistit stupňovité odfrézování stávající vozovky pro napojení odbočky do areálu. Následně byla provedena dilatační spára a nové vodorovné dopravní značení - bílá vodící čára. Jedná se o práce které nebyly zahrnuty do zadávací dokumentace, dodatečné náklady jsou stanoveny rozpočtem.



ZL 26 – Odpočet nákladů za bankovní záruku

Bankovní záruka nebyla požadována. Poplatek se odečítá z nákladů stavby.

Jedná se o nové skutečnosti, kde nutnost jejich řešení vyvstala až po zahájení stavebních prací. Zhotoviteli tyto skutečnosti v době zadávací lhůty soutěže o tuto veřejnou zakázku nebyly a ani nemohly být známy. Jedná se o nezbytné změny a neoddelitelné práce potřebné pro provedení tohoto díla.


Čeho se zhotovitel domáhá:

S odvoláním na článek IV - Práva a povinnosti zhotovitele


se zhotovitel domáhá:

V souladu s předloženým ZBV6 se zhotovitel domáhá změny rozsahu předmětu plnění díla a s tím související navýšení ceny díla podle příložených položkových rozpočtů ZL23 – ZL26 ve výši 22 171,31 Kč.

Datum a podpis oprávněné osoby dodavatele



Datum a potvrzení

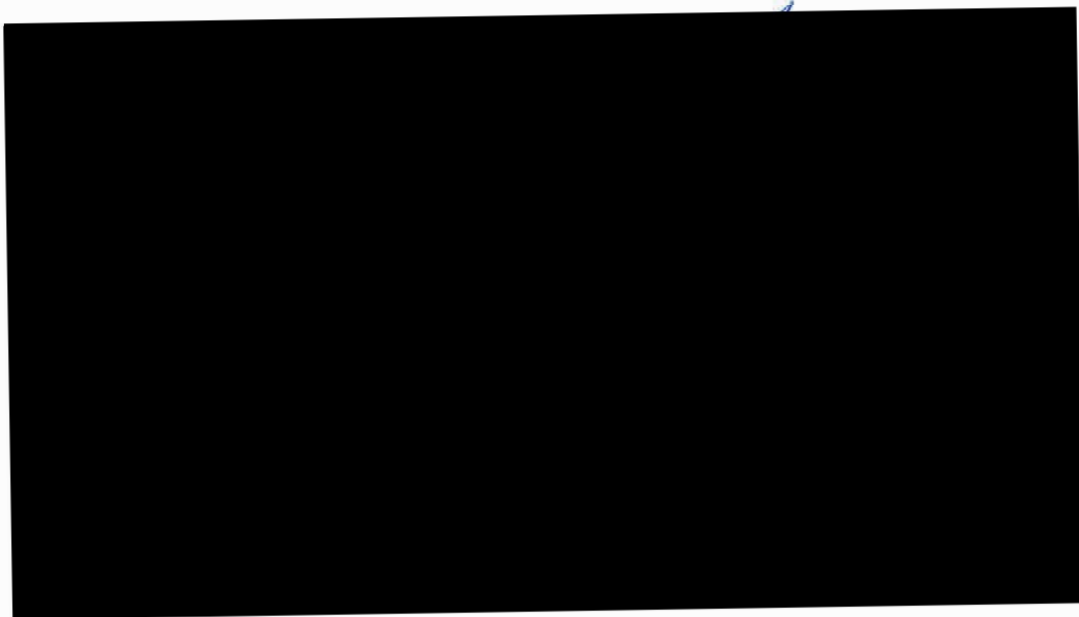

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.5 Slaboproud...	EČO	
Název části	Telefonní přípojka	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		02414864	CZ02414864
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		04 06 2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž -15 605,78	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 0,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) -15 605,78	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -15 605,78			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-15 605,78	-3 277,21
Cena s DPH			-18 882,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt						
3	Objekt: SO 02.5 Slaboproud...						
4	Část: Telefonní přípojka						
5							
6	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy						
7	Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.						
8	Místo:						
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	4300	Telefonní přípojka	0,00	-15 605,78	-15 605,78	0,000	0,000
14		Celkem	0,00	-15 605,78	-15 605,78	0,000	0,000

Zpracoval:
Datum: 4. 6. 2022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR											
2	Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt											
3	Objekt: SO 02.5 Slaboproud...											
4	Část: Telefonní přípojka											
6	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy											
7	Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.											
8	Místo: Zpracoval: Datum: 4. 6. 2022											
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13			4300	Telefonní přípojka				0,00	-15 605,78	-15 605,78		0,000
14	223	R	4301	Vytyčení trasy	m	20,000	-9,12	0,00	-182,40	-182,40	0,000	0,000
15	224	R	4302	Rýha v trávě 35/70-100	m	20,000	-269,83	0,00	-5 396,60	-5 396,60	0,000	0,000
16	225	R	4303	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	20,000	-13,92	0,00	-278,40	-278,40	0,000	0,000
17	226	R	4304	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	m	20,000	-11,97	0,00	-239,40	-239,40	0,000	0,000
18	227	R	4305	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8	m	30,000	-34,75	0,00	-1 042,50	-1 042,50	0,000	0,000
19	228	R	4306	Montáž úložných kabelů do 15 XN	ks	30,000	-15,45	0,00	-463,50	-463,50	0,000	0,000
20	229	R	4307	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	6,000	-18,89	0,00	-113,34	-113,34	0,000	0,000
21	230	R	4308	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	2,000	-259,68	0,00	-519,36	-519,36	0,000	0,000
22	231	R	4309	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	ks	1,000	-95,40	0,00	-95,40	-95,40	0,000	0,000
23	232	R	4310	Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	ks	1,000	-225,39	0,00	-225,39	-225,39	0,000	0,000
24	233	R	4311	Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	ks	6,000	-38,85	0,00	-233,10	-233,10	0,000	0,000
25	234	R	4312	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	1,000	-126,58	0,00	-126,58	-126,58	0,000	0,000
26	235	R	4313	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	2,000	-26,74	0,00	-53,48	-53,48	0,000	0,000
27	236	R	4314	Skříň rozvaděče MRK 20-QT 20p-na omítku	ks	1,000	-647,36	0,00	-647,36	-647,36	0,000	0,000
28	237	R	4315	Montáž skříň rozv.na omítku do 10 čtyř.	m	1,000	-145,76	0,00	-145,76	-145,76	0,000	0,000
29	238	R	4316	Zámek skříň 1370 L2 Praha-11342	ks	1,000	-81,18	0,00	-81,18	-81,18	0,000	0,000
30	239	R	4317	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	m	0,000	-892,03	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
31	240	R	4318	Montáž uzemnění vnitřního rozvaděče	m	1,000	-1 119,15	0,00	-1 119,15	-1 119,15	0,000	0,000
32	241	R	4319	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	ks	15,000	-35,75	0,00	-536,25	-536,25	0,000	0,000
33	242	R	4320	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	ks	1,000	-34,75	0,00	-34,75	-34,75	0,000	0,000
34	243	R	4321	Vodič propoj. s V svorkou A6 10114-A6L50	ks	1,000	-54,92	0,00	-54,92	-54,92	0,000	0,000
35	244	R	4322	Přichytka kabelu 26-32 mm 05-633-05400	ks	1,000	-108,56	0,00	-108,56	-108,56	0,000	0,000
36	245	R	4323	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	1,000	-180,68	0,00	-180,68	-180,68	0,000	0,000
37	246	R	4324	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000	-3 727,72	0,00	-3 727,72	-3 727,72	0,000	0,000
38				Celkem				0,00	-15 605,78	-15 605,78		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 02.1 Architekto...	EČO	
Název části	Odpočet Chrlíč	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel		02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž -1 341,78	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) -1 341,78	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -1 341,78

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-1 341,78	-281,77

Cena s DPH -1 623,55

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt						
3	Objekt: SO 02.1 Architekto...						
4	Část: Odpočet Chrlič						
5							
6	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy						
7	Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.					Zpracoval:	
8	Misto:					Datum: 4. 6. 2022	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	-1 341,78	-1 341,78	0,000	0,000
14	712	Povlakové krytiny	0,00	-1 341,78	-1 341,78	0,000	0,000
15		Celkem	0,00	-1 341,78	-1 341,78	0,000	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR											
2	Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt											
3	Objekt: SO 02.1 Architekto...											
4	Část: Odpočet Chrlíč											
5												
6	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy											
7	Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.											
8	Místo:											
9	Zpracoval: Datum: 4. 6. 2022											
10	Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	-1 341,78	-1 341,78		0,000
14			712	Povlakové krytiny				0,00	-1 341,78	-1 341,78		0,000
15	133	R	71299OV09	Hranatý chrlíč s PVC manžetou 50x100 mm dl. 600 mm - dodávka a montáž	kus	-1,000	1 341,78	0,00	-1 341,78	-1 341,78	0,000	0,000
16				Celkem				0,00	-1 341,78	-1 341,78		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	SO 03 Komunikace a ČTÚ	EČO	
Název části	Frezování vozovky	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol. s r.o.	02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	04.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 1 018,62	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 40 100,25	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	41 118,87	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				41 118,87
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	41 118,87	8 634,96	
Cena s DPH				49 753,83
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1	REKAPITULACE ROZPOČTU						
2	Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt						
3	Objekt: SO 03 Komunikace a ČTÚ						
4	Část: Frezování vozovky						
5							
6	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy						
7	Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.					Zpracoval:	
8	Místo:					Datum: 4. 6. 2022	
9							
10	Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	1 018,62	40 100,25	41 118,87	0,007	0,469
14	1	Zemní práce	39,42	39 776,58	39 816,00	0,000	0,469
15	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	39 000,00	39 000,00	0,000	0,000
16	VRN9	Ostatní náklady	0,00	39 000,00	39 000,00	0,000	0,000
17	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	979,20	35,70	1 014,90	0,007	0,000
18	997	Přesun sutě	0,00	287,97	287,97	0,000	0,000
19		Celkem	1 018,62	40 100,25	41 118,87	0,007	0,469

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR												
1												
2	Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt											
3	Objekt: SO 03 Komunikace a ČTÚ											
4	Část: Frezování vozovky											
5												
6	Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy											
7	Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.											
8	Místo:											
9												
10	Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
13			HSV	Práce a dodávky HSV				1 018,62	40 100,25	41 118,87		0,007
14			1	Zemní práce				39,42	39 776,58	39 816,00		0,000
15	1	221	113154112	Frezování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,100	160,00	39,42	776,58	816,00	0,000	0,000
16				17*0,3		5,100						
17			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	39 000,00	39 000,00		0,000
18			VRN9	Ostatní náklady				0,00	39 000,00	39 000,00		0,000
19	2	R	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - doprava frézy	kpl	1,000	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,000	0,000
20	3	R	091104000R2	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - doprava stříkacího stroje	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
21			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				979,20	35,70	1 014,90		0,007
22	4	221	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	17,000	59,70	979,20	35,70	1 014,90	0,000	0,007
23			997	Přesun sutě				0,00	287,97	287,97		0,000
24	41	R	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,469	40,00	0,00	18,76	18,76	0,000	0,000
25	42	R	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	4,221	16,00	0,00	67,54	67,54	0,000	0,000
26				0,469 * 9		4,221						
27	44	R	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	0,469	430,00	0,00	201,67	201,67	0,000	0,000
28				Celkem				1 018,62	40 100,25	41 118,87		0,007

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt	JKSO	
Název objektu	VON	EČO	
Název části	Bankovní záruka	Místo	
Objednatel	Správa služeb hlavního města Prahy	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	DC ENGINEERING spol. s r.o.	02414864	CZ02414864
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	10.06.2022	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -2 000,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -2 000,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH -2 000,00
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				snížená	15,0 0,00 0,00
				základní	21,0 -2 000,00 -420,00
				Cena s DPH -2 420,00	
				E	Přípočty a odpočty
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: VON

Část: Bankovní záruka

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
Ostatní	Ostatní	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,000	0,000
98X	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč - IV. etapa, Administrativní objekt

Objekt: VON

Část: Bankovní záruka

Objednatel: Správa služeb hlavního města Prahy

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10.6.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Ostatní	Ostatní				0,00	-2 000,00	-2 000,00		0,000
		BSX	Vedlejší a ostatní náklady				0,00	-2 000,00	-2 000,00		0,000
							3,00	-2 000,00	-2 000,00	3,000	3,000
			Celkem				0,00	-2 000,00	-2 000,00		0,000
