

Číslo smlouvy dle evidence objednatele: S-05/A5155/2021 (Čj.: SOAA-Smlouva/44/2022/1)  
Číslo smlouvy dle evidence zhotovitele:

## **DODATEK č. 1** **Smlouvy o dílo:**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

### **Smluvní strany:**

Obchodní jméno: Roman Behota  
Místem podnikání: Lessnerova 267, 109 00, Praha 10  
IČ: 10147675  
DIČ: CZ10147675  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Tel:  
Email:  
Kontaktní osoba:  
(dále jen „zhotovitel“)



a

### **Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze** **Organizační složka státu**

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4  
Za níž právně jedná: PhDr. Karel Koucký  
IČ: 70979391  
DIČ: nejsme plátcí DPH  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Tel:  
Email:  
Kontaktní osoba:



(dále jen „objednatel“)

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-05/A5155/2021, neboť zhotovitel není schopen ve stanovené době dokončit dílo a předat jej objednateli.

Důvodem prodlení je jednak složitá situace na trhu s komoditami a to včetně kotlů, které jsou součástí díla, a rovněž problematická komunikace se zhotovitelem, který v průběhu trvání smlouvy nereagoval na zprávy, výzvy a požadavky objednatele.

Po jednání smluvních stran, které proběhlo dne 20. 6. 2022 v Kutné Hoře v sídle Státního okresního archivu Kutná Hora, Benešova 257/33, Kutná Hora (dále jen. SOkA Kutná Hora) a současně v místě realizace díla, byla smluvními stranami dohodnuta následující změna smluvních podmínek/povinností, což smluvní strany stvrzují vlastnoručními podpisy:

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. II. odst. 4 Smlouvy tak, že nově zní takto:

*4. Dílo bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo dokončeno nejpozději **do 15. 8. 2022** včetně 15 denního zkušebního provozu celého systému (tím se rozumí 15 kalendářních dní). Teprve úspěšným ukončením 15 denního zkušebního provozu lze považovat dílo za dokončené a lze jej řádně předat a převzít (o tom bude sepsán příslušný protokol).*

2. Smluvní strany se dohodly, že se mění rovněž čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní takto:

*1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do **15. 8. 2022**.*

3. Smluvní strany se dohodly, že se mění rovněž čl. VII. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní takto:

*1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do **15. 8. 2022**.*

4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku již závazně objednal kotle značky De Dietrich Evodens Pro AMC 90 (14,1-84,2 kW), které budou dodány do 4. 7. 2022 do místa provedení díla, tedy do sídla SOkA Kutná Hora. Pro případ prodlení s dodávkou kotlů se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 100.000,- Kč, kterou je zhotovitel povinen zaplatit do 5 dní ode dne, kdy o ni bude požádán objednatelem. Zhotovitel rovněž souhlasí se zápočtem smluvní pokuty na cenu zhotovitelem provedených prací. Objednatel je v tomto případě (prodlení s dodáním nebo nedodání kotlů) rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na požadavek objednatele k úhradě případně vzniklé škody. **Přílohu č. 1** této smlouvy tvoří potvrzení zhotovitele o tom, že kotle jsou objednány a ideálně, že budou dodány ve sjednaném termínu.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je podepsán elektronicky a objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno oběma stranami podepsané vyhotovení dodatku.
3. V ostatním je Smlouva o dílo nedotčena.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1. dodatku - Doklad prokazující objednání kotlů

V Praze dne 24. 6. 2022

V Praze dne 24. 6. 2022

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze

Roman Behota

Objednatel

Zhotovitel




Příloha č. 1

Dobrý den

Přeposílám potvrzení objednávky na dodávku kotlů a technologie kotelny SoKA v Kutné Hoře.

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

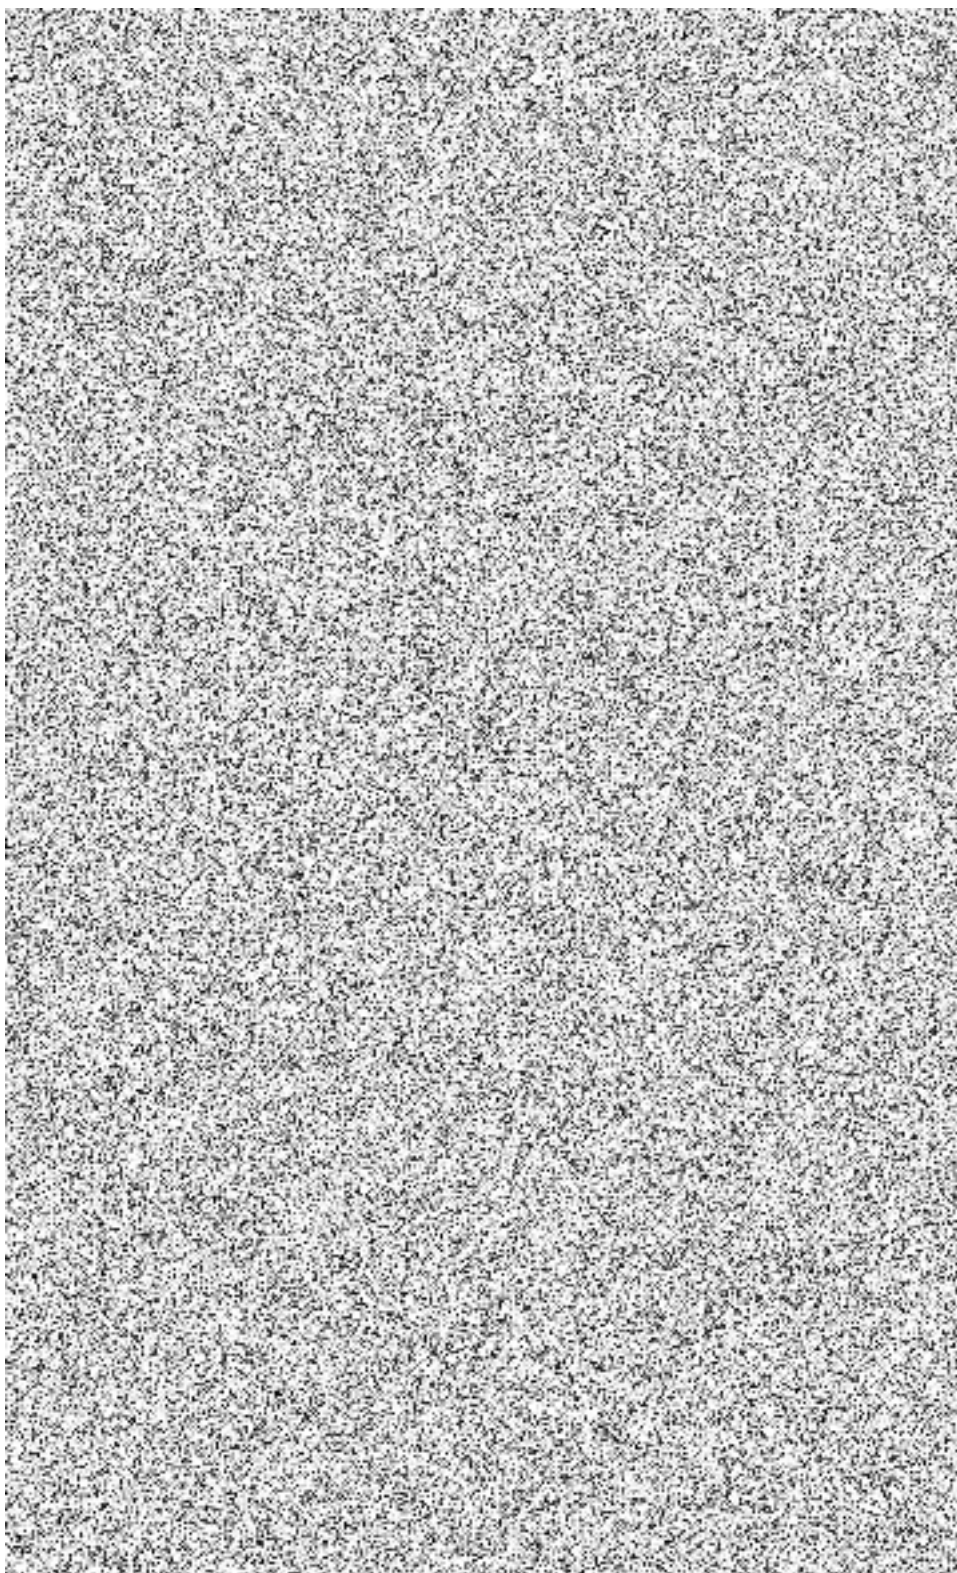

enci a

očany

