
DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

ČÍSLO S180/2021/0004/OIV

S980/2021/0003/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, místostarostou MČ Praha 2
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 27-2000758339/0800

(na straně jedné jako „Objednatel“, dále také „Zmocnitel“), za níž na základě udělené plné moci Zmocnitelem ze dne 20. 10. 2020 jedná:

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2, A.S.

Sídlo: Sokolská 1869/18, nové město, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci
IČ: 049 58 268
DIČ: CZ049 58 268
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha 2
číslo účtu: 4222138329/0800

(dále jen „zadavatel“, nebo také „Zmocněnec“)

A

Zhotovitel

DEREZA, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6
Zastoupený: Filip Záborský, jednatel
Monika Šebková, prokuristka
IČ: 480 36 315
DIČ: CZ 480 36 315
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 252961465/0300
ČS, a.s., číslo účtu 7024072/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 2. 2021, Evidenční číslo objednatele S180/2021/0004/OIV a S980/2021/0003/OIV (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „**Na Libušince 3/83 – celková rekonstrukce domu**“ se vyskytly po odkrytí skrytých konstrukcí zjištění, které nebylo možné před zahájením předvídat. Tato zjištění si vyžádali technologické změny postupu prací a použitých materiálů a řešení, mezi kterými jsou nutné technologické pauzy z důvodu vyschnutí předchozích vrstev. Změny technického řešení, posouzení/odsouhlasení a technologické pauzy nebyly v původním harmonogramu plnění prací a dodávek zohledněny. Nutnost provedení těchto změn je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) *dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat budou předmětem dalšího dodatku*

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 2.1.2. Článku II, Původní SOD. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2 Řádné ukončení a předání celého díla Zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání, včetně úplného a řádného vyklízení staveniště nejpozději do 542 kalendářních dnů od zahájení provádění díla dle čl. 2.1.1. této smlouvy,

(tj. nejpozději do 15. 8. 2022)

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1. *Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 2 strany. Tento dodatek č.1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.*

II.2. *Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje*

Příloha č. 1 – harmonogram plnění prací a dodávek BD Na Libušince_05_22

V Praze dne

Mgr. Marek Braidl
Digitálně podepsal
Mgr. Marek Braidl
Datum: 2022.06.15
07:56:45 +02'00'

za Objednatele

Mgr. Marek Braidl

Člen představenstva, na základě plné moci

Monika Šebková
Digitálně
podepsal Monika
Šebková
Datum: 2022.06.14
15:22:43 +02'00'

za Zhotovitele


Monika Šebková

prokuristka

<p style="text-align: center;">Doložka potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů</p> <p style="text-align: center;">Zveřejněno: od - do -</p> <p style="text-align: center;">Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ č. 383 ze dne 30.05. 2022</p> <p style="text-align: center;">vedoucí odboru majetku a investic</p> <p>Ing. Petr Grametbauer Digitálně podepsal Ing. Petr Grametbauer Datum: 2022.06.14 15:08:06 +02'00'</p> <p style="text-align: center;">..... podpis</p> <p>Nehodící se škrtněte</p>

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan Bureš
Digitálně podepsal Jan Bureš
Datum: 2022.06.13
18:22:56 +02'00'

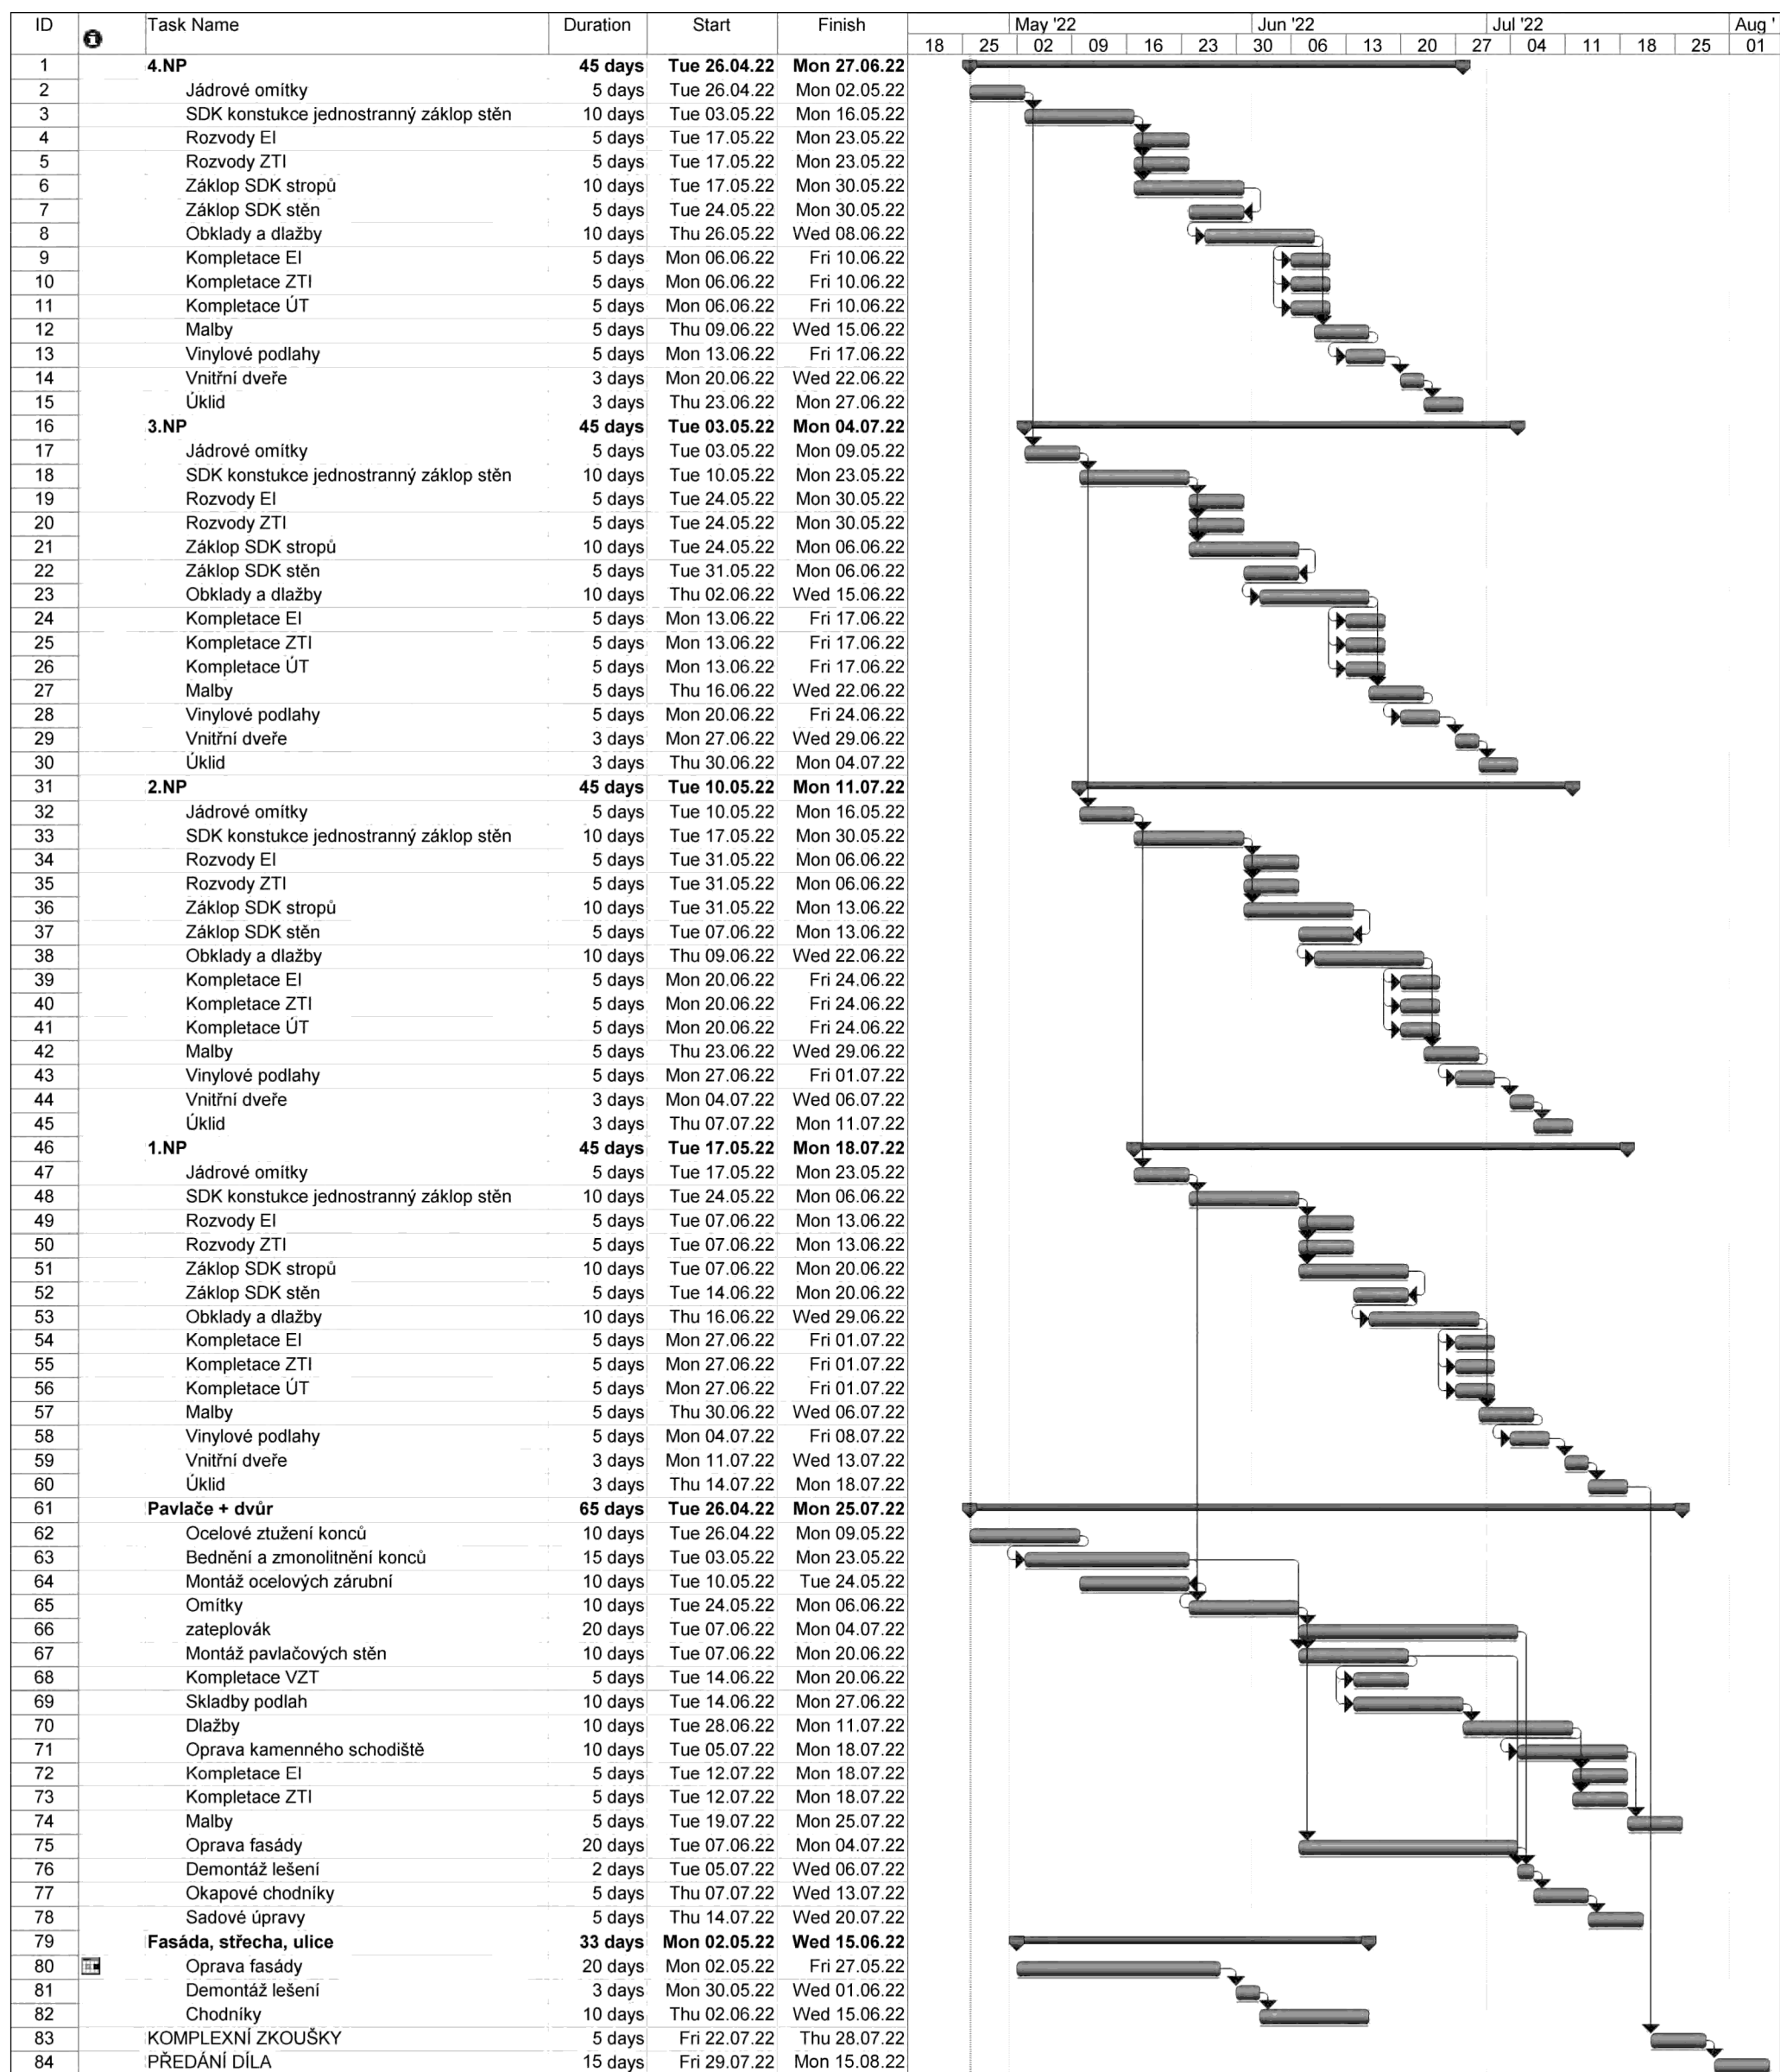

Project: Project1
Date:

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	
