

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000

IČ: 466 78 468

DIČ: CZ46678468

jednající: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.2.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/007 – OD (dále jen „**Dodatek č.3**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 25.2.2021, 001/OVZ/21/007 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**FN Ostrava - rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v 1. NP a 2. NP objektu Vyšetřovacího komplementu**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava

předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu pro dokončení díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací, méněprací a změny termínu dokončení díla se dosavadní ustanovení článku **V. Cena a platební podmínky, odstavce 1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:

aa.	Celková cena bez DPH	84.015.078,55 Kč
ab.	DPH ve výši	17.643.166,50 Kč
ac.	Celková cena celkem vč. DPH	101.658.245,05 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méně prací, navýšení ceny o 3.733.310,55 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 2.142.400,59 Kč bez DPH je zaznamenáno ve Oznámení o změně akce č. 13 – č. 41, č. 43, č. 44, č. 46 – č. 49, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Dále se Smluvní strany dohodly na změně tabulky uvedené v **článku III. Termín plnění** Smlouvy, která se mění následovně:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 10 pracovních dnů ode dne určeného v písemné výzvě objednatele (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)
Termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky:	bezprostředně od předání staveniště
<u>Termín pro dokončení, předání a převzetí díla:</u>	<u>předání díla k řádnému užívání do max. 17. měsíců od předání staveniště</u>

5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně dosavadní Přílohy č.2 Smlouvy – Časový harmonogram výstavby s vyznačením uzlových bodů (milníky, uzly), která se nahrazuje v plném rozsahu novou přílohou označenou rovněž jako Příloha č.2, která je současně přílohou č. 2 tohoto Dodatku č.3 (dále jen „**Příloha č.2**“)
6. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 3 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 3 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Oznámení o změně akce č. 13 – č. 41, č. 43, č. 44, č. 46 – č. 49 a Příloha č. 2 – Časový Harmonogram.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.3 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Oznámení o změně akce č. 13 – č. 41, č. 43, č. 44, č. 46 – č. 49

Příloha č. 2 – Časový harmonogram

V Ostravě dne _____

V Praze dne _____

Objednatel
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava


Oznámení o změnách akce č 13.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Provedení prostupů a stavebních úprav pro rozvody UT, VZT a EL, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Při realizaci stavby bylo nutno změnit trasu UT pro VZT, která byla vyvolaná z důvodu malého prostoru stávajících šachet, ve kterých nebylo možné provést montáž potrubí. Ve spolupráci TDI a AD byla určena náhradní trasa pro montáž potrubí. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, VZT a Chlazení, ZTI+UT, elektroinstalace</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	119 517,83 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	119 517,83 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	25 098,74 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	144 616,57 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

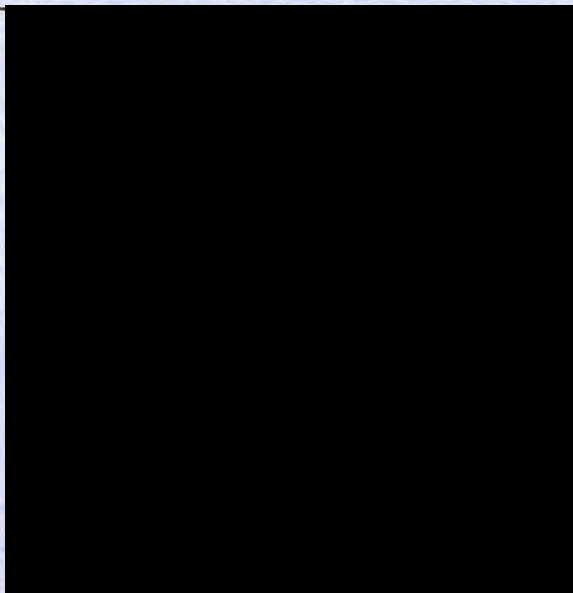

Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 13, Příloha č. 2 - výkresy dotčených kcí

Oznámení o změnách akce č 14.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[Redacted]	
Navrhované změny akce	
Demontáž a montáž FeAl podhledu v 2.PP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Demontáž a montáž FeAl podhledu ve 2.PP – v tomto prostoru se předpokládalo dle PD provádět montáže instalací (elektroinstalace) a ve výkazu výměr nebylo uvažováno s položkami, které se týkají úprav na podhledech. V tomto ZL jsou tedy uvedené položky týkající se stavebních přípomocí. Změny se dotýkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	45 426,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	45 426,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	9 539,46 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	54 965,46 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[Redacted]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:




Ing. Petr Slezáček

Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 14

Oznámení o změnách akce č 15.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplexu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Nástavba k horním skřínkám kuchyňky T27, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se doplnění horních skříněk v m.č. A 211 - dodatečný požadavek uživatele a objednatele. Rozsah je patrný z příložené dílenské dokumentace. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	18 516,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	18 516,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 888,36 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	22 404,36 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 15, Příloha č. 2 - dílenské dokumentace horních skříněk

Oznámení o změnách akce č 16.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
výhřevná komora pro armatury chlazení, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o výhřevnou komoru pro armatury chlazení a zřízení zásuvky pro topný kabel. Změna je vyvolaná zástupcem objednatele (údržba) pro zajištění funkčnosti chlazení v zimních měsících. Princip řešení je patrný dle přiloženého náčrtu. Změny se týkají těchto částí – VZT a Chlazení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	55 717,99,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	55 717,99,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	11 700,78,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	67 418,77 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 16, Příloha č. 2 - nákres

Oznámení o změnách akce č 17.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
VCP a MNP VZT - odpočet prvku Z57 a náhrada za podpěry, dmtž potrubí ve 2NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Vícepráce a méněpráce pro VZT konstrukce – jedná se o záměnu prvku Z57 za nastavitelné podpěry pro VZT jednotky v 6.NP. Dále je řešena demontáž potrubí ve 2NP, které nebylo součástí projektové dokumentace – toto potrubí bylo odhaleno po demontáži stávajícího pohledu.</p> <p>Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, Chlazení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-70 543,20 Kč	24 573,45 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-45 969,75 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	- 9 653,65 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-55 623,40 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 17



Oznámení o změnách akce č 18.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Náhrada kazetového podhledu v místnosti A221, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o náhradu kazetové podhledu v m.č. A221 za plný SDK podhled doplněný o kastlíky pro zakrytí rozvodů a konstrukcí. Záměnu bylo nutno provést z důvodu velkého počtu křížení nových instalací VZT a chladu v předmětné místnosti. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-16 096,63- Kč	10 586,79 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-5 509,84 Kč
Výsledná celková cena změny DPH	
	-1 157,07 Kč
Výsledná celková cena změny vč. DPH	
	-6 666,91 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKOVANÉ]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 18



Oznámení o změnách akce č 19.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplexu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
VZT - 1ks filtračního nádstavce navíc, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Ve 2.NP dle výkresové části PD (VZT) je uvažováno s 15ks nástavců s položkou 71.9. Ve VV je jich vykázáno 14ks. Chybějící kus nebyl tedy součástí smluvního rozpočtu. Změny se týkají těchto částí – VZT a Chlazení.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	14 306,79,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	14 306,79 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 004,43 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	17 311,22 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 19



Oznámení o změnách akce č 20.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
T51 - dveře k OS dospívání, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o 1ks protipožárních dveří dřevěných s DTD, vnitřních hladkých kouřotěsných včetně ocelové zárubně - dodáno nad rámec PD. Projektová dokumentace předpokládala zachování stávajících dveří. Před zahájením realizace bylo s ohledem na stav těchto dveří rozhodnuto o jejich výměně.</p> <p>Změny se týkají těchto části - Architektonicko-stavební řešení</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	52 107,36,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	52 107,36 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	10 942,55 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	63 049,91 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 20, Příloha č. 2 – výpis prvků



Oznámení o změnách akce č 21.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Úpravy spodních skříněk u kuchyňské linky m.č. 211, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na dodatečný požadavek objednatele na změnu typu dezinfekční myčky bylo nutno upravit spodní skřínky kuchyňské linky v místnosti č. 211. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	15 500,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	15 500,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	3 255,-Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	18 755,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 21

Oznámení o změnách akce č 22.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Doplnění ochranných prvků, m.č. B 230, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o doplnění ochranných pásků a rohů v m.č. B230, které nebyly součástí VV - dodatečný požadavek uživatele a objednatele. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.	
Cena méněprací bez DPH:	
0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:
	29 443,36 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	29 443,36 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 183,11Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	35 626,47 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 22



Oznámení o změnách akce č 23.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Přízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Příčka v místnosti B127 a 129, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na nestabilitu stávající zděné příčky v místnosti B127 a 129 bylo rozhodnuto o demontáži této příčky a nahrazení za SDK příčku. Dále bylo nutno v této příčce provést výztuhy pro uchycení kuchyňské linky. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	46 084,93 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	46 084,93 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	9 677,84 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	55 762,77 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 23, Příloha č. 2 - výkresy s vyznačenými změnami

Oznámení o změnách akce č 24.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Odpočet nerealizovaných položek a režijní náklady	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Vzhledem k prodloužení dodávky nemocničního vybavení objednatele (vazba na stavební kompletaci jednotlivých řemesel) a dále s ohledem na časové omezení zhotovitele při realizaci díla z důvodu provozu nemocnice, vznikly zhotoviteli náklady spojené s vlastními režiiemi a provozem zařízení staveniště. Tyto vícenáklady byly vyčísleny na dobu 3 měsíců dle schváleného harmonogramu prací. Dále je v tomto ZL řešen odpočet nerealizovaných položek - odpočet položky ostatních nákladů staveb a přípočet položek souvisejících s úpravou podlah dle požadavku objednatele a technických listů pro podlahové krytiny.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-1 500 000,- Kč	1 040 591,50 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-459 408,50 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-96 475,79 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-555 884,29 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č.1 - rozpočet ZL 24



Oznámení o změnách akce č 25.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Doplnění přívodu elektro pro venkovní žaluzie, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o doplnění přívodu pro venkovní žaluzie, který nebyl součástí VV a rozpočtu. Změny se týkají těchto částí - Silnoproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	
0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:
	21 960,64 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	21 960,64 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	4 611,73 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	26 572,37 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 25

Oznámení o změnách akce č 26.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Úpravy dveří u skladu léků A214, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o úpravy dveří do místnosti č. A214 a B230 dle požadavku uživatele a objednatele. Jedná se o následující změny:</p> <ul style="list-style-type: none">- úprava dveří T12 z místnosti A212 do místnost A214 (nové označení dveří T49) a to v rozsahu přidání elektromechanického zámku ABLOY, kabelu s konektorem 10 m, ocelové průchodky, protiplechu, děleného čtyřhranu a dalších pomocných prací.- dále je řešená D+M 1ks protipožárních dveří dřevěných dveří s DTD vnitřních hladkých kouřotěsných včetně ocelové zárubně (T50) - m.č. B230- přidání čtečky vč kabelových rozvodů. <p>Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-14 036,75 Kč	138 036,97 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	124 000,22 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	26 040,05 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	150 040,26 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 26



Oznámení o změnách akce č 27.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava -Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Úprava pozice vnitřní klimatizační jednotky, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o úpravu pozice vnitřní klimatizační jednotky z důvodu kolize s interiérem- posun jednotky ve skladu léků 2NP - požadavek uživatele a objednatele. Změny se týkají těchto částí – VZT a Chlazení.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	33 654,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	33 654,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	7 067,34 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	40 721,34 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 27



Oznámení o změnách akce č 28.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Čerpadlo pro odvod kondenzátu – 2ks, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o dodání 2ks čerpadel ke klimatizačním jednotkám. Při realizaci nebylo možno dodržet minimální spád na potrubí odvodu kondenzátu a bylo tedy nutné doplnit čerpadla nad rámec projektové dokumentace. Změny se týkají těchto částí – VZT a Chlazení.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	7 300,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	7 300,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 533,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	8 833,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 28



Oznámení o změnách akce č 29.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Montáž sanitárních prvků a doplňků ve 2.NP, odpočet skříněk T29 - T40, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>V tomto ZL je řešena montáž sanitárních prvků a doplňků ve 2.NP – TV držáky, dávkovače mýdla a desinfekce, box na toaletní papír, box na papírové ručníky, čističky vzduchu, pořadače na dokumentaci, držáky rukavic a plášťů. Jedná se o dodatečný požadavek uživatele a objednatele z důvodu dodržení souladu s montážními listy SDK konstrukcí.</p> <p>Dále je řešen odpočet vestavěných skříní v 1NP s ozn. T29 - T40 dle požadavku objednatele.</p> <p>Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-351 999,41 Kč	28 337,80 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-323 661,61 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	-67 968,94 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	-391 630,55 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 29

Oznámení o změnách akce č 30.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Stavební úpravy na chodbě v 1.NP č. m. A157, A158, B156, B157, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o provedení povrchových úprav v chodbě 1.NP v m.č. A157, A158, B156 a B157 z důvodu nesoudržného podkladu po provedení bouracích prací. Dále je řešena výměna poškozené stávající podlahové krytiny. Vše dle požadavků uživatele a objednatele.</p> <p>Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení,</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	449 403,12 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	449 403,12 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	94 374,66 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	543 777,78 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 30

Oznámení o změnách akce č 31.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[Redacted]	
Navrhované změny akce	
ZTI - potrubí stoupačky č.19, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o vícepráce ZTI potrubí vedené ve stoupačce č. 19, které nebyly součástí VV a rozpočtu – odhaleno v průběhu bouracích prací. Změny se týkají těchto částí – ZTI + UT.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	42 785,61 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	42 785,61 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 984,98 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	51 770,58 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[Redacted]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 31

Oznámení o změnách akce č 32.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Revize PD v 1.NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se úpravu dispozičního řešení a úpravu tras řemesel a technologií v 1.NP dle dodatečného požadavku uživatele a objednatele. Projektant na tyto práce vypracoval změnovou dokumentaci včetně výkazu výměr. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Silnoproudá elektrotechnika, Slaboproudá elektrotechnika, VZT + chlazení.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-58 652,07,- Kč	810 861,45,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	752 209,38 Kč
Výsledná celková cena změny DPH	
	157 963,97 Kč
Výsledná celková cena změny vč. DPH	
	910 173,36 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 32, Příloha č. 2 - výkresy dle příloženého seznamu PD

Rekapitulace investičních nákladů:

Investor

Fakultní nemocnice Ostrava

ZL 32

Akce

**Rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v 1.NP a 2.NP objektu
Vyšetřovacího komplementu**

Stupeň

Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

		Cena	
		Kč bez DPH	
OBJEKT VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		
SO 01 VON	Vedlejší a ostatní náklady		0
VON celkem			0
OBJEKT SO 01	Rekonstrukce ORIM 1, 2		
D.1.01 Arytmologické sály	D.1.01.1	Architektonicko-stavební řešení	204 095
	D.1.01.2	Konstrukční řešení - viz D1.01	
	D.1.01.3	Požárně bezpečnostní řešení - viz D1.01	
	D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	258 369
	D.1.01.4b	Vytápění	26 286
	D.1.01.4c	Sílnoproudá elektrotechnika	137 115
	D.1.01.4d	Slaboproudé elektroinstalace	106 590
	D.1.01.4e	Rozvody medicinálních plynů	0
	D.1.01.4f	Vzduchotechnika	19 754
	D.1.01.4g	Měření a regulace	0
	D.1.01.4h	EPS	0
	D.1.01.4i	Potrubní pošta	0
D.1.01.4j	Chlazení	0	
Stavební objekt SO 01 celkem			752 209,38
Stavební objekt, vedlejší a ostatní náklady celkem:			752 209
CELKEM ZA AKCI (bez DPH)			752 209
DPH 21%			157 963,97
CELKEM ZA AKCI (vč. DPH)			910 173,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 64 FN Ostrava ORIM

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			84 707,26
PSV			119 387,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			204 094,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		204 094,60 CZK
Základní DPH	21 %		42 859,87 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

246 954,47 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D1	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1 NP a 2NP objektu	0,00	204 094,60	42 859,87	246 954,47	100
R017a	Změnový rozpočet č. R17 - méněpráce	0,00	-28 657,72	-6 018,12	-34 675,84	-14
R017b	Změnový rozpočet č. R17 - vícepráce	0,00	232 752,32	48 877,99	281 630,31	114
Celkem za stavbu		0,00	204 094,60	42 859,87	246 954,47	100

Popis stavby: 64 - FN Ostrava ORIM

Popis objektu: D1 - Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1 NP a 2NP objektu vyšetřovacího komplementu

Popis rozpočtu: R017a - Změnový rozpočet č. R17 - méněpráce

Popis rozpočtu: R017b - Změnový rozpočet č. R17 - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 456,18	1
31	Překlady	HSV			10 554,86	5
34	Stěny a příčky	HSV			17 338,53	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 653,87	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 055,62	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 563,44	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			340,68	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			15 905,78	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			103 481,56	51
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			30 744,08	15
Cena celkem					204 094,60	100

Oznámení o změnách akce č 33.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Nátěr potrubí UT, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o nátěr stávajícího potrubí UT - dle dodatečného požadavku uživatele a objednatele. Tyto práce nebyly součástí PD. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení, ZTI+ UT.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,-Kč	7 800,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	7 800,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 638 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	9 438,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 33



Oznámení o změnách akce č 34.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Elektroinstalace - dozbrojení rozvaděče ve 2.PP, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o dozbrojení rozvaděče ve 2.PP (místnost BO 203) z důvodu zajištění provozu 2.NP při rekonstrukci 1.NP - dodatečný požadavek údržby a objednatele. Změny se týkají těchto částí - Silnoproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	112 730,26 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	112 730,26 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	23 673,35 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	136 403,61 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 34



Oznámení o změnách akce č 35.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Krabice do všech protipožárních stěn a předstěn ve 2.NP, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o dodávku a montáž krabic do všech protipožárních stěn a předstěn ve 2.NP – tyto nebyly součástí VV. Původní nepožární krabice se odečítají. Provedeno dle požadavku PBR.</p> <p>Změny se týkají těchto částí - Silnoproudá elektrotechnika</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-8 324,80 Kč	52 417,23 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	44 092,43 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	9 259,41 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	53 351,84 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 35



Oznámení o změnách akce č 36.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Napájení požárních klapek, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o napájení požárních klapek ve 2.NP, které nebyly součástí VV. Změny se týkají těchto částí - Slaboproudá elektrotechnika.	
	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	41 902,45 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	41 902,45 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	8 799,51 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	50 701,96 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 36



Oznámení o změnách akce č 37.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[Redacted]	
Navrhované změny akce	
Elektroinstalace - Doplnění zásuvek evidence pacienta, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o doplnění rozvodu a zařízení pro komunikační zařízení (sestra-pacient) - dospávací pokoje - dodatečný požadavek uživatele a objednatele. Změny se týkají těchto částí – Slaboproudá a silnoproudá elektrotechnika	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	191 518,78 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	191 518,78 Kč
Výsledná celková cena změny DPH	
	40 218,94 Kč
Výsledná celková cena změny vč. DPH	
	231 737,72 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 37



Oznámení o změnách akce č 38.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Úprava vedení VZT tras ve strojovně VZT v 6.NP, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>S ohledem na kolize se stávajícími rozvody ve strojovně VZT v 6.NP bylo nutno upravit trasy vedení oproti předpokladu z PD. Změny se týkají těchto částí – VZT a chlazení, silnoproudá elektroinstalace</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	36 497,06,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	36 497,06,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	7 664,38 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	44 161,44 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 38



Oznámení o změnách akce č 39.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Změna instalací z důvodu koordinace s interiérem, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Při montáži interiéru vyplynula nutnost změn některých koncových prvků dodávaných stavbou. Tyto práce jsou řešeny v tomto ZL.</p> <p>Změny se týkají těchto částí - Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika.</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	7 147,06 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	7 147,06,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	1 500,88,- Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	8 647,94 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 39



Oznámení o změnách akce č 40.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Telefony - nové trasy, nerealizované položky SLP, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Dle požadavků zástupců FNO – IT oddělení a objednatele bylo požadováno doplnit novou trasu pro telefonní rozvody. Dále bylo dohodnuto provést dílčí redukce slaboproudu (telefonní rozvody) oproti zpracované PD. Změny se týkají těchto částí - Slaboproudá elektrotechnika</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-104 433,91,- Kč	54 275,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	-50 158,91- Kč
Výsledná celková cena změny DPH	
	-10 533,37 Kč
Výsledná celková cena změny vč. DPH	
	-60 692,28 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 40



Oznámení o změnách akce č 41.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Doplnění rozvodů pro požární klapku v 1.NP, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o zřízení rozvodů požární klapky v 1.NP, které nebyly součástí VV a rozpočtu. Změny se týkají těchto částí - Silnoproudá elektrotechnika.	
Cena méněprací bez DPH:	
0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:
	9 453,33 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	9 453,33 Kč
Výsledná celková cena změny DPH	
	1 985,20 Kč
Výsledná celková cena změny vč. DPH	
	11 438,53 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 41

Oznámení o změnách akce č 43.



Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Přeložky potrubí u rozvaděče, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Na základě požadavku objednatele byly provedené přeložky potrubí nad rozvaděči (B 205 a B 203) z důvodu bezpečnosti v místnosti elektrorozvodny. Změny se týkají těchto částí – ZTI+UT.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	13 613,44 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	13 613,44 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 858,82 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	16 472,26 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 43



Oznámení o změnách akce č 44.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Výměna vodovodního potrubí, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Z důvodu zachování funkčnosti vodovodního potrubí bylo nutno provést výměnu potrubí v m.č.B 205 nad rámeček smluvní PD. Změny se týkají těchto částí – ZTI+UT.	
Cena méněprací bez DPH:	
0,- Kč	Cena víceprací bez DPH:
	30 104,14 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	30 104,14 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	6 321,87 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	36 426,01 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 44



Oznámení o změnách akce č 46.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKOVANÉ]	
Navrhované změny akce	
Přeložka rozvodu topení, SO 01 D.1.01.4	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o m.č. B 139 - přeložka rozvodu topení z důvodu nového dispozičního řešení v 1.NP dle požadavku uživatele a objednatele. Změny se týkají těchto částí – ZTI+UT	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	10 224,20 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	10, 224,20 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	2 147,08 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	12 371,28 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 46

Oznámení o změnách akce č 47.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Osazení a zapravení prvků dialýzy do příček ve 2.NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
Jedná se o osazení prvků dialýzy do příček 2NP - dodatečný požadavek objednatele (dodané dialyzační panely FNO byly pro povrchovou montáž). Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení.	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	54 720,- Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	54 720,- Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	11 491,20 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	66 211,20 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
[REDAKCE]	



Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 47


Oznámení o změnách akce č 48.

Identifikační údaje akce	
Název	Rekonstrukce jednotky ORIM 1,2 v 1.NP a 2.NP objektu vyšetřovacího komplementu
SOD ev.č. 001/OVZ/21/007/OD	
Objednatel:	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
Zhotovitel	
Název	Hochtief CZ a.s.
Adresa	Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
Oznámení vystavil:	
[REDAKCE]	
Navrhované změny akce	
Vytvoření dělicích stěn od provozu v 1.NP, SO 01 D.1.01.1	
Zdůvodnění navrhovaných změn	
<p>Jedná se o vytvoření provizorních dělicích příček v 1NP mezi stavbou a provozem nemocnice z důvodu zachování chodu operačního sálu č. 17 a chodby FNO dle požadavků objednatele. Toto nebylo součástí VV. Změny se týkají těchto částí - Architektonicko-stavební řešení</p>	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	106 196,01 Kč
Výsledná cena změn bez DPH:	
	106 196,01 Kč
	Výsledná celková cena změny DPH
	22 301,16 Kč
	Výsledná celková cena změny vč. DPH
	128 497,17 Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:

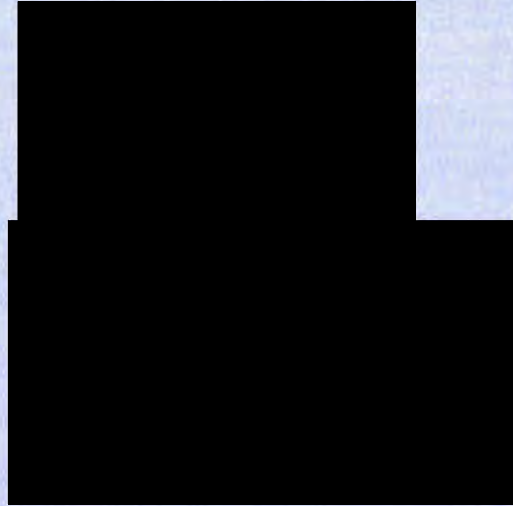

Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:


Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:





Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 48

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum:



Datum:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Stanovisko TDI:

Datum:

Podpis TDI:



Stanovisko projektanta stavby:

Datum:

Podpis projektanta stavby:



Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 - rozpočet ZL 49
