

## Změnový list č.4 - oznámení změny

<b>Název stavby:</b>	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
<b>Zhotovitel</b>	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
<b>Technický dozor:</b>	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
<b>Autorský dozor:</b>	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

### Základní popis a zdůvodnění změny:

#### Úprava výtlaku (požadavky p. Koďouska)

Dle PD byl navržena trasa výtlaku na pozemku č.p. 4556/1. Majitel pozemku nedal povolení ke vstupu, trasa bude vymístěna ze soukromého pozemku do pozemku obecního, které je součástí stavebního povolení.

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

### Přílohy ke změně

Příloha č. 1	Položkový rozpočet (odhad)		

<b>Za zhotovitele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za projektanta:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za objednatele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	

Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

## Změnový list č.4 - potvrzení změny





<b>Název stavby:</b>	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
<b>Zhotovitel</b>	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice
<b>Technický dozor:</b>	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
<b>Autorský dozor:</b>	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

<b>Změna ceny stavby:</b>		
Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů:		
<b>Cena dle SoD původní:</b>		<b>34 589 763,65</b>
<b>Více práce celkem</b>	<b>Méně práce celkem</b>	<b>Cena změny celkem</b>
<b>58 458,87</b>		<b>58 458,87</b>
<b>Cena dle SoD včetně předchozích změn:</b>		<b>35 586 318,37</b>
<b>Cena dle SoD včetně všech změn:</b>		<b>35 644 777,24</b>

<b>Změna doby plnění:</b>
Změna nemá vliv na termín dokončení stavby

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Přílohy ke změně</b>			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet		

<b>Za zhotovitele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za projektanta:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za objednatele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	

Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí



## Rozpočet více-méně prací

stavba: **Odkanalizování částí města Haviřova IV.etapa P5 - lokalita Důlnák**

kód položky	popis	MJ	množství	cena	celkem
<b>Úprava výtlačku (požadavky p. Kodřouska)</b>					
<b>Vícepráce</b>					
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,000	24,10	361,50
132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně	m <sup>3</sup>	11,200	240,00	2 688,00
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na c	m <sup>3</sup>	11,200	259,00	2 900,80
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na c	m <sup>3</sup>	168,000	19,80	3 326,40
167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo s	m <sup>3</sup>	11,200	44,60	499,52
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce	t	20,160	140,00	2 822,40
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkop	m <sup>3</sup>	7,200	127,00	914,40
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelno	m <sup>3</sup>	4,000	188,00	752,00
58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	6,800	347,00	2 359,60
181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklon	m <sup>2</sup>	15,000	74,90	1 123,50
181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 100	m <sup>2</sup>	15,000	18,70	280,50
00572410	osivo směs travní parková	kg	0,450	93,00	41,85
181951111	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině	m <sup>2</sup>	15,000	13,40	201,00
211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber na	m <sup>2</sup>	198,000	26,80	5 306,40
69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v t	m <sup>2</sup>	217,800	15,00	3 267,00
212752401	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikac	m	110,000	250,00	27 500,00
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 s	m	10,000	122,00	1 220,00
28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 RC SDR11 návin se signa	m	10,000	140,00	1 400,00
877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyet	kus	2,000	248,00	496,00
28614841	koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	274,00	548,00
<b>23-M</b>	<b>Montáže potrubí</b>				
230170013	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125	m	10,000	45,00	450,00
<b>Celkem</b>					<b>58 458,87</b>
<b>Vícepráce - celkem</b>					<b>58 458,87</b>
<b>Méněpráce - celkem</b>					<b>0,00</b>
<b>Celkem</b>					<b>58 458,87</b>

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD

## Změnový list č.5 - oznámení změny

Název stavby:	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
Číslo veřejné zakázky:	
Číslo smlouvy:	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice
Technický dozor:	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
Autorský dozor:	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

### Základní popis a zdůvodnění změny:





#### Realizace 5 ks neveřejných částí kanalizačních přípojek

Dle projektové dokumentace byl dán rozsah domovních přípojek. Od doby zpracování projektové dokumentace byly vybudovány nové rodinné domy, tyto přípojky byly provedeny nad rámec projektové dokumentace.

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

### Přílohy ke změně

Příloha č. 1	Položkový rozpočet (odhad)		

<b>Za zhotovitele:</b> datum: 16.06.2022 podpis: 	<b>Za projektanta:</b> datum: 16.06.2022 podpis: 
<b>Za TDS:</b> datum: 16.06.2022 podpis: 	<b>Za objednatele:</b> datum: 16.06.2022 podpis: 

Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí



## Změnový list č.5 - potvrzení změny





Název stavby:	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
Číslo veřejné zakázky:	
Číslo smlouvy:	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
Zhotovitel	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice
Technický dozor:	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
Autorský dozor:	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

<b>Změna ceny stavby:</b>		
Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů:		
Cena dle SoD původní:		34 589 763,65
Více práce celkem	Méně práce celkem	Cena změny celkem
808 502,70	0,00	808 502,70
Cena dle SoD včetně předchozích změn:		35 644 777,24
Cena dle SoD včetně všech změn:		36 453 279,94

<b>Změna doby plnění:</b>
Změna nemá vliv na termín dokončení stavby

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Přílohy ke změně</b>			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet		

<b>Za zhotovitele:</b>	datum:	podpis:	<b>Za projektanta:</b>	datum:	podpis:
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	datum:	podpis:	<b>Za objednatele:</b>	datum:	podpis:
	16.06.2022			16.06.2022	

Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

## Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování částí města Havířova IV.etapa P5 - lokalita Důlnák

kód položky	popis	MJ	množství	cena	celkem
<b>Realizace 5 ks neveřejných částí kanalizačních přípojek</b>					
<b>(P15 - 36,05 m, P19a - 8,61 m, P24 - 54,83 m, P32 - 15,00 m, P51 - 45,21 m)</b>					
<b><u>Vícepráce</u></b>					
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				
132212211	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených	m3	73,462	1 020,00	74 931,24
132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strc	m3	293,848	300,00	88 154,40
151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příl	m2	734,620	197,00	144 720,14
151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní veden	m2	734,620	99,20	72 874,30
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na c	m3	183,655	259,00	47 566,65
162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na c	m3	2 754,825	19,80	54 545,54
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládk	t	312,214	140,00	43 709,89
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkoj	m3	257,117	127,00	32 653,86
58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	437,099	300,00	131 129,67
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelni	m3	110,193	188,00	20 716,28
58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	187,328	300,00	56 198,43
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sl	m	159,700	209,00	33 377,30
877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvr	kus	5,000	364,00	1 820,00
28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	5,000	983,00	4 915,00
877315231	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvr	kus	5,000	216,00	1 080,00
28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 150	kus	5,000	22,00	110,00
<b>Celkem</b>					<b>808 502,70</b>
<b>Vícepráce - celkem</b>					<b>808 502,70</b>
<b>Méněpráce - celkem</b>					<b>0,00</b>
<b><u>Celkem</u></b>					<b><u>808 502,70</u></b>

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD

## Změnový list č.6 - oznámení změny

<b>Název stavby:</b>	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
<b>Zhotovitel</b>	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice
<b>Technický dozor:</b>	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
<b>Autorský dozor:</b>	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

### Základní popis a zdůvodnění změny:





#### Více-méně práce finálních ploch živič

Během realizace kanalizace dochází k poruše a následným výmolům na stávající komunikaci mimo stavební rýhu. Tyto poruchy jsou způsobeny pojezdem těžké stavební techniky, kdy komunikace není uzpůsobená takovému provozu. Projektová dokumentace počítala s dostatečnou skladbou komunikace. Po dokončení kanalizace bude třeba provést obnovu komunikací do funkčního stavu.

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

### Přílohy ke změně

Příloha č. 1	Položkový rozpočet (odhad)		

<b>Za zhotovitele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za projektanta:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za objednatele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	

Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí



## Změnový list č.6 - potvrzení změny





<b>Název stavby:</b>	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
<b>Zhotovitel</b>	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254,716 00 Ostrava - Radvanice
<b>Technický dozor:</b>	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
<b>Autorský dozor:</b>	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

<b>Změna ceny stavby:</b>		
Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů:		
<b>Cena dle SoD původní:</b>		<b>34 589 763,65</b>
<b>Více práce celkem</b>	<b>Méně práce celkem</b>	<b>Cena změny celkem</b>
<b>747 348,79</b>	<b>0,00</b>	<b>747 348,79</b>
<b>Cena dle SoD včetně předchozích změn:</b>		<b>36 453 279,94</b>
<b>Cena dle SoD včetně všech změn:</b>		<b>37 200 628,73</b>

<b>Změna doby plnění:</b>
Změna nemá vliv na termín dokončení stavby

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Přílohy ke změně</b>			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet		
Příloha č. 2	Situace obnovy komunikací		

<b>Za zhotovitele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za projektanta:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za objednatele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí					



## Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování části města Havířova IV.etapa P5 - lokalita Důlnák

### Rekapitulace objemu položek

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>		<i>dle SoD</i>	<i>skutečnost</i>	<i>rozdíl</i>
564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřen	m2	4 638,600	10 817,000	6 178,40
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame	m2	4 315,058	5 195,700	880,64
573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič	m2	7 748,942	7 832,600	83,66
573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič	m2	5 919,058	5 955,100	36,04
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostře	m2	7 363,500	7 632,600	269,10
577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřenír	m2	409,000	409,400	0,40

<i>kód položky</i>	<i>popis</i>	<i>MJ</i>	<i>množství</i>	<i>cena</i>	<i>celkem</i>
--------------------	--------------	-----------	-----------------	-------------	---------------

### Více-méně práce finálních ploch živíc

#### Vícepráce

<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
564931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřen	m2	6 178,400	68,70	424 456,08
565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame	m2	880,642	280,00	246 579,76
573211108	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič	m2	83,658	6,27	524,54
573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnič	m2	36,042	8,89	320,41
577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostře	m2	269,100	280,00	75 348,00
577166131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřenír	m2	0,400	300,00	120,00
<b>Celkem</b>					<b>747 348,79</b>

Vícepráce - celkem

747 348,79

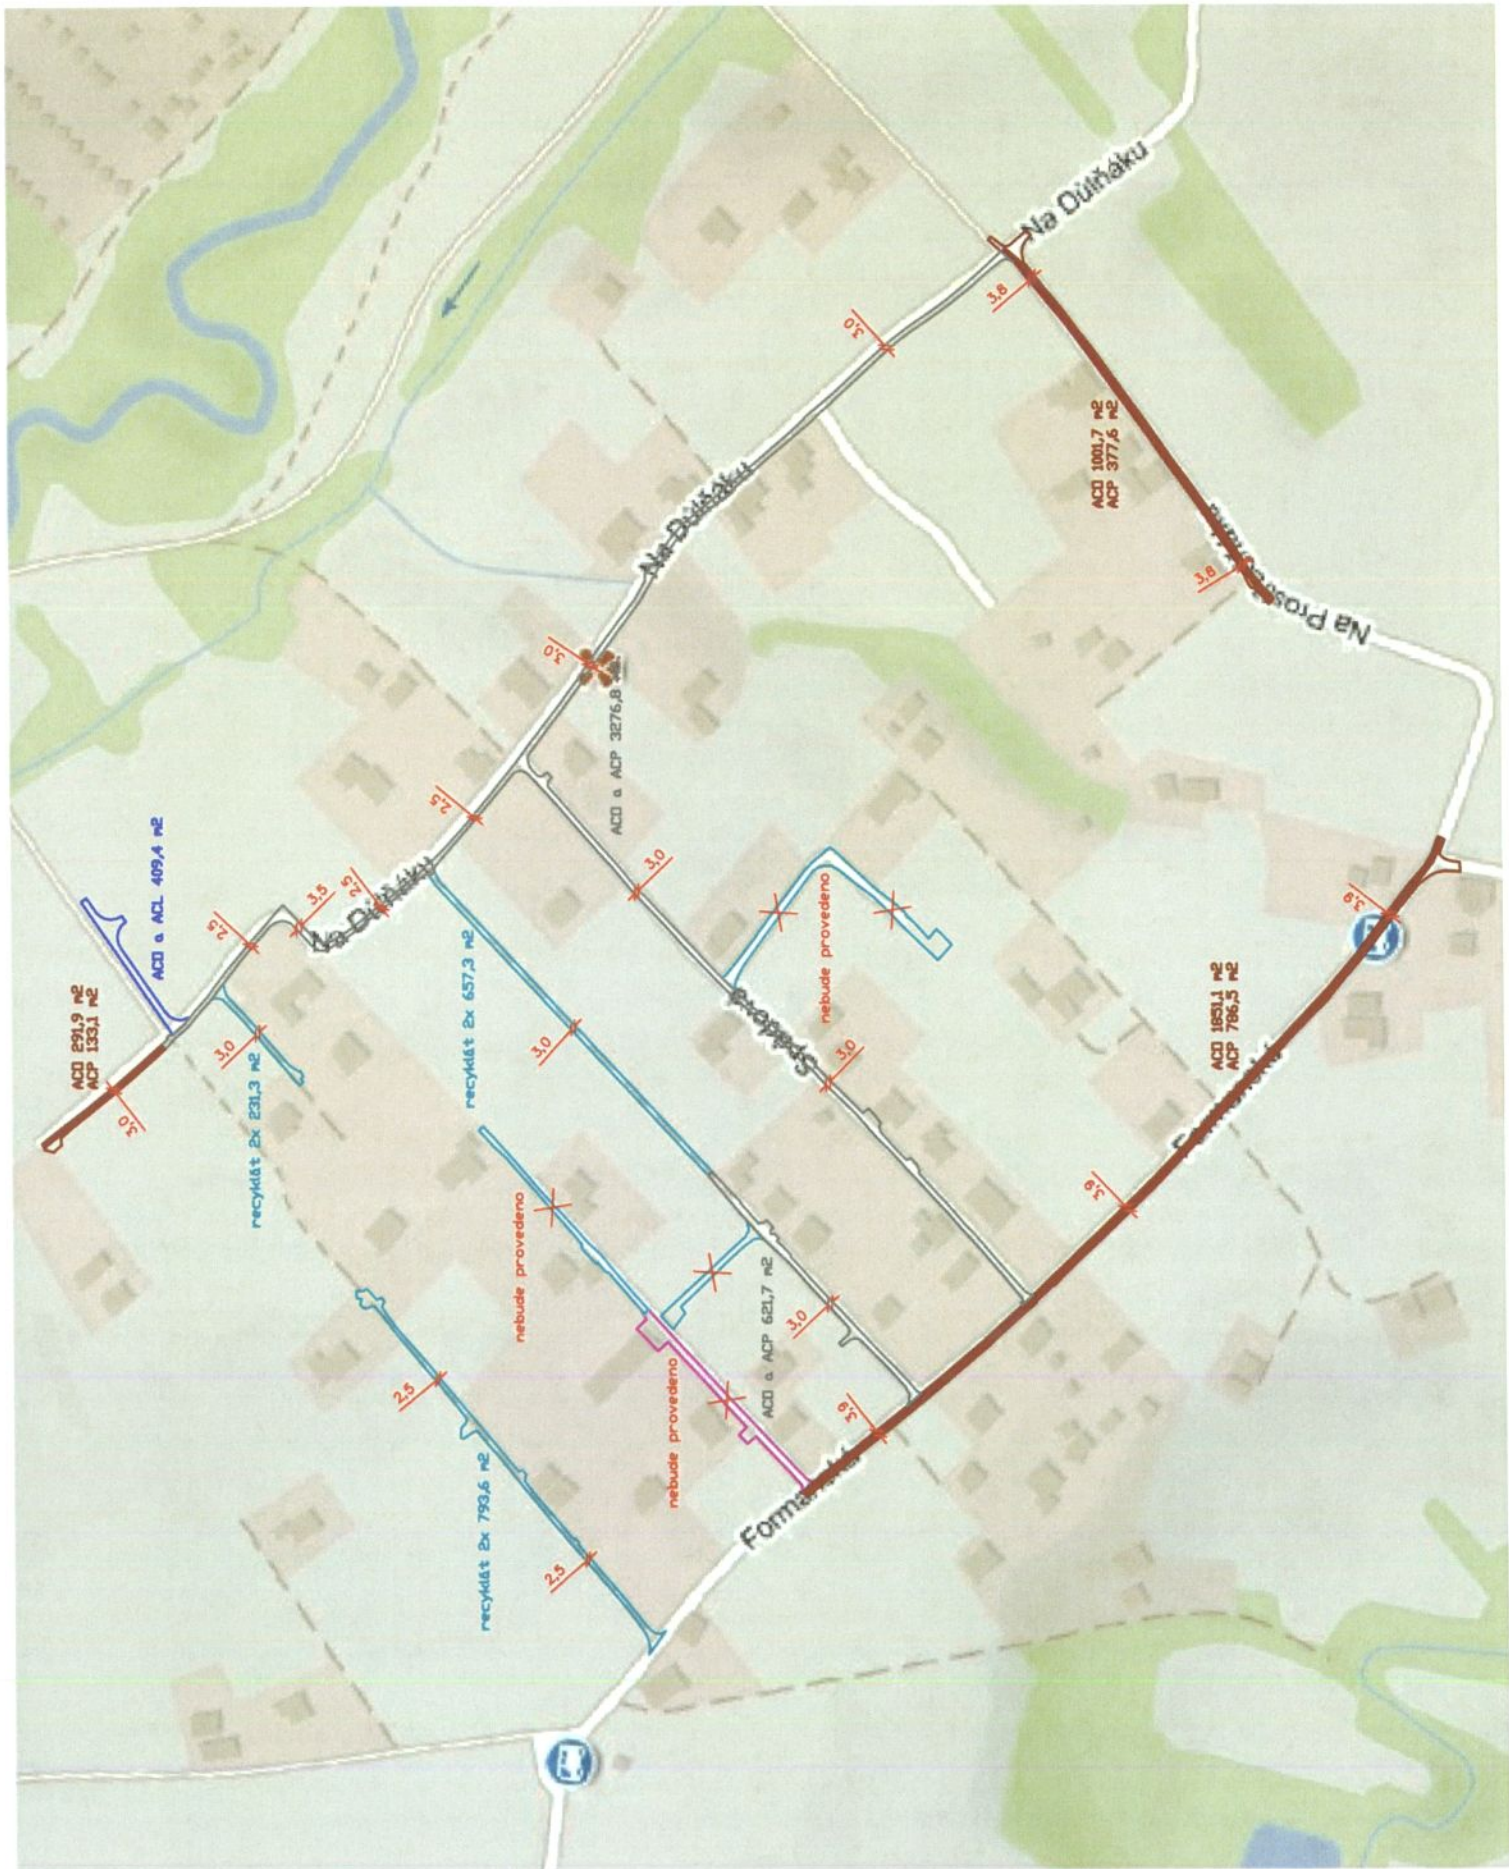
Méněpráce - celkem

0,00

#### Celkem

747 348,79

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD





## Změnový list č.7 - oznámení změny

<b>Název stavby:</b>	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
<b>Zhotovitel:</b>	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
<b>Technický dozor:</b>	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov - Město
<b>Autorský dozor:</b>	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

### Základní popis a zdůvodnění změny:





#### Délky podle skutečnosti

Během realizace stavby dochází k drobným posunům trasy a kanalizačních šachet. Tyto posuny jsou způsobeny prostorovým umístěním stávajících sítí a oplocení, kdy bude potřeba provést drobné korekce trasy. Ve výsledku dojde k drobným odchylkám v délkách kanalizace. Dále dojde změně některých betonových šachet DN1000 za šachty plastové DN600. Tato změna je také způsobena prostorovým umístěním stávajících sítí, kdy nebude možné umístit šachtu DN1000 mezi tyto sítě.

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Potvrzení změny (PZ). Dodavatel bude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce dle OZ. Po stanovení definitivního rozsahu změny bude zpracováno PZ. Samotné OZ není podkladem pro zpracování dodatku ke SoD ani k fakturaci.

### Přílohy ke změně

Příloha č. 1	Položkový rozpočet (odhad)		

<b>Za zhotovitele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za projektanta:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za objednatele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	

Výše podepsaní k oznámení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí

## Změnový list č.7 - potvrzení změny





<b>Název stavby:</b>	Odkanalizování části města Havířova - lokalita Důlnák
<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	
<b>Číslo smlouvy:</b>	dle SoD č. 13/OÚR/21 ze dne 1.2.2021
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 737 01 Havířov - Město
<b>Zhotovitel:</b>	STASPO spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice
<b>Technický dozor:</b>	KADMARSTAV s.r.o., Na Vyhlídce 1447/4, 736 01 Havířov – Město
<b>Autorský dozor:</b>	IGEA, s. r. o., Na Valše 47/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

<b>Změna ceny stavby:</b>		
Po ekonomickém vyhodnocení více a méně prací a provedených změn na realizovaném díle podle změnových listů:		
<b>Cena dle SoD původní:</b>		<b>34 589 763,65</b>
<b>Více práce celkem</b>	<b>Méně práce celkem</b>	<b>Cena změny celkem</b>
<b>348 495,70</b>	<b>-538 378,71</b>	<b>-189 883,01</b>
<b>Cena dle SoD včetně předchozích změn:</b>		<b>37 200 628,73</b>
<b>Cena dle SoD včetně všech změn:</b>		<b>37 010 745,72</b>

<b>Změna doby plnění:</b>
Změna nemá vliv na termín dokončení stavby

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

<b>Přílohy ke změně</b>			
Příloha č. 1	Položkový rozpočet		
Příloha č. 2	Porovnání PD a geodetického zaměř.		

<b>Za zhotovitele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za projektanta:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	
<b>Za TDS:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>	<b>Za objednatele:</b>	<i>datum:</i>	<i>podpis:</i>
	16.06.2022			16.06.2022	

Výše podepsaní k potvrzení změny nemají připomínky a se změnou souhlasí



Haviřov, Důlník - kanalizace

stoky	PP DN250	PE d90	přípojky PVC DN150	přípojky PVC DN250	šachty BET1000	šachty PP600	šachty přípojky	voda PE d32	chránička DN400
A	950,85		101,04	3,00	31		15		14,00
A.1	428,68		56,05		13	2	5		15,80
A.1.1	85,15		6,17		2				
A.2	354,20		34,04		11		4		14,45
A.3	337,79		33,02		9		9		18,00
A.4	716,25		69,70		20		17		14,31
A.4.1	101,43		29,39		2		4		
A.4.2	91,37				2				
výtlač	3,85	789,07			7				
vodovod								218,07	
<b>dle zaměření</b>	<b>3 069,57</b>	<b>789,07</b>	<b>329,41</b>	<b>3,00</b>	<b>97</b>	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>218,07</b>	<b>76,56</b>
SO 01 protlak	915,00								30,00
SO 01 výkop	1 936,10				91				
SO 01b	414,40		80,60		10		14		
SO 02			165,10				51		
SO 05.2 protlak		301,00							
SO 05.2 výkop		484,00			7			217,00	
SO 05.4									
ZL č.12									
ZL č.13									
<b>celkem</b>	<b>3 265,50</b>	<b>785,00</b>	<b>245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>217,00</b>	<b>30,00</b>
<b>rozdíl</b>	<b>-195,93</b>	<b>4,07</b>	<b>83,71</b>	<b>3,00</b>	<b>-11</b>	<b>2</b>	<b>-11</b>	<b>1,07</b>	<b>46,56</b>

## Rozpočet více-méně prací

stavba: Odkanalizování částí města Havířova IV.etapa P5 - lokalita Důlnák

kód položky	popis	MJ	množství	cena	celkem	pozn.
<b>Délky podle skutečnosti</b>						
<b>Vícepráce</b>						
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
141721221	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy	m	46,560	4 200,00	195 552,00	
28613437	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 tyče 12m se sign	m	46,560	1 719,00	80 036,64	
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
<b>hl. řády</b>						
894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno	kus	2,000	7 480,000	14 960,00	ÚRS
894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugc	kus	2,000	6 010,00	12 020,00	ÚRS
894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro tříd	kus	2,000	12 100,00	24 200,00	ÚRS
<b>přípojky</b>						
871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve s	m	83,710	209,00	17 495,39	
871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy :	m	3,000	1 030,000	3 090,00	ÚRS
<b>výtlač</b>						
871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100	m	4,070	122,00	496,54	
28613384	potrubí kanalizační tlakové PE100 RC SDR11 návin se sign	m	4,070	140,00	569,80	
<b>vodovodní přípojka</b>						
871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z	m	1,070	48,40	51,79	
28613170	potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 1C	m	1,070	22,00	23,54	
<b>Celkem</b>					<b>348 495,70</b>	
<b>Méněpráce</b>						
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm str	m3	-125,284	200,00	-25 056,72	
151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení př	m2	-278,408	50,00	-13 920,40	
151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vede	m2	-278,408	40,00	-11 136,32	
162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na	m3	-125,284	200,00	-25 056,72	
171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	-212,982	110,00	-23 428,03	
174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výk	m3	-75,170	127,00	-9 546,61	
58981122	recyklát betonový frakce 0/32	t	-120,272	200,00	-24 054,45	
175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitel	m3	-50,113	188,00	-9 421,33	
58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	-85,193	347,00	-29 561,92	
<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
<b>hl. řády</b>						
871363121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů těsněných gumovým	m	-195,930	147,00	-28 801,71	
28614257S	trubka kanalizační PP DN 250 SN16	m	-195,930	350,00	-68 575,50	
894414111R	D+M kanalizační betonové šachty plast DN1000	ks	-11,000	16 000,00	-176 000,00	
<b>přípojky</b>						
894812201	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trout	kus	-11,000	4 100,00	-45 100,00	
894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trout	kus	-11,000	1 635,00	-17 985,00	
894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trout	kus	-11,000	2 794,00	-30 734,00	
<b>Celkem</b>					<b>-538 378,71</b>	
<b>Vícepráce - celkem</b>					<b>348 495,70</b>	
<b>Méněpráce - celkem</b>					<b>-538 378,71</b>	
<b>Celkem</b>					<b>-189 883,01</b>	

Poznámka: pokud není u položky uvedeno jinak, jedná se o položky dle rozpočtu ze SoD
