



DODATEK č. 8 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
sídlo:	Komenského 432, 530 03 Pardubice
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy
IČO:	25916092
ID datové schránky:	ypbsq9b

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

a

Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., zkratkou S-VWPL
Vedoucí společník:	VW WACHAL a.s. sídlem: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž IČO: 25567225 DIČ: CZ25567225 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. Zn. 2976 B
Společník:	PROFISTAV Litomyšl, a.s. sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741 Zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. Zn. 2747 B
Sídlo:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený:	Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva VW WACHAL a.s. Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva PROFISTAV Litomyšl, a.s.
ID datové schránky (vedoucí společník):	j89tauv

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“



uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu u dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit předmět veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní č.p.52 Pardubice**“ (dále jen „veřejná zakázka“) a stavbu protokolárně předat objednateli a závazek objednatele provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“).

1.2. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu čl. 7 Smlouvy upravují předmět díla a další s tím související ustanovení Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmět díla vymezený v čl. 1 Smlouvy se doplňuje o stavební práce, dodávky a služby ve Smlouvě původně neuvedené (vícepráce) a omezuje v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které sice byly součástí díla, ale nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce). Vícepráce a méněpráce jsou definovány změnovými listy, které byly odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem a jsou přílohou této smlouvy. Jedná se o tyto změny:

Vícepráce:

- ZL036 Střecha - námětky, opravy, prodloužení
- ZL037 Doplnění AV techniky
- ZL038 Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů
- ZL039 Doplnění jádrového vrtání
- ZL040 Změna typu svítidel
- ZL041 Střecha - prostupové tašky a výlez
- ZL042 Navýšení standardu vypínačů a zásuvek
- ZL043 Revize a změna provedení oprav omítek severní strany
- ZL044 Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB
- ZL045 Opravy římsy atria - běžný vzhled
- ZL046 Navýšení standardu zařizovacích předmětů
- ZL047 Vybourání bet. mazanin ve 2.NP
- ZL048 Doplnění armatur rozdělovačů ÚT
- ZL049 Úprava lávky krovu nad 4.NP
- ZL050 Doplnění ÚT

Méněpráce:

- ZL037 Doplnění AV techniky
- ZL038 Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů
- ZL039 Doplnění jádrového vrtání
- ZL040 Změna typu svítidel



- ZL041 Střecha - postupové tašky a výlez
- ZL043 Revize a změna provedení oprav omítek severní strany
- ZL044 Navýšení výměr kabelází elektro z důvodu kolize profesí TZB
- ZL045 Opravy římsy atria - běžný vzhled
- ZL046 Navýšení standardu zařizovacích předmětů
- ZL050 Doplnění ÚT

2.2. V návaznosti na změnu předmětu díla se upravuje cena díla uvedená v čl. 3 Smlouvy takto:

Cena díla dle Smlouvy, dodatku č. 1 – č. 7 bez DPH **101.483.905,42 Kč**

Vícepráce dle dodatku č. 8 bez DPH **3.340.222,33 Kč**

Méněpráce dle dodatku č. 8 bez DPH **1.792.451,68 Kč**

Cena díla celkem bez DPH **103.031.676,07 Kč**

(slovy: stotřímilionůtřicetjednatisícšestsetšedesátšest korun českých sedm haléřů)

DPH (21 %) **21.636.651,97 Kč**

(slovy: dvacetjednamilionůšestsetřicetšesttisícšestsetpadesátjedna korun českých devadesátšedem haléřů)

Cena díla celkem včetně DPH **124.668.328,04 Kč**

(slovy: stodvacetčtyřmilionůšestsetšedesátosmtisícčtřístadvacetosm korun českých čtyři haléře)

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronickém originále, přičemž každé smluvní straně náleží soubor příloh, které jsou připojeny na datovém nosiči (CD/DVD), který je uzamčen proti změnám a podepsán permafíxem oběma smluvními stranami.

3.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy (na CD/DVD):

Příloha 1A – Změnové listy č. 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem dodatku včetně jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění a uzavírají jej na základě svobodné vůle.

Za objednatele:

Mgr. Miluše Horská
ředitelka školy

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Wachal
VW Wachal a.s.
místopředseda představenstva

Ing. Tomáš Zavřel, MBA
PROFISTAV Litomyšl a.s.
předseda představenstva

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN K DODATKU Č. 08 ZMĚNOVÉ LISTY Č. ZL036 – ZL050 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“

SoD: Na stavbě „Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice.“ ze dne 30.4.2020

Podrobný popis změn:

• **ZL036 – Střecha – námětky, opravy, prodloužení**

Změnový list ZL036 se skládá z několika relativně samostatných částí. Jedná se o část A – vyčištění římsy mezi pozednicí a okapovou hranou, část B – výměna zhlaví vazných trámů, drobnější úpravy krovu, vyrovnání rovinnosti krovu, sanace degradovaných námětek u okapů, část C – doplnění okapové hrany střechy o okapový plech, dílčí doplnění větrací mřížky a úpravu ve využití zavěšených plastových latí.

Část A – v průběhu rekonstrukce dodavatel zjistil, že horní část římsy střechy za atikou/pozednicí je zcela zaplněna stavebním rumem pocházejícím pravděpodobně z minulé etapy rekonstrukce z přelomu 60. a 70. let 20. století. Po rozkrytí střechy bylo nutno tento materiál odstranit a vyvézt na skládku. Současně bylo zjištěno, že oproti předpokladu je prostor pod nástřešním žlabem plně vybedněn prkny, která bylo taktéž nutno demontovat a odstranit ze stavby.

Část B – po rozkrytí střechy se ukázalo, že její stav je v horším stavu, než předpokládal projekt, jelikož mezi projektem a realizací uplynulo 5 let během kterých bohužel pokračovala degradace střechy. Dodavatel byl nucen vyrovnat lokálně prohnuté krokve, bylo nutno provést výměnu námětek u okapu, výměnu zhlaví vazných trámů a další drobné úpravy krovu.

Část C – GD oprávněně rozporoval chybějící oplechování okapové hrany, dílčí doplnění větrací mřížky a dílčí řešení zavěšené okapní latě aplikoval jakožto vhodnější řešení na celou délku okapové hrany. Současně bylo zjištěno, že plastové latě nad vikýři nebyly zahrnuty do VV. Součástí změny je i demontáž anténního stožáru, která nebyla do původního VV zahrnut.

Změny řešené v části A a B nebyly v době projekčních prací zřejmé a projektant je nemohl ani při nejvyšší odborné péči do projektu zahrnout. Změny v části C bylo nutno po odsouhlasení TDS, AD a investorem provést pro řádné dokončení díla.

Uvedené změny jsou v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s snížením o 5 % dle SoD. Některé drobnější položky, které nejsou součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele a odsouhlaseny AD a TDS.

Změnu částí A a B je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Změnu části C je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací nebylo možné pokračovat v realizaci střešního pláště. Vzhledem k tomu, že hrozilo aktuální nebezpečí další degradace krovu bez ochrany střešním pláštěm, bylo rozhodnuto o urychlené realizaci uvedených úprav.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

ZL037 – Doplnění AV techniky

Vzhledem k uplynutí cca 6 let mezi zpracováním projektové dokumentace a realizací díla, došlo v oblasti vývoje AV systémů k podstatným změnám, které si vyžádaly dílčí úpravy v systému AV techniky.

V přednáškovém sále m.č. 102 a 103 byl nově navržen jiný typ projektoru s podstatně větší zobrazovací plochou a s tím související změny (projektor, držák, plátno), byla nově navržena osvětlovací rampa se současnými požadavky na řízení a ovládání osvětlení a byly nově navrženy rozvaděče pro řízení osvětlení na ozvučení celého sálu.

V tělocvičně m.č. 114 byl zrušen původně navržený projektor a nahrazen novým LCD panelem (s tím souvisí zrušení projektoru, držáku a promítacího plátna a jejich nahrazení LCD panelem a nutné úpravy v připojení nových přístrojů.

V muzikoterapii m.č. 309 a v jídelně 214 byly provedeny drobnější úpravy v audio vybavení tak, aby splňovalo současné požadavky na takové zařízení.

ZL037 řeší úpravy v AV technice společenských prostor dle současných standardů.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Uvedená změna je v rozsahu nedodávaných položek méněpráce, v rozsahu nově dodávaných položek vícepráce. Celkově se jedná o vícepráci.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele, odsouhlaseny AD a TDS a prověřeny konkurenční nabídkou.

Navržená změna významně zlepšuje možnosti využití společenských prostor školy v aktuálním standardu AV techniky. Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

• **ZL038 – Úpravy kleneb, zrušení přesunu kamenné zárubně a niky rozvaděčů**

V průběhu stavebních prací zjistil dodavatel, že v rozpočtu chybí položky pro vytvoření nik pro rozvaděče elektro a rozdělovače UT včetně souvisejících prací (osazení překladů, vybourání nik, vyrovnání vybouraných povrchů). Tyto práce je nutno do rozpočtu doplnit.

ZL dále řeší vybourání podezděnění klenby v chodbě 1.NP, u které bylo zjištěno, že nemá žádnou nosnou funkci a lze ji jednoduše odbourat a tím vizuálně chodbu sjednotit. ZL řeší i zrušení přesunu kamenného ostění ze zadního schodiště mezi 3.NP a 4.NP. Po vyčištění objektu bylo zjištěno, že toto ostění nevádí nově navrženému provozu a může zůstat na původním místě.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s ponížením o 5 % dle SoD. Některé drobnější položky, které nejsou součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele a odsouhlaseny AD a TDS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací nebylo možné pokračovat v realizaci navazujících prací elektrorozvodných a topenářských. Bez realizace navržených prací by nebylo možné dokončit dílo.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

ZL039 – Doplnění jádrového vrtání

Projektant předpokládal pro trasy instalací bourání prostupů stěnami. Při realizaci se ukázalo, že při bourání by docházelo otřesy k degradaci původního historického zdiva i k ohrožení stability kleneb. Proto bylo rozhodnuto v kritických místech o záměně provádění otvorů bouráním za jádrové vrtání.

Uvedená změna řeší zrušení vytvoření otvorů skrz nosné zdi bouráním a jeho nahrazení jádrovým vrtáním.

Uvedená změna je ve zrušení bourání otvorů méněpráce, u nových jádrových vrtání vícepráce, celkově se jedná o vícepráci.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou přejeté z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn hrozila degradace barokního zdiva a kleneb otřesy z bourání otvorů s jejich dopady do pevnosti zdiva.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

• **ZL040 – Změna typu svítidel**

Vzhledem k požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek specifikoval projektant požadavky na osvětlovací tělesa po technické stránce jednoznačně, po stránce designové však nebylo možno provést specifikaci dostatečně jednoznačně. Dodavatel nabídl svítidla, která vyhovovala všem technickým požadavkům a splňovala i obecné požadavky na design. Po dohodě architekta s investorem došlo u části svítidel k upřesnění designových požadavků, které však šly nad rámec původních designových specifikací. Dodavatel tedy provedl nové vzorkování svítidel, které architekt i investor odsouhlasili za cenu navýšení původní ceny. V některých případech došlo i k aktualizaci počtu jednotlivých typů svítidel.

ZL040 řeší záměnu původně navržených osvětlovacích těles za tělesa vyššího designového standardu.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Uvedená změna je v rozsahu zrušených dodávek svítidel méněpráce, v rozsahu nově dodávaných položek vícepráce. Celkově se jedná o vícepráci.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele, odsouhlaseny AD a TDS a prověřeny konkurenční nabídkou.

Navržená změna významně zlepšuje designovou úroveň zvláště společenských prostor rekonstruovaného objektu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

- **ZL041 – Střecha, prostupové tašky a výlez**

V průběhu prací na střešním pláštii byly zjištěny některé rozpory mezi realizovanou střechou a výkazem výměr. Z důvodu zjednodušeného řešení elektročásti byl zrušen jeden anténní stožár na střeše. S tím souvisí zrušení jedné prostupové tašky. Dále byl zrušen výlez k tomuto zrušenému stožáru, a naopak byl navýšen počet prostupových tašek pro odvětrání kanalizace dle skutečného počtu větracích hlavic kanalizace.

V části odpočtu výlezu a souvisejících prací se jedná o méněpráci, doplnění prostupových tašek je vícepráce, celkem je ZL041 víceprací.

Výměry jsou určeny výpočtem a kontrolou přímo na stavbě, jednotkové ceny, jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací nebylo možné pokračovat v realizaci navazujících prací na střeše. Bez realizace navržených prací by nebylo možné dokončit dílo.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

- **ZL042 – Navýšení standardu vypínačů a zásuvek**

V době zpracování projektové dokumentace předpokládal projektant osazení klasických vypínačů a zásuvek např. ABB Tango. Dodavatel nabídl dodávku vypínačů v požadovaném standardu (ABB Tango) v ceně dle nabídkového rozpočtu a ve variantě zcela novou řadu vypínačů LEGRAND NILOE STEP v barvě bílý střed, šedý rámeček. K nově navrženým vypínačům byla vybrána alternativní řada zásuvek ABB Levit ve vyšší cenové hladině ale s vhodnějším designem. AD i investor s navrhovanou změnou souhlasili z důvodu významného navýšení estetického standardu při mírném navýšení ceny. Navýšení ceny činí cca 5 – 10 % z ceny původně navržených vypínačů a zásuvek.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele a odsouhlaseny AD a TDS.

Navržená změna významně zlepšuje designovou úroveň rekonstruovaného objektu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

- **ZL043 – Revize a změna provedení oprav omítek severní strany**

Změnový list řeší úpravy v provádění vnějších omítek severní strany. Po postavení lešení bylo konstatováno, že stav omítek je lepší, než předpokládal původní odhad prováděný pouze z úrovně terénu. Proto bylo zásadně omezeno množství omítek určených k otlučení a opětovnému nahození. Změnový list dále řeší úpravu vnější omítky severní fasády na přístavbě z přelomu 60. a 70. let 20. století. Zde se ukázalo, že byla použita zcela nevhodná technologie vyzdění z podélně děrovaných cihel, která je dnes nejen zcela nevhodná z hlediska energetického, ale může způsobovat závažné tepelně technické poruchy stavby. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o dodatečném zateplení tepelně izolačními deskami a následném sjednocení celé severní fasády.

Uvedená změna je v omezení výměr pro opravu fasády méněpráce, nové zateplení je vícepráce, celkově se jedná o méněpráci.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s snížením o 5 % dle SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 6, nepředvídatelné práce.

Bez navrhovaných změn není možné pokračovat ve stavebních pracích a nebylo by možné dílo dokončit.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

- **ZL044 – Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB**

Změnový list řeší navýšení výměr kabeláží z důvodu kolize kabelových tras s ostatními rozvody. Vzhledem k přesunu kabeláže z podlah do stropů ve 2. a 3. NP a tím výraznému navýšení vertikálních tras se jedná o významné navýšení výměr. ZL dále řeší zrušení rozvodů EZS ve 2.NP a zrušení rozvodů STA v celém objektu. Se zrušením STA souvisí i zrušení antény na střeše včetně jejího kompletního vystrojení (zrušení prvků střechy viz ZL041)

Změnu v rozsahu rušení EZS a STA je možno zařadit do §222 odst. 4.

Změnu v navýšení výměr kabeláže je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla

Uvedená změna je rozsahu rušení rozvodu EPS a STA méněpráce, v rozsahu navýšení výměr kabeláže vícepráce, celkem se jedná o víceprací.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny byly převzaty z rozpočtu k SoD.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

ZL045 – Opravy římsy atria, běžný vzhled

V projektové dokumentaci bylo předpokládáno s přezděním celé délky atikové římsy, současně se předpokládalo, že opravovaná plocha římsy je zahrnuta do jednoduché omítkové plochy. Po odstranění novodobých omítek se ukázalo, že stav zdiva římsy je lepší, než předpokládal projekt. Profilace římsy se však ukázala po odstranění omítkových vrstev jako mnohem bohatší, než odpovídá složitosti 1 – 2. Ve změnovém listu je odečteno bourání degradované římsy a její oprava ve složitosti č. 1 – 2., část římsy je v dobrém stavu a nepředpokládá se její bourání, naopak vzhledem k bohatosti profilace byla plocha římsy zařazena do složitosti 3.

Uvedená změna je v dílčí méněpráce a dílčí vícepráce, celkem se jedná o vícepráce.

Výměry jsou určeny výpočtem a oměřením přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD byly převzaty z aktuální cenové hladiny URS s snížením o 5 % dle SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací není možné zajistit údržbu a obsluhu půdního prostoru.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

ZL046 – Navýšení standardu zařizovacích předmětů ZTI

Vzhledem k požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek specifikoval projektant požadavky na zařizovací předměty ZTI po technické stránce jednoznačně, po stránce designové však nebylo možno provést specifikaci dostatečně jednoznačně. Dodavatel nabídl předměty, které vyhovovaly všem technickým požadavkům a splňovaly i obecné požadavky na základní design. Po dohodě architekta s investorem došlo k upřesnění designových požadavků, které však šly nad rámec původních designových specifikací. Dodavatel tedy provedl nové vzorkování zařizovacích předmětů, které architekt i investor odsouhlasili za cenu navýšení původní ceny.

ZL046 řeší záměnu původně navržených zařizovacích předmětů za předměty vyššího designového standardu.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 4.

Uvedená změna je v rozsahu zrušených dodávek výrobků méněpráce, v rozsahu nově dodávaných položek vícepráce. Celkově se jedná o vícepráci.

Výměry jsou zjištěny dle skutečnosti přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele, odsouhlaseny AD a TDS a prověřeny konkurenční nabídkou.

Navržená změna významně zlepšuje designovou úroveň zvláště společenských prostor rekonstruovaného objektu.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

• ZL047 – Vybourání bet. mazanin ve 2.NP

V projektové dokumentaci předpokládal projektant v chodbách pouze odstranění nášlapné vrstvy podlahy a položení podlahy nové. V rámci projektu UT však bylo nutno do podlah chodeb uložit rozvody UT mezi rozdělovači a jednotlivými tělesy. Z toho důvodu se ukázalo jako nezbytné odstranit stávající podkladní betony, urovnat násypy kleneb, vybetonovat nové podkladní betony.

Výměry jsou určeny oměřením a výpočtem přímo na stavbě, jednotkové ceny, jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací nebylo možné pokračovat v realizaci navazujících prací v chodbách a dokončování UT.

Bez realizace navržených prací by nebylo možné dokončit dílo.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

• ZL048 – Doplnění armatur rozdělovačů ÚT

Při realizaci rozdělovačů ÚT pro větev 1 se ukázalo, že ve výkazu výměr chybí část armatur. Vzhledem k nezbytnosti těchto armatur pro provoz UT bylo rozhodnuto o jejich doplnění.

Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny kontrolou přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele a odsouhlaseny AD a TDS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací není možné zprovoznit systém UT ani dokončit dílo.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

• **ZL049 – Úprava lávky krovu nad 4.NP**

Dle projektové dokumentace byla v průlezných částech krovu navržena lávka pro možnost základního pohybu pro údržbu půdního prostoru. Při realizaci se ukázalo, že je nutno rozsah lávky zvětšit pro obsluhu dalších prostorů na půdě.

Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny kontrolou přímo na stavbě, jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu k SoD.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací není možné zajistit údržbu a obsluhu půdního prostoru.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

• **ZL050 – Doplnění ÚT**

Při realizaci rozvodů UT se ukázalo, že ve výkresové dokumentaci chybí část armatur. Vzhledem k nezbytnosti těchto armatur pro provoz UT bylo rozhodnuto o jejich doplnění.

Uvedená změna je v celém rozsahu vícepráce.

Výměry jsou určeny kontrolou přímo na stavbě, jednotkové ceny, které nebyly součástí rozpočtu k SoD, a nejsou ani součástí URS byly určeny kalkulací dodavatele a odsouhlaseny AD a TDS.

Změnu je možno zařadit do §222 odst. 5, práce nutné k dokončení díla.

Bez realizace navržených prací není možné zprovoznit systém UT ani dokončit dílo.

Vzhledem k charakteru a rozsahu navrhované změny a vzhledem k termínu dokončení není možné provést nové výběrové řízení na nového dodavatele.

Termínové plnění:

Navrhované změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Odůvodnění vyvolaných změn:



Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Petra Vondráčková	Podpis zmocněnce AD, datum, razítko: Atelier Mudruňka, Pavel Mudruňka
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: BUNG CZ, TDS Jan Andrš	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Hubert Kuchař

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL036	Název rozpočtu Střecha - námětky, opravy, prodloužení	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	255 887,24 Kč
		DPH	53 736,32 Kč
		DPH 21%	53 736,32 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	309 623,55 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL036: Střecha - námětky, opravy, prodloužení

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL036: Střecha - námětky, opravy, prodloužení	255 887,24	53 736,32	309 623,55
NAKL01: Uznatelné náklady	255 887,24	53 736,32	309 623,55
00: Vedlejší a ostatní náklady	8 108,22	1 702,73	9 810,95
00: Vedlejší a ostatní náklady	8 108,22	1 702,73	9 810,95
00: Vedlejší a ostatní náklady	8 108,22	1 702,73	9 810,95
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	8 108,22	1 702,73	9 810,95
VRN3: Zařízení staveniště	7 530,86	1 581,48	9 112,34
VRN4: Inženýrská činnost	577,37	121,25	698,61
01: D1 - Budova - stavební a statická část	247 779,01	52 033,59	299 812,61
01: D1 - Budova - stavební a statická část	247 779,01	52 033,59	299 812,61
01: D1 - Budova - stavební a statická část	247 779,01	52 033,59	299 812,61
HSV: Práce a dodávky HSV	56 793,60	11 926,66	68 720,26
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 831,70	5 844,66	33 676,36
94: Lešení a stavební výtahy	1 250,72	262,65	1 513,37
997: Přesun sutě	27 711,18	5 819,35	33 530,53
PSV: Práce a dodávky PSV	190 985,41	40 106,94	231 092,35
762: Konstrukce tesařské	140 284,85	29 459,82	169 744,66
764: Konstrukce klempířské	47 157,29	9 903,03	57 060,32
765: Krytina skládaná	1 703,28	357,69	2 060,97
767: Konstrukce zámečnické	1 840,00	386,40	2 226,40
Celkem (bez DPH)	255 887,24		
DPH		53 736,32	
DPH 21 % ze základny: 255 887		53 736,32	
Celkem (včetně DPH)			309 623,55

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



Rozpočet: ZL036: Střecha - námětky, opravy, prodloužení

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL036: Střecha - námětky, opravy, prodloužení						255 887,24
NAKL01: Uznatelné náklady						255 887,24
00: Vedlejší a ostatní náklady						8 108,22
00: Vedlejší a ostatní náklady						8 108,22
00: Vedlejší a ostatní náklady						8 108,22
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						8 108,22
VRN3: Zařízení staveniště						7 530,86
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	247 779,01	3 413,99
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	247 779,01	2 547,94
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,01		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	247 779,01	1 568,93
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						577,37
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	247 779,01	376,54
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	247 779,01	200,82
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
01: D1 - Budova - stavební a statická část						247 779,01
01: D1 - Budova - stavební a statická část						247 779,01
01: D1 - Budova - stavební a statická část						247 779,01
HSV: Práce a dodávky HSV						56 793,60
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						27 831,70
1 132.	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosu bahna - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	151,0	176,70	26 681,70
Výkaz výměr: vyčištění římsy od nečistot (50kg/bm); 151				151,000		
1 133.	952905-R01	Osekání, očištění a 3x narušení spec. přípravkem - Nová R-položka	soubor	1,0	1 150,00	1 150,00
94: Lešení a stavební výtahy						1 250,72
64.	949111113	Montáž lešení lehkého kovového trubkového v do 2,5 m	sada	2,0	323,84	647,67
Výkaz výměr: oprava zhlaví vazných trámů; 2				2,000		
65.	949111213	Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití	sada	10,0	25,10	251,00
Výkaz výměr: oprava zhlaví vazných trámů; 2*5				10,000		
66.	949121813	Demontáž lešení lehkého kovového dílcového v do 2,5 m	sada	2,0	176,03	352,05
997: Přesun sutě						27 711,18
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,659	2 306,48	22 278,27
Výkaz výměr: (151*0,05)+2,109				9,659		
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,659	116,81	1 128,28
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19,143	5,00	95,62
Výkaz výměr: 9,077*2,109				19,143		
311.	997013831	Poplatek za uložení na skládku (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	9,659	435,76	4 209,01
PSV: Práce a dodávky PSV						190 985,41
762: Konstrukce tesařské						140 284,85
376.	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	120,8	59,92	7 237,97
Výkaz výměr: pod nadstřešním žlabem; 151*0,8				120,800		
385.	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	23,11	58,83	1 359,48
Výkaz výměr: závitová tyč M24; 3,5*0,55*12				23,100		
matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M24; 0,00011*2*12				0,003		
podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 24mm; 0,000288*2*12				0,007		
386.	553412001	konstrukční ocel - svorníky + podložky + matky (pozink)	kg	23,11	84,97	1 963,73

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
403.	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	317,3	204,81	64 985,32
		Výkaz výměr: námětky krovu do řimsy; 160		160,000		
		rámečky z RVH latí; 69,3		69,300		
		pomocné konstrukce bůdníku; 8*11		88,000		
406.	605121215	řezivo jehličnaté pro konstrukci krovu	m3	0,92	11 096,63	10 204,46
		Výkaz výměr: rámečky z RVH latí; 0,366*1,1		0,403		
		oprava zhlaví vazných trámů; 0,47*1,1		0,517		
411.	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,655	7 742,37	5 069,08
		Výkaz výměr: námětky krovů do řimsy; 0,06*0,04*160*1,1		0,422		
		pomocné konstrukce bůdníku; 0,06*0,04*8*11*1,1		0,232		
412.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,69	1 927,15	3 256,11
		Výkaz výměr: námětky krovů do řimsy; 0,06*0,04*4*160*1,1		1,690		
426.	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,162	2 332,82	2 710,74
1 135.	76283-R001	Vyrovnaní částí střechy - Nová R-položka	m2	150,0	69,00	10 350,00
1 136.	76283-R002	PVC lať na Cu páskách vč. montáže - Nová R-položka	m	151,0	89,70	13 544,70
		Výkaz výměr: žlab; 151-26,3		124,700		
		nad budniky; 26,3		26,300		
1 137.	762332134	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	12,0	362,90	4 354,80
		Výkaz výměr: oprava zhlaví vazných trámů; 12		12,000		
1 138.	762332924	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	1,1	959,50	1 055,45
		Výkaz výměr: 2*0,55		1,100		
1 139.	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	5 614,50	11 229,00
1 129.	762331941	Výřezání částí střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	12,0	247,00	2 964,00
		Výkaz výměr: oprava zhlaví vazných trámů; 12		12,000		
		764: Konstrukce klempířské				47 157,29
505.	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,344	11 983,40	4 122,29
1 217.	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m	151,0	285,00	43 035,00
		Výkaz výměr: okapnice; 151		151,000		
		765: Krytina skládaná				1 703,28
507.	765113122	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m	11,1	152,52	1 692,93
		Výkaz výměr: okapní větrací pás; 151-139,9		11,100		
520.	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	0,019	544,70	10,35
		767: Konstrukce zámečnické				1 840,00
1 141.	767D-R01	Demontáž anténního stožáru - Nová R-položka	kus	2,0	920,00	1 840,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	  <small>Litomyšl a.s.</small>
200 930	Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL037	Doplnění AV techniky	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ
		Celkem (bez DPH) 59 391,93 Kč
		DPH 12 472,31 Kč
		DPH 21% 12 472,31 Kč
		DPH 15% 0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH) 71 864,24 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL037: Doplnění AV techniky

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL037: Doplnění AV techniky	59 391,93	12 472,31	71 864,24
NAKL01: Uznatelné náklady	30 261,93	6 355,01	36 616,94
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 881,93	395,21	2 277,14
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 881,93	395,21	2 277,14
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 881,93	395,21	2 277,14
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 881,93	395,21	2 277,14
VRN3: Zařízení staveniště	1 747,93	367,06	2 114,99
VRN4: Inženýrská činnost	134,01	28,14	162,15
02: D1 - Budova - profese TZB	28 380,00	5 959,80	34 339,80
004: Osvětlovací a ozvučovací technika	28 380,00	5 959,80	34 339,80
004: Osvětlovací a ozvučovací technika	28 380,00	5 959,80	34 339,80
PSV.: Osvětlovací a ozvučovací technika	28 380,00	5 959,80	34 339,80
.1: Přednáškový sál - pódium 102+103	85 469,60	17 948,62	103 418,22
.D1: Tělocvična 114	- 6 670,00	- 1 400,70	- 8 070,70
.D3: Muzikoterapie 309	13 500,00	2 835,00	16 335,00
.D4: Učebna 302	11 280,00	2 368,80	13 648,80
.OST: AV-technika Ostatní	- 75 199,60	- 15 791,92	- 90 991,52
NAKL02: Neuznatelné náklady	29 130,00	6 117,30	35 247,30
03.: D1 - Profese TZB	29 130,00	6 117,30	35 247,30
001.: Osvětlovací a ozvučovací technika	29 130,00	6 117,30	35 247,30
001.: Osvětlovací a ozvučovací technika	29 130,00	6 117,30	35 247,30
PSV.: Osvětlovací a ozvučovací technika	29 130,00	6 117,30	35 247,30
.1.: Jídelna 214	29 130,00	6 117,30	35 247,30
Celkem (bez DPH)	59 391,93		
DPH	12 472,31		
DPH 21 % ze základny: 59 392		12 472,31	
Celkem (včetně DPH)			71 864,24

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL037: Doplnění AV techniky

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL037: Doplnění AV techniky						59 391,93
NAKL01: Uznatelné náklady						30 261,93
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 881,93
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 881,93
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 881,93
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 881,93
VRN3: Zařízení staveniště						1 747,93
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	57 510,00	792,39
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezisklady materiálů.	Celek	0,01	57 510,00	591,38
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,01		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	57 510,00	364,15
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						134,01
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	57 510,00	87,40
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	57 510,00	46,61
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
02: D1 - Budova - profese TZB						28 380,00
004: Osvětlovací a ozvučovací technika						28 380,00
004: Osvětlovací a ozvučovací technika						28 380,00
PSV.: Osvětlovací a ozvučovací technika						28 380,00
.1: Přednáškový sál - pódium 102+103						85 469,60
1.	OZV 001	Videodata short throw projektor DLP LED 1920x1080 2800 ANSI lumen. kontrast 25000:1	kus	- 1,0	21 000,00	- 21 000,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1				- 1,000		
Skutečné množství; 0				-		
1.	OZV 001N	Videodata projektor - změna typu - SONY VPL-CH370	kus	1,0	43 200,00	43 200,00
2.	OZV 002	držák výložný pro short throw videodata projektor	kus	- 1,0	4 375,00	- 4 375,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1				- 1,000		
Skutečné množství; 0				-		
2.	OZV 002N	Stropní držák pro data projektor	kus	1,0	5 040,00	5 040,00
3.	OZV 003	el.stahovatelné plátno 244cm x 183 bílý tubus, RF dálkové ovládání	kus	- 1,0	6 250,00	- 6 250,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1				- 1,000		
Skutečné množství; 0				-		
3.	OZV 003N	Plátno s vestavbovým rámem do podhledu Cineroll PRO Electric, 350x265/342x257	kus	1,0	36 600,00	36 600,00
3.	OZV 003NN	Doplnění plátna Cineroll PRO 330	kus	1,0	8 340,00	8 340,00
6.	OZV 006	rampa/konstrukce pro efektová světla 230V/300W PAR 56	kus	- 3,0	6 250,00	- 18 750,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -3				- 3,000		
Skutečné množství; 0				-		
6.	OZV 006N	Změna v provedení - rampa/konstrukce pro efektová světla 230V/300W PAR 56	kus	1,0	26 400,00	26 400,00
8.	OZV 008	rampa/konstrukce pro efektová světla PAR 56 LED 230V/ 20W	kus	- 2,0	6 250,00	- 12 500,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -2				- 2,000		
Skutečné množství; 0				-		
8.	OZV 008N	Změna v provedení - rampa/konstrukce pro efektová světla PAR 56 LED 230V/ 20W	kus	2,0	4 560,00	9 120,00
9.	OZV 009	Dimmer - stmívač DMX control max. 1150W/230V	kus	- 2,0	3 000,00	- 6 000,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -2				- 2,000		
Skutečné množství; 0				-		
9.	OZV 009N	Změna v provedení - CS2,2 Kanálový DMX Rozbočovač	kus	1,0	1 440,00	1 440,00
10.	OZV 010	Ovládací SW ef.osvětlení vč.inerface	kus	- 1,0	6 875,00	- 6 875,00
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1				- 1,000		
Skutečné množství; 0				-		
10.	OZV 010N	Ovládací SW ef.osvětlení vč.inerface - Změna v provedení - Chauvet Obey 70	kus	1,0	3 960,00	3 960,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	OZV 013	Mixpult analogový rack Poznámka k položce: 19" 4U s USB playerem Kompaktní 4-kanálový mixážní pult s USB; ovládací panel a displej; 2 mikrofonní vstupy s funkcí Talkover a 2-pásmovými korekcemi. Vstupy 6x Line (RCA, 3 přepínatelné na Phono), 2x Mic (Jack 6,3 mm) a 2x USB (přifažené k 3 a 4 kanálu). Funkce Echo s nastavitelnými parametry (Level, Repeat a Delay), 3-pásmový EQ pro všechny kanály, sluchátkový výstup s možností přiřazení libovolného kanálu. Výstupy Master (Jack 6,3 mm), AMP (RCA), BOOTH (RCA) a REC (RCA).	kus	-1,0	4 350,00	-4 350,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1 Skutečné množství; 0		-1,000 -		
13.	OZV 013N	Mixpult analogový rack - změna v provedení - ELvia atyp přepínání audio - repro	kus	1,0	38 400,00	38 400,00
14.	OZV 014	Mixpult analogový rack Poznámka k položce: 19" 4U 10 kanálový mixážní pult do racku 4 mikrofonní vstupy 2 kanály s Bluetooth technologií Výstup pro externí mix/efekty, Sluchátkový výstup	kus	-1,0	9 000,00	-9 000,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -2 Skutečné množství; 1		-2,000 1,000		
17.	OZV 017	power unit spínací jednotka napájení 19" 1U	kus	-2,0	8 750,00	-17 500,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -2 Skutečné množství; 0		-2,000 -		
17.	OZV 017N	power unit spínací jednotka napájení 19" 1U - změna v provedení - power unit spínací jednotka atyp E	kus	3,0	3 120,00	9 360,00
19.	OZV 019	skříň rack19" Poznámka k položce: 10U pro analogový mixpult a CD/USB player - pro vestavbu do svislé konstrukce rozměr š.56cm v.52cm h.45cm	kus	-2,0	7 500,00	-15 000,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -2 Skutečné množství; 0		-2,000 -		
19.	OZV 019N	skříň rack19" - změna v provedení - AV skříň - volně stojící	kus	2,0	12 604,80	25 209,60
		Výkaz výměr: Skutečné množství; Sál; 1 Technická místnost; 1		- 1,000 1,000		
		.D1: Tělocvična 114				-6 670,00
31.	OZV 031	Videodata short throw projektor DLP LED 1920x1080 2800 ANSI lumen. kontrast 25000:1	kus	-1,0	21 000,00	-21 000,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1 Skutečné množství; 0		-1,000 -		
31.	OZV 031N	4K LCD 65" (147x83 cm) Samsung QE65Q60T	kus	1,0	25 200,00	25 200,00
32.	OZV 032	držák výložný pro short throw videodata projektor	kus	-1,0	4 375,00	-4 375,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1 Skutečné množství; 0		-1,000 -		
32.	OZV 032N	Nástěnný držák LCD TV	kus	1,0	1 200,00	1 200,00
33.	OZV 033	el.stahovatelné plátno 244cm x 183 bílý tubus, RF dálkové ovládání	kus	-1,0	6 250,00	-6 250,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1 Skutečné množství; 0		-1,000 -		
34.	OZV 034	nátěnný vestavný připojovací panel HDMI pro projektor	kus	-1,0	3 125,00	-3 125,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1 Skutečné množství; 0		-1,000 -		
34.	OZV 034N	HDMI příp. panel	kus	1,0	1 680,00	1 680,00
		.D3: Muzikoterapie 309				13 500,00
53.	OZV 053	Zesilovač výkonový Poznámka k položce: 2x300W 4 Ohm Počet kanálů: 2 Výstupní výkon do zátěže 4 Ohm: 2 x 300 W RMS; Výstupní výkon do zátěže 8 Ohm: 2 x 200 W RMS; Výstupní výkon v režimu BRIDGE do zátěže 8 Ohm: 1 x 600 W RMS; Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz; Harmonické zkreslení: < 0.5 %; Vstupní citlivost: přepínatelná – 0,75 V nebo 1,4 V; Odstup signálu od šumu: > 100 dB; Indikátory: přítomnost signálu / clipping / chybové hlášení; Signálové konektory: 2 x XLR vstup, 2x RCA vstup Konektory výstupu zesilovače: speakon; Aktivní nucené chlazení Výška: 2U	kus	-1,0	7 500,00	-7 500,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -2 Skutečné množství; 1		-2,000 1,000		
55.	OZV 055	skříň nábytková 19" pro mixpult,USB player a výkonový zesilovač rozměr 49cm x 100cm x 50cm - atyp	kus	-1,0	7 500,00	-7 500,00
		Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu; -1 Skutečné množství; 0		-1,000 -		
55.	OZV 055N	AV skříňka - nástěnná uzamykatelná Rack skříňka	kus	1,0	11 400,00	11 400,00
1 146.	VPOZV05	Zes. pro ind. Smyčku - Dexon ILA450	kus	1,0	17 100,00	17 100,00
		.D4: Učebna 302				11 280,00
1 147.	VPOZV06	Zesilovač indukční smyčky ILD 100	kus	1,0	11 280,00	11 280,00
		.OST: AV-technika Ostatní				-75 199,60
1 230.	AVT-SL01	Projektová sleva	kpl	1,0	-75 199,60	-75 199,60

NAKL02: Neuznatelné náklady

29 130,00

03.: D1 - Profese TZB

29 130,00

001.: Osvětlovací a ozvučovací technika

29 130,00

001.: Osvětlovací a ozvučovací technika

29 130,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

PSV.: Osvětlovací a ozvučovací technika

29 130,00

.1.: Jídlna 214

29 130,00

2.	OZV 206	Zesilovač výkonový Poznámka k položce: 2x300W 4 Ohm Počet kanálů: 2 Výstupní výkon do zátěže 4 Ohm: 2 x 300 W RMS; Výstupní výkon do zátěže 8 Ohm: 2 x 200 W RMS; Výstupní výkon v režimu BRIDGE do zátěže 8 Ohm: 1 x 600 W RMS; Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz; Harmonické zkreslení: < 0.5 %; Vstupní citlivost: přepínatelná – 0,755 V nebo 1,4 V; Odstup signálu od šumu: > 100 dB; Indikátory: přítomnost signálu / clipping / chybové hlášení; Signálové konektory: 2 x XLR vstup, 2x RCA vstup Konektory výstupu zesilovače: speak; Aktivní nucené chlazení Výška: 2U	kus	- 1,0	7 500,00	- 7 500,00
----	---------	---	-----	-------	----------	------------

Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:

-

Poznámka k položce:

2x300W 4 Ohm Počet kanálů: 2 Výstupní výkon do zátěže 4 Ohm: 2 x 300 W RMS; Výstupní výkon do zátěže 8 Ohm: 2 x 200 W RMS; Výstupní výkon v režimu BRIDGE do zátěže 8 Ohm: 1 x 600 W RMS; Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz; Harmonické zkreslení: < 0.5 %; Vstupní citlivost: přepínatelná – 0,755 V nebo 1,4 V; Odstup signálu od šumu: > 100 dB; Indikátory: přítomnost signálu / clipping / chybové hlášení; Signálové konektory: 2 x XLR vstup, 2x RCA vstup Konektory výstupu zesilovače: speak; Aktivní nucené chlazení Výška: 2U

-2; výměra položky



- 2,000

Skutečné množství: 1

1,000

1 142.	VPOZV01	AV skříňka - volně stojící uzamykatelná Rack skříňka, nábytkové provedení, 800x600x400	kus	1,0	8 550,00	8 550,00
1 143.	VPOZV02	4K LCD 65" (147x83 cm) Samsung QE65Q60T	kus	1,0	25 200,00	25 200,00
1 144.	VPOZV03	nástěnný držák LCD	kus	1,0	1 200,00	1 200,00
1 145.	VPOZV04	HDM příp. panýlek	kus	1,0	1 680,00	1 680,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL038	Název rozpočtu Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	79 329,45 Kč
		DPH	16 659,18 Kč
		DPH 21%	16 659,18 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	95 988,64 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL038: Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL038: Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů	79 329,45	16 659,18	95 988,64
NAKL01: Uznatelné náklady	79 329,45	16 659,18	95 988,64
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 513,69	527,87	3 041,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 513,69	527,87	3 041,56
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 513,69	527,87	3 041,56
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 513,69	527,87	3 041,56
VRN3: Zařízení staveniště	2 334,70	490,29	2 824,98
VRN4: Inženýrská činnost	178,99	37,59	216,58
01: D1 - Budova - stavební a statická část	76 815,76	16 131,31	92 947,07
01: D1 - Budova - stavební a statická část	76 815,76	16 131,31	92 947,07
01: D1 - Budova - stavební a statická část	76 815,76	16 131,31	92 947,07
HSV: Práce a dodávky HSV	75 476,55	15 850,07	91 326,62
3: Svislé a kompletní konstrukce	14 169,95	2 975,69	17 145,64
61: Úprava povrchů vnitřní	16 921,21	3 553,45	20 474,66
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 432,42	510,81	2 943,22
94: Lešení a stavební výtahy	137,30	28,83	166,13
96: Bourání konstrukcí	9 591,02	2 014,11	11 605,13
997: Přesun sutě	23 303,18	4 893,67	28 196,84
998: Přesun hmot	8 921,48	1 873,51	10 794,99
PSV: Práce a dodávky PSV	1 339,22	281,24	1 620,45
767: Konstrukce zámečnické	1 339,22	281,24	1 620,45
Celkem (bez DPH)	79 329,45		
DPH		16 659,18	
DPH 21 % ze základny: 79 329		16 659,18	
Celkem (včetně DPH)			95 988,64

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL038: Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL038: Opravy kleneb, přesun dveří a niky rozvaděčů						79 329,45
NAKL01: Uznatelné náklady						79 329,45
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 513,69
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 513,69
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 513,69
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 513,69
VRN3: Zařízení staveniště						2 334,70
2.	031002000	Souvisující práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	76 815,76	1 058,40
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezisklady materiálu.	Celek	0,01	76 815,76	789,91
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,010		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	76 815,76	486,39
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						178,99
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	76 815,76	116,73
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	76 815,76	62,26
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
01: D1 - Budova - stavební a statická část						76 815,76
01: D1 - Budova - stavební a statická část						76 815,76
01: D1 - Budova - stavební a statická část						76 815,76
HSV: Práce a dodávky HSV						75 476,55
3: Svislé a kompletní konstrukce						14 169,95
47.	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	14,0	295,47	4 136,54
Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče				-		
1.NP:				-		
EL-R1D; 1				1,000		
ÚT-RS1.2; 1				1,000		
EL-R1; 1				1,000		
2.NP:				-		
ÚT-RS2.3; 1				1,000		
ÚT-RS2.4; 1				1,000		
D1-MaR-B21; 1				1,000		
ÚT-RS2.1; 1				1,000		
ÚT-RS2.2; 1				1,000		
EL-R2; 1				1,000		
3.NP:				-		
ÚT-RS3.3; 1				1,000		
ÚT-RS3.4; 1				1,000		
EL-R3; 1				1,000		
ÚT-RS3.1; 1				1,000		
ÚT-RS3.2; 1				1,000		
48.	593211070	překlad železobetonový RZP 149x14x21,5 cm	kus	8,0	610,06	4 880,51
Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče				-		
2.NP:				-		
ÚT-RS2.3; 1				1,000		
ÚT-RS2.4; 1				1,000		
ÚT-RS2.1; 1				1,000		
ÚT-RS2.2; 1				1,000		
EL-R2; 1				1,000		
3.NP:				-		
ÚT-RS3.3; 1				1,000		
ÚT-RS3.1; 1				1,000		
ÚT-RS3.2; 1				1,000		
54.	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	1,0	273,74	273,74
Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče				-		
1.NP:				-		
ÚT-RS-PDL2;1				1,000		
58.	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou Poznámka k položce: Začištění u vybouraných zdí a otvorů.	m2	6,565	251,52	1 651,33

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		2.NP:		-		
		ÚT-RS2.4; 1,13*0,83		0,938		
		ÚT-RS2.1; 1,13*0,83		0,938		
		ÚT-RS2.2; 1,13*0,83*3		2,814		
		ÚT-RS3.1; 1,13*0,83		0,938		
		ÚT-RS3.2; 1,13*0,83		0,938		
1010.	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	387,60	775,20
		Výkaz výměr: Vybourání cihelného zdiva v oblouku klenby		-		
		1.NP zazdívka otvorů po I100; 2		2,000		
1016.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	0,116	5 700,00	659,32
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		1.NP:		-		
		EL-R1D; 0,92*0,14*0,03		0,004		
		ÚT-RS1.2; 1,52*0,14*0,03		0,006		
		EL-R1; 0,92*0,21*0,03		0,006		
		ÚT-RS-PDL2; 1,27*0,15*0,03		0,006		
		2.NP:		-		
		ÚT-RS2.3; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		ÚT-RS2.4; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		D1-MaR-B21; 1,22*0,14*0,03		0,005		
		ÚT-RS2.1; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		ÚT-RS2.2; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		EL-R2; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		3.NP:		-		
		ÚT-RS3.3; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		ÚT-RS3.4; 1,52*0,14*0,03		0,006		
		EL-R3; 0,92*0,21*0,03		0,006		
		ÚT-RS3.1; 1,52*0,21*0,03		0,010		
		ÚT-RS3.2; 1,52*0,21*0,03		0,010		
1091.	5932107R	překlad železobetonový RZP 890x140x140mm - Nová R-položka	kus	2,0	219,00	438,00
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		1.NP:		-		
		EL-R1D; 1		1,000		
		EL-R1; 1		1,000		
1092.	59321071	překlad železobetonový RZP 1490x140x140mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	345,80	691,60
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		1.NP:		-		
		ÚT-RS1.2; 1		1,000		
		3.NP:		-		
		ÚT-RS3.4; 1		1,000		
1093.	59321070	překlad železobetonový RZP 1190x140x140mm - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	1,0	277,40	277,40
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		2.NP:		-		
		D1-MaR-B21; 1		1,000		
1094.	5932110R	překlad železobetonový RZP 890x140x215mm - Nová R-položka	kus	1,0	386,30	386,30
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		3.NP:		-		
		EL-R3; 1		1,000		
		61: Úprava povrchů vnitřní				16 921,21
153.	61281101R	Jádrová vápenná omítka stěn + tenkovrstvá renovační omítka na bázi vápna, bílého cementu s -organickými přísadami a armovacími vlákny	m2	11,66	544,70	6 351,20
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče		-		
		1.NP:		-		
		EL-R1D; (0,6+1,03)*2*0,2		0,652		
		ÚT-RS1.2; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		EL-R1; ((0,6+1,4)*2*0,2)		0,800		
		ÚT-RS-PDL2; ((0,85+0,8)*2*0,2)		0,660		
		2.NP:		-		
		ÚT-RS2.3; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		ÚT-RS2.4; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		D1-MaR-B21; ((0,64+0,57)*2*0,2)		0,484		
		ÚT-RS2.1; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		ÚT-RS2.2; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		EL-R2; ((1,03+2,03)*2*0,2)		1,224		
		3.NP:		-		
		ÚT-RS3.3; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		ÚT-RS3.4; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		EL-R3; ((0,6+1,9)*2*0,2)		1,000		
		ÚT-RS3.1; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
		ÚT-RS3.2; ((1,1+0,8)*2*0,2)		0,760		
1084.	612131100	Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	31,705	74,86	2 373,42
		Výkaz výměr: Oprava kleneb vápennou maltou, geotextilií a zásypem		-		
		4,767*1,37+0,797*1,053+2,435*5,716+0,595*2,144+0,817*2,91+4,533*1,277 +0,89*1,095		31,705		
1085.	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	5,531	1 482,00	8 196,58
		Výkaz výměr: Oprava kleneb vápennou maltou, geotextilií a zásypem		-		
		10,16/1,837		5,531		



9: Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 432,42

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
35.	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	37,649	42,73	1 608,62
		Výkaz výměr: Oprava kleneb vápennou maltou, geotextilií a zásypem 2,569*2,314+4,767*1,37+0,797*1,053+2,435*5,716+0,595*2,144+0,817*2,91 +4,533*1,277+0,89*1,095		- 37,649		
1 083.	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	0,672	1 225,50	823,79
		Výkaz výměr: Vybourání cihelného zdiva v oblouku klenby (2,2*0,67+(2,2*(1,367-0,67)/2))*0,3		- 0,672		
		94: Lešení a stavební výtahy				137,30
185.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,2	62,41	137,30
		Výkaz výměr: Vybourání cihelného zdiva v oblouku klenby 2,2*1,0		- 2,200		
		96: Bourání konstrukcí				9 591,02
258.	968024551	Vybourání kamenných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	- 1,8	256,05	- 460,89
		Výkaz výměr: "st. schodiště půda" 0,9*2,0 -1,8; výměra položky		- 1,800		
270.	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,607	1 464,47	3 817,28
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče 1.NP: EL-R1D; 0,63*1,06*0,215 ÚT-RS1.2; 1,13*0,83*0,215 EL-R1; 0,63*1,43*0,215 ÚT-RS-PDL2; 0,88*0,83*0,215 2.NP: ÚT-RS2.3; 1,13*0,83*0,215 ÚT-RS2.4; 1,13*0,83*0,25 D1-MaR-B21; 0,67*0,6*0,215 ÚT-RS2.1; 1,13*0,83*0,25 ÚT-RS2.2; 1,13*0,83*0,3 3.NP: ÚT-RS3.3; 1,13*0,83*0,215 ÚT-RS3.4; 1,13*0,83*0,215 ÚT-RS3.1; 1,13*0,83*0,25 ÚT-RS3.2; 1,13*0,83*0,25		- - 0,144 0,202 0,194 0,157 - 0,202 0,234 0,086 0,234 0,281 - 0,202 0,202 0,234 0,234		
273.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,731	933,10	682,00
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče 2.NP: EL-R2; 1,06*2,06*0,215 3.NP: EL-R3; 0,63*1,93*0,215		- - 0,469 - 0,261		
281.	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	20,45	271,52	5 552,63
		Výkaz výměr: Niky pro rozvaděče 1.NP: EL-R1D; 0,92 ÚT-RS1.2; 1,52 EL-R1; 0,92 ÚT-RS-PDL2; 1,27 2.NP: ÚT-RS2.3; 1,52 ÚT-RS2.4; 1,52 D1-MaR-B21; 1,22 ÚT-RS2.1; 1,52 ÚT-RS2.2; 1,52 EL-R2; 1,52 3.NP: ÚT-RS3.3; 1,52 ÚT-RS3.4; 1,52 EL-R3; 0,92 ÚT-RS3.1; 1,52 ÚT-RS3.2; 1,52		- - 0,920 1,520 0,920 1,270 - 1,520 1,520 1,220 1,520 1,520 1,520 - 1,520 1,520 0,920 1,520 1,520		
		997: Přesun sutě				23 303,18
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	8,126	2 306,48	18 742,44
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,126	116,81	949,21
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,654	5,00	1 177,10
		Výkaz výměr: 8,126*29		235,654		
310.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	8,126	299,59	2 434,43
		998: Přesun hmot				8 921,48
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	12,599	708,11	8 921,48
		PSV: Práce a dodávky PSV				1 339,22
		767: Konstrukce zámečnické				1 339,22
634.	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg Poznámka k položce: Bude zpětně namontováno na fasádu.	kg	41,7	32,12	1 339,22
		Výkaz výměr: Vybourání cihelného zdiva v oblouku klenby 2xI100; 2,5*8,34*2		- 41,700		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	 
Označení rozpočtu ZL039	Název rozpočtu Doplnění jádrového vrtání	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	42 385,80 Kč
		DPH	8 901,02 Kč
		DPH 21%	8 901,02 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	51 286,81 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL039: Doplnění jádrového vrtání

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL039: Doplnění jádrového vrtání	42 385,80	8 901,02	51 286,81
NAKL01: Uznatelné náklady	49 952,77	10 490,08	60 442,85
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 467,65	308,21	1 775,85
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 467,65	308,21	1 775,85
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 467,65	308,21	1 775,85
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 467,65	308,21	1 775,85
VRN3: Zařízení staveniště	1 363,14	286,26	1 649,40
VRN4: Inženýrská činnost	104,51	21,95	126,45
01: D1 - Budova - stavební a statická část	99 712,10	20 939,54	120 651,64
01: D1 - Budova - stavební a statická část	99 712,10	20 939,54	120 651,64
01: D1 - Budova - stavební a statická část	99 712,10	20 939,54	120 651,64
HSV: Práce a dodávky HSV	99 712,10	20 939,54	120 651,64
96: Bourání konstrukcí	99 685,19	20 933,89	120 619,09
998: Přesun hmot	26,91	5,65	32,56
02: D1 - Budova - profese TZB	- 51 226,98	- 10 757,67	- 61 984,65
001: Zdravotní technika	- 14 360,60	- 3 015,73	- 17 376,32
001: Zdravotní technika	- 14 360,60	- 3 015,73	- 17 376,32
HSV: Práce a dodávky HSV	- 14 360,60	- 3 015,73	- 17 376,32
97: Prorážení otvorů	- 14 360,60	- 3 015,73	- 17 376,32
005: Elektroinstalace, bleskosvody	- 12 745,98	- 2 676,66	- 15 422,64
005: Elektroinstalace, bleskosvody	- 12 745,98	- 2 676,66	- 15 422,64
A2: Elektroinstalace - dodávka	- 12 745,98	- 2 676,66	- 15 422,64
EL-590: Zemní práce	- 12 745,98	- 2 676,66	- 15 422,64
007: Elektronická požární signalizace	- 24 120,41	- 5 065,29	- 29 185,69
007: Elektronická požární signalizace	- 24 120,41	- 5 065,29	- 29 185,69
2: EPS montáž	- 24 120,41	- 5 065,29	- 29 185,69
EPS25: Ostatní	- 24 120,41	- 5 065,29	- 29 185,69
NAKL02: Neuznatelné náklady	- 7 566,97	- 1 589,06	- 9 156,04
03.: D1 - Profese TZB	- 7 566,97	- 1 589,06	- 9 156,04
002.: Slaboproudé rozvody	- 7 566,97	- 1 589,06	- 9 156,04
.0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)	- 7 566,97	- 1 589,06	- 9 156,04
.PSV: Práce a dodávky PSV	- 7 566,97	- 1 589,06	- 9 156,04
0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)	- 7 566,97	- 1 589,06	- 9 156,04
Celkem (bez DPH)	42 385,80		
DPH	8 901,02		
DPH 21 % ze základny: 42 386		8 901,02	
Celkem (včetně DPH)	51 286,81		

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



Rozpočet: ZL039: Doplnění jádrového vrtání

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL039: Doplnění jádrového vrtání						42 385,80
NAKL01: Uznatelné náklady						49 952,77
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 467,65
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 467,65
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 467,65
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 467,65
VRN3: Zařízení stavenišť						1 363,14
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	44 849,81	617,96
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	44 849,81	461,20
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,010		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	44 849,81	283,99
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						104,51
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	44 849,81	68,16
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	44 849,81	36,35
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
01: D1 - Budova - stavební a statická část						99 712,10
01: D1 - Budova - stavební a statická část						99 712,10
01: D1 - Budova - stavební a statická část						99 712,10
HSV: Práce a dodávky HSV						99 712,10
96: Bourání konstrukcí						99 685,19
283.	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,87	7 008,00	6 096,96
Výkaz výměr: Množství v SoD; -6,4				- 6,400		
Skutečné množství; 7,27				7,270		
284.	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	34,0	2 665,64	90 631,83
Výkaz výměr: Množství v SoD; -2,7				- 2,700		
Skutečné množství; 36,7				36,700		
285.	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	-	3 033,26	-
Výkaz výměr: Množství v SoD; -16,8-7,8				- 24,600		
Skutečné množství; 24,6				24,600		
286.	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,56	5 279,30	2 956,41
Výkaz výměr: Množství v SoD; -15				- 15,000		
Skutečné množství; 15,56				15,560		
287.	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	m	-	6 282,11	-
Výkaz výměr: Množství v SoD; -6,5				- 6,500		
Skutečné množství; 6,5				6,500		
288.	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	-	8 067,09	-
Výkaz výměr: Množství v SoD; -2,4				- 2,400		
Skutečné množství; 2,4				2,400		
998: Přesun hmot						26,91
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,038	708,11	26,91
02: D1 - Budova - profese TZB						- 51 226,98
001: Zdravotní technika						- 14 360,60
001: Zdravotní technika						- 14 360,60
HSV: Práce a dodávky HSV						- 14 360,60
97: Prorážení otvorů						- 14 360,60
38.	971029481R00	Vybourání otvoru zeď kam. pl. 0,16m2, tl. 90cm, MC	kus	- 2,0	1 494,83	- 2 989,66
39.	971024461R00	Vybourání otvoru zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 60cm, MVC	kus	- 17,0	668,88	- 11 370,93

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		005: Elektroinstalace, bleskosvody				- 12 745,98
		005: Elektroinstalace, bleskosvody				- 12 745,98
		A2: Elektroinstalace - dodávka				- 12 745,98
		EL-590: Zemní práce				- 12 745,98
265.	EL-593	Drobné stavební práce (bourání prostupů a pod.)	hod	- 30,0	424,87	- 12 745,98
		007: Elektronická požární signalizace				- 24 120,41
		007: Elektronická požární signalizace				- 24 120,41
		2: EPS montáž				- 24 120,41
		EPS25: Ostatní				- 24 120,41
90.	EPS 127	Průvrt stěnou o průměru do 250 mm	ks	- 76,0	164,50	- 12 501,95
91.	EPS 128	Průvrt stěnou o průměru do 450 mm	ks	- 31,0	273,44	- 8 476,62
92.	EPS 129	Průvrt stropem o průměru do 450 mm	ks	- 7,0	448,83	- 3 141,83
		NAKL02: Neuznatelné náklady				- 7 566,97
		03.: D1 - Profese TZB				- 7 566,97
		002.: Slaboproudé rozvody				- 7 566,97
		.0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)				- 7 566,97
		.PSV: Práce a dodávky PSV				- 7 566,97
		0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)				- 7 566,97
21.	SL-UKS-021	průraz do 250mm	ks	- 46,0	164,50	- 7 566,97

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL040-	Název rozpočtu Změna typu svítidel - odpočet	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-635 761,90 Kč
		DPH	-133 510,00 Kč
		DPH 21%	-133 510,00 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-769 271,90 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL040-: Změna typu svítidel - odpočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL040-: Změna typu svítidel - odpočet	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
NAKL01: Uznatelné náklady	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
02: D1 - Budova - profese TZB	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
005: Elektroinstalace, bleskosvody	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
005: Elektroinstalace, bleskosvody	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
A2: Elektroinstalace - dodávka	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
_D13: Svítidla	- 635 761,90	- 133 510,00	- 769 271,90
Celkem (bez DPH)	- 635 761,90		
DPH	- 133 510,00		
DPH 21 % ze základny: -635 762	- 133 510,00		
Celkem (včetně DPH)	- 769 271,90		


Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL040:- Změna typu svítidel - odpočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL040:- Změna typu svítidel - odpočet				- 635 761,90
		NAKL01: Uznatelné náklady				- 635 761,90
		02: D1 - Budova - profese TZB				- 635 761,90
		005: Elektroinstalace, bleskosvody				- 635 761,90
		005: Elektroinstalace, bleskosvody				- 635 761,90
		A2: Elektroinstalace - dodávka				- 635 761,90
		D13: Svítidla				- 635 761,90
153.	EL-470	A Nástěnné svítidlo 230V, E27, 18W, IP20,	ks	- 109,0	303,07	- 33 034,75
154.	EL-471	B Svítidlo 230V, G23, 11W, IP20,	ks	- 13,0	170,48	- 2 216,24
155.	EL-472	C Průmyslové liniové LED svítidlo	ks	- 4,0	635,28	- 2 541,13
159.	EL-476	G Závěsné/přisazené LED svítidlo 230V, 42W, IP20, 4000K, 4900lm	ks	- 3,0	1 253,08	- 3 759,25
160.	EL-477	H Nástěnné svítidlo 230V, 70W, IP20, 5700lm	ks	- 7,0	5 630,13	- 39 410,90
161.	EL-478	I Zavěšené/přisazené LED svítidlo 230V, 27W, IP20, 4000K, 2684lm	ks	- 2,0	1 183,88	- 2 367,77
162.	EL-479	J Svítidlo 230V, 29W, IP20, 3000K, 3400lm	ks	- 33,0	1 194,80	- 39 428,38
163.	EL-480	K Vestavné LED svítidlo 230V, 28W, IP20, 4000K, 3100lm	ks	- 1,0	1 296,80	- 1 296,80
164.	EL-481	L Svítidlo LED 230V, 16W, IP20, 4000K, 1960lm	ks	- 50,0	852,39	- 42 619,51
165.	EL-482	L Svítidlo 230V žárovkové, 230V, IP20, (místnost muzikoterapie)	ks	- 15,0	303,07	- 4 546,07
168.	EL-485	O Vestavné led svítidlo 230V, 39W, IP20, 4000K, 3900lm	ks	- 3,0	1 253,08	- 3 759,25
170.	EL-487	Q Svítidlo žárovkové nástěnné 230V, 40W, IP20	ks	- 8,0	303,07	- 2 424,57
171.	EL-488	K Svítidlo zářivkové průmyslové 2x36W, IP44, 230V, EP	ks	- 10,0	615,13	- 6 151,30
172.	EL-489	Bodová svítidla do podhledu 230V, IP20	ks	- 3,0	498,32	- 1 494,97
173.	EL-490	Svítidlo venkovní	ks	- 3,0	1 897,11	- 5 691,34
174.	EL-491	LED pásky	m	- 80,0	408,53	- 32 682,00
175.	EL-492	LED podvícení informačních cedulí	ks	- 85,0	301,91	- 25 661,96
177.	EL-494	Nouzové LED svítidlo vestavné, adresné, 230V	ks	- 95,0	1 988,16	- 188 874,73
178.	EL-495	Nouzové LED svítidlo dekorativní, adresné, 230V	ks	- 61,0	1 423,03	- 86 804,75
179.	EL-496	Nouzové LED svítidlo s piktogramem, adresné, 230V	ks	- 78,0	1 423,03	- 110 996,24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
200 930	Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL040+	Změna typu svítidel - přípočet	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">1 335 389,04 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">280 431,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">280 431,70 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1 615 820,73 Kč</td> </tr> </table>	Celkem (bez DPH)	1 335 389,04 Kč	DPH	280 431,70 Kč	DPH 21%	280 431,70 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	1 615 820,73 Kč
Celkem (bez DPH)	1 335 389,04 Kč											
DPH	280 431,70 Kč											
DPH 21%	280 431,70 Kč											
DPH 15%	0,00 Kč											
Cena celkem (včetně DPH)	1 615 820,73 Kč											
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>											

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL040+: Změna typu svítidel - přípočet

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL040+: Změna typu svítidel - přípočet	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
NAKL01: Uznatelné náklady	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
02: D1 - Budova - profese TZB	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
005: Elektroinstalace, bleskosvody	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
005: Elektroinstalace, bleskosvody	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
A2: Elektroinstalace - dodávka	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
_D13: Svítidla	1 335 389,04	280 431,70	1 615 820,73
Celkem (bez DPH)	1 335 389,04		
DPH	280 431,70		
DPH 21 % ze základny: 1 335 389	280 431,70		
Celkem (včetně DPH)	1 615 820,73		



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL040+: Změna typu svítidel - přípočet

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL040+: Změna typu svítidel - přípočet						1 335 389,04
NAKL01: Uznatelné náklady						1 335 389,04
02: D1 - Budova - profese TZB						1 335 389,04
005: Elektroinstalace, bleskosvody						1 335 389,04
005: Elektroinstalace, bleskosvody						1 335 389,04
A2: Elektroinstalace - dodávka						1 335 389,04
_D13: Svítidla						1 335 389,04
156.	EL-473	D Svítidlo 230V, 29W, IP20, 3000K, 3300lm	ks	13,0	1 049,09	13 638,20
166.	EL-483	M Zářivkové svítidlo 230V, 2x18W, IP65, 4000K, 1800lm	ks	2,0	672,38	1 344,76
167.	EL-484	N Závěsné/přisazené LED svítidlo 230V, 42W, IP20, 4000K, 4150lm	ks	2,0	1 847,57	3 695,14
1 154.	EL-470.1	A1 - TOB 26 W WALL DIR/INDIR	ks	29,0	10 868,41	315 183,80
1 155.	EL-470.2	A2 - IN-22KN73/PC19	ks	89,0	1 362,17	121 233,49
1 156.	EL-470.3	A2 acc. - LEDPCLA100 10W/840 230V FIL E27 FS1OSRAM	ks	178,0	225,61	40 158,58
1 157.	EL-470.4	A3 - 40W, 4410lm, 1200x215x55mm	ks	2,0	1 052,70	2 105,40
1 159.	EL-471.1	B1 - TABLO LED N AS 4650lm I kl. IP20 1430x85 840 (35W)	ks	6,0	3 087,70	18 526,20
1 164.	EL-473.3	D3 - DWL 018U 40OD00 1K5 65 V.2 FLP	ks	2,0	2 062,50	4 125,00
1 167.	EL-475.2	F control - DALI ACU BT control	ks	2,0	3 283,72	6 567,44
1 169.	EL-477.1	H1 - TOB 26 W WALL DIR/INDIR	ks	3,0	10 868,41	32 605,22
1 170.	EL-477.2	H2 - IN-22KN73/PC19	ks	3,0	1 362,17	4 086,52
1 171.	EL-477.3	H2 acc. - LEDPCLA100 10W/840 230V FIL E27 FS1OSRAM	ks	6,0	225,61	1 353,66
1 175.	EL-479.1	J1 - CAMELEON MAXI 1 160.LED 840 3000lm CLEAR 60° RING 30W IP20 RAL9016 DRV PREMIUM	ks	27,0	2 149,15	58 026,97
1 177.	EL-479.3	J3 - DWL 018U 40OD00 1K5 65 V.2 FLP	ks	2,0	2 035,00	4 070,00
1 180.	EL-481.2	L2 - CAMELEON MAXI 1 160.LED 830 3000lm CLEAR 60° RING 30W IP20 RAL9016 DRV DIM DALI	ks	14,0	2 915,00	40 810,00
1 182.	EL-481.3	L4 - SIRIUS 280.LED 840 2250lm OPAL 24W IP54 DRV	ks	10,0	987,51	9 875,14
1 189.	EL-SV01	VO v.2 - AL-WL/1 E27 SCHWARZ/SW-TRANSP.'TAVERNA'	ks	-	1 364,00	-
1 190.	EL-SV02	VO v.2 acc. - LEDPCLA100 10W/827 230V FIL E27 FS1OSRAM	ks	-	225,61	-
1 191.	EL-SV03	LED - LED pásek 230V 15W/m, 1000mm, do profilu	ks	80,0	904,67	72 373,84
1 192.	EL-SV04	LED acc. - AL profil 17x15 mm, opalový difuzor, 1000mm	ks	80,0	262,59	21 007,36
1 193.	EL-SV05	LED - LED pásek 230V 7W/m, 1000mm, podsvícení tabulí, bez profilu	ks	85,0	740,19	62 916,15
1 194.	EL-SV06	NA - COBRA AL CAU2 CB220 1X3 TC VWD WH	ks	95,0	2 262,70	214 956,50
1 195.	EL-SV07	NB - LUMI LUN CB220 1x3 ASM bílá, nástěnná optika	ks	53,0	1 657,70	87 858,10
1 196.	EL-SV08	NB černá - LUMI LUN CB220 1X3 VWD, černá, stropní optika	ks	8,0	1 980,00	15 840,00
1 197.	EL-SV09	NC strop - VERSO LED VSN.VSN CB220 1,2, stropní montáž	ks	50,0	1 657,70	82 885,00
1 198.	EL-SV10	NC stěna - MONITOR1 IP40 LED.OP1-CB220 1,2, nástěnná montáž	ks	28,0	2 133,69	59 743,38
1 199.	REC01	Recyklační příspěvek svítidla >50cm	kpl	1,0	4 385,70	4 385,70
1 200.	REC02	Recyklační příspěvek sv. zdroje	kpl	1,0	1 017,50	1 017,50
1 201.	INZ01	Inženýring, vypracování nového projektu, výpočet osvětlení, tvorba nových světel.	kpl	1,0	35 000,00	35 000,00

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL041	Název rozpočtu Střecha - prostupové tašky a výlez	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	7 352,36 Kč
		DPH	1 544,00 Kč
		DPH 21%	1 544,00 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	8 896,36 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL041: Střecha - prostupové tašky a výlez

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL041: Střecha - prostupové tašky a výlez	7 352,36	1 544,00	8 896,36
NAKL01: Uznatelné náklady	7 352,36	1 544,00	8 896,36
01: D1 - Budova - stavební a statická část	7 352,36	1 544,00	8 896,36
01: D1 - Budova - stavební a statická část	7 352,36	1 544,00	8 896,36
01: D1 - Budova - stavební a statická část	7 352,36	1 544,00	8 896,36
HSV: Práce a dodávky HSV	- 2 356,37	- 494,84	- 2 851,21
950: Ostatní výrobky	- 2 356,37	- 494,84	- 2 851,21
PSV: Práce a dodávky PSV	9 708,73	2 038,83	11 747,57
765: Krytina skládaná	18 423,93	3 869,03	22 292,96
766-1: Výplně otvorů	- 8 715,20	- 1 830,19	- 10 545,39
Celkem (bez DPH)	7 352,36		
DPH	1 544,00		
DPH 21 % ze základny: 7 352		1 544,00	
Celkem (včetně DPH)			8 896,36



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL041: Střecha - prostupové tašky a výlez

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL041: Střecha - prostupové tašky a výlez				7 352,36
		NAKL01: Uznatelné náklady				7 352,36
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				7 352,36
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				7 352,36
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				7 352,36
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 2 356,37
		950: Ostatní výrobky				- 2 356,37
207.	95001-O34	O34 - Doplnková prostupová taška pro ocelové stojky žebříku (o38) a anténní stožáry, dodávka a - montáž	kus	- 1,0	2 356,37	- 2 356,37
		PSV: Práce a dodávky PSV				9 708,73
		765: Krytina skládaná				18 423,93
512.	765115012	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové maloformátové na sucho	kus	4,0	30,50	122,01
		Výkaz výměr: Množství v SoD; -5		- 5,000		
		Skutečné množství; 9		9,000		
515.	596605171	taška ražená rezná maloformátová prostupová DN do 125 mm	kus	4,0	4 575,48	18 301,92
		766-1: Výplně otvorů				- 8 715,20
629.	76610-083	ozn.83 - Střešní výlez z nevytápěného prostoru rozm.450x730 mm zasklený, dodávka a montáž	kus	- 1,0	8 715,20	- 8 715,20

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL042	Název rozpočtu Navýšení standardu vypínačů a zásuvek	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	12 587,03 Kč
		DPH	2 643,28 Kč
		DPH 21%	2 643,28 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	15 230,31 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL042: Navýšení standardu vypínačů a zásuvek

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL042: Navýšení standardu vypínačů a zásuvek	12 587,03	2 643,28	15 230,31
NAKL01: Uznatelné náklady	11 114,08	2 333,96	13 448,04
02: D1 - Budova - profese TZB	11 114,08	2 333,96	13 448,04
006: Slaboproudé rozvody	32,64	6,85	39,49
0001.: Evakuační rozhlas (EVAC)	32,64	6,85	39,49
PSV: Práce a dodávky PSV	32,64	6,85	39,49
742-1: Slaboproud - Evakuační rozhlas (EVAC)	32,64	6,85	39,49
009: Měření a regulace	11 081,44	2 327,10	13 408,54
009: Měření a regulace	11 081,44	2 327,10	13 408,54
A2: Elektroinstalace - dodávka	11 081,44	2 327,10	13 408,54
_D13: Svítidla	11 081,44	2 327,10	13 408,54
NAKL02: Neuznatelné náklady	1 472,95	309,32	1 782,27
03.: D1 - Profese TZB	1 472,95	309,32	1 782,27
002.: Slaboproudé rozvody	1 472,95	309,32	1 782,27
.0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)	1 472,95	309,32	1 782,27
.PSV: Práce a dodávky PSV	1 472,95	309,32	1 782,27
0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)	1 472,95	309,32	1 782,27
Celkem (bez DPH)	12 587,03		
DPH	2 643,28		
DPH 21 % ze základny: 12 587	2 643,28		
Celkem (včetně DPH)	15 230,31		



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL042: Navýšení standardu vypínačů a zásuvek

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL042: Navýšení standardu vypínačů a zásuvek				12 587,03
		NAKL01: Uznatelné náklady				11 114,08
		02: D1 - Budova - profese TZB				11 114,08
		006: Slaboproudé rozvody				32,64
		0001.: Evakuační rozhlas (EVAC)				32,64
		PSV: Práce a dodávky PSV				32,64
		742-1: Slaboproud - Evakuační rozhlas (EVAC)				32,64
27.	SL-EVAC-027P	Jednozásuvka 1xRJ45 kat.5e UTP, bílá - příplatek za navýšení standardu	ks	2,0	16,32	32,64
		009: Měření a regulace				11 081,44
		009: Měření a regulace				11 081,44
		A2: Elektroinstalace - dodávka				11 081,44
		_D13: Svítidla				11 081,44
181.	EL-499P	Zásuvka 2násobná s clonkami, 230V, 16A, IP40, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	232,0	18,14	4 208,48
182.	EL-500P	Zásuvka jednonásobná s clonkami, 230V, 16A, IP40, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	159,0	16,32	2 594,88
183.	EL-501P	Zásuvka dvojnásobná, 230V, 16A, IP40, vč. rámečku, s přepěť. ochr., s clonkami - příplatek za navýšení standardu	ks	64,0	18,14	1 160,96
184.	EL-502P	Zásuvka jednonásobná, 230V, 16A, IP44, montáž na povrch - příplatek za navýšení standardu	ks	8,0	16,32	130,56
186.	EL-505P	Vypínač, řazení 1, 230V, 10A, IP20, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	89,0	16,32	1 452,48
187.	EL-506P	Vypínač střídavý, řazení 6, 230V, 10A, IP20, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	28,0	16,32	456,96
188.	EL-507P	Vypínač seriový, řazení 5, 230V, 10A, IP20, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	46,0	16,32	750,72
189.	EL-508P	Vypínač křížový, řazení 7, 230V, 10A, IP20, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	9,0	16,32	146,88
190.	EL-509P	Vypínač dvojit střídavý, řazení 6+6, 230V, 10A, IP20, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	6,0	16,32	97,92
191.	EL-510P	Vypínač, řazení 1, 230V, 10A, IP44, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	2,0	16,32	32,64
192.	EL-511P	Vypínač střídavý, řazení 6, 230V, 10A, IP44, vč. rámečku - příplatek za navýšení standardu	ks	3,0	16,32	48,96
		NAKL02: Neuznatelné náklady				1 472,95
		03.: D1 - Profese TZB				1 472,95
		002.: Slaboproudé rozvody				1 472,95
		.0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)				1 472,95
		.PSV: Práce a dodávky PSV				1 472,95
		0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)				1 472,95
6.	SL-UKS-006P	Dvojjzásuvka 2xRJ45 kat.6A STP, bílá - příplatek za navýšení standardu	ks	83,0	16,37	1 358,71
7.	SL-UKS-007P	Jednozásuvka 1xRJ45 kat.6A STP, bílá - příplatek za navýšení standardu	ks	7,0	16,32	114,24

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL043	Název rozpočtu Revize a změna provedení oprav omítek severní strany	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	-93 992,88 Kč
		DPH	-19 738,51 Kč
		DPH 21%	-19 738,51 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	-113 731,39 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL043: Revize a změna provedení oprav omítek severní strany
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL043: Revize a změna provedení oprav omítek severní strany	- 93 992,88	- 19 738,51	- 113 731,39
NAKL01: Uznatelné náklady	- 2 978,32	- 625,45	- 3 603,77
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 2 978,32	- 625,45	- 3 603,77
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 2 978,32	- 625,45	- 3 603,77
00: Vedlejší a ostatní náklady	- 2 978,32	- 625,45	- 3 603,77
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	- 2 978,32	- 625,45	- 3 603,77
VRN3: Zařízení staveniště	- 2 766,25	- 580,91	- 3 347,16
VRN4: Inženýrská činnost	- 212,08	- 44,54	- 256,62
NAKL02: Neuznatelné náklady	- 91 014,56	- 19 113,06	- 110 127,62
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	- 91 014,56	- 19 113,06	- 110 127,62
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	- 91 014,56	- 19 113,06	- 110 127,62
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	- 91 014,56	- 19 113,06	- 110 127,62
HSV: Práce a dodávky HSV	- 158 843,33	- 33 357,10	- 192 200,43
62: Úprava povrchů vnějších	- 45 096,92	- 9 470,35	- 54 567,27
96: Bourání konstrukcí	- 52 503,21	- 11 025,67	- 63 528,88
997: Přesun sutě	- 61 148,78	- 12 841,24	- 73 990,02
998: Přesun hmot	- 94,43	- 19,83	- 114,26
PSV: Práce a dodávky PSV	67 828,77	14 244,04	82 072,82
783: Dokončovací práce - nátěry	67 828,77	14 244,04	82 072,82
Celkem (bez DPH)	- 93 992,88		
DPH	- 19 738,51		
DPH 21 % ze základny: -93 993	- 19 738,51		
Celkem (včetně DPH)			- 113 731,39




Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL043: Revize a změna provedení oprav omítek severní strany
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL043: Revize a změna provedení oprav omítek severní strany				- 93 992,88
		NAKL01: Uznatelné náklady				- 2 978,32
		00: Vedlejší a ostatní náklady				- 2 978,32
		00: Vedlejší a ostatní náklady				- 2 978,32
		00: Vedlejší a ostatní náklady				- 2 978,32
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				- 2 978,32
		VRN3: Zařízení staveniště				- 2 766,25
2.	031002000	Souvisující práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	- 91 014,56	- 1 254,03
		Výkaz výměr: 1360000/98705514,44		0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezisklady materiálu.	Celek	0,01	- 91 014,56	- 935,91
		Výkaz výměr: 1015000/98705514,44		0,01		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	- 91 014,56	- 576,30
		Výkaz výměr: 625000/98705514,44		0,006		
		VRN4: Inženýrská činnost				- 212,08
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	- 91 014,56	- 138,31
		Výkaz výměr: 150000/98705514,44		0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	- 91 014,56	- 73,77
		Výkaz výměr: 80000/98705514,44		0,001		
		NAKL02: Neuznatelné náklady				- 91 014,56
		01.: D1 - Budova - stavební a statická část				- 91 014,56
		01.: D1 - Budova - stavební a statická část				- 91 014,56
		01.: D1 - Budova - stavební a statická část				- 91 014,56
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 158 843,33
		62: Úprava povrchů vnějších				- 45 096,92
9.	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	29,612	571,44	16 921,53
		Výkaz výměr: Zateplení strany A4; 8,08*5,15-(4*1,5*2)		29,612		
10.	283759510	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 140mm Poznámka k položce: $\lambda_{m,0,039}$ [W / m K]	m2	31,685	189,56	6 006,04
		Výkaz výměr: Přepočteno koeficientem množství; 29,612*1,07		31,685		
11.	62225201A	Příplatek za montáž lišt kontaktního zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, začišťovacích - apod./	m2	29,612	145,50	4 308,55
12.	622325209.A	Oprava stávající vnější omítky stěn v ploše do 100% + tenkovrstvá renovační fasádní omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny v celé ploše vč. profílace Poznámka k položce: Výměry vypočteny počítačovým programem. Podrobný popis omítky viz. PD.	m2	- 421,786	391,63	- 165 184,30
		Výkaz výměr: Omítky severní strany (A,B,C) soudržné, opravy pouze z 20%. Štít D bylo nutné zrealizovat dle původního předpokladu.		-		
		Smluvní množství:		-		
		Pohled Severní		-		
		-(176,0+37,0+121,0+25,0+14,0+61,0)		- 434,000		
		-((2,1+2,15+2,1)*0,2*4)		- 5,080		
		Dostavba		-		
		pohl.V; -(90,0+20,0+(0,65+0,65+0,65)*0,2*4)		- 111,560		
		pohl.Z; -32,0		- 32,000		
		Skutečné množství:		-		
		Štít D; 59,32		59,320		
		Severní strana viz příloha č.1 (otlučení 20%); 507,67*0,2		101,534		
16.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	- 421,786	49,81	- 21 008,97
		Výkaz výměr: Omítky severní strany (A,B,C) soudržné, opravy pouze z 20%. Štít D bylo nutné zrealizovat dle původního předpokladu.		-		
		Smluvní množství:		-		
		Pohled Severní		-		
		-(176,0+37,0+121,0+25,0+14,0+61,0)		- 434,000		
		-((2,1+2,15+2,1)*0,2*4)		- 5,080		
		Dostavba		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		pohl.V; -(90,0+20,0+(0,65+0,65+0,65)*0,2*4)		- 111,560		
		pohl.Z; -32,0		- 32,000		
		Skutečné množství:		-		
		Štít D; 59,32		59,320		
		Severní strana viz příloha č.1 (otlučení 20%); 507,67*0,2		101,534		
1 151.	622325209.AR	Tenkovrstvá renovační fasádní omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny v celé ploše - Nová R-položka	m2	406,136	280,35	113 860,23
		Výkaz výměr: Omítky severní strany (A,B,C) soudržné, opravy pouze z 20%. Štít D bylo nutné zrealizovat dle původního předpokladu.		-		
		Skutečné množství:		-		
		Severní strana viz příloha č.1 (80%); 507,67*0,8		406,136		
		96: Bourání konstrukcí				- 52 503,21
43.	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	- 408,706	64,23	- 26 251,60
		Výkaz výměr: Omítky severní strany (A,B,C) soudržné, opravy pouze z 20%. Štít D bylo nutné zrealizovat dle původního předpokladu.		-		
		Smluvní množství:		-		
		Hlavní budova		-		
		"pohl.S"; -(174,0+32,0+121,0+24,0+14,0+61,0)		- 426,000		
		Dostavba		-		
		pohl.V; -(90,0+20,0+(0,65+0,65+0,65)*0,2*4)		- 111,560		
		pohl.Z; -32,0		- 32,000		
		Skutečné množství:		-		
		Štít D - proveden dle PD; 59,32		59,320		
		Severní strana viz příloha č.1 (otlučení 20%); 507,67*0,2		101,534		
44.	97801539A	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% -- příplatek za tl. omítky nad 15 mm	m2	- 408,706	64,23	- 26 251,60
		997: Přesun sutě				- 61 148,78
45.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	- 48,227	706,68	- 34 081,25
46.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 48,227	116,81	- 5 633,47
47.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 1 398,583	5,00	- 6 985,97
		Výkaz výměr: -48,227*29		- 1 398,583		
48.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	- 48,227	299,59	- 14 448,09
		998: Přesun hmot				- 94,43
49.	998017003_01	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	- 0,24	393,45	- 94,43
		PSV: Práce a dodávky PSV				67 828,77
		783: Dokončovací práce - nátěry				67 828,77
1 149.	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	406,136	95,00	38 582,92
		Výkaz výměr: Omítky severní strany (A,B,C) soudržné, opravy pouze z 20%. Štít D bylo nutné zrealizovat dle původního předpokladu.		-		
		Skutečné množství:		-		
		Severní strana viz příloha č.1 (80%); 507,67*0,8		406,136		
1 150.	783833153	Penetrační silikátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	406,136	72,01	29 245,85

Revize severní strany

Strana	výpočet	výměra	mj
A1	$15,845 \cdot 8,275$	131,117	m2
A2	$3,982 \cdot 8,275 / 2$	16,476	m2
A3	$5,983 \cdot 5,235$	31,321	m2
A4	$8,08 \cdot 5,15 - (2 \cdot 1,5 \cdot 4)$	29,612	m2
A5	$0,7 \cdot 5,09$	3,563	m2
A6	$0,65 \cdot 4,4$	2,860	m2
A7	$13,44 \cdot 7,48$	100,531	m2
A8	$2,9 \cdot 5,143$	14,915	m2
A9	$4,12 \cdot 5,14 / 2$	10,588	m2
A10	$(4,12 + 2,97) \cdot 0,462$	3,276	m2
A11	$5,69 \cdot 2,424$	13,793	m2
A12	$1,7 \cdot 2,424 / 2$	2,060	m2
A13	$4,708 \cdot 3,299$	15,532	m2
A14	$1,966 \cdot 3,299 / 2$	3,243	m2
B1	$9,358 \cdot 2,258$	21,130	m2
B2	$6,404 \cdot 0,85$	5,443	m2
B3	$0,65 \cdot 8,24$	5,356	m2
C1	$6,76 \cdot 3,9$	26,364	m2
C2	$9,344 \cdot 3,05 - (2,776 \cdot 2,33)$	22,031	m2
C3	$13,892 \cdot 2,776 - (0,65 \cdot 1,1 \cdot 2 + 0,6 \cdot 0,9)$	36,594	m2
C4	$0,85 \cdot 6,449$	5,482	m2
C5	$0,65 \cdot 9,82$	6,383	m2
Celkem		507,670	m2
štit D	proveden dle PD	59,320	m2
Celkem vč. D		566,990	m2

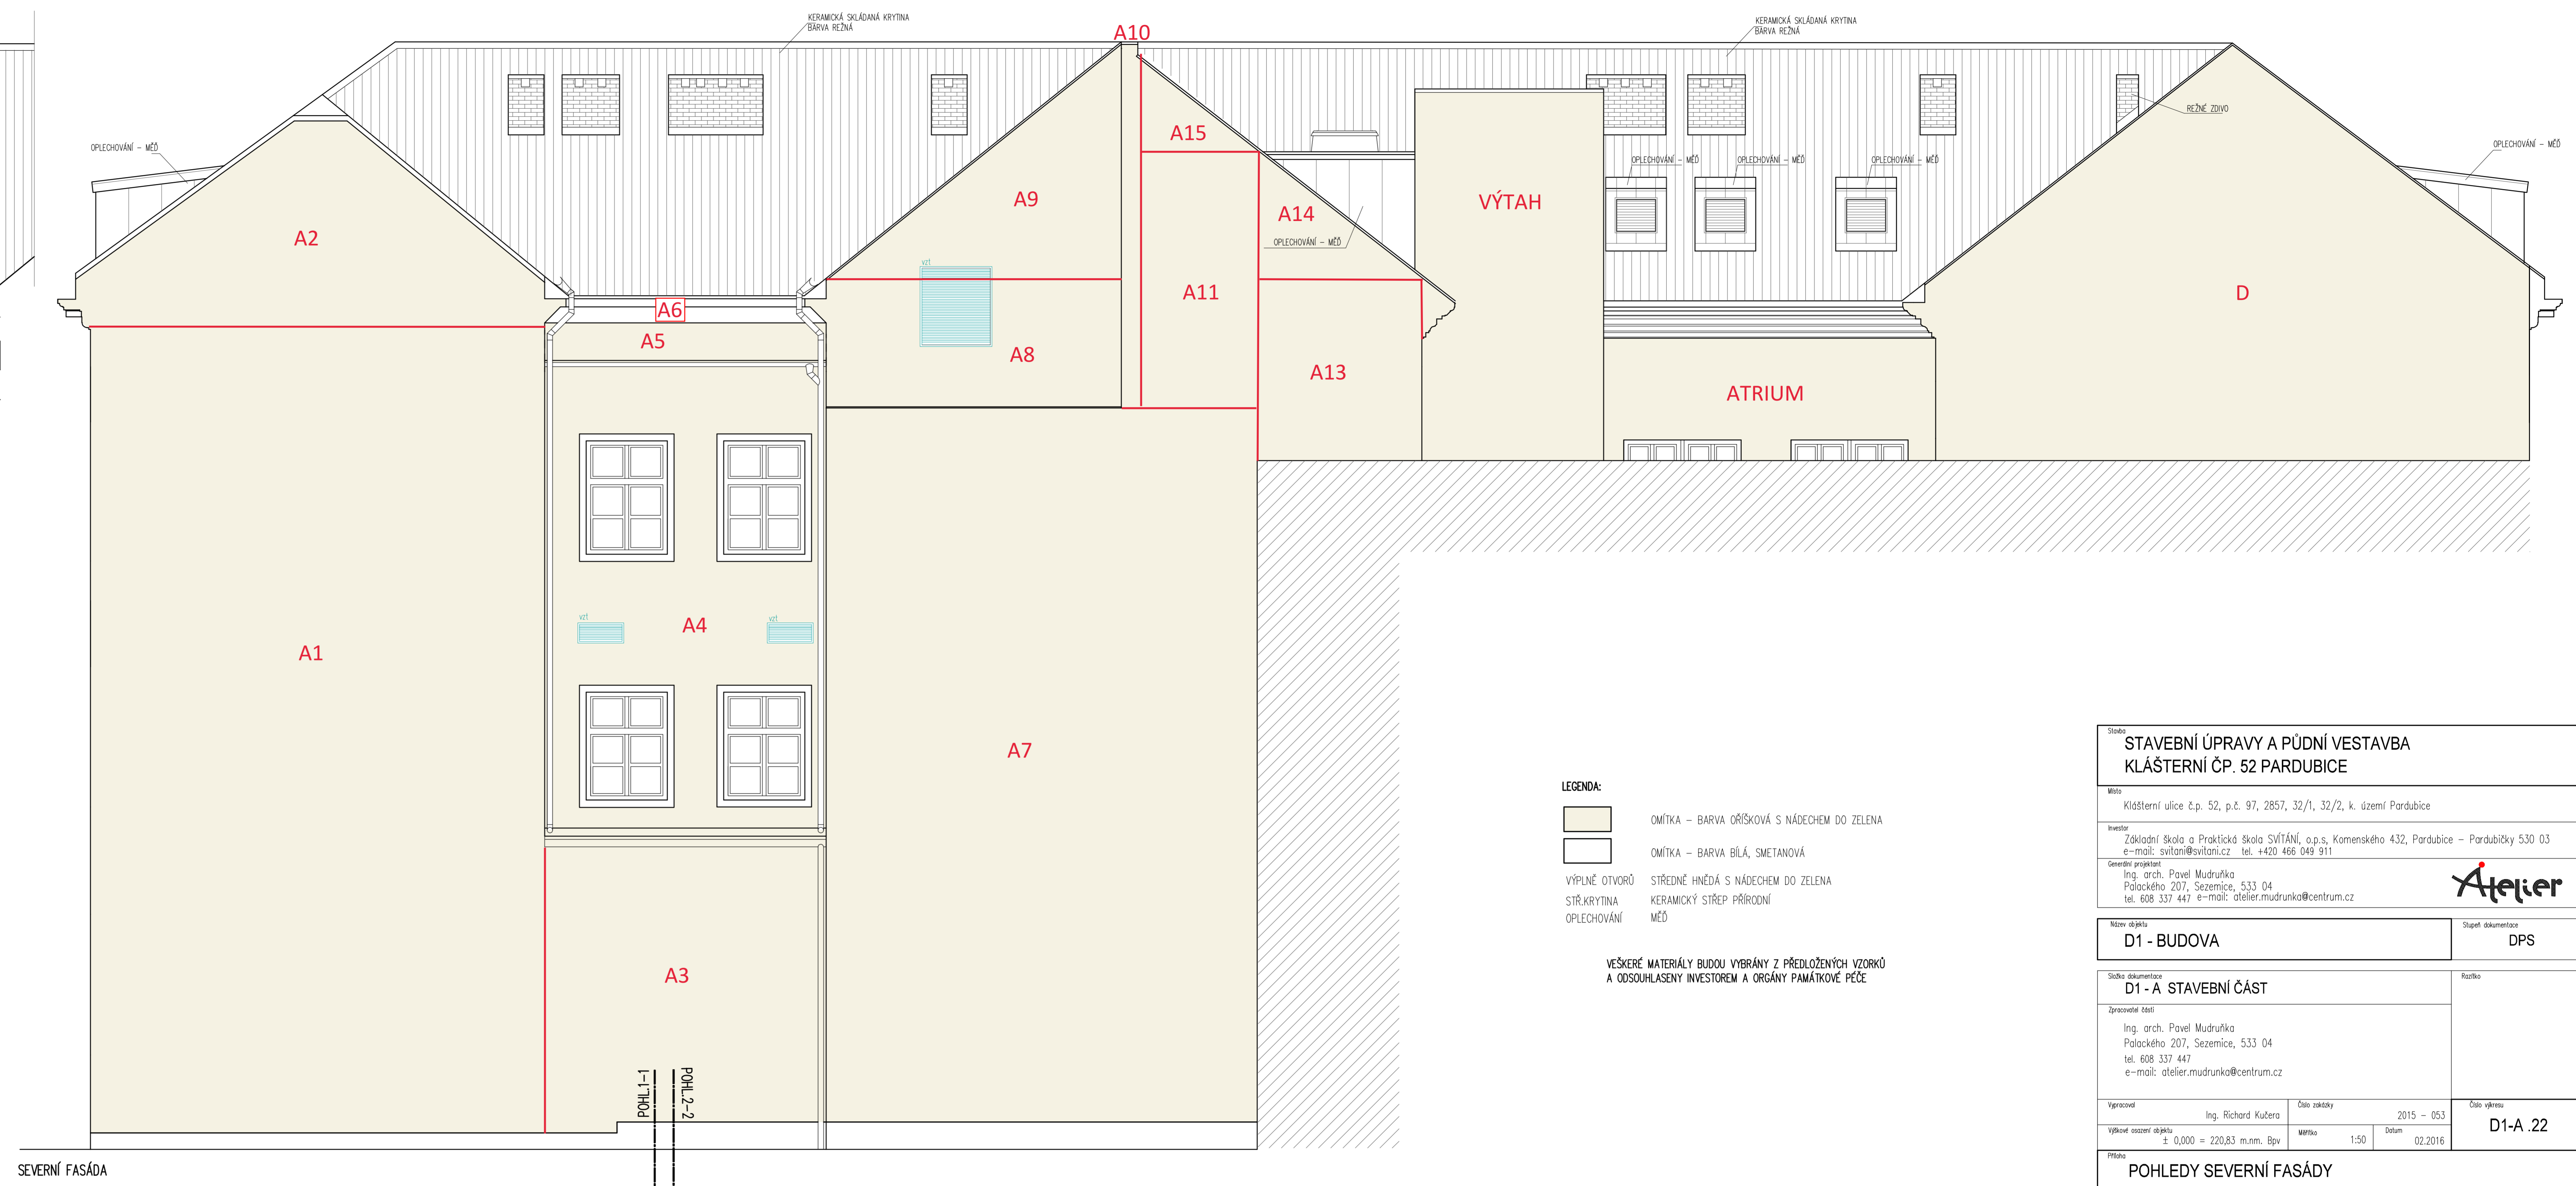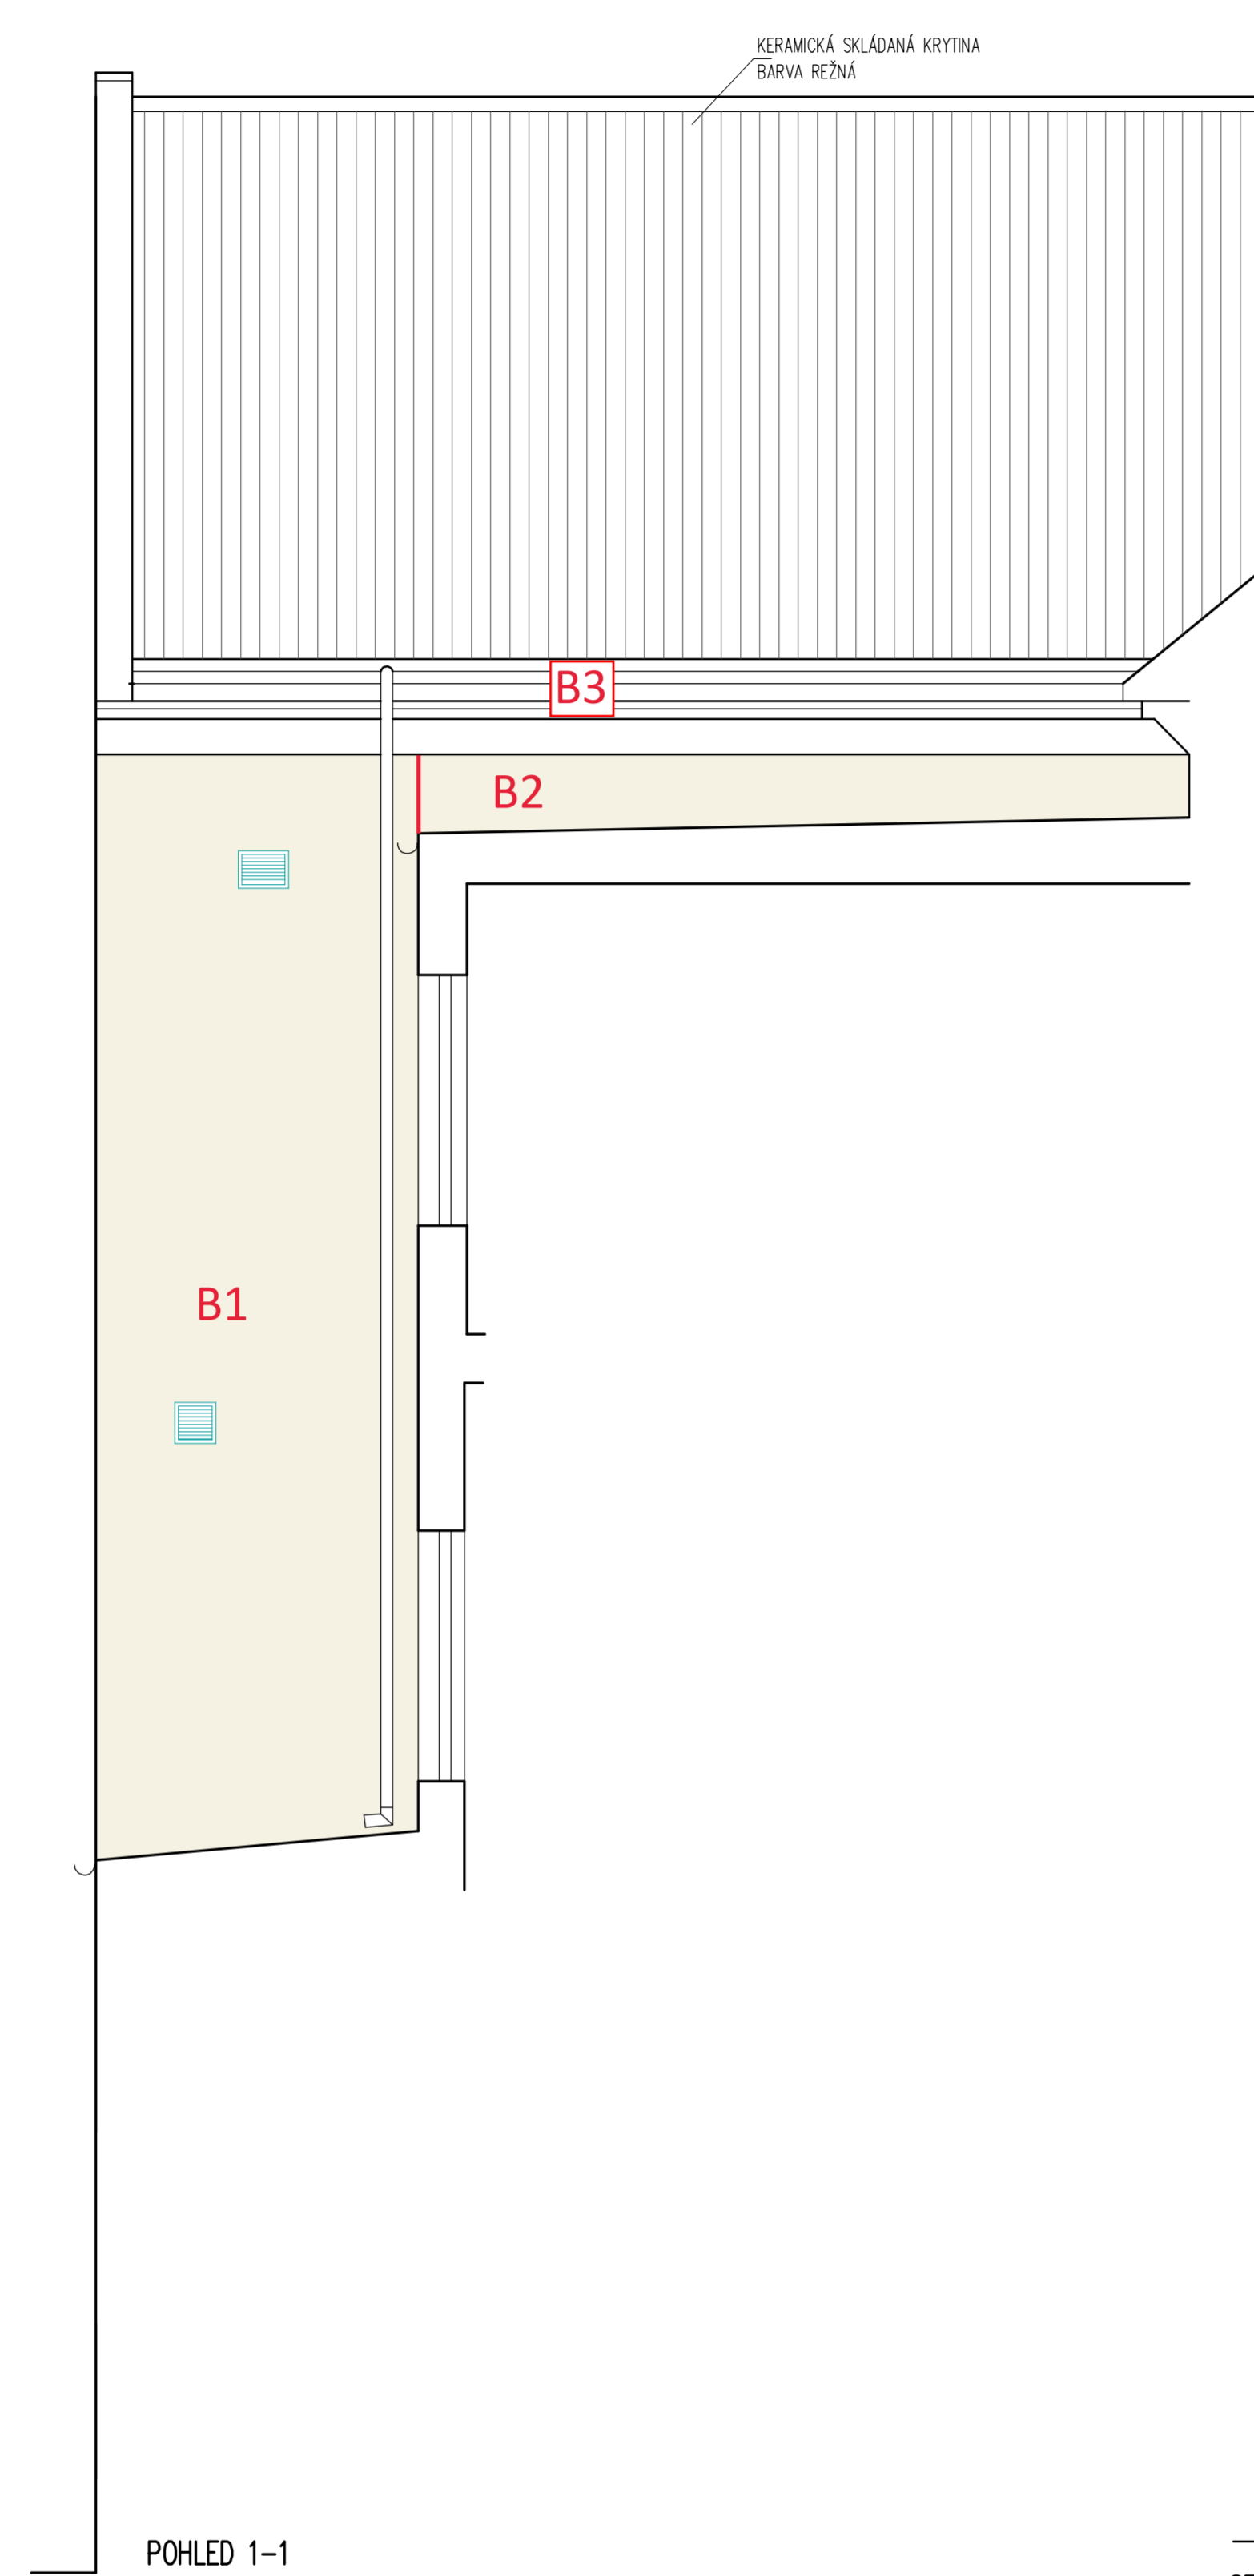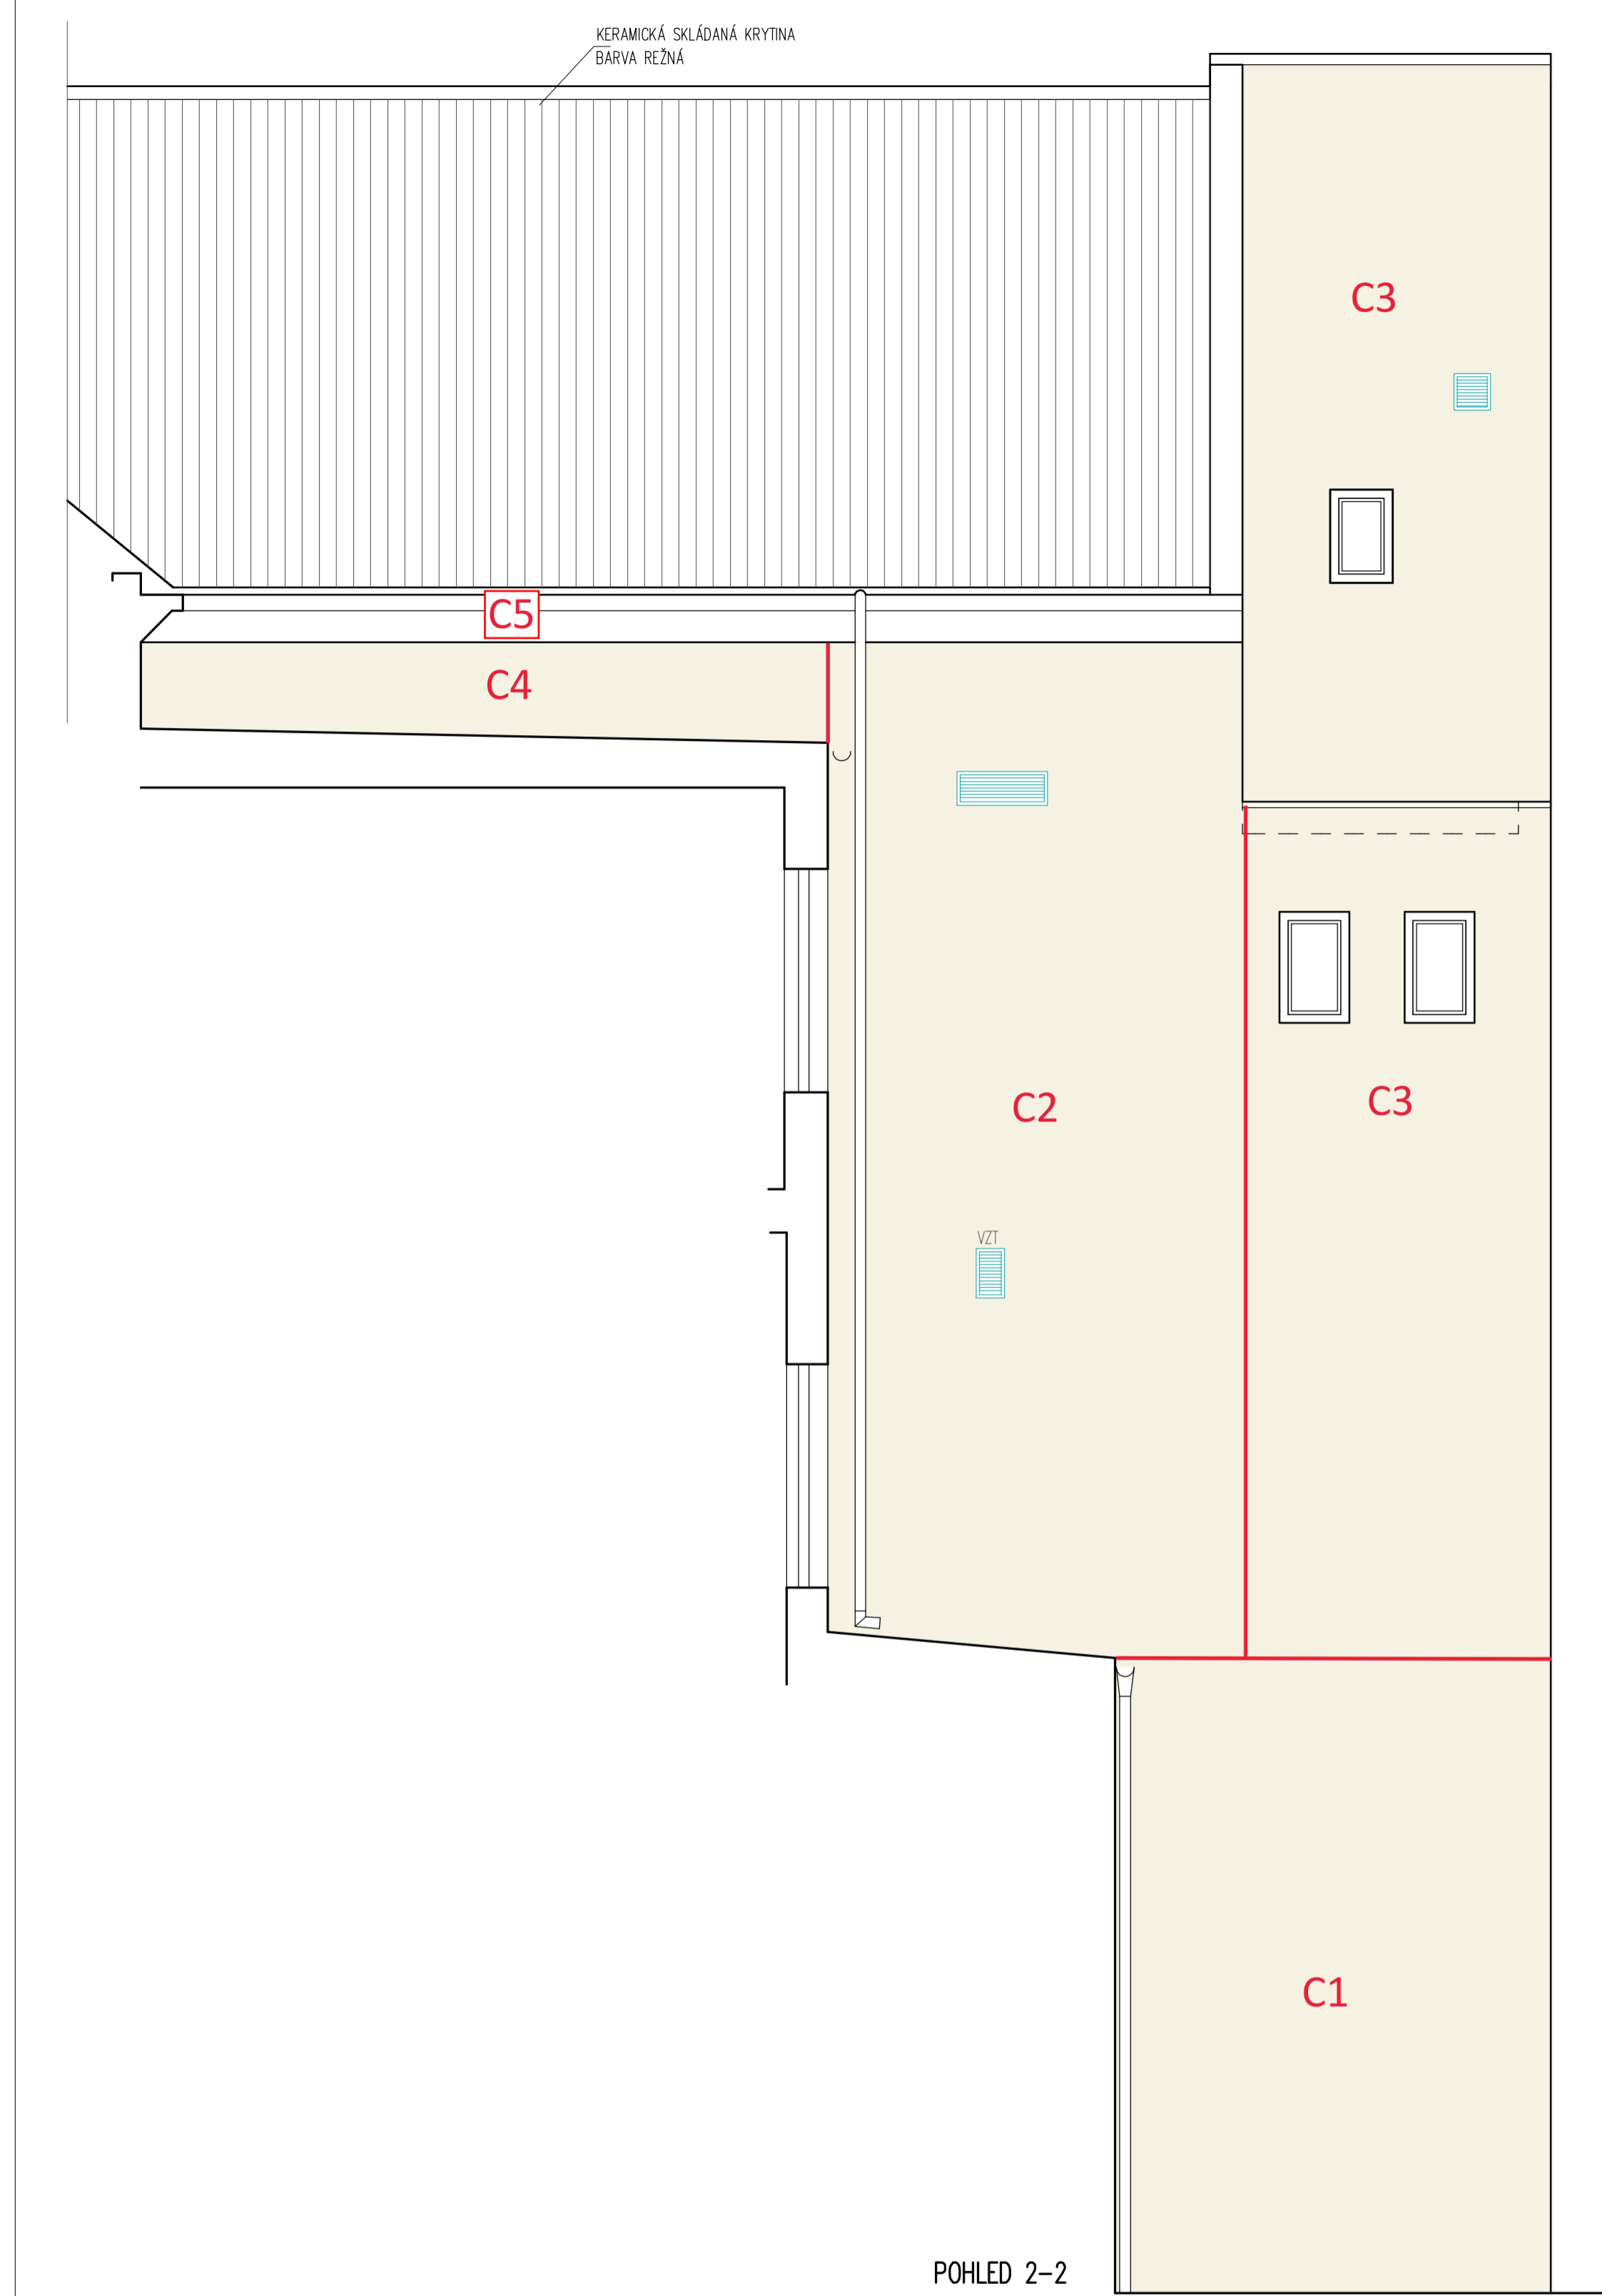



- LEGENDA:**
- OMÍTKA – BARVA OŘÍŠKOVÁ S NÁDECHEM DO ZELENA
 - OMÍTKA – BARVA BÍLÁ, SMETANOVÁ
 - VÝPLNĚ OTVORŮ STŘEDNĚ HNĚDÁ S NÁDECHEM DO ZELENA
 - STŘEKRYTINA KERAMICKÝ STŘEP PŘÍRODNÍ
 - OPLECHOVÁNÍ MĚD

VEŠKERÉ MATERIÁLY BUDDU VYBRÁNY Z PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ A ODSOUHLASENY INVESTOREM A ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PĚČE

Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA KLÁŠTERNÍ ČP. 52 PARDUBICE	
Místo Klášteřní ulice č.p. 52, p.č. 97, 2857, 32/1, 32/2, k. území Pardubice	
Investor Základní škola a Praktická škola SVĚTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, Pardubice – Pardubitzky 530 03 e-mail: svitan@svitan.cz tel. +420 466 049 911	
Generální projektant Ing. arch. Pavel Mudruška Palackého 207, Sezemice, 533 04 tel. 608 337 447 e-mail: atelier.mudrunko@centrum.cz	
Název objektu D1 - BUDOVA	Stupeň dokumentu DPS
Stupeň dokumentu D1 - A STAVEBNÍ ČÁST	
Zpracovatel části Ing. arch. Pavel Mudruška Palackého 207, Sezemice, 533 04 tel. 608 337 447 e-mail: atelier.mudrunko@centrum.cz	
Vypracoval Ing. Richard Kužera	Číslo zadání 2015 - 053
Výhled osazení objektu ± 0,000 = 220,83 m.nm. Bp	Číslo výkresu D1-A.22
Průběh POHLEDY SEVERNÍ FASÁDY	

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL044	Název rozpočtu Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB + odpočet STA	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Sysala Jakub</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	165 977,09 Kč
		DPH	34 855,19 Kč
		DPH 21%	34 855,19 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
<i>Razítko a podpis</i>	<i>Razítko a podpis</i>	Cena celkem (včetně DPH)	200 832,28 Kč

Poznámka:

Výměry jsou orientační, bude následně upřesněno.

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Rozpočet: ZL044: Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB + odpočet STA
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL044: Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB + odpočet STA	165 977,09	34 855,19	200 832,28
NAKL01: Uznatelné náklady	198 468,44	41 678,37	240 146,82
02: D1 - Budova - profese TZB	198 468,44	41 678,37	240 146,82
005: Elektroinstalace, bleskosvody	180 896,42	37 988,25	218 884,67
006: Slaboproudé rozvody	- 7 320,77	- 1 537,36	- 8 858,13
007: Elektronická požární signalizace	24 892,79	5 227,49	30 120,28
NAKL02: Neuznatelné náklady	- 32 491,36	- 6 823,18	- 39 314,54
03.: D1 - Profese TZB	- 32 491,36	- 6 823,18	- 39 314,54
002.: Slaboproudé rozvody	- 32 491,36	- 6 823,18	- 39 314,54
Celkem (bez DPH)	165 977,09		
DPH	34 855,19		
DPH 21 % ze základny: 165 977	34 855,19		
Celkem (včetně DPH)	200 832,28		

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



Rozpočet: ZL044: Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB + odpočet STA

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL044: Navýšení výměr kabeláží elektro z důvodu kolize profesí TZB + odpočet STA				165 977,09
		NAKL01: Uznatelné náklady				198 468,44
		02: D1 - Budova - profese TZB				198 468,44
		005: Elektroinstalace, bleskosvody				180 896,42
		005: Elektroinstalace, bleskosvody				180 896,42
		A1: Elektroinstalace - montáž				114 942,51
		D13: Svítidla				102 913,44
70.	EL-221	Kabel CYKY-J 3x1,5 - pevně ložený	m	2 000,0	25,15	50 308,49
72.	EL-223	Kabel CYKY-J 3x2,5 - pevně ložený	m	1 900,0	25,15	47 793,07
86.	EL-237	Kabel JYSTY 2x2x0,8 - pevně ložený	m	350,0	13,75	4 811,88
		D15: Vedlejší a rozpočtové náklady				12 029,07
126.	EL-284	Podružný materiál (cca 5% z rozpočtové ceny)	set	0,05	168 867,35	8 443,37
		Výkaz výměr: 5% z rozpočtové ceny; 0,05		0,050		
127.	EL-285	Doprava	set	0,004	168 867,35	717,14
		Výkaz výměr: Poměr ceny VRN / cena celkem Elektro bez VRN; 21243,3/(5186333,01-184108,60)		0,004		
128.	EL-286	Projektová dokumentace	set	0,007	168 867,35	1 195,23
		Výkaz výměr: Poměr ceny VRN / cena celkem Elektro bez VRN; 35405,5/(5186333,01-184108,60)		0,007		
129.	EL-287	Zařízení staveniště	set	0,01	168 867,35	1 673,33
		Výkaz výměr: Poměr ceny VRN / cena celkem Elektro bez VRN; 49567,70/(5186333,01-184108,60)		0,010		
		A2: Elektroinstalace - dodávka				65 953,91
		D13: Svítidla				65 953,91
202.	EL-522	Kabel CYKY-J 3x1,5 - pevně ložený	m	2 000,0	12,13	24 250,04
204.	EL-524	Kabel CYKY-J 3x2,5 - pevně ložený	m	1 900,0	19,82	37 650,75
218.	EL-538	Kabel JYSTY 2x2x0,8 - pevně ložený	m	350,0	11,58	4 053,11
		006: Slaboproudé rozvody				- 7 320,77
		0002.: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)				- 7 320,77
		742-2: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PTZS)				- 7 320,77
		D3: Detektory				- 7 320,77
11.	SL-PZTS-010	Magnetický kontakt s vestavěnými rezistory 2x1.1k? (2EOL/NC), záporná montáž, pracovní mezera - 14-18mm, plast, NC kontakt, 2 vodiče, rozměry: 25 x 8,5 mm	ks	- 20,0	366,04	- 7 320,77
		007: Elektronická požární signalizace				24 892,79
		007: Elektronická požární signalizace				24 892,79
		1: EPS materiál				10 948,47
		EPS08: Kabeláž				10 948,47
27.	EPS 027	J-H(St)-H 1x2x0,8	m	300,0	9,80	2 941,38
28.	EPS 028	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8	m	500,0	16,01	8 007,09
		2: EPS montáž				13 944,32
		EPS20: Kabeláž				13 944,32
63.	EPS 096	J-H(St)-H 1x2x0,8	m	300,0	17,43	5 229,12
64.	EPS 097	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8	m	500,0	17,43	8 715,20
		NAKL02: Neuznatelné náklady				- 32 491,36
		03.: D1 - Profese TZB				- 32 491,36
		002.: Slaboproudé rozvody				- 32 491,36
		.0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)				100 224,80
		.PSV: Práce a dodávky PSV				100 224,80
		0001: Univerzální kabelážní systém (UKS)				100 224,80
5.	SL-UKS-005	Kabel STP, kat.6A,bezhalogenový, 4 páry	m	4 000,0	25,06	100 224,80
		.0003: Televizní rozvody (STA)				- 132 716,16
		.PSV: Práce a dodávky PSV				- 132 716,16
		0003: Televizní rozvody (STA)				- 132 716,16
1.	SL-STA-001	Zásuvka televizní TV+R	ks	- 54,0	216,79	- 11 706,69
2.	SL-STA-002	Krytka zásuvky televizní TV+R, bílá	ks	- 54,0	81,71	- 4 412,07
3.	SL-STA-003	Krabice přístrojová rozvodná včetně lůžka, KU68	ks	- 54,0	95,87	- 5 176,83
4.	SL-STA-004	Kabel koaxiální RG59	m	- 2 590,0	25,06	- 64 895,56
5.	SL-STA-005	Stožár jednodílný 2,5m, dural	ks	- 1,0	1 045,82	- 1 045,82
6.	SL-STA-006	Držák stožáru s posuvným úchytem na krov	ks	- 2,0	424,87	- 849,73
7.	SL-STA-007	Všesměrová anténa pro příjem VKV. Materiál hliník v kombinaci s plastem. Třmen s možností upevnění - na stožár. Plastová krabice se symetrizačním členem. Frekvenční rozsah 87,5 - 108MHz. Hmotnost / 1,32kg. Impedance 75Ohm.	ks	- 1,0	702,66	- 702,66

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
8.	SL-STA-008	Pásmová, 27 prvková anténa, je určena pro příjem DVB-T signálu v pásmu UHF (IV - V), kanálů 21-60.	ks	- 1,0	964,12	- 964,12
9.	SL-STA-009	Domovní širokopásmový zesilovač (47-862MHz) s vestavěnou regulací zisku a náklonu, vhodný pro - použití pro cca 20-30 zásuvek, 34dB, 1x vstup	ks	- 1,0	1 677,68	- 1 677,68
10.	SL-STA-010	Slučuje pásmo FM (87,5 - 108MHz) s pásmem DAB (174 - 230MHz) + UHF (470 - 790MHz).	ks	- 1,0	351,88	- 351,88
11.	SL-STA-011	Plechová skříň pro TV rozvody, zesilovč, slučovač, rozbočovače, pozor - provedení je bez zadní stěny	ks	- 1,0	3 191,94	- 3 191,94
12.	SL-STA-012	Rozbočovač 16x výstup 16dB. Šířka pásma 5-1000 MHz. Kryt z poniklované zinkové slitiny. Výborná - odolnost proti korozi. Provedení na konektory F.	ks	- 4,0	1 946,76	- 7 787,03
13.	SL-STA-013	F konektor	ks	- 62,0	42,49	- 2 634,17
14.	SL-STA-014	Měření přípojky, popis	kpl	- 1,0	3 812,90	- 3 812,90
15.	SL-STA-015	Trubka ohebná 25 mm	m	- 216,0	49,02	- 10 588,97
16.	SL-STA-016	vysekání drážky 3x3cm	m	- 162,0	64,27	- 10 412,49
17.	SL-STA-017	Drobné práce a materiál	kpl	- 1,0	2 505,62	- 2 505,62

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL045	Název rozpočtu Opravy římsy atria	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Malý Ondřej</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	59 210,61 Kč
		DPH	12 434,23 Kč
		DPH 21%	12 434,23 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	71 644,83 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL045: Opravy římsy atria

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL045: Opravy římsy atria	59 210,61	12 434,23	71 644,83
NAKL01: Uznatelné náklady	- 54 348,24	- 11 413,13	- 65 761,37
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 54 348,24	- 11 413,13	- 65 761,37
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 54 348,24	- 11 413,13	- 65 761,37
01: D1 - Budova - stavební a statická část	- 54 348,24	- 11 413,13	- 65 761,37
HSV: Práce a dodávky HSV	- 54 348,24	- 11 413,13	- 65 761,37
96: Bourání konstrukcí	- 7 487,69	- 1 572,42	- 9 060,11
997: Přesun sutě	- 45 166,75	- 9 485,02	- 54 651,77
998: Přesun hmot	- 1 693,80	- 355,70	- 2 049,50
NAKL02: Neuznatelné náklady	113 558,85	23 847,36	137 406,20
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	113 558,85	23 847,36	137 406,20
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	113 558,85	23 847,36	137 406,20
01.: D1 - Budova - stavební a statická část	113 558,85	23 847,36	137 406,20
HSV: Práce a dodávky HSV	113 558,85	23 847,36	137 406,20
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 34 318,27	- 7 206,84	- 41 525,11
62: Úprava povrchů vnějších	147 877,11	31 054,19	178 931,31
Celkem (bez DPH)	59 210,61		
DPH	12 434,23		
DPH 21 % ze základny: 59 211	12 434,23		
Celkem (včetně DPH)	71 644,83		



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL045: Opravy římsy atria

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL045: Opravy římsy atria				59 210,61
		NAKL01: Uznatelné náklady				- 54 348,24
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				- 54 348,24
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				- 54 348,24
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				- 54 348,24
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 54 348,24
		96: Bourání konstrukcí				- 7 487,69
236.	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	- 6,3	1 188,52	- 7 487,69
		Výkaz výměr: "Římsy u fasád složitosti 1-2" 6,3 -6,3		- 6,300		
		997: Přesun sutě				- 45 166,75
307.	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	- 15,75	2 306,48	- 36 327,02
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 15,75	116,81	- 1 839,78
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 456,75	5,00	- 2 281,48
		Výkaz výměr: -15,75*29 - 456,750		- 456,750		
310.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - suť (skládkovné)	t	- 15,75	299,59	- 4 718,46
		998: Přesun hmot				- 1 693,80
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	- 2,392	708,11	- 1 693,80
		NAKL02: Neuznatelné náklady				113 558,85
		01.: D1 - Budova - stavební a statická část				113 558,85
		01.: D1 - Budova - stavební a statická část				113 558,85
		01.: D1 - Budova - stavební a statická část				113 558,85
		HSV: Práce a dodávky HSV				113 558,85
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 34 318,27
1.	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	- 1,89	18 157,81	- 34 318,27
		Výkaz výměr: "Římsy u fasád složitosti 1-2" 6,3 -6,3*0,3		- 1,890		
		62: Úprava povrchů vnějších				147 877,11
12.	622325209.A	Oprava stávající vnější omítky stěn v ploše do 100% + tenkovrstvá renovační fasádní omítka na bázi vápna, bílého cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny v celé ploše vč. profilace Poznámka k položce: Výměry vypočteny počítačovým programem. Podrobný popis omítky viz. PD.	m2	- 55,627	391,63	- 21 785,24
		Výkaz výměr: -55,627		- 55,627		
1 254.	622325409	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu přes 80 do 100 % - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m2	55,627	3 050,00	169 662,35
		Výkaz výměr: (0,68+0,75)*38,9		55,627		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL046	Název rozpočtu Navýšení standardu zařizovacích předmětů	

Název stavby:	Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	63 474,60 Kč
		DPH	13 329,67 Kč
		DPH 21%	13 329,67 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	76 804,27 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL046: Navýšení standardu zařizovacích předmětů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL046: Navýšení standardu zařizovacích předmětů	63 474,60	13 329,67	76 804,27
NAKL01: Uznatelné náklady	63 474,60	13 329,67	76 804,27
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 011,30	422,37	2 433,67
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 011,30	422,37	2 433,67
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 011,30	422,37	2 433,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	2 011,30	422,37	2 433,67
VRN3: Zařízení staveniště	1 868,08	392,30	2 260,38
VRN4: Inženýrská činnost	143,22	30,08	173,30
02: D1 - Budova - profese TZB	61 463,30	12 907,29	74 370,59
001: Zdravotní technika	61 463,30	12 907,29	74 370,59
001: Zdravotní technika	61 463,30	12 907,29	74 370,59
PSV: Práce a dodávky PSV	61 463,30	12 907,29	74 370,59
725: Zařizovací předměty	51 724,06	10 862,05	62 586,12
726: Instalační prefabrikáty	9 739,24	2 045,24	11 784,48
Celkem (bez DPH)	63 474,60		
DPH		13 329,67	
DPH 21 % ze základny: 63 475		13 329,67	
Celkem (včetně DPH)			76 804,27

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice



Rozpočet: ZL046: Navýšení standardu zařízovacích předmětů

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL046: Navýšení standardu zařízovacích předmětů						63 474,60
NAKL01: Uznatelné náklady						63 474,60
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 011,30
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 011,30
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 011,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 011,30
VRN3: Zařízení stavenišť						1 868,08
2.	031002000	Související práce pro zařízení stavenišť	Celek	0,014	61 463,30	846,86
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení stavenišť Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení stavenišť a jeho provoz včetně skládky a mezisklady materiálu.	Celek	0,01	61 463,30	632,03
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,01		
5.	034002000	Zabezpečení stavenišť	Celek	0,006	61 463,30	389,18
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						143,22
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	61 463,30	93,40
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	61 463,30	49,82
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
02: D1 - Budova - profese TZB						61 463,30
001: Zdravotní technika						61 463,30
001: Zdravotní technika						61 463,30
PSV: Práce a dodávky PSV						61 463,30
725: Zařízovací předměty						51 724,06
177.	725014131RT1	Klozet závěsný keramický + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	-25,0	2 538,30	-63 457,55
Výkaz výměr: Smluvní množství; -25				-25,000		
Skutečné množství; 0				-		
177.	725014131RT1-S	WC závěsné DEEP BY JIKA+sedátko duroplast	soubor	6,0	5 330,50	31 983,00
Výkaz výměr: 6				6,000		
177.	725014131RT1-S2	WC závěsné LYRA PLUS +sedátko duroplast	soubor	15,0	4 130,50	61 957,50
Výkaz výměr: 15				15,000		
177.	725014131RT1-S3	WC závěsné LYRA PLUS zkrácené+sedátko duroplast	soubor	5,0	4 466,50	22 332,50
Výkaz výměr: 5				5,000		
178.	725014141R00	Klozet závěsný ZTP keramický + sedátko, bílý	soubor	-1,0	3 635,33	-3 635,33
Výkaz výměr: Smluvní množství; -4				-4,000		
Skutečné množství; 3				3,000		
179.	725017162R00	Umyvadlo keramické, na šrouby, 55 x 45 cm, bílé	soubor	-61,0	1 346,50	-82 136,40
Výkaz výměr: Smluvní množství; -61				-61,000		
Skutečné množství; 0				-		
179.	725017162R00-S	Umyvadlo DEEP BY JIKA 55	soubor	44,0	1 836,00	80 784,00
179.	725017162R00-S2	Umyvadlo LYRA PLUS 55	soubor	18,0	1 860,00	33 480,00
181.	725017153R00	Umyvadlo invalidní keramické 64 x 55 cm, bílé	soubor	-1,0	1 589,43	-1 589,43
182.	725017172R00	Umyvadlo keram. do nábytku, 55 x 45 cm, bílé	soubor	1,0	1 621,03	1 621,03
Výkaz výměr: Smluvní množství; -1				-1,000		
Skutečné množství; 2				2,000		
189.	55231356	Jednodílný nerez. dřez s odpadávacím, přepad, typ 3, hladký, 780x435 mm, hl. 150 mm	kus	-1,0	2 799,76	-2 799,76
Výkaz výměr: Smluvní množství; -1				-1,000		
Skutečné množství; 0				-		
190.	55231358	Dřez s odpadávacím, přepad, mat. Fraganit, typ 5, 520x425 mm, hl. 190 mm, výpust 92 mm	kus	-3,0	5 664,88	-16 994,64
Výkaz výměr: Smluvní množství; -3				-3,000		
Skutečné množství; 0				-		
193.	55231350	Dvoudílný nerez. dřez, typ 2, 780x475 mm, hl. 150 mm	kus	-2,0	3 093,90	-6 187,79
Výkaz výměr: Smluvní množství; -2				-2,000		
Skutečné množství; 0				-		
201.	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková pákov, bez otvor. odpadu, standardní	kus	28,0	1 514,27	42 399,45
Výkaz výměr: Smluvní množství; -3				-3,000		
Skutečné množství; 31				31,000		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
201.	725823114RT1.S	Baterie dřezová stojánková FRESH horní ramínko	kus	3,0	2 011,00	6 033,00
201.	725823114RT1.S2	Baterie dřezová stojánková FERRO elastická	kus	3,0	2 149,00	6 447,00
202.	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. pákov, bez otvír.odpadu, standardní	kus	- 36,0	1 318,17	- 47 454,26
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -65		- 65,000		
		Skutečné množství; 29		29,000		
202.	725823111RT1.S	Baterie umyvadlová stojánková Metalia	kus	5,0	2 208,00	11 040,00
203.	725829201RT1	Baterie dřezová nástěnná chromová, rozteč 150 mm	kus	- 12,0	1 198,34	- 14 380,08
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -18		- 18,000		
		Skutečné množství; 6		6,000		
213.	725860211R00	Sifon umyvadlový D40, 5/4 " přípoj pračka, nerez. miska, prostorově úsporný	kus	- 64,0	242,94	- 15 547,92
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -64		- 64,000		
		Skutečné množství; 0		-		
213.	725860211R00.S	Sifon 5/4" trubkový chromový	kus	66,0	456,00	30 096,00
214.	725860211R00.1	Sifon umyvadlový, D 40, přípoj pračka, nerez. miska, prostorově úsporný	kus	- 64,0	293,05	- 18 755,11
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -64		- 64,000		
		Skutečné množství; 0		-		
215.	55162145	Mezikus 5/4" s přípojkou	kus	- 50,0	65,36	- 3 268,20
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -50		- 50,000		
		Skutečné množství; 0		-		
216.	725860212RT1	Sifon umyvadlový pod omítku, D 40, nerez. miska, přípoj. souprava plast. 5/4"	kus	- 1,0	242,94	- 242,94
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -1		- 1,000		
		Skutečné množství; 0		-		
		726: Instalační prefabrikáty				9 739,24
231.	28696752R	Tlačítko ovládací plastové, bílá/chrom/bílá	kus	6,0	860,63	5 163,76
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -23		- 23,000		
		Skutečné množství; 29		29,000		
232.	28696755R	Tlačítko ovládací plastové, oddálené, bílá/chrom/bílá	kus	2,0	2 287,74	4 575,48
		Výkaz výměr: Smluvní množství; -4		- 4,000		
		Skutečné množství; 6		6,000		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL047	Název rozpočtu Vybourání bet. mazanin ve 2.NP	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	24 425,18 Kč
		DPH	5 129,29 Kč
		DPH 21%	5 129,29 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	29 554,46 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL047: Vybourání bet. mazanin ve 2.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL047: Vybourání bet. mazanin ve 2.NP	24 425,18	5 129,29	29 554,46
NAKL01: Uznatelné náklady	24 425,18	5 129,29	29 554,46
00: Vedlejší a ostatní náklady	773,95	162,53	936,48
00: Vedlejší a ostatní náklady	773,95	162,53	936,48
00: Vedlejší a ostatní náklady	773,95	162,53	936,48
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	773,95	162,53	936,48
VRN3: Zařízení staveniště	718,84	150,96	869,80
VRN4: Inženýrská činnost	55,11	11,57	66,68
01: D1 - Budova - stavební a statická část	23 651,22	4 966,76	28 617,98
01: D1 - Budova - stavební a statická část	23 651,22	4 966,76	28 617,98
01: D1 - Budova - stavební a statická část	23 651,22	4 966,76	28 617,98
HSV: Práce a dodávky HSV	23 651,22	4 966,76	28 617,98
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 413,75	1 766,89	10 180,63
96: Bourání konstrukcí	4 677,33	982,24	5 659,57
997: Přesun sutě	8 200,01	1 722,00	9 922,01
998: Přesun hmot	2 360,13	495,63	2 855,76
Celkem (bez DPH)	24 425,18		
DPH	5 129,29		
DPH 21 % ze základny: 24 425	5 129,29		
Celkem (včetně DPH)	29 554,46		

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL047: Vybourání bet. mazanin ve 2.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL047: Vybourání bet. mazanin ve 2.NP				24 425,18
		NAKL01: Uznatelné náklady				24 425,18
		00: Vedlejší a ostatní náklady				773,95
		00: Vedlejší a ostatní náklady				773,95
		00: Vedlejší a ostatní náklady				773,95
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				773,95
		VRN3: Zařízení staveniště				718,84
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	23 651,22	325,87
		Výkaz výměr: 1360000/98705514,44		0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	23 651,22	243,21
		Výkaz výměr: 1015000/98705514,44		0,010		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	23 651,22	149,76
		Výkaz výměr: 625000/98705514,44		0,006		
		VRN4: Inženýrská činnost				55,11
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	23 651,22	35,94
		Výkaz výměr: 150000/98705514,44		0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	23 651,22	19,17
		Výkaz výměr: 80000/98705514,44		0,001		
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				23 651,22
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				23 651,22
		01: D1 - Budova - stavební a statická část				23 651,22
		HSV: Práce a dodávky HSV				23 651,22
		6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 413,75
121.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,325	239,41	317,21
133.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,079	32 682,00	2 572,22
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Prostor před schodištěm; 7,408*2,37*0,0031*1,15		0,063		
		Chodba + vstup do WC CHL m.č. 220; 1,6*2,825*0,0031*1,15		0,016		
1 203.	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	1,325	4 170,50	5 524,32
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Prostor před schodištěm; 7,408*2,37*0,06		1,053		
		Chodba + vstup do WC CHL m.č. 220; 1,6*2,825*0,06		0,271		
		96: Bourání konstrukcí				4 677,33
245.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,505	2 420,86	3 644,41
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Prostor před schodištěm; 7,408*2,37*0,06		1,053		
		Chodba + vstup do WC CHL m.č. 220; 1,6*2,825*0,1		0,452		
1 204.	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	m3	1,806	571,90	1 032,92
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Prostor před schodištěm; 7,408*2,37*0,09		1,580		
		Chodba + vstup do WC CHL m.č. 220; 1,6*2,825*0,05		0,226		
		997: Přesun sutě				8 200,01
306.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	5,84	706,68	4 127,03
308.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,84	116,81	682,18
309.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	169,36	5,00	845,96
		Výkaz výměr: 5,840*29		169,360		
311.	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,84	435,76	2 544,84
		998: Přesun hmot				2 360,13
312.	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,333	708,11	2 360,13

Poř.

Kód

Popis



MJ

Výměra

Jedn. cena

Cena

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL048	Název rozpočtu Doplnění armatur rozdělovačů ÚT	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum: <i>Razítko a podpis</i>	Za objednatele: Jan Andrš Datum: <i>Razítko a podpis</i>	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	41 517,73 Kč
		DPH	8 718,72 Kč
		DPH 21%	8 718,72 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)		50 236,46 Kč	

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL048: Doplnění armatur rozdělovačů ÚT

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL048: Doplnění armatur rozdělovačů ÚT	41 517,73	8 718,72	50 236,46
NAKL01: Uznatelné náklady	41 517,73	8 718,72	50 236,46
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 315,56	276,27	1 591,83
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 315,56	276,27	1 591,83
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 315,56	276,27	1 591,83
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 315,56	276,27	1 591,83
VRN3: Zařízení staveniště	1 221,88	256,60	1 478,48
VRN4: Inženýrská činnost	93,68	19,67	113,35
02: D1 - Budova - profese TZB	40 202,17	8 442,46	48 644,63
002: Ústřední vytápění	40 202,17	8 442,46	48 644,63
0001: Větev 1	40 202,17	8 442,46	48 644,63
.PSV: Práce a dodávky PSV	40 202,17	8 442,46	48 644,63
D4: Armatury	40 202,17	8 442,46	48 644,63
Celkem (bez DPH)	41 517,73		
DPH	8 718,72		
DPH 21 % ze základny: 41 518	8 718,72		
Celkem (včetně DPH)	50 236,46		

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL048: Doplnění armatur rozdělovačů ÚT

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL048: Doplnění armatur rozdělovačů ÚT				41 517,73
		NAKL01: Uznatelné náklady				41 517,73
		00: Vedlejší a ostatní náklady				1 315,56
		00: Vedlejší a ostatní náklady				1 315,56
		00: Vedlejší a ostatní náklady				1 315,56
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				1 315,56
		VRN3: Zařízení staveniště				1 221,88
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	40 202,17	553,92
		Výkaz výměr: 1360000/98705514,44		0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezisklady materiálu.	Celek	0,01	40 202,17	413,40
		Výkaz výměr: 1015000/98705514,44		0,01		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	40 202,17	254,56
		Výkaz výměr: 625000/98705514,44		0,006		
		VRN4: Inženýrská činnost				93,68
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	40 202,17	61,09
		Výkaz výměr: 150000/98705514,44		0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	40 202,17	32,58
		Výkaz výměr: 80000/98705514,44		0,001		
		02: D1 - Budova - profese TZB				40 202,17
		002: Ústřední vytápění				40 202,17
		0001: Větev 1				40 202,17
		.PSV: Práce a dodávky PSV				40 202,17
		D4: Armatury				40 202,17
50.	734209113	Mtz armatura 2zavity G 1/2	kus	54,0	68,63	3 706,14
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 35		35,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 15		15,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 4		4,000		
51.	734209114	Mtz armatura 2zavity G 3/4	kus	90,0	80,62	7 255,40
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 10		10,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 54		54,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 18		18,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 8		8,000		
52.	734209115	Mtz armatura 2zavity G 1	kus	28,0	91,51	2 562,27
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 10		10,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 12		12,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 120.	73442-R014	Redukce 1"x3/4" - Nová R-položka	kus	4,0	19,55	78,20
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS4.4,4.5; 4		4,000		
1 205.	73442-R22	Kulový kohout DN 15 vnitřní/vnitřní - Nová R-položka	kus	8,0	217,35	1 738,80
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 5		5,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 3		3,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 206.	73442-R023	Vsuvka1/2" - Nová R-položka	kus	16,0	14,84	237,44
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 10		10,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 207.	73442-R024	Přechod22 1/2" venkovní - Nová R-položka	kus	26,0	186,30	4 843,80
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 20		20,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 208.	73442-R025	Koleno 22 NT - Nová R-položka	kus	28,0	101,20	2 833,60
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 10		10,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 12		12,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 209.	73442-R026	Přechod 22 1" venkovní - Nová R-položka	kus	28,0	251,85	7 051,80

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 10		10,000		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 12		12,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 210.	73442-R027	Kulový kohout DN20 vnitřní/vnitřní - Nová R-položka	kus	6,0	289,23	1 735,38
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 6		6,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 0		-		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 211.	73442-R028	Přechod 28 3/4" venkovní - Nová R-položka	kus	18,0	255,30	4 595,40
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 12		12,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 212.	73442-R029	Přechod 22 3/4" venkovní - Nová R-položka	kus	12,0	173,65	2 083,80
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 12		12,000		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 0		-		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 213.	73442-R030	Vsuvka 3/4" - Nová R-položka	kus	12,0	18,98	227,76
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 12		12,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 214.	73442-R031	Redukovaná vsuvka 3/4"x1/2" - Nová R-položka	kus	6,0	27,03	162,18
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 6		6,000		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 0		-		
1 215.	73442-R032	Přechod 18 3/4" venkovní - Nová R-položka	kus	4,0	178,25	713,00
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 0		-		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 4		4,000		
1 216.	73442-R033	Koleno 18 NT - Nová R-položka	kus	4,0	94,30	377,20
		Výkaz výměr: Rozdělovač RS1.1,1.3,2.2,3.2,4.2; 0		-		
		Rozdělovač RS1.2,2.1,2.4,3.1,3.4,4.1; 0		-		
		Rozdělovač RS2.3,3.3,4.3; 0		-		
		Rozdělovač RS4.4,4.5; 4		4,000		

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL049: Úprava lávky krovu nad 4.NP

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL049: Úprava lávky krovu nad 4.NP	92 807,67	19 489,61	112 297,29
NAKL01: Uznatelné náklady	92 807,67	19 489,61	112 297,29
00: Vedlejší a ostatní náklady	2 940,77	617,56	3 558,33
01: D1 - Budova - stavební a statická část	89 866,91	18 872,05	108 738,96
Celkem (bez DPH)	92 807,67		
DPH	19 489,61		
DPH 21 % ze základny: 92 808	19 489,61		
Celkem (včetně DPH)			112 297,29



Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL049: Úprava lávky krovu nad 4.NP

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL049: Úprava lávky krovu nad 4.NP						92 807,67
NAKL01: Uznatelné náklady						92 807,67
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 940,77
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 940,77
00: Vedlejší a ostatní náklady						2 940,77
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						2 940,77
VRN3: Zařízení staveniště						2 731,36
2.	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	89 866,91	1 238,22
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	89 866,91	924,11
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,010		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	89 866,91	569,03
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						209,40
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	89 866,91	136,57
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	89 866,91	72,84
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
01: D1 - Budova - stavební a statická část						89 866,91
01: D1 - Budova - stavební a statická část						89 866,91
01: D1 - Budova - stavební a statická část						89 866,91
PSV: Práce a dodávky PSV						89 866,91
762: Konstrukce tesařské						89 866,91
403.	762332131	Montáž vázaných křívků krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	180,5	204,81	36 967,70
418.	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	39,256	600,26	23 563,93
Výkaz výměr: Množství ve smluvním rozpočtu:				-		
4.NP				-		
-9,5				- 9,500		
Dle skutečnosti:				-		
43,6+8,25*0,625				48,756		
422.	605120011_01	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2, sušený vč. impregnace	m3	1,906	11 096,63	21 151,06
Výkaz výměr: 0,06*0,16*180,5*1,1				1,906		
423.	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných křívků	m3	1,906	2 197,32	4 188,09
426.	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,713	2 332,82	3 996,12

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 930	Zakázka Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice	  <small>Litomyšl a.s.</small>
Označení rozpočtu ZL050	Název rozpočtu Doplnění ÚT	

Název stavby:	<i>Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice</i>
Objednatel:	<i>Základní a praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03, Pardubice</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW Wachal a.s. a PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. MUDRUŇKA PAVEL, Palackého 207, 53304, Sezemice</i>
Technický dozor:	<i>Jan Andrš</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Michal Khýr</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert Datum:	Za objednatele: Jan Andrš Datum:	REKAPITULACE NÁKLADŮ	
		Celkem (bez DPH)	37 789,71 Kč
		DPH	7 935,84 Kč
		DPH 21%	7 935,84 Kč
		DPH 15%	0,00 Kč
		Cena celkem (včetně DPH)	45 725,54 Kč

Poznámka:

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL050: Doplnění ÚT

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL050: Doplnění ÚT	37 789,71	7 935,84	45 725,54
NAKL01: Uznatelné náklady	37 789,71	7 935,84	45 725,54
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 205,99	253,26	1 459,24
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 205,99	253,26	1 459,24
00: Vedlejší a ostatní náklady	1 205,99	253,26	1 459,24
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 205,99	253,26	1 459,24
VRN3: Zařízení staveniště	1 120,11	235,22	1 355,33
VRN4: Inženýrská činnost	85,88	18,03	103,91
02: D1 - Budova - profese TZB	36 583,72	7 682,58	44 266,30
002: Ústřední vytápění	36 583,72	7 682,58	44 266,30
0007: Objektová směšovací stanice (OSS)	- 2 457,69	- 516,11	- 2 973,80
.PSV: Práce a dodávky PSV	- 2 457,69	- 516,11	- 2 973,80
D3: Rozvod potrubí UT	- 2 457,69	- 516,11	- 2 973,80
Z001: Doplnění ÚT	39 041,41	8 198,70	47 240,10
.PSV: Práce a dodávky PSV	39 041,41	8 198,70	47 240,10
D4: Armatury	39 041,41	8 198,70	47 240,10
Celkem (bez DPH)	37 789,71		
DPH	7 935,84		
DPH 21 % ze základny: 37 790	7 935,84		
Celkem (včetně DPH)	45 725,54		

Zakázka: Stavební úpravy a půdní vestavba Klášterní čp. 52 Pardubice

Rozpočet: ZL050: Doplnění ÚT

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL050: Doplnění ÚT						37 789,71
NAKL01: Uznatelné náklady						37 789,71
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 205,99
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 205,99
00: Vedlejší a ostatní náklady						1 205,99
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 205,99
VRN3: Zařízení staveniště						1 120,11
2.	031002000	Souvisějící práce pro zařízení staveniště	Celek	0,014	36 853,72	507,78
Výkaz výměr: 1360000/98705514,44				0,014		
3.	032002000	Vybavení staveniště Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálu.	Celek	0,01	36 853,72	378,97
Výkaz výměr: 1015000/98705514,44				0,010		
5.	034002000	Zabezpečení staveniště	Celek	0,006	36 853,72	233,36
Výkaz výměr: 625000/98705514,44				0,006		
VRN4: Inženýrská činnost						85,88
7.	045002000	Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla a dále koordinace navazujících dodávek interiérového vybavení a informačního systému, které nejsou součástí díla.	Celek	0,002	36 853,72	56,01
Výkaz výměr: 150000/98705514,44				0,002		
8.	049103000	Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Poznámka k položce: Zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; Zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla.	Celek	0,001	36 853,72	29,87
Výkaz výměr: 80000/98705514,44				0,001		
02: D1 - Budova - profese TZB						36 583,72
002: Ústřední vytápění						36 583,72
0007: Objektová směšovací stanice (OSS)						- 2 457,69
.PSV: Práce a dodávky PSV						- 2 457,69
D3: Rozvod potrubí UT						- 2 457,69
22.	733111115	Potru oczav bezne bsve kotelny DN25	m	- 2,0	515,29	- 1 030,57
23.	733111116	Potru oczav bezne bsve kotelny DN32	m	- 1,0	667,80	- 667,80
24.	733111117	Potru oczav bezne bsve kotelny DN40	m	- 1,0	759,31	- 759,31
Z001: Doplnění ÚT						39 041,41
.PSV: Práce a dodávky PSV						39 041,41
D4: Armatury						39 041,41
30.	734261233_01	Sroubení prime G1/2"	ks	2,0	64,27	128,55
31.	734261234_01	Sroubení prime 3/4"	ks	2,0	69,72	139,44
32.	734261235	Sroubení prime 1"	ks	4,0	119,83	479,34
40.	734209103	Mtz armatura 1zavít G 1/2	kus	38,0	45,75	1 738,68
44.	734209114	Mtz armatura 2zavít G 3/4	kus	2,0	80,62	161,23
45.	734209115	Mtz armatura 2zavít G 1	kus	29,0	91,51	2 653,78
46.	734209116	Mtz armatura 2zavít G 5/4	kus	25,0	108,94	2 723,50
47.	734209117	Mtz armatura 2zavít G 6/4	kus	7,0	142,71	998,98
66.	734261236	Sroubení prime G5/4"	ks	8,0	162,32	1 298,56
1 098.	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	224,20	448,40
1 099.	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	14,0	152,95	2 141,30
1 100.	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	14,0	182,40	2 553,60
1 101.	734209127	Montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	5,0	230,85	1 154,25
1 102.	734209128	Montáž armatury závitové s třemi závity G 2 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	277,40	554,80
1 105.	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	193,80	387,60
1 106.	734494214	Návarek s trubkovým závitem G 3/4 - - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	9,0	197,60	1 778,40
1 108.	73442-R002	Vsuvka 1" - Nová R-položka	kus	20,0	27,60	552,00
1 109.	73442-R003	Vsuvka 5/4" - Nová R-položka	kus	15,0	39,10	586,50
1 110.	73442-R004	Vsuvka 6/4" - Nová R-položka	kus	7,0	41,40	289,80
1 111.	73442-R005	T kus 25/15 - Nová R-položka	kus	12,0	47,15	565,80

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 112.	73442-R006	T kus 32/15 - Nová R-položka	kus	11,0	77,05	847,55
1 113.	73442-R007	T kus 40/15 - Nová R-položka	kus	5,0	115,00	575,00
1 114.	73442-R008	T kus 50/15 - Nová R-položka	kus	2,0	163,30	326,60
1 115.	73442-R009	T kus 32 - Nová R-položka	kus	2,0	58,65	117,30
1 116.	73442-R010	T kus 25 - Nová R-položka	kus	2,0	39,10	78,20
1 117.	73442-R011	T kus 32/20 - Nová R-položka	kus	1,0	80,50	80,50
1 118.	73442-R012	Prodloužení mosaz - Nová R-položka	kus	31,0	16,10	499,10
1 119.	73442-R013	Redukce 6/4"x5/4" - Nová R-položka	kus	1,0	35,65	35,65
1 120.	73442-R014	Redukce 1"x3/4" - Nová R-položka	kus	2,0	19,55	39,10
1 121.	73442-R015	Redukce 1"x1/2" - Nová R-položka	kus	2,0	19,55	39,10
1 122.	73442-R016	Redukce 3/4"x1/2" - Nová R-položka	kus	1,0	12,65	12,65
1 123.	73442-R017	Redukovaná vsuvka 2"x6/4" - Nová R-položka	kus	2,0	82,80	165,60
1 124.	73442-R018	Redukovaná vsuvka 5/4"x1" - Nová R-položka	kus	4,0	44,85	179,40
1 125.	73442-R019	Redukce 1/2"x1/4" - Nová R-položka	kus	10,0	48,30	483,00
1 127.	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 40 - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	soubor	1,0	1 273,00	1 273,00
1 129.	734190818	Rozpojení přírubového spoje do DN 100 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	112,10	224,20
1 130.	734109216	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 80 - Nová položka - Cena ÚRS - 5%	soubor	2,0	2 394,00	4 788,00
1 131.	73442-R021	Jímka do DN25 pro měřiče - Nová R-položka	kus	2,0	906,00	1 812,00
1 218.	733191925	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 25 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	4,0	323,95	1 295,80
1 219.	733191926	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	369,55	739,10
1 220.	733191927	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	425,60	851,20
1 221.	734494217	Návarek s trubkovým závitem G 6/4 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	327,75	655,50
1 222.	723150344	Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 65/40 - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	896,80	1 793,60
1 223.	230040026	Zhotovení vnějšího závitů G DN 1" - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	4,0	83,51	334,04
1 224.	230040027	Zhotovení vnějšího závitů G DN 1 1/4" - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	102,60	205,20
1 225.	230040028	Zhotovení vnějšího závitů G DN 1 1/2" - Nová položka - Cena ÚRS -5%	kus	2,0	128,25	256,50
