

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „**Stavba 1**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „**Stavba 2**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „**Stavba 3**“)

„Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“ (dále jen „**Stavba 4**“)

„Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“ (dále jen „**Stavba 5**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1309/2021/Bř

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 3273514800/ 5213530055

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 3273514800/ 5213530056

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 3273514800/ 5213530057

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 3273514800/ 5213530058

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 3273514800/ 5213520097

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem Ústí nad Labem – centrum, Blahoslavova 937/62, PSČ 400 01

IČO: 44222734 DIČ: CZ44222734

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 1713

zastoupená Evou Hadravovou, MSc, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, MBA, ředitelem společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **88/2020-2021**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4, s účinností Smlouvy ke dni 07. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je požadavek na doplnění projektových prací dokumentace Stavby 5. Stavba bude oproti původnímu zadání rozšířena o rekonstrukci výhybky č. 1 v nz. Hořátev a další s tím související úpravy stavební části přejezdu P4944.

V průběhu zpracování dokumentace **Stavby 5** bylo dne 09. 11. 2021 obdrženo negativní stanovisko společnosti ČD Cargo ke stávajícímu projekčnímu řešení související se zařízením infrastruktury v nz. Hořátev. Na základě toho byl dne 18. 11. 2021 objednatelem zhotoviteli vydán Pokyn k přerušování prací do doby, než bude potvrzen další vhodný postup projekčních prací. Následně bylo dne 11. 02. 2022 na interní poradě dotčených složek Správy železnic vybráno vhodné projekční řešení a zhotovitelem byla posléze prověřena a potvrzena možnost realizovatelnosti tohoto řešení. Objednatel následně doručil zhotoviteli dne 09. 05. 2022 Pokyn k obnovení prací, na základě kterého proběhne doplnění projektové dokumentace stavby. Zhotovitel zaslal dne 09. 05. 2022 Objednateli žádost o prodloužení termínů plnění v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi. V souvislosti s tím dochází k adekvátnímu prodloužení termínů plnění jednotlivých dílčích etap zpracování Projektové dokumentace díla.

2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází u Stavby 5 k celkovému navýšení ceny Díla o **660.000,- Kč bez DPH**.

3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací,** přičemž dochází k úpravám termínů jednotlivých dílčích etap Díla následovně:

- **pro Stavbu 1** se posouvá dílčí etapa zpracování a předání dílčích částí PD v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištěním stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby ke dni 24. 03. 2022 a současně dochází k posunutí lhůty pro dokončení prací a celkové lhůty pro provedení Díla ke dni **24. 03. 2022**.

V rámci vypořádání stavebního řízení došlo u Stavby 1 k prodloužení vyjádření účastníka řízení. Dne 10. 11. 2021 bylo zažádáno o vyjádření Policie České republiky ke změně zabezpečení, které bylo obdrženo až dne 21. 01. 2022, čímž došlo k průtahu celého procesu získání stavebního povolení.

Současně se z důvodů potřeby koordinace výluk na této trati, které byly přiděleny až v průběhu června 2022, v souladu s čl. 3.7.5 OP prodlužuje lhůta pro dokončení prací a celková lhůta pro provedení Díla Stavby 1 **o 2 měsíce**. Jedná se především o změnu v rozsahu plánovaných výluk traťového úseku Neratovice – Brandýs nad Labem a Brandýs – Lázně Toušeň – Čelákovice a současně s tím i opravných prací OŘ Praha.

- **pro Stavbu 2, 3 a 4** se posouvá dílčí etapa zpracování a předání dílčích částí PD v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištěním stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby ke dni **28. 01. 2022**.

V rámci vypořádání stavebního řízení došlo u Stavby 2, 3 a 4 k prodloužení ze strany stavebního úřadu z důvodu jeho vyčerpání. Dne 03. 12. 2021 bylo zažádáno o vydání souhlasu Drážního úřadu s ohlášením stavby, které bylo následně obdrženo až dne 19. 01. 2022 a k předání Objednateli následně došlo dne 28. 01. 2022.

Současně se z důvodů potřeby koordinace výluk na této trati, které budou přiděleny až v průběhu listopadu 2022, v souladu s čl. 3.7.5 OP prodlužuje lhůta pro dokončení prací a celková lhůta pro provedení Díla Stavby 2, 3 a 4 **o 7 měsíců**. Jedná se především o změnu na základě obdržení požadavků ze strany dopravce (ČD, a.s.) Středočeského kraje (IDSK, p.o.), které byly předloženy na pravidelné celostátní výlukové poradě.

- **pro Stavbu 5** dochází k úpravám termínů jednotlivých dílčích etap zpracování Projektové dokumentace díla z důvodů uvedených v bodě 1 Preambule tohoto Dodatku. Současně se z důvodů potřeby koordinace výluk na této trati, které budou přiděleny až v průběhu dubna 2023, v souladu s čl. 3.7.5 OP prodlužuje lhůta pro dokončení prací a celková lhůta pro provedení Díla Stavby 5 **o 12 měsíců**. Jedná se především o koordinaci výluk v souvislosti s realizací stavby „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha – Vysočany (včetně)“ v roce 2022. Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca **1,02 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli, kromě plnění uvedeného v bodě 2 Preambule tohoto Dodatku. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3, 3.8 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Příloha č. 2 d) Zvláštní technické podmínky se pro Stavbu 5 doplňuje o odstavec 4.9.2 v následujícím znění:

4.9.2 Součástí stavby bude řešení obnovy výhybky č. 1 v nz. Hořátev, která vyžaduje rekonstrukci nebo komplexní opravu a s tím související stavební úpravy části přejezdu P4944 v km 9,884, především ve vztahu k železničnímu spodku.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: **65.135.000,- Kč**
slovy: **šedesát pět milionů sto třicet pět tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 1
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8.840.000,- Kč**
slovy: **osm milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **10.670.000,- Kč**
slovy: **deset milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 3
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **9.240.000,- Kč**
slovy: **devět milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 4
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **8.990.000,- Kč**
slovy: **osm milionů devět set devadesát tisíc korun českých**

Cena Díla stavby 5
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **27.395.000,- Kč**
slovy: **dvacet sedm milionů tři sta devadesát pět tisíc korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

4. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 – Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

3.8.1 Stavba 1

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **18 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **4 měsíce** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **7 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci

včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **24. 03. 2022**. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **15 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3.8.2 Stavba 2, 3 a 4

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **22 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **3 měsíce** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **28. 01. 2022**. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **19 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíce** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3.8.3 Stavba 5

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **28 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání upravené dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **31. 08. 2022**. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **30. 11. 2022**.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **28. 02. 2023**. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **25 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zázpis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

5. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu

tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Za objednatele:

V Praze



18.08.2022 12:44

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

Datum: 2022.07.28

11:16:59 +02'00'

.....
Eva Hadravová, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

Datum: 2022.07.28

11:17:24 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu 600 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 65.135.000,- Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDAKCE] Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDAKCE] Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE] Kč, tj. 1.000,- Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDAKCE] Kč**

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8.840.000,- Kč

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDAKCE] Kč**
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH [REDAKCE] - Kč**
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE] Kč, tj. 1.000,- Kč/hod**
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH [REDAKCE] Kč**

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 10.670.000,- Kč

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH [REDAKCE] Kč**

- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH
██████████ Kč
- h) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. **1.000,- Kč/hod**
- i) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 3 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **9.240.000,- Kč**

Z toho:

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH
██████████ Kč
- k) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. **1.000,- Kč/hod**
- l) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 4 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **8.990.000,- Kč**

Z toho:

- m) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH
██████████ Kč
- n) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. **1.000,- Kč/hod**
- o) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 5 „Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **27.395.000,- Kč**

Z toho:

- p) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši ██████████ Kč
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH ██████████ Kč
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH
██████████ Kč
- q) **Smluvní cena za AD** bez DPH ██████████ Kč, tj. **1.000,- Kč/hod**
- r) **Smluvní cena za RS** bez DPH ██████████ Kč


PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

Harmonogram předpokládané realizace zakázky




Název zakázky: „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2747 v km 7,557 trati Čelákovice – Neratovice“

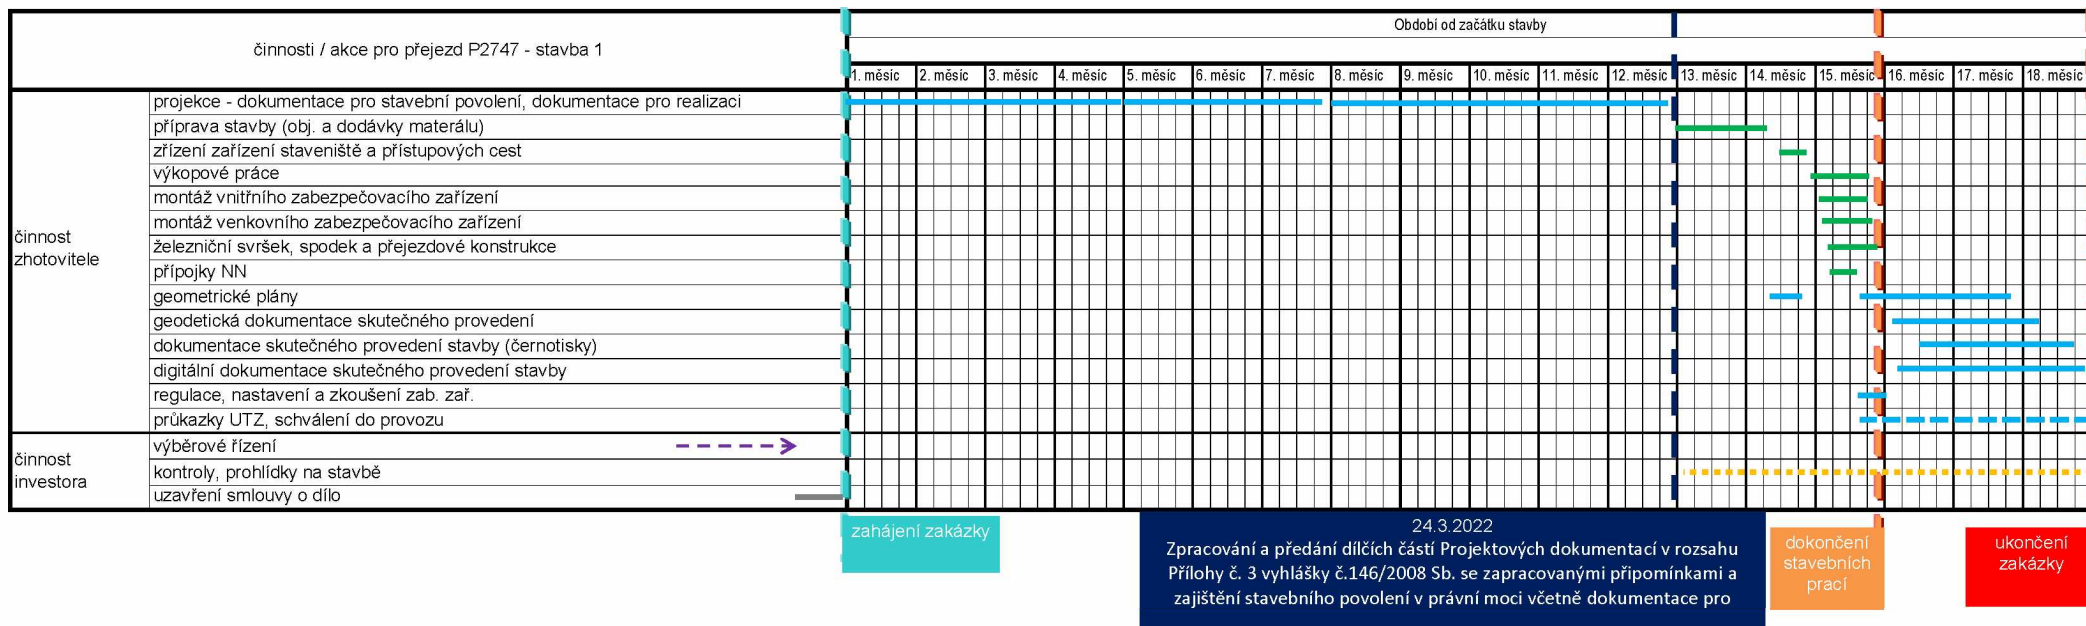

Harmonogram předpokládané realizace zakázky

Název zakázky: „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2762 v km 14,033 trati Čelákovice – Neratovice“
 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2764 v km 14,500 trati Čelákovice – Neratovice“
 „Rekonstrukce PZS a doplnění závor na přejezdu P2765 v km 14,613 trati Čelákovice – Neratovice“

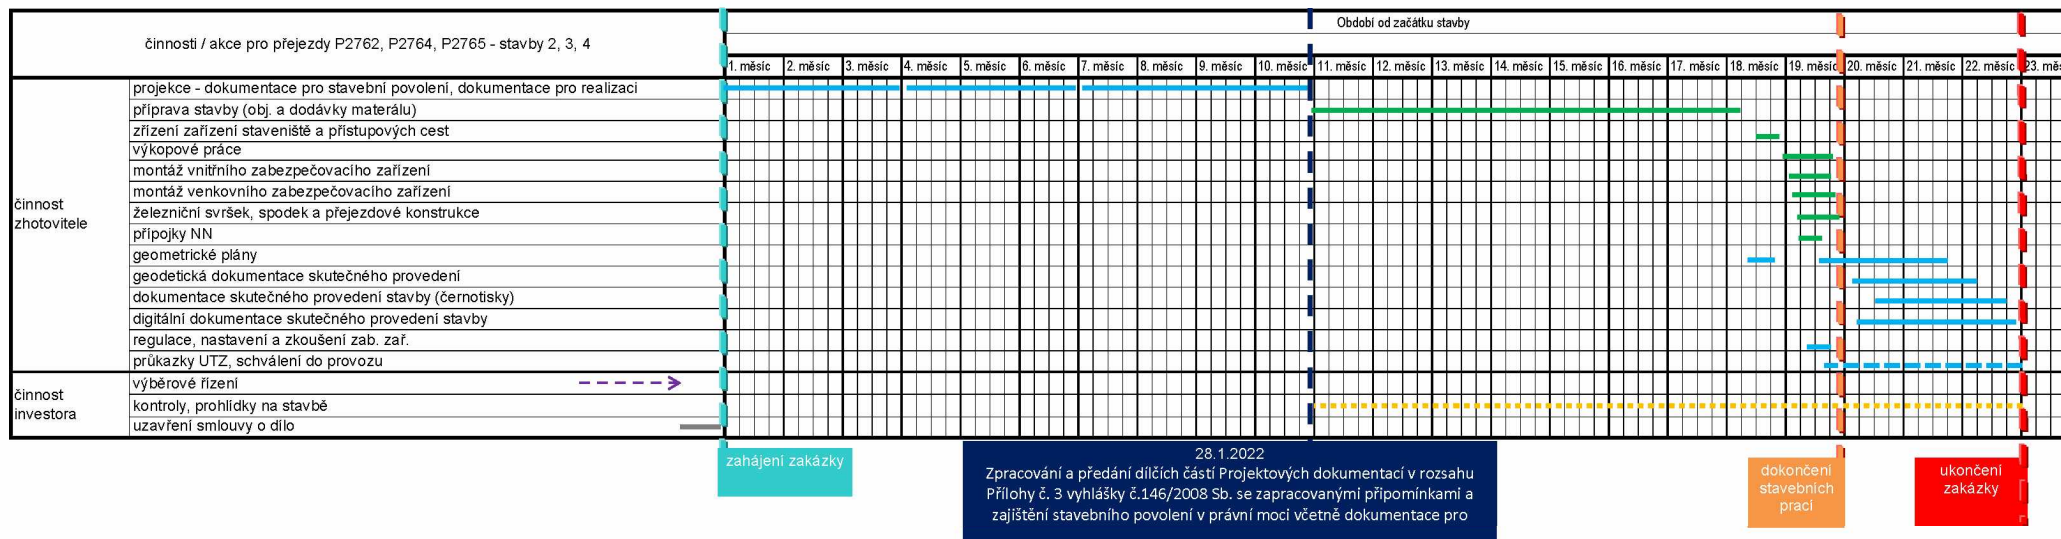

Harmonogram předpokládané realizace zakázky



Název zakázky: „Rekonstrukce přejezdů P4943 v km 9,694 a P4944 v km 9,884 na trati Nymburk – Poříčany a rekonstrukce PZS a doplnění závor

