

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	123-5588480297/0100

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **CE - ING s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921

se sídlem	Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO	04475631
DIČ	CZ04475631
zastoupený	Janem Čejchanem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	3959710399/0800

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2022, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: **Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build**, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 16 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací (tzv. víceprací), tedy prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace a objednatel tyto práce požaduje provést nad rámec zadání, a to víceprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku, podle ust. § 222 odst. 4 zákona – práce podle změnových listů č. 1, č. 2,

č. 3 a č. 4; a dále se ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ v souvislosti se změnami podle změnových listů č. 1 a č. 4 prodlužuje termín plnění.

2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí:
Vícepráce: 587 623,58 Kč bez DPH
4. Celkové dodatečné stavební práce – vícepráce dle tohoto dodatku činí:
587 623,58 Kč bez DPH.
5. Smluvní cena se tedy navyšuje o **587 623,58 Kč bez DPH.**
6. V souvislosti se změnami podle Změnových listů č. 1 a 4 se posouvá i termín uvedený v čl. 5 odst. 5.2 ve smlouvě o dílo, a to o 21 dní. Upravený harmonogram bude předložen zhotovitelem bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku a stane se oddělenou přílohou tohoto dodatku.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Článek 5 odst. 5.2 se mění následovně:

Doba a místo plnění

- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky:

Plnění bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele.**

Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele a **zahájit provádění díla** do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí.

Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

Dokončení plnění včetně zajištění kolaudace zhotovené stavby a její předání objednateli nejdéle **do 27 týdnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a k převzetí staveniště.**

Místem plnění je sídlo zhotovitele a Pavilon G – Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 01 Náchod

2. Článek 6, odstavec 6.2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v Krycím listu nabídky, činí

Celkem 9 575 277,58 Kč bez DPH

(slovy: devět milionů pět set sedmdesát pět tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých a padesát osm haléřů bez DPH)

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 28. 3. 2022 č. **RK/13/514/2022** hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:

Změnový list č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 včetně rekapitulace ZL

Změny závazků

Objednatel:

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

V Náchodě dne

.....
Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj

.....
Jan Čejchan, jednatel
CE – ING s.r.o.

SOUHRN ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK č. 1

Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy)

formou Design & Build

Ozn.	Název	Odst. č.	Cena méněprací bez DPH	Cena víceprací bez DPH	Výsledná cena bez DPH
ZL01	Změna VZT jednotky na střeše	4	- Kč	350 101,60 Kč	350 101,60 Kč
ZL02	Doplnění vybavení - nerezové stoly	4	- Kč	62 782,72 Kč	62 782,72 Kč
ZL03	Výměna čerpadel v kotelně	4	- Kč	107 361,46 Kč	107 361,46 Kč
ZL04	Vytvoření a úprava příčky (pracoviště Covid-19)	4	- Kč	67 377,80 Kč	67 377,80 Kč
CELKEM (bez DPH)			- Kč	587 623,58 Kč	587 623,58 Kč

Méněpráce / vícepráce k odst. č. 4	- Kč	587 623,58 Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 5	- Kč	- Kč
Méněpráce / vícepráce k odst. č. 6	- Kč	- Kč
Měněné položky (nahrazované / nové) k odst. č. 7	- Kč	- Kč

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 1

Změna VZT jednotky na střeše

Stavba:	Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build		
Objekt:	ON Náchod - Pavilon G (klinická imunologie a mikrobiologie + patologie a cytologie)		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	15.07.2022

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ano listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

Dle zadávací dokumentace se mělo jednat o pouhou náhradu resp. výměnu VZT jednotek za nové tak, aby samostatně mohly obsluhovat jednotlivá patra pavilonu G. V rámci dodatečné informace č. 2 byly zveřejněny půdorysy „Příloha DI_02 - Půdorysy 1NP, 2NP.pdf“, kde byly zakresleny místnosti, které má VZT jednotka obsluhovat. V těchto půdorysech však chyběly zakreslit i další místnosti, které má VZT jednotka větrat (místnost „Rozlévání“, místnost „Parazitologie“ a dlouhá „Chodba“ jako taková). Původní technické parametry VZT jednotky musely být proto přepočítány a navýšeny výkonové parametry vzhledem k objemu odvětrávaných místností, což má za následek zvětšení rozměrů jednotky. Vzhledem k těmto větším rozměrům jednotky nebylo možné umístit dovnitř objektu.

1.2 Popis nového řešení:

S ohledem na uvedené důvody níže je nutné umístit VZT jednotku včetně rekuperace na střechu objektu. S tím jsou však spojené vícenáklady na úpravu střechy, příplatek za venkovní provedení jednotky, podkladní ocelovou konstrukci, tepelnou izolaci, apod.

2 Zdůvodnění změny:

V předložených půdorysech, v rámci DI č. 2 zadávací dokumentace, chyběly zakreslit i další místnosti, které má VZT jednotka větrat (místnost „Rozlévání“, místnost „Parazitologie“ a dlouhá „Chodba“ jako taková) - v průběhu realizace došlo proto od uživatele a investora k požadavku na rozšíření větraných prostor. Původní technické parametry VZT jednotky musely být proto přepočítány a navýšeny výkonové parametry vzhledem k objemu odvětrávaných místností, což má za následek zvětšení rozměrů jednotky.

Projektant (zhotovitel) potom předložil 3 varianty umístění VZT jednotky (na původní umístění VZT jednotky ke stěně do skladu / na chodbu / na střechu budovy s upozorněním, že se jedná o dražší variantu kvůli venkovnímu provedení jednotky a dalším opatřením). Uživatel uvedl, že vzhledem k těmto větším rozměrům jednotky není z prostorových, provozních a hlukových důvodů možné umístit jednotku na původní umístění do skladu, ani na chodbu. Po několika diskuzích, stanovení kladů a záporů, se nakonec investor s uživatelem shodli na tom, že jediné řešení bude umístit VZT jednotku na střechu i přesto, že se jedná o vícenáklady. Umístit VZT jednotku dovnitř objektu se po těchto dodatečných změnách během realizace ukázalo z pohledu uživatele nakonec jako nerealizovatelné a neakceptovatelné. Vznikly proto vícepráce s ohledem na příplatek za venkovní provedení jednotky, podkladní ocelovou konstrukci, tepelnou izolaci, apod.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>		NE
--	----------	---	--	----

• měření hluku, hromosvod PD - revize






4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>		NE
--------------------------------------	----------	---	--	----

• 21 dní

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	350 101,60 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		350 101,60 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
15.07.2022 	15.07.2022 	15.07.2022 	15.07.2022 	15.07.2022 
Ing. Tomáš Pázdera Ekolog. rozvoj a výstavba	Ing. Petr Chobotský CE - ING / PRISPO s.r.o.	Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL01 - požadavek investora VZT jednotka střecha

Místo:

ON Náchod

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Královohradecký Kraj

Projektant:

CE-ING s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

350 101,60

PSV - Práce a dodávky PSV

325 101,60

751 - Vzduchotechnika

325 101,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL01 - požadavek investora VZT jednotka střecha

Místo: ON Náchod

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							350 101,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				325 101,60	
D	751		Vzduchotechnika				325 101,60	
2	K	7511001R	Dodatečné práce dle požadavku investora - umístění VZT na střeše - viz podrobný rozpočet	kus	1,000	325 101,60	325 101,60	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				25 000,00	
1	K	011434000	Měření (monitoring) hlukové hladiny - jednotka na střeše		1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01

Podrobný rozpočet VZT - příplatek za provedení na střeše

4. Zařízení č. 4 – Větrání laboratoře mikrobiologie					
4.A.1	VZT jednotka přivodně odvodní ve venkovním provedení - příplatek za venkovní provedení	1	ks	52150	52 150,00 Kč
	Ocelová konstrukce pod VZT jednotku 4.A.1 hmotnost jednotky: 710,5kg rozměr (ŠxVxH): 4263x880x1330mm	1	soub.	82836	82 836,00 Kč
4.H.2	Tepelná izolace s oplechováním - minerální vata tloušťky 100mm s oplechováním. Minimální tloušťka plechu 1,2 mm. Oplechování s poměrem stran větším než 1/4 bude vyztuženo tak, aby nedošlo k prověšení oplechování a k vibracím.	40	m2	2244,36	89 774,40 Kč
4.UT.10	Ocelové potrubí ČSN 42 5715 trubka ocelová bezešvá vč tvarovek DN 25	30	bm	1058,46	31 753,80 Kč
4.UT.12	Tepelná izolace 108/100mm včetně oplechování	10	bm	2946,74	29 467,40 Kč
99.7	Autojeřáb - před objednáním konkrétního typu je třeba místo zkontrolovat - s bezpečným dosahem do vzdálenosti 25bm - s bezpečným dosahem do výšky 12bm Hmotnost nejtěžšího přepravovaného břemena: 255kg	1	soub.	15000	15 000,00 Kč
	VZT				300 981,60 Kč
Bleskosvod a uzemnění					
1	Úprava stávající jímací soustavy v návaznosti na VZT odstranění stávající sítě, jímací tyče, napojení na stávající rozvod - doplnění Celkem úprava uzemnění	1		dodávka 14400 montáž 9720	24 120,00 24 120,00 Kč
	CELKEM VZT úprava				325 101,60 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 2

Doplnění vybavení - nerezové stoly

Stavba:	Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build		
Objekt:	ON Náchod - Pavilon G (klinická imunologie a mikrobiologie + patologie a cytologie)		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	15.07.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ano listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	
Nebylo řešeno	
1.2 Popis nového řešení:	
Dle požadavku provozovatele bude předmět plnění doplněn o nové pracovní nerezové stoly, které jsou pevně spojené se stavbou (dodávka + montáž), a to na oddělení mikrobiologie a pitevnu.	






2 Zdůvodnění změny:	
Dle požadavku provozovatele bude předmět plnění doplněn o nové pracovní nerezové stoly, které jsou pevně spojené se stavbou (dodávka + montáž), a to na oddělení mikrobiologie a pitevnu.	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
--	---	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X	NE
--------------------------------------	---	----------	----

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	
	Cena víceprací (přípočet):	+	62 782,72 Kč bez DPH
	Výsledná ceny změny:		62 782,72 Kč bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022
 Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Petr Chobotský CE - ING / PRISPO s.r.o.	 Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL02 - vybavení nerez stoly

Místo: ON Náchod

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 782,72

PSV - Práce a dodávky PSV

62 782,72

767 - Konstrukce zámečnické

62 782,72



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL02 - vybavení nerez stoly

Místo: ON Náchod

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Královohradecký Kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 782,72

D PSV Práce a dodávky PSV

62 782,72

D 767 Konstrukce zámečnické

62 782,72

1	K	767001	Nerez mycí stůl s odkapávačem a dřezem1200/600	kus	1,000	11 872,28	11 872,28	
2	K	767002	Nerez pracovní stůl s policí 1200/700	kus	1,000	6 665,35	6 665,35	
3	K	767003	Nerez pracovní stůl 1200/700 s posuvnými dveřmi	kus	1,000	11 751,29	11 751,29	
4	K	767004	Nerez mycí stůl s odkapávačem a dřezem1200/700	kus	1,000	12 942,30	12 942,30	
5	K	767005	Nerez pracovní stůl 1200/600xH850+100	kus	1,000	13 699,20	13 699,20	
6	K	767006	Nerez pracovní stůl 800/600x850+100	kus	1,000	5 852,30	5 852,30	

ch



GASTROMANIA

Hledaná fráze

HLEDEJ

PŘIHLÁSIT SE

ÚSCHOVNA

0 / 0 Kč s DPH

K POKLA

žek
/ přidat
títky
f
www.us
é deviz.
Králové
schráni
antewe
ePortál
fikace -
portal
osnova
RMARK
produk
nikace
objedn
stránka
efox
če Inter
če Inter
če Inter
če In



Stůl nerezový s dřezem jednokomorovým na pravé straně a l police 1200x600x850 mm | STALGAST, 980646120

980646120

Cena

21 565 Kč s DPH

17 822 Kč bez DPH

14 664 Kč s DPH

12 119 Kč bez DPH

Množství

1

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Do úschovny

Zasilka do 21 dnů.

POPIS A INFORMACE

HODNOCENÍ A RECENZE

REKLAMACE A VÝMĚNA

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. [Přečíst si](#)

FORMACE

STŮL NEREZOVÝ S DŘEZEM JEDNOKOMOROVÝM NA PRAVÉ STRANĚ A REZ POLICE 1200X600X850

Stůl s jednokomorovým dřezem z levé strany bez police 1200x600x850 mm | STALGAST, 980666120

Výrobce: [STALGAST](#) | Kód výrobku: 980666120



Dostupnost: **21 dnů** ?

Náklad na dopravu: **1.100 Kč** ?

Šroubovaný stůl bez police 1200x600x850 mm s jednokomorovým dřezem s otvorem o průměru 52 mm vyrobený z nerezové oceli pro samostatnou montáž. Nohy spojované šrouby. Otvor pro baterii o průměru 33 mm (zaslepený) ve středu komory. Komora o rozměrech 400x400x250 mm. Možnost tvorby otvoru pro drtič odpadu o průměru 90 mm za příplatek. [více >](#)

cena bez DPH: **12.219 Kč** ~~16.854 Kč~~

cena s DPH: **14.785 Kč** ~~20.393 Kč~~

Množství:

[do košíku](#)

[do schránky](#)

[porovnej](#)

[tiskni](#) [zeptejte se na výrobek](#)

Máte dotaz? Volejte!

555 30 30 30

Naši odborníci jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku 7:30-16:00.





- žek
- r přidat
- řítky
- í
- www.us
- é deviz.
- Králové
- schránk
- antewe
- ePortál
- fikace -
- portal
- osnova
- RMARK
- produk
- unikace
- objedn
- stránka
- efox
- če Inter
- če Inter
- če Inter
- če Inter



Stůl nerezový přístěnný s policí 1200x700x850 mm | STALGA

980047120

980047120

Cena

13 620 Kč s DPH

11 256 Kč bez DPH

9 261 Kč s DPH

7 654 Kč bez DPH

Množství

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Do úschovny

Zasilka do 21 dnů.

POPIS A INFORMACE

HODNOCENÍ A RECENZE

REKLAMACE A VÝMĚNA

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. [Přečíst si více](#)

STŮL NEREZOVÝ PŘÍSTĚNNÝ S POLICÍ 1200X700X850 MM | STALGAST 980047120 - POPIS

Přístěnný stůl s policí, šroubovaný, 1200x700x850 mm | STALGAST, 611327

Výrobce: [STALGAST](#) | Kód výrobku: 611327



Dostupnost: **7 dnů** ?

Náklad na dopravu: **0 Kč** ?

Přístěnný stůl k samostatné montáži s pracovní plochou zpevněnou laminátovou deskou. Nohy spojené pomocí šroubů. [více](#)

cena bez DPH: **6.770 Kč** 8.458 Kč

cena s DPH: **8.192 Kč** 10.234 Kč

Množství:

[do košíku](#)

[do schránky](#)

[porovnej](#)

[tiskni](#) [zeptejte se na výrobek](#)

Máte dotaz? Volejte!

555 30 30 30

Naši odborníci jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku 7:30-16:00.

AKCE

stalga



Stůl nerezový přístěnný s posuvnými dveřmi 1200x700x850 STALGAST, 980187120

980187120

Cena
29 266 Kč s DPH
24 187 Kč bez DPH

19 901 Kč s DPH
16 447 Kč bez DPH

Množství

1

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Do úschovny

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. [Přečíst si](#)

Přístěnný stůl s posuvnými dveřmi 1200x700x850 mm | STALGAST, 980187120

Výrobce: [STALGAST](#) | Kód výrobku: 980187120



Dostupnost: 21 dnů ?

Náklad na dopravu: 1.100 Kč ?

Přístěnný stůl s posuvnými dveřmi 1200x700x850 mm vyrobený z nerezové oceli vysoké kvality. Nástavná police. Možnost montáže zámku za příplatek. [více >](#)

cena bez DPH: **16.583 Kč** ~~22.873 Kč~~

cena s DPH: **20.065 Kč** ~~27.676 Kč~~

Množství: 1

do košíku 🛒 >

[do schránky](#) ➔ [porovnej](#)

[tiskni](#) ➔ [zeptejte se na výrobek](#)

Máte dotaz? Volejte!

☎ **555 30 30 30**

Naši odborníci jsou Vám k dispozici od pondělí do pátku 7:30-16:00.



Naše stránky používají soubory cookies k potřebám uživatelů. Můžete si změnit nastavení pro soubory cookies ve Vašem prohlížeči. [Více informací.](#)

ROZ

[Nerezový nábytek](#)

[Nerezové pracovní a mycí stoly](#)

[Přistěnné nerezové stoly](#)

[Přistěnné nerezové stoly s dřezem](#)

[Pracovní nerezové mycí stoly s policí](#)

AKCE

Bartscher



FACEBOOK

TWITTER

GOOGLE+

Stůl se dřezem, 1200x700x850 mm, jednokomorový dřez straně | BARTSCHER, 306620

306620

Cena

29 711 Kč s DPH

24 555 Kč bez DPH

25 255 Kč s DPH

20 872 Kč bez DPH

Množství

1

PŘIDAT DO KOŠÍKU

Do úschovny

Zasilka do 14 dnů.



< NÁKUPNÍ KOŠÍK



NEREZOVÝ MYCÍ STŮL SE DŘEZEM A ROŠTOVOU POLICÍ NSVOR-170206
DÉLKA X ŠÍŘKA: 1200 X 600

Dostupnost

1 ^
v

Cena za kus

Součet

14 237 Kč / ks

14 237 Kč x

Celkem za zboží:

14 237,36 Kč

Cena vč. DPH:

17 227,21 Kč

POKRAČOVAT >

[NOVINKY](#)[AKCE](#)[OUTLET](#)[BLOG](#)[B2B](#)[bytek](#)[Nerezové pracovní a mycí stoly](#)[Přístěnné nerezové stoly](#)[Přístěnné nerezové stoly s skříňkou](#)[Nerezové stoly oplechované](#)[f FACEBOOK](#)[TWITTER](#)[g+ GOOGLE+](#)

Stůl pracovní 1200x600x850 mm s posuvnými dveřmi a deskou se zadním lemem | RILLING, ASS 0612C 0000

ASS0612C0000

Cena

~~25 879 Kč s DPH~~

~~21 388 Kč bez DPH~~

23 291 Kč s DPH

19 249 Kč bez DPH

Množství

1



GASTROMANIA


[Do úschovny](#)

5



Pracovní stůl | Kuchyňské potřeby | Gastro technika | Přeprava a výdej | Party a rauty | Restaurace obsluha | Hygiena a úklid

Gastro technika / Pracovní stoly nerez

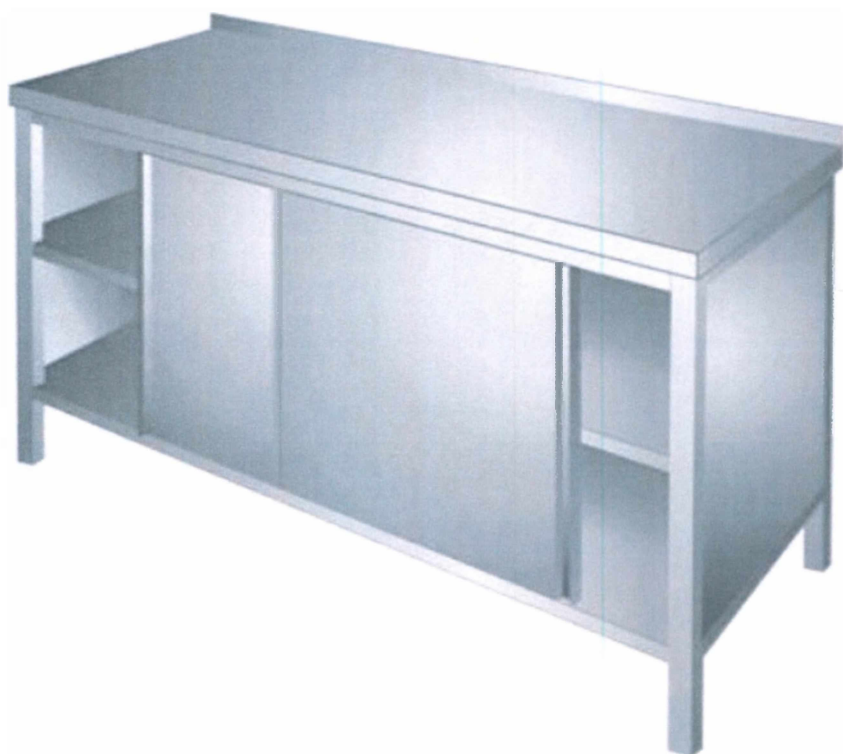

Stůl pracovní s posuvnými dvíř nerez, Š 1200 x H 700 x V 850

Výrobce: Seveza

Žádr



Celonerezový uzavřený pracovní stůl do profesionálních kuchyní a provozů. Stůl je možné upravit ve výrobě na zakázku dle Vašich

více informací

22.465,00 Kč bez DPH

27.182,65 Kč vč. DPH

GASTRO TECHNIKA NA S

při registraci máte lepší cenu



odborní pora

+420 730

Napište n

Koupit na splátky





< NÁKUPNÍ KOŠÍK



NEREZOVÝ PRACOVNÍ STŮL S POLICÍ NNM-17010Z
DÉLKA X ŠÍŘKA: 800 X 600

Dostupnost

1  

Cena za kus

Součet

7 845 Kč / ks

7 845 Kč x


Celkem za zboží:

7 845,07 Kč

Cena vč. DPH:

9 492,53 Kč

POKRAČOVAT >



FACEBOOK



TWITTER



GOOGLE+

Stůl nerezový centrální s policí 800x800x850 mm | S

980108080

980108080

Cena

11 431 Kč s DPH

9 447 Kč bez DPH

7 773 Kč s DPH

6 424 Kč bez DPH

Množství

1



Do úschovny

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 3

Výměna čerpadel v kotelně

Stavba:	Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build		
Objekt:	ON Náchod - Pavilon G (klinická imunologie a mikrobiologie + patologie a cytologie)		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	15.07.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	
<p>Nebylo předmětem plnění a ani nebyly předmětem posouzení stávajícího stavu. Jedná se o čerpadla pro teplou užitkovou vodu, nikoliv VZT. Původní rozvod a původní čerpadla TUV jsou v již nevyhovujícím stavu.</p>	
1.2 Popis nového řešení:	
<p>Výměna původních čerpadel TUV za nová.</p>	

2 Zdůvodnění změny:	
<p>Na základě požadavku uživatele dochází k výměně stávajících WILO oběhových čerpadel TUV v kotelně, která se ukázala, že již nejsou funkční. Dojde proto k výměně a úpravě na páteřních rozvodech TUV.</p>	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	NE
--	--	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	X NE
--------------------------------------	--	-------------

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	107 361,46 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		107 361,46 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022
Jan Cejchan s.r.o.	Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	Ing. Petr Chobotský CE - ING / PRISPO s.r.o.	Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL03 - výměna čerpadel v kotelně

Místo:

ON Náchod

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Královohradecký Kraj

Projektant:

CE-ING s.r.o.

Zhotovitel:

CE-ING s.r.o.

Zpracovatel:

Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 361,46

PSV - Práce a dodávky PSV

107 361,46

731 - Ústřední vytápění - kotelny

107 361,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt: **ZL03 - výměna čerpadel v kotelně**

Místo: ON Náchod

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Královeský kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 361,46	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				107 361,46	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelný				107 361,46	
1	K	7311001	výměna čerpadel kotelná - viz podrobný rozpočet	soubor	1,000	107 361,46	107 361,46	

Vícepráce výměny čerpadel

	množství	jednotky	j.c	cena celkem
Wilo Yonos Maxo 50/0,5-8 PN6/10 230V	2	ks	32 040,00 Kč	64 080,00 Kč
R950X008 2"kulový kohout pro topné plyny	4	ks	2 604,43 Kč	10 417,74 Kč
Filtr šikmý "Y" 2" závitový	2	ks	636,12 Kč	1 272,24 Kč
3280 2" vsuvka mosaz	2	ks	223,20 Kč	446,40 Kč
Varný návarek 2"x150mm	4	ks	88,04 Kč	352,16 Kč
Příruba s krkem 50/6 přivařovací	6	ks	133,92 Kč	803,52 Kč
Těsnění pryž DN 50 PN 6 61x 95mm	4	ks	17,36 Kč	69,44 Kč
Šroub M12x055 částečný závit pozink	16	ks	6,20 Kč	99,20 Kč
Podložka M12 pozink	32	ks	2,48 Kč	79,36 Kč
Matka M12 přesná pozink	16	ks	2,48 Kč	39,68 Kč
Nátrubek varný 1/2"	2	ks	16,12 Kč	32,24 Kč
R608Y013 1/2" vypouštěcí kulový kohout vnější/vnější s hadicovou vývodkou a zátkou	2	ks	337,28 Kč	674,56 Kč
Montážní a spojovací materiál	1	kpl	1 181,72 Kč	1 181,72 Kč
Montáž	1	kpl	24 800,00 Kč	24 800,00 Kč
Doprava	1	kpl	3 013,20 Kč	3 013,20 Kč
			celkem bez DPH	107 361,46 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 4

Vytvoření a úprava příčky (pracoviště Covid-19)

Stavba:	Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build		
Objekt:	ON Náchod - Pavilon G (klinická imunologie a mikrobiologie + patologie a cytologie)		
Předkládá:	CE - ING s.r.o.	Datum:	15.07.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	ne listů, výkresů
osobně	X	3) Fotodokumentace	ne listů

1 Technický popis změny:	
1.1 Popis původního řešení:	Nebylo řešeno
1.2 Popis nového řešení:	Nově instalovaná dělicí příčka na chodbě ve 2. NP - rozdělení oddělení.






2 Zdůvodnění změny:	Na základě požadavku provozovatele bylo navrženo rozdělení chodby ve 2. NP pro oddělení dvou mikrobiologických pracovišť od COVID-19 pracoviště, a to dělicí transparentní plastovou stěnou včetně spojených úprav s tímto požadavkem.
----------------------------	--

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	X	NE
--	--	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:	X ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>		NE
• 21 dní (stejný termín dokončení jako u ZL 1)			

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	4
--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	67 377,80 Kč bez DPH
	Výsledná ceny změny:		67 377,80 Kč bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022
 Ing. Tomáš Pazdera Ekolog. rozvoj a výstavba	 Ing. Petr Chobotský CE - ING / PRISPO s.r.o.	 Miroslav Bůžek ON Náchod a.s.	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj	 Ing. Miroslav Michl Královéhradecký kraj

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL04 - covidová příčka na chodbě

Místo: ON Náchod

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Královehradecký Kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 377,80

HSV - Práce a dodávky HSV

5 998,80

4 - Vodorovné konstrukce

5 076,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

922,80

PSV - Práce a dodávky PSV

61 379,00

763 - Konstrukce suché výstavby

4 981,00

766 - Konstrukce truhlářské

56 398,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava patologie ON Náchod (VZT + stavební úpravy)

Objekt:

ZL04 - covidová příčka na chodbě

Místo: ON Náchod

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Královohradecký Kraj

Projektant: CE-ING s.r.o.

Zhotovitel: CE-ING s.r.o.

Zpracovatel: Čejchan Jan

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

67 377,80


D HSV			Práce a dodávky HSV				5 998,80	
D 4			Vodorovné konstrukce				5 076,00	
4	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,072	12 000,00	864,00	CS ÚRS 2022 01
VV			"Úč.12" 2*2,7*13,4*0,001		0,072			
5	M	RMAT0001	nosník ocelový válcovaný	t	0,072	58 500,00	4 212,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				922,80	
1	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	4,000	91,70	366,80	CS ÚRS 2022 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				61 379,00	
D 763			Konstrukce suché výstavby				4 981,00	
7	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	2,700	1 030,00	2 781,00	CS ÚRS 2022 02
VV			2,7*1		2,700			
6	K	763111912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK příčce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2022 02
D 766			Konstrukce truhlářské				56 398,00	
8	K	766641142	Montáž dveří zdvojených jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem včetně rámu do zdiva	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	CS ÚRS 2022 02
9	M	RMAT0002	plastová dělicí stěna na chodbě II.Np s rozšiřovacím pruhem a dveřním otvorem 1100 mm (2660 x 2540) bezprahové, boční fix	ks	1,000	49 680,00	49 680,00	
10	M	RMAT0003	plastové rohové přelištování	bm	10,400	420,00	4 368,00	
VV			2,6*2*2		10,400			

Pozice : 1 Kusů : 1 Š : 720 V : 2480

Perfectline Rovný

System: Perfectline Rovný
 Název okna: Okno Fix v rámu+Fix v rámu
 Barva: Ven Bílý 051/BI// Dovnitř Bílý 051
 Těsnění: Černé

Pohled z vnitřní str

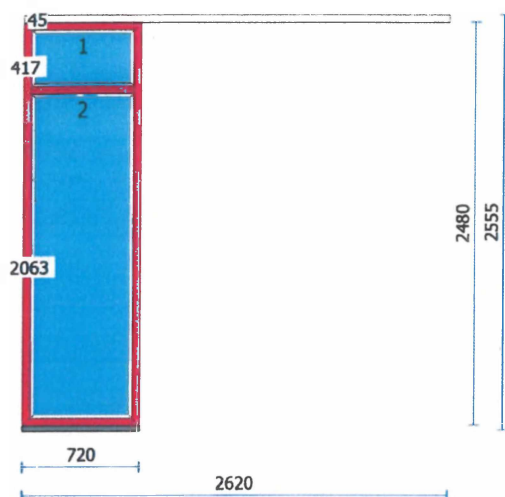

Uw ~ 1,3

Váha 1 ks~

Povrch

65,35 kg

1,7856 m²

Profil a výztuha:

Rám: 101.212 ->67mm ST 113.025.1,5
 Sloupek: 102.214 ->85mm ST 113.025.1,5
 [1,2] Lišta Zaoblená 107.235 Těsnění: Černé

Skla:

[1,2] [24]mm TR Šedý 4/16A/4 t1,1 U=1,1
 [619x340] [619x1986]

Příslušenství

[Rozšíření 45mm 114.202]

1 Ks délka[mm] : 2620

051 / 051

Výztuha : 113.271.1,5 [1]

Montáž : Ne

Cena 135,13

Příslušenství :

Prvky

[110.058 Metalplast]

1 Ks délka [mm] : 720

Montáž Ano

[Lacznik statyczny 20mm + plaskownik 10mm Veka 70mm]

1 Ks délka [mm] : 2480

Montáž Ne


Barva: Bílý / Bílý

CZ 0169675/2

Datum výjezdu

Pozice : 2 Kusů : 1 Š : 1140 V : 2480**Dveře Perfect 70 otevíravé
dovnitř**

Systém: Dveře Perfect 70 otevíravé dovnitř
 Název okna: Dveře otevíravé dovnitř Fix v rámu+O
 Barva: Ven Bílý 051/BI// Dovnitř Bílý 051
 Těsnění: Černé

Pohled z vnitřní str

Uw ~ 1,3

Váha 1 ks~

Povrch

104,78 kg

2,8272 m2

Profil a výztuha:

Rám:	101.209 ->80mm	ST	113.025.3,0
Křídlo:	105.232 ->120mm	ST	113.286.3,0
Sloupek:	102.218 ->85mm	ST	113.271.4,0
Kaltenfein	AMS1220 5		

[1,2] Lišta Zaoblená 107.235 Těsnění: Černé

Skla:

[1,2] [24]mm TR Šedý 4/16A/4 t1,1 U=1,1
 [1013x327] [831x1837]

Funkce kování:

-Dovnitř-

[2] Greenteq 1/2 Kliky část vnitřní - Bílá

Ven

[2] Greenteq 1/2 Kliky část venk. Bílá

2 O

Typ rozvory

Zamek 2 Trny - Háky Automatická Vložka

Standard Cylyndricka vložka 45/45

Ks 1

Pant dveřní JOCER 20,5mm Bílý Ks

3

Bez dodatečného dveřního závěsu

Ks 1

Poznámky

PRUCHOD 954 MM


SIEGENIA

CZ 0169675/2

Datum výjezdu

Pozice : 3 Kusů : 1 Š : 720 V : 2480**Perfectline Rovný**

System: Perfectline Rovný
Název okna: Okno Fix v rámu+Fix v rámu
Barva: Ven Bílý 051/BI// Dovnitř Bílý 051
Těsnění: Černé

Pohled z vnitřní str

Uw ~ 1,3

Váha 1 ks~

Povrch

59,17 kg

1,7856 m2

Profil a výztuha:

Rám: 101.212 ->67mm ST 113.025.1,5
Sloupek: 102.214 ->85mm ST 113.025.1,5
[1,2] Lišta Zaoblená 107.235 Těsnění: Černé


Skla:

[1,2] [24]mm TR Šedý 4/16A/4 t1,1 U=1,1
[619x340] [619x1986]

Příslušenství :**Prvky****[110.058 Metalplast]****1 Ks délka [mm] : 720****Montáž Ano****[Lacznik statyczny 20mm + plaskownik 10mm Veka 70mm]****1 Ks délka [mm] : 2480****Montáž Ne**

Barva: Bílý / Bílý


SESTAVA PLASTOVÁ DELEČ STĚNA

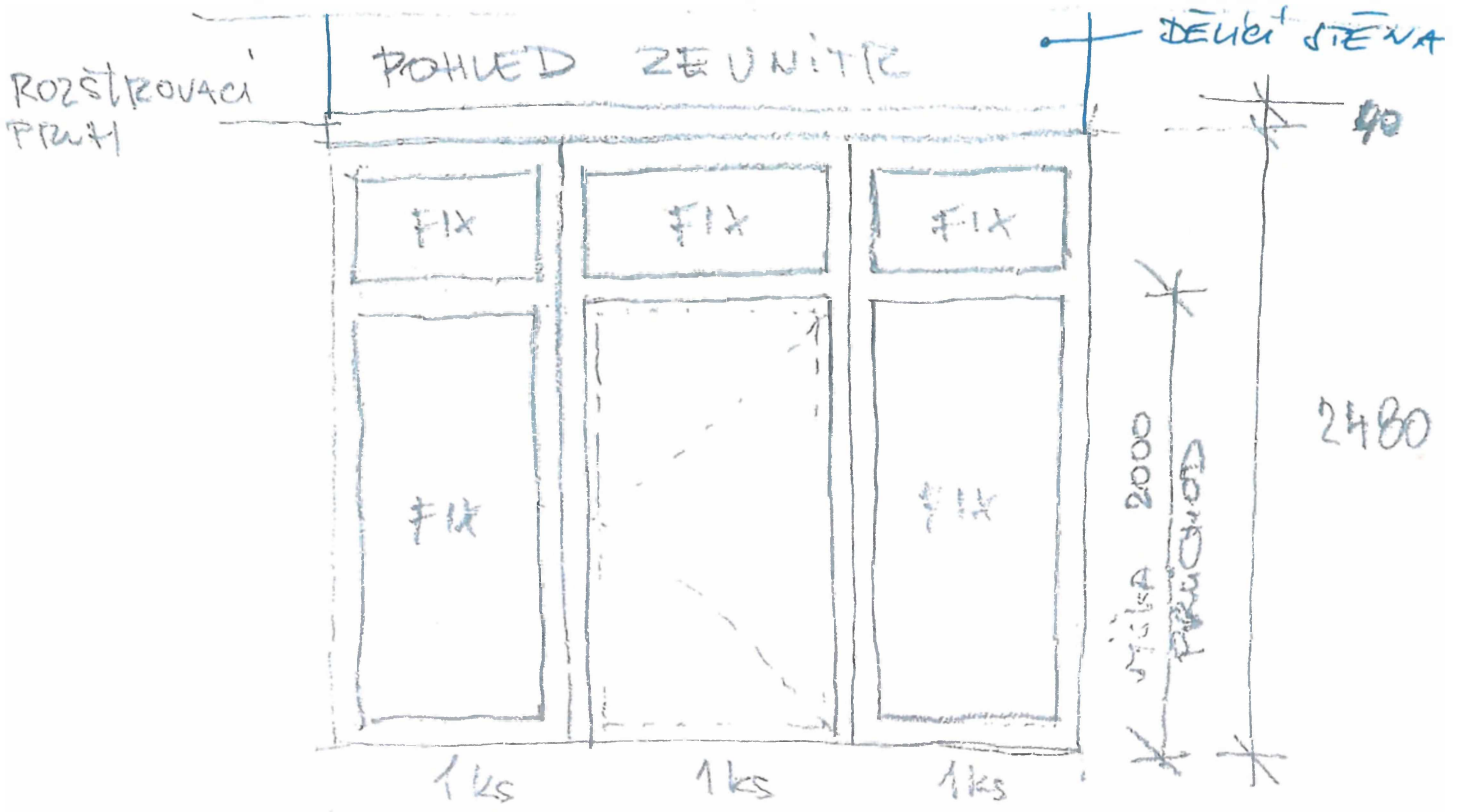

minimální průchod 950

- zasklení dvojitě

- rám jednokomorový

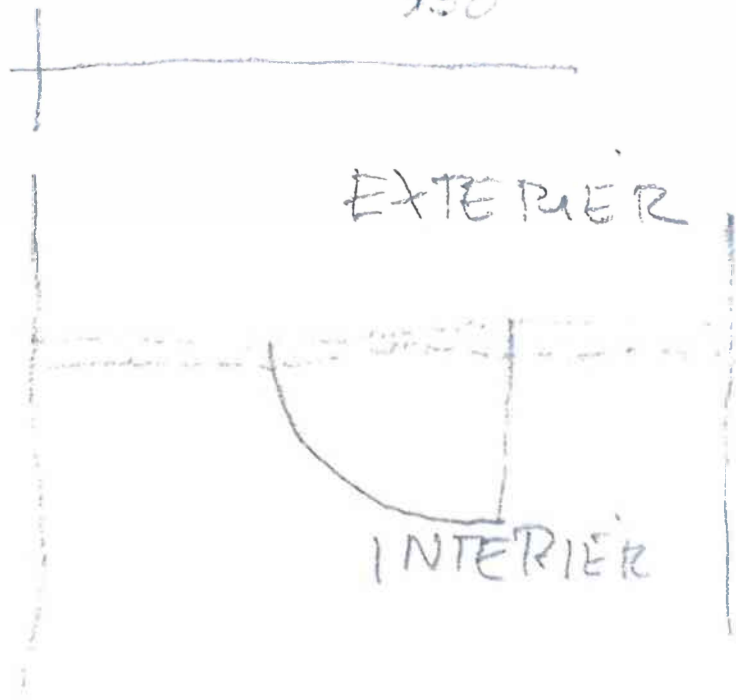

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Úprava patologie ON Náchod (vzduchotechnika + stavební úpravy) formou Design & Build

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	8 987 654,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 587 623,58 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 587 623,58 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	587 623,58 Kč bez DPH		
(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	587 624 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	6,54 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	8 987 654,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	8 987 654,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena	8 987 654,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	0,00 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 587 623,58 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	587 623,58 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	8 987 654,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	9 575 277,58 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 575 277,58 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Miroslav Michl
