

## **DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

**na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb „Výstavba PZS P1778,  
doplnění závor P1791, výstavba PZS P1807 trati Rakovník – Bečov nad Teplou“**

### **Označení jednotlivých staveb:**

„Výstavba PZS v km 29,082 (P1778) trati Rakovník – Bečov nad Teplou“

(dále jen „Stavba 1“)

„Doplnění závor na přejezdu P1791 v km 35,308 trati Rakovník – Bečov nad Teplou“

(dále jen „Stavba 2“)

„Výstavba PZS v km 48,942 (P1807) trati Rakovník – Bečov nad Teplou“

(dále jen „Stavba 3“)

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana  
Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

Číslo smlouvy: E618-S-1487/2021/Bř

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 1: 327 351 4800 / 542 353 0047

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 2: 327 351 4800 / 542 353 0042

ISPROFOND / Sub.ISPROFIN Stavba 2: 327 351 4800 / 541 353 0023

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

**ATE, s. r. o.**

se sídlem: Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

spisová značka C3542

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Václavem Mastným**, jednatelem

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

shodná se sídlem společnosti

číslo smlouvy: 20243

(dále jen „**zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb „Výstavba PZS P1778, doplnění závor P1791, výstavba PZS P1807 trati Rakovník – Bečov nad Teplou“ (dále jen „Smlouva“), s účinností Smlouvy ke dni 19. 04. 2021.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla. Důvodem úprav lhůt je:

- a. dílčí etapa Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavební povolení, nebo společného povolení** – důvodem pro úpravu lhůty z 6 na 8 měsíců je nemožnost kompletnosti dokladové části projektové dokumentace z důvodu objektivních prodlev ve vyjadřování k PD ve stupni k připomínkám na úrovni odborných složek Správy železnic, státní organizace, zejména z důvodu větší rozsáhlosti požadovaného plnění. Kompletní připomínky k zpracování zhotovitel obdržel dne 15. 11. 2021, tedy cca o 2 měsíce později. V důsledku toho nebylo možné tuto dílčí etapu odevzdat v řádném termínu dle Smlouvy.
- b. dílčí etapa Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby** – důvodem pro úpravu lhůty z 9 na 11 měsíců je posun související se změnou lhůty 2. dílčí etapy podle bodu a).

Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení byla Drážnímu úřadu doručena dne 11. 03. 2022. Drážní úřad oznámil zahájení stavebních řízení ve dnech 23. 03. 2022 (P1778), 30. 03. 2022 (P1791), 01. 04. 2022 (P1807), následně vydal stavební povolení ve dnech 12. 04. 2022 (P1778), 20. 04. 2022 (P1791), 25. 04. 2022 (P1807), která nabyla právní moci ve dnech 06. 05. 2022 (P1778), 07. 05. 2022 (P1791) a 26. 05. 2022 (P1807) a byla předána objednateli dne 26. 05. 2022.

- c. dílčí etapa *Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací)*** – důvodem úpravy lhůty z 15 na 18 měsíců je přidělení realizačních výluk až v termínu 09/2022, přičemž tyto termíny nebyly v okamžiku uzavření Smlouvy známy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.8 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

## **I. Předmět Dodatku**

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**



3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **21 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **8 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **11 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **18 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## 2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

*příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací***

**Za Objednatele:**

V Praze



01.09.2022 16:57  
Podepsáno elektronicky


Ing. Mojmír Nejezchleb  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Chebu

Ing. Václav Mastný  
jednatel

Datum:  
2022.08.12  
15:23:07 +02'00'

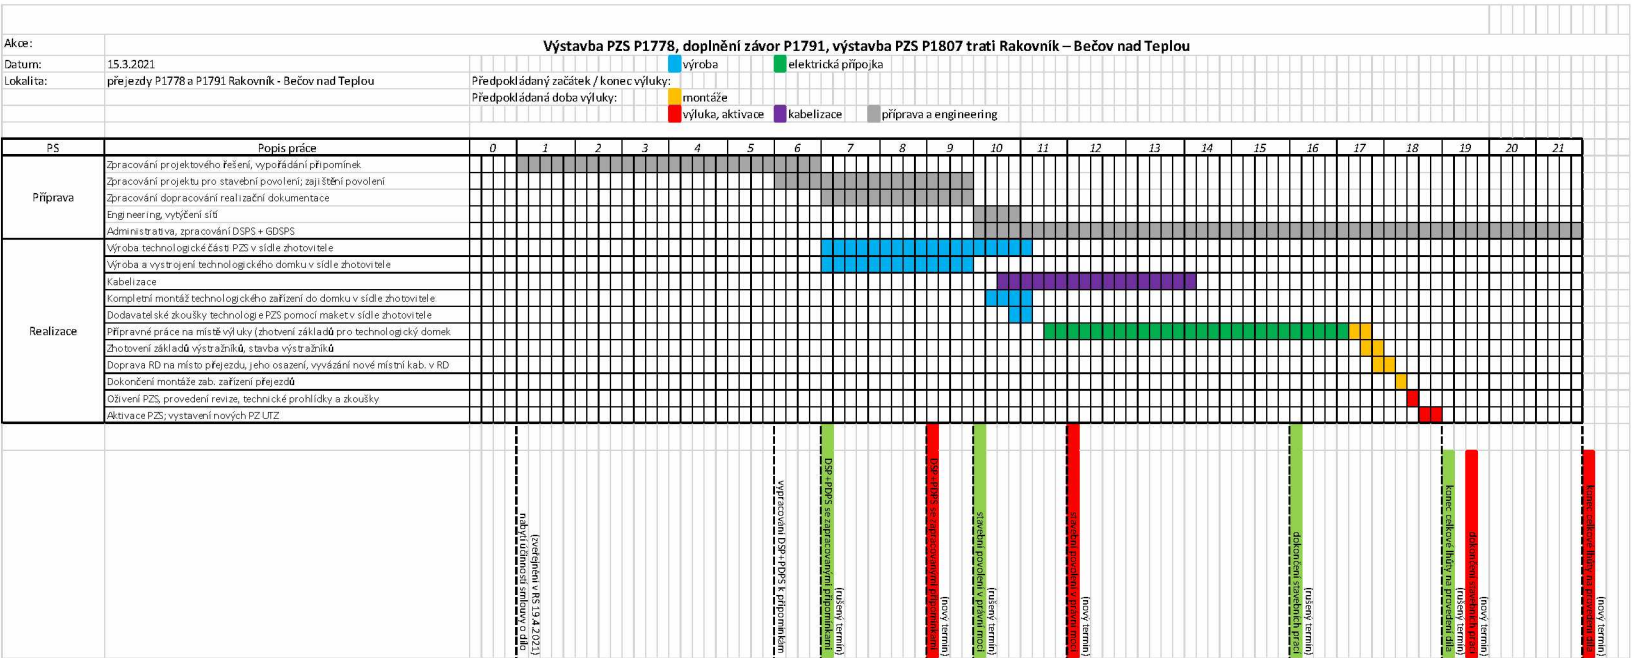

### Harmonogram postupu prací

(Příloha č. 5 Smlouvy)

## PŘÍLOHA Č. 1
