



S/0457/2020/IO/6

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0457/2020/IO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 / e-mail: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

Tel: 558 609 259/ e-mail: rek.pavel@frydek-mistek.cz

▪ dále jen objednatel

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716


zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: 558 443 211

Kontaktní osoby ve věcech technických:

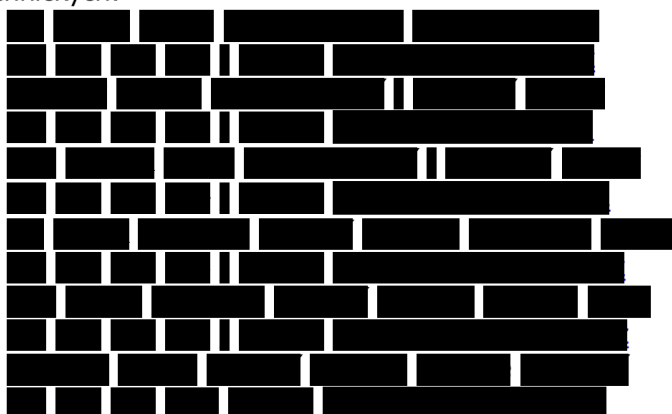

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 6 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.07.2020 na stavební práce pod názvem „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA V DŮSLEDKU OBNOVENÉHO JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ

1.1 Strany se dohodly na navýšení ceny díla na základě obnovení jednání o smlouvě dle ust. § 1765 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ).

1.1.1. Vzhledem ke skutečnosti, že:

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. 07. 2020;
2. žádost o obnovení jednání o smlouvě byla městu přednesena dne 14. 06. 2022 (avizován skokový nárůst cen ve stavebnictví působením ekonomických následků pandemie Covid 19 + Ukrajinský konflikt); žádost byla doplněna o cenovou kalkulaci dne 23. 08. 2022;
3. jednání se zhotovitelem se uskutečnilo ve dnech 14. 06. 2022, 17. 8. 2022 a 23. 8. 2022;
4. TS a.s. navrhuje jako spravedlivý a legitimní a objektivně doložitelný způsob navýšení ceny díla prostřednictvím vývoje míry inflace za dobu trvání smlouvy za období po skokovém nárůstu v letošním roce 2022, a to:
 - a) u stavebních prací doposud provedených a vyúčtovaných za období leden až červen 2022 ve výši 11 365 127,04 Kč bez DPH, u kterých požadují navýšit cenu o 10,60 %, tj. provést dodatečnou indexaci o koeficient 0,106, což představuje nárůst o 1 204 703,47 Kč bez DPH;
 - b) u stavebních prací zasmluvněných a doposud neprovedených v roce 2022 ve výši 17 201 490,12 Kč bez DPH, které požadují v rámci vyúčtování dle skutečnosti navýšit o aktuální míru inflace spotřebitelských cen ve výši 17,5 %, tj. indexovat koeficientem 0,175, což představuje nárůst o 3 010 260,77 Kč bez DPH; v této souvislosti lze uvést, že výsledné navýšení ceny díla se bude odvíjet od skutečně provedených prací, kdy lze očekávat do splnění smlouvy ještě neprováděné práce.

Strany se dohodly, že nabytím účinnosti tohoto dodatku bude cena díla i zpětně, počínaje měsícem ledna 2022 změněna - indexována v rozsahu dle změnového listu č. 25.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena díla	DPH 21 %	Cena díla celkem
Cena díla dle SoD	51 619 637,62 Kč	10 840 123,90 Kč	62 459 761,52 Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 1	492 589,70 Kč	103 443,84 Kč	596 033,54 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	52 112 227,32 Kč	10 943 567,74 Kč	63 055 795,06 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	- 715 277,17 Kč	- 150 208,21 Kč	- 865 485,38 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2	845 321,72 Kč	177 517,56 Kč	1 022 839,28 Kč
Cena dle dodatku č. 2	52 242 271,87 Kč	10 970 877,09 Kč	63 213 148,96 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 3	-2 235 460,08 Kč	-469 446,62 Kč	2 704 906,70 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 3	678 342,67 Kč	142 451,96 Kč	820 794,63 Kč
Cena dle dodatku č. 3	50 685 154,46 Kč	10 643 882,44 Kč	61 329 036,89 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 4	-14 580,00 Kč	-3 061,80 Kč	-17 641,80 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 4	3 117,25 Kč	654,62 Kč	3 771,87 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4	50 673 691,71 Kč	10 641 475,26 Kč	61 315 166,97 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 5	-5 109 853,93 Kč	-1 073 069,33 Kč	-6 182 923,26 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 5	3 201 738,66 Kč	672 365,12 Kč	3 874 103,78 Kč
Cena díla dle dodatku č. 5	48 765 576,44 Kč	10 240 771,05 Kč	59 006 347,49 Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 6 (ZL č. 25) na základě obnoveného jednání o smlouvě se zhotovitelem	4 214 964,24 Kč	885 142,49 Kč	5 100 106,73 Kč
Cena díla dle dodatku č. 6	52 980 540,68 Kč	11 125 913,54 Kč	64 106 454,22 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 08. 2022.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 25 - Indexace cen materiálů a nákladových vstupů

Příloha č. 2 – Žádost TS a.s. ze dne 18. 8. 2022 o navýšení ceny, včetně kalkulace ze dne 23. 8. 2022

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Petr Korč
primátor

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva
