

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky: „GSM-R, trať Kralupy n. Vlt. - Neratovice“

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-374/2021/PH**
číslo smlouvy Zhotovitele: **2020/VIT/1327**
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: **327 321 4993/521 352 0057**,
uzavřené dne 17. 02. 2021 (dále jen „Smlouva“) mezi

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitelem:

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005; DIČ: CZ45311005,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1 a analogicky s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

a) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	- 148 475,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	- 148 475,00 Kč

b) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	+ 1 377 895,00 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	- 392 700,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 985 195,00 Kč

c) U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	+ 6 464 527,73 Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	- 5 993 037,00 Kč
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 1 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 471 490,73 Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ je **0,59 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ je **5,83 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku **1 308 210,73 Kč bez DPH**.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

2. Úprava harmonogramu plnění a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Důvodem pro změnu harmonogramu plnění spočívající v úpravě níže uvedených lhůt je zejména rozšíření PS 201 Úprava BTS v ŽST Kralupy nad Vltavou, kde díky skutečnosti, že původně plánovaná BTS Chvatěrubu nebude realizována a místo ní bude rozšířena stávající BTS Kralupy nad Vltavou o druhý sektor, který bude umístěn na stejném stožáru jako stávající první sektor a jeho anténa bude směřována na odbočnou trať směr Neratovice, což má dopad do délky dokončení prací.

Lhůta pro dokončení prací se prodlužuje o dva měsíce na celkem 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy a lhůty pro předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby se zkracuje o dva měsíce na celkem jeden měsíc ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Celková lhůta pro provedení Díla se nemění a zůstává beze změn.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.8 Smlouvy, článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 1, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

3. Zhotovitel bere dále na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně adresy a způsobu doručování faktur.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly dle čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele E618-S-374/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/VIT/1327, uzavřené dne 17. 02. 2021, takto:

1) ČLÁNEK 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 24 977 000,00 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH + 1 308 210,73 Kč

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH: 26 285 210,73 Kč

slovy: **dvacet šest milionů dvě stě osmdesát pět tisíc dvě stě deset korun českých sedmdesát tři haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

b) ruší se stávající text odst. 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **21 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **20 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) ČLÁNEK 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/24/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

– nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

– nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-374/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/VIT/1327, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
příloha č. 2 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram plnění
– nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze



19.09.2022 08:39

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel

Stavební správa západ

Správa železnic, státní organizace



kontron

Date: 2022.09.15

09:57:24 +02'00'

.....
Ing. Petr Vitek

jednatel společnosti

Kontron Transportation s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 20 měsíců) v celkovém počtu 53 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla - Rekapitulace

Smluvní cena celkem dle dodatku č. 1, bez DPH ve výši 26 285 210,73 Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši [REDAKCE] Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH [REDAKCE] Kč, tj. [REDAKCE] Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS dle dodatku č. 1, bez DPH [REDAKCE] Kč**

Rekapitulace ceny

stavba:				Cena díla dle SOD [Kč]	ZL č. 1 Vícepráce [Kč]	ZL č. 1 Méněpráce [Kč]	Celková cena dle dodatku č. 1 [Kč]
GSM-R, trat' Kralupy n. Vlt. - Neratovice				24 977 000,00	7 842 423	6 534 212	26 285 210,73
Číslo objektu	Název objektu		Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby							
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS	PS 101	Úpravy DOK ČD-T v úseku Kralupy nad Vltavou - Všetaty	SŽ				
PS	PS 102	Přenosové zařízení v úseku Kralupy nad Vltavou - Všetaty	SŽ				
PS	PS 103	Přístupové terminály do sítě GSM-R v úseku Kralupy nad Vltavou - Všetaty	SŽ				
PS	PS 201	BTS ŽST Chvatěruby	SŽ				
PS	PS 202	BTS ŽST Úžice	SŽ				
PS	PS 203	BTS ŽST Neratovice	SŽ				
PS	PS 301	Úvedení do provozu, úsek Kralupy nad Vltavou - Všetaty	SŽ				
PS	PS 401	Doplňení centrálních a ústřednových částí sítě GSM-R	SŽ				
PS	PS 402	Radiovníky	SŽ				
Všeobecný objekt							
SO	98-98	Všeobecný objekt	SŽ				
Cena díla za zpracování projektové dokumentace							
	PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby	SŽ				
Cena díla za výkon autorského dozoru							
		Autorský dozor projektanta	SŽ				
		<i>hodinová sazba</i>					
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]				24 977 000,00			26 285 210,73


PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Harmonogram prací, dodatek č.1

Název stavby: GSM-R, trať Kralupy n. Vlt. - Neratovice

Název práce / činnosti	Doba trvání (ve dnech)	Předpokládaný začátek (ve dnech)	Předpokládaný konec (ve dnech)
Podpis smlouvy / zahájení stavby k 02/21	1	1	1
Přípravné práce	8	1	9
Úvodní porada		7	7
Zpracování rádiového plánování	82	9	91
Zpracování projektu stavby, odsouhlasení, projednání	31	13	44
Vydání stavebního povolení v právní moci	30	44	74
PS 102 - Přenosové zařízení v úseku Kralupy nad Vltavou - Všetaty	230	184	414
PS 103 - Přístupové terminály do sítě GSM-R v úseku Kralupy nad Vltavou - Všetaty	313	280	593
PS 201 - BTS ŽST Chvatěruby	312	275	587
PS 202 - BTS ŽST Újčice	321	275	596
PS 203 - BTS ŽST Neratovice	242	275	517
PS 301 - Uvedení do provozu, úsek Kralupy nad Vltavou - Všetaty	14	518	532
PS 401 - Doplnění centrálních a ústřednových částí sítě GSM-R	181	275	456
PS 402 - Radiovníky	121	396	517
SO 98-98 - Všeobecný objekt	355	151	506
Provedení akceptačního měření	14	529	543
Autorský dozor + rezerva	540	1	539
Dokončení projekční a stavební části	600	1	600
Vyhotovení a předání dokumentace projektu	30	600	630
Lhůta pro dokončení projektu	630	1	630

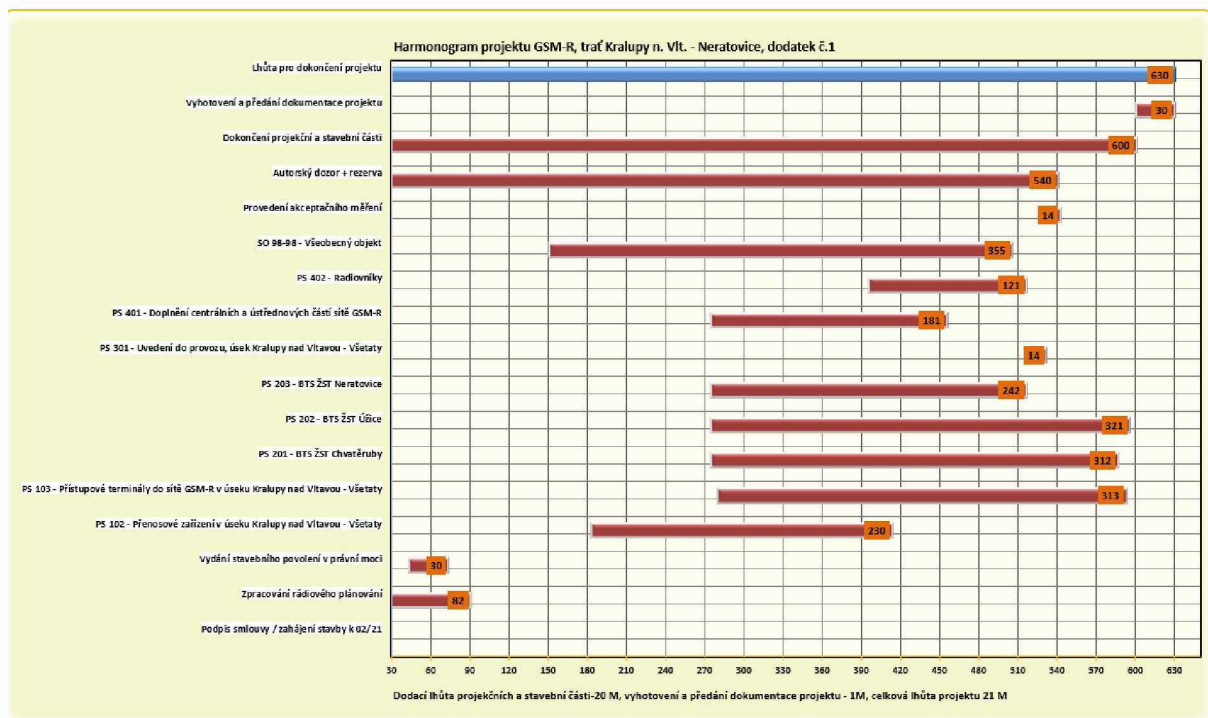

Harmonogram - finanční objemy po měsících, dodatek č. 1

Měsíce	Procenta
1	1,20%
2	1,80%
3	2,60%
4	2,80%
5	2,90%
6	3,10%
7	3,20%
8	3,90%
9	4,30%
10	4,50%
11	4,60%
12	5,00%
13	5,00%
14	5,10%
15	5,30%
16	6,80%
17	6,90%
18	7,50%
19	7,80%
20	8,30%
21	7,40%

