

## Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) mezi těmito smluvními stranami:

### I. Smluvní strany

#### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: + [REDACTED]  
Zdeňka Nováková, referentka odboru investic  
E-mail: [REDACTED]  
Tel.: + [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Metrostav Infrastructure a.s.

sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupena: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
Ing. Marek Steiner, místopředseda představenstva  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Čmiel, ředitel oblasti  
oprávněn jednat ve věcech reklamací: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda představenstva  
Ing. Tomáš Čmiel, ředitel oblasti  
IČO: 24204005  
DIČ: CZ24204005  
e-mail: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2021/02/067/Li, uzavřené dne 29.09.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 27.03.2022, č. 3 ze dne 13.06.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby s názvem „Nadjezd Závodní“.
2. Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli zhotovitele. Soupis těchto změn (soupis víceprací a méněprací) je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce budou, nebo měly být realizovány. O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla tak, že cena díla je tímto dodatkem snížena o 1.243.359,41 Kč bez DPH.

### II.

#### Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
  - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

**Cena díla bez DPH                      75.340.027,51 Kč bez DPH**


*K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“*

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel dva výtisky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 122. schůzi Rady města Třince dne 05.09.2022 usnesením č. 2022/3937, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.



primátorka

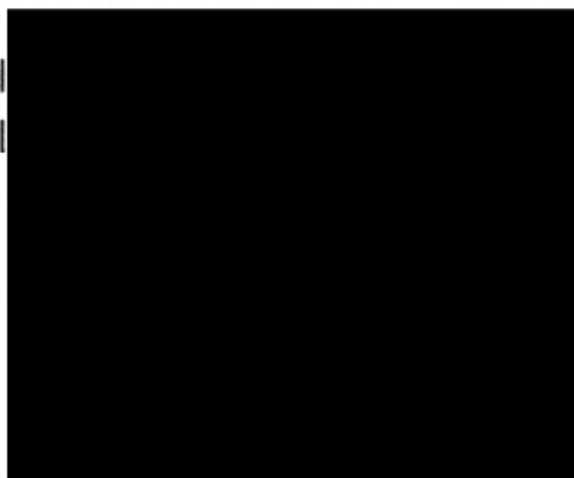

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 5	
Zhotovitel:	Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	29.08.2022
Název akce:	NADJEZD ZÁVODNÍ		
<b>Předmět změny:</b>			
<p>Předmětem změny je narovnání výměrníc dle skutečnosti v souladu s projektovou dokumentací skutečného provedení. Jedná se o narovnání množství výztuže, kdy v projektové dokumentaci pro provedení stavby bylo původně navrženo větší množství výztuže, než bylo použito v rámci realizace. Množství výztuže bylo upřesněno na základě zhotovitelem zpracované a autorským dozorem odsouhlasené realizační dokumentace.</p>			
<b>Potvrzená změna rozsahu díla:</b>			
Cena méněprací bez DPH:	-1 484 191,07 Kč	Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-1 484 191,07 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	14.9.2022
Cena dle SOD vč. dodatků bez DPH:	76 824 218,58 Kč	Nová cena bez DPH:	75 340 027,51 Kč
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	Ing. Tomáš Čmiel	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (Supervize):</u></b>	Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (TDS):</u></b>	Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Twardzik	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (AD):</u></b>	Ing. Martin Řehulka	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Bc. Alexandra Lipovská	<b><u>podpis:</u></b>	

## Změnový list č.05

Stavba: NADJEZD ZÁVODNÍ

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
		- Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		- Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
		- 1 484 191,07 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		
		- 1 484 191,07 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		- 1 484 191,07 Kč
-----------------------------------	--	-------------------

Dodavatel: Ing. Tomáš Čmiel

Supervize: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

TDS: Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal

AD: Ing. Martin Řehulka

Objednatel: Bc. Alexandra Lipovská



4: Vodoravné konstrukce


Objekt	Podíl
65	SUB
67	SUB
71	SUB

420365 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B

421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

422365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 4	
Zhotovitel:	Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	29.08.2022
Název akce:	NADJEZD ZÁVODNÍ		
<p><b>Předmět změny:</b>  Předmětem změny jsou mimo jiné méněpráce v korytu řeky Olše. V projektové dokumentaci je navrženo opevnění břehu kamenem do betonového lože. Vzhledem k současnému stavu koryta není toto technické řešení proveditelné. Po konzultaci se správcem toku je navržena záměna kamenné dlažby do betonu zatravněním a protierozní georohoží. Dále došlo k narovnání množství výztuže týkající se změny technologického postupu (řešeno ve ZL 01) dle skutečnosti a v souladu s projektovou dokumentací skutečného provedení stavby. Po zaměření skutečně provedených prací vznikly i vícepráce. Jedná se zejména o větší množství silničních obrub a nárůst ploch sanačních prací.</p>			
<b>Potvrzená změna rozsahu díla:</b>			
Cena méněprací bez DPH: -1 244 643,67 Kč		Cena víceprací bez DPH: 1 485 475,32 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: 240 831,66 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 14.9.2022	
Cena dle SOD vč. dodatků bez DPH: 76 583 386,92 Kč		Nová cena bez DPH: 76 824 218,58 Kč	
<b><u>schválil (Dodavatel):</u></b>	Ing. Tomáš Čmiel	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (Supervize):</u></b>	Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (TDS):</u></b>	Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Twardzik	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (AD):</u></b>	Ing. Martin Řehulka	<b><u>podpis:</u></b>	
<b><u>schválil (Objednatel):</u></b>	Bc. Alexandra Lipovská	<b><u>podpis:</u></b>	

## Změnový list č.04

Stavba: NADJEZD ZÁVODNÍ

Objekt:

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
		1 485 475,32 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		
		<b>1 485 475,32 Kč</b>

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
		- 1 244 643,67 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		
		<b>- 1 244 643,67 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>240 831,66 Kč</b>
--	--	----------------------

Dodavatel: Ing. Tomáš Čmiel

Supervize: Ing. Vladislav Varmuža, Ph.D.

TDS: Ing. Daniel Mrozek, Ing. Michal Tw

AD: Ing. Martin Řehulka

Objednatel: Bc. Alexandra Lipovská





107	SUB	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2
109	SUB	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2
110	SUB	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL. CCA 2MM	M2
111	SUB	62652	ÖCHIRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2

**7: Přidružené stavební výroba**

118	SUB	76381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2
-----	-----	-------	-----------------------------------	----

**8: Ostatní konstrukce a práce**

149	SUB	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M
150	SUB	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M
152	SUB	919112	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M
165	SUB	93650x	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KUS
168	SUB	938551	ÖČIŠTĚNÍ ZDIVA ÖTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2
170	SUB	938552	ÖČIŠTĚNÍ BETON KONSTR ÖTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2
181	SUB	97811	ÖTLUČENÍ ÖMITKY	M2
