

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022
č. smlouvy: S-3531/00066001/2020
(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost GG+KDS – Jiříce“

GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
č. smlouvy: AV.20043.1.150
zastoupená: Vlastou Končelovou, osobou pověřenou elektronickým podpisem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. (společník)

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice
IČO: 284 47 085
DIČ: CZ28447085
zastoupená: Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**JIRICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení odst. 15.13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	10 493 668,09 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	11 086 756,89 Kč
DPH 21%	2 328 218,95 Kč
Cena Díla včetně DPH	13 414 975,84 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatel odsouhlasen Změnový listy 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech

V Praze dne

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

„Společnost GG+KDS – Jiřice“
Vlasta Končelová
osoba pověřená elektronickým podpisem

POVĚŘENÍ č. 20/GG/082

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

pověřuje

svou zaměstnankyni Vlastu Končelovou, nar. dne

trvale bytem

, která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis zaměstnavatele (dále jen „pověřený zaměstnanec“),

aby v souladu s výkonem své pracovní pozice tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námitky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání,
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároků
- a další.

Pověřený zaměstnanec je v souladu s výkonem své pracovní pozice rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsaným způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 10. srpna 2020

Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám pověření:

Vlasta Končelová, pověřená osoba

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **016161/101/2020/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve dvou (2) vyhotoveních podepsal:

Luděk Kostka

narozený dne

bytem

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. :

vydaného Městským úřadem

Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 12. 8. 2020

Mgr. Daniel Thelen, advokát

OFFICE OF THE DEAN

CHICAGO, ILLINOIS

DEAN

UNIVERSITY OF CHICAGO

1100 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

TEL: (773) 492-3000

FAX: (773) 492-3000

WWW.CHICAGO.EDU

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

CHICAGO, ILLINOIS 60637

[Handwritten signature]

THE DEAN

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131120295-18390-200813131618**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA OŽDIANOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha 7**

Pracoviště: **Městská část Praha 7**

V Praze dne **13.08.2020**



131120295-18390-200813131618

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nevhodného místa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: "Společnost GG+KDS - Jiřice"
GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník), se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník), se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-37 453,20	630 542,00	593 088,80

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-37 453,20	630 542,00	593 088,80

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nevhodného místa	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272		

Strany smlouvy o dílo objednatel č. S-3531/00066001/2020 a zhotovitel č. AV.20043.1.150 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: "Společnost GG+KDS - Jiřice"

GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník), se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, IČ: 28169522

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. (společník), se sídlem Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice, IČ: 28447085

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	6	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dalších dokladů	22	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při realizaci stavby bylo zjištěno odlišné řešení stávající chráničky vodovodu pod komunikací, která měla být v rámci stavebního záměru prodloužena kvůli změně trasy a rozšíření komunikace. Technické řešení prodloužení chráničky bylo v zadávací dokumentaci řešeno přesně dle požadavku správce specifikovaném v jeho vyjádření č.j. 3902/16/Ko. Po odkrytí stávajícího stavu však bylo nutné na základě reálných skutečností zjištěných na stavbě technické řešení upravit. Zhotovitel proto předmětnou skutečnost zaznamenal do stavebního deníku (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 15.06.2021) a objednateli ji oznámil dále svým dopisem ze dne 30.8.2021 (viz oznámení o změně prováděné stavby ze dne 30.08.2021) Na základě skutečného stavu chráničky a dodatečných požadavků správce byla realizováno prodloužení v délce 7 m a průměru DN 1230 mm. Tato změna byla konzultována s autorským dozorem, který s předmětnou změnou souhlasí (viz vyjádření autorského dozoru ze dne 03.08.2021), stejně jako TDI (viz stanovisko TDI ze dne 23.09.2021).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů, jelikož potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (nepředvídané fyzické podmínky vzniklé na stavbě v průběhu realizace a požadavky třetí osoby v průběhu realizace), nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, resp. ve spojení s ostatními změnami 30 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-37 453,20	630 542,00	593 088,80	667 995,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Miroslav Kunt	datum	15-08-2022	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Alena Svěrková	datum	15-08-2022	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Kateřina Kotoučová	datum		podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Marek Hanuš, MPA	datum	31.8.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno *ing. Jan Fidler* datum _____ podpis _____

Zhotovitel jméno *Ivan Havel* datum *15-08-2022* podpis *Ing. Michal Beňák*

Číslo paré: *1*

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice II/272

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 191 258,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 191 258,95	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-37 453,20	630 542,00	630 542,00	8,77%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-37 453,20	7 784 347,75	593 088,80	8,25%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Miroslav Kunt

15 -08- 2022

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Alena Svěrková

15 -08- 2022

Stavební dozor: souhlasím Ing. Kateřina Kotoučová

Zástupce Objednatel: souhlasím Bc. Marek Hanuš, MPA.

31.8.2022

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV číslo 1.3

Evidenční číslo a název stavby: JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 -

úprava nevhodného místa

Číslo a název SO/PS: 101 Silnice II/272

Číslo a název rozpočtu: 101 Silnice II/272

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	86671.	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM	M	4,000	0,000	-4,000	9 363,30	37 453,20	-37 453,20	0,00	0,00	-37 453,20	-100,000
30	86671.R1	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM	KPL	0,000	1,000	1,000	630 542,00	0,00	0,00	630 542,00	630 542,00	630 542,00	100,000
Celkem									- 37 453,20	630 542,00	630 542,00	593 088,80	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Miroslav Kunt

Objednatel: Bc. Marek Hanuš, MPA

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	10 493 666,09
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	11 086 756,89
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	13 414 975,84
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	105,65%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 34. odst. (5), písm. b)	-0,36%

6=22+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	593 088,80
7=6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,65%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 148 100,43

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	6,37%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	667 995,20
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 246 834,05

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15%	0,00
13=37	Sledování limitu 140 448 000	-
14=140448000-37		140 448 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvidanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo 140 448 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+28+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		0,00	- 37 453,20	630 542,00	593 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 453,20	630 542,00	593 088,80	667 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Silnice II/272 / změna chráničky	- 37 453,20	630 542,00	593 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 453,20	630 542,00	593 088,80	667 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice II/272
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis ve SD ze dne 15.06.2021	1	
Oznámení o změně ze dne 30.08.2021	1	
Vyjádření AD ze dne 03.08.2021	1	
Stanovisko TDI ze dne 23.09.2021	2	
Stanovisko správce vodovodu	2	
Zápis z kontrolního dne stavby č. 2 ze dne 28.06.2021 vč. prezenční listiny	4	
Cenové nabídky	3	
Geodetické zaměření chráničky	1	
Fotodokumentace	7	
Počet listů celkem	22	



Věc: Vyjádření GP / AD k řešení stávající chráničky vodovodu
Stavba: **BESIP – Jiřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa PD**
Číslo akce zhotovitele: 2501/21

Jako generální projektant a osoba provádějící výkon autorského dozoru na výše uvedené stavbě Vám ke skutečnostem zjištěným na stavbě sděluji následující:

Při realizaci stavby bylo zjištěno odlišné řešení stávající chráničky vodovodu pod komunikací, která měla být v rámci stavebního záměru prodloužena kvůli změně trasy a rozšíření komunikace. Technické řešení prodloužení chráničky bylo v zadávací dokumentaci řešeno přesně dle požadavku správce specifikovaném v jeho vyjádření č.j. 3902/16/Ko. Po odkrytí stávajícího stavu však bylo nutné na základě reálných skutečností zjištěných na stavbě technické řešení upravit. Na základě skutečného stavu chráničky a dodatečných požadavků správce byla realizováno prodloužení v délce 7 m a průměru DN 1230 mm.

Výše uvedené změny byly s projektantem konzultovány a autorský dozor s výše uvedenými změnami souhlasí.

Dne: 3. 8. 2021

Zapsala:

Ing. Alena Svěrková

Dobrý den,

dle telefonické dohody souhlasím s délkou chráničky, která bude končit v odvodňovacím příkopu (mimo těleso komunikace) a zohledňuje skutečný stav po odkrytí produktovodu. Předpokládaná délka 7m, průměr chráničky 1230mm.

Ostatní podmínky ve vyjádření zůstávají v platnosti. Sdělovací kabel procházející chráničkou bude zachován, průchod čelem chráničky bude konzultován s provozovatelem vodovodu. Děkuji.

S pozdravem

František Klouček

výrobní náměstek

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

tel.:

fax:

mob.:


disp.:

e-mail:

http:

OSA STAVADCI' KOTUVNICE

NOVA' KOTUVNICE
MIII 0,410 00

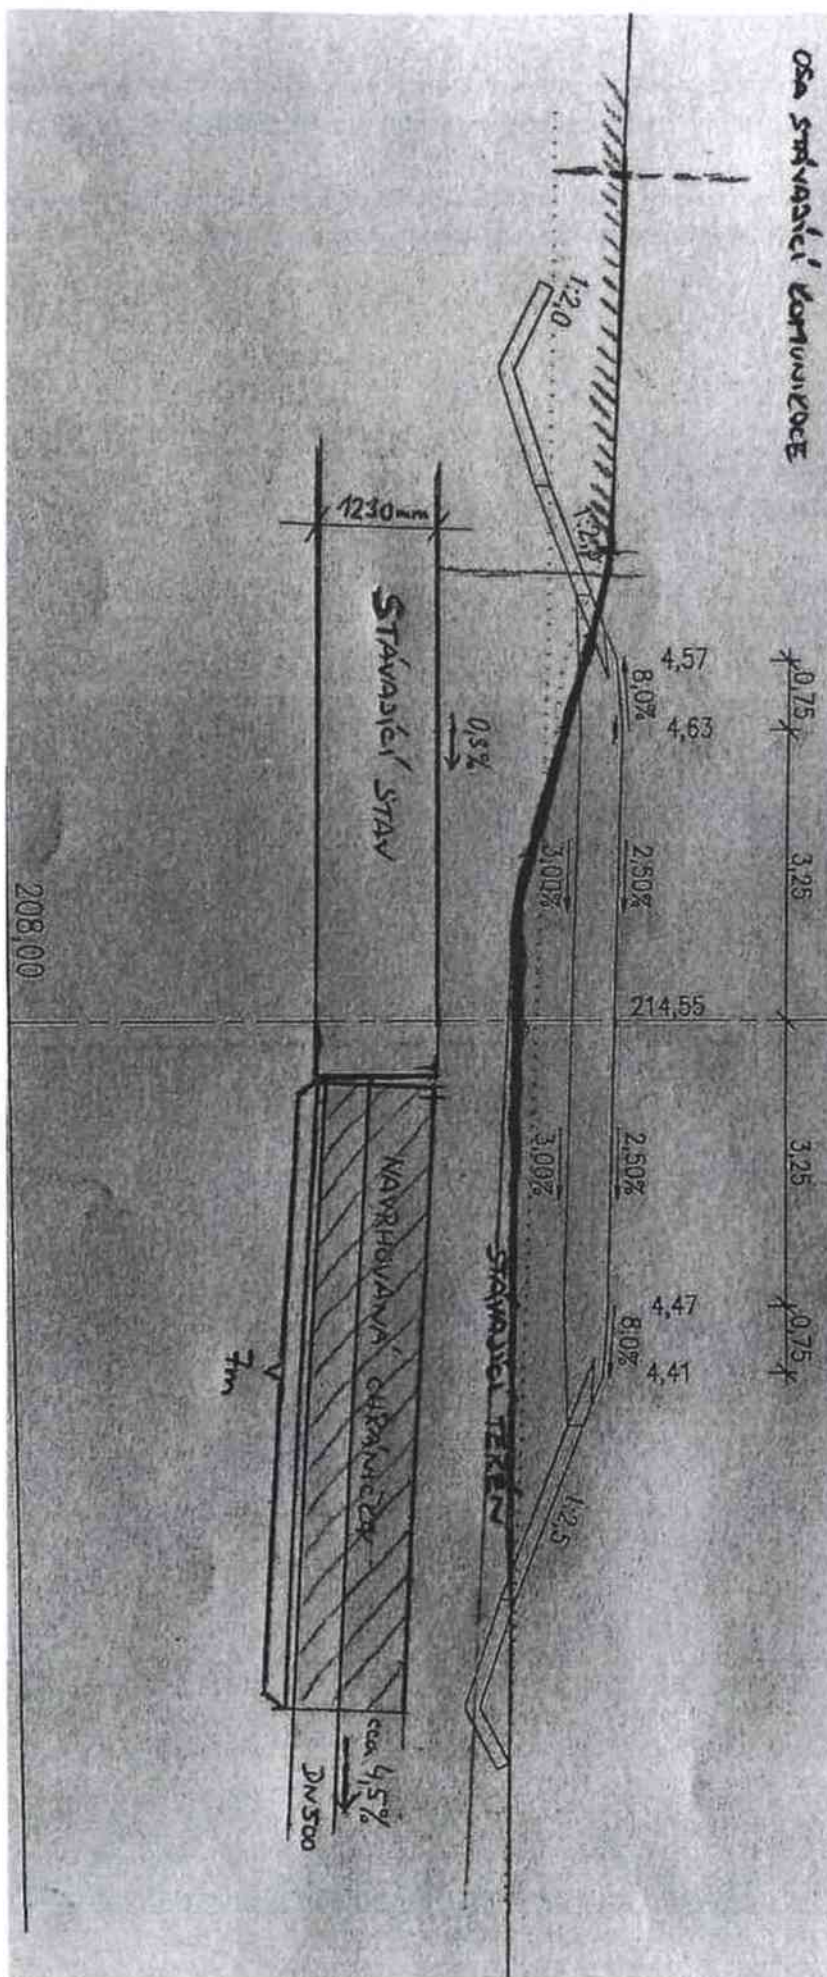

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: II-272/2021/ 210

VYŘIZUJE: Ing. Kateřina Kotoučová
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: V Praze/ 23.9.2021

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č.1 předložené v rámci realizace stavby „Jiřice, II/272 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: „Společnost GG+KDS – Jiřice“ GEOSAN GROUP a.s. (vedoucí společník)
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín - Kolín III

TDI a KOO BOZP: SUDOP GROUP TDI - BOZP ve Stř.Kr.; SUDOP PRAHA a.s., Olšanská
2643/1a, 130 80 Praha

Zpracovatel PDPS: KO-KA s.r.o., kancelář Thákurova 7, 166 29 Praha 6

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č.1 – SO 101 silnice II/272 – úprava chráničky a ochrany vodovodu OC 500

Předmětná dokumentace ZBV řeší zjištěnou skutečnost při výkopových pracích na OC 500, kde byl zjištěn odlišný průměr a délka chráničky oproti PDPS a požadavku správce vodovodu (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). Na základě konzultace s VAK Mladá Boleslav a projektantem bylo navrženo nové technické řešení – průměr chráničky DN 1230 mm v délce 7 m.

V ZBV č.1 jsou předmětné práce řešeny následujícími položkami:

86671 **CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM – změna záporná**

R1 **Prodloužení chráničky dle skutečnosti – nová položka, množství odpovídá skutečnosti, jako přímý náklad byla předložena nejnižší cenová nabídka od subdodavatele. Jednotková cena určena v souladu s čl. č.6 odstavec 6.7 bod b) SOD**



Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek. TDI tímto **souhlasí** se zapracováním do ZBV.

Ing. Kateřina Kotoučová
Technický dozor stavby



Datovou schránkou

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

č. j. 533/2021/DZO
ID: a6ejgmx


Praha dne 30. srpna 2021

Oznámení o změně prováděné stavby

Dobrý den,

jako zhotovitel stavby „**Jiřice, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa**“ si Vás jako objednatele dovoluujeme upozornit na vznikající změnový list stavby a s ním spojené vícenáklady stavby.

S pozdravem


Miroslav Kunt
Vedoucí projektového týmu

Dodejka datové zprávy

Předmět: Oznámení o změně prováděné stavby
ID zprávy: 942216625
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Dodaná

Odesílatel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 28002 Kolín, CZ
ID schránky: i7vcy29
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: a6ejgmx
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: 533/2021/DZO
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

30.8.2021 v 15:33:31 EV0: Datová zpráva byla podána.
30.8.2021 v 15:33:31 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Denní záznamy stavby	Datum
Pčas: POLOVASNO + 25°C	15.6.2017
Práce: ATHT + GD; J. ATRAM, J. HATČEK, K. KRAK, M.	
Práce: P. LUŠŤÁK	
PROBÍKA' SERVEA OSMCE A OBRZ NA	
PREZIPETOMI. ODKOZÁVKY NA CHRÁNICIČE.	
Z PŘÍČINY ATHTICKÉ CHRÁNICIČY BUDE V NÁSLEDUJÍCÍM	
DNEM PROJEDNÁN DALŠÍ POSTUP A VYMOTOVEN	
ZMĚNOVÝ LIST NA PRODLOUŽENÍ CHRÁNICIČY.	
PRÁCE BUDOU POZASTAVĚNY	
ZÁPIS TDS: DNEŠ BYLO PŘEKONTROVANO PROBÍKAJÍCÍCH PRÁCI ZŠITÝCH	15.6.2017
ZE STAVBY CHRÁNICIČY DN 1000 NA ODUŠNÝ KOTLE PRO VODU	
OC 500, KTERÁ SE VE SPOLNĚ VAK TLADY BOLESNAV a.s. PROSÍM O VYJÁŠENÍ	
AD A VAK TLADY BOLESNAV (P. FINT) O DALŠÍM POSTUPU PRÁCE DODÁNÍ	
VÝKRESU CHRÁNICIČY A ZADEL JI PRO VÝROBU. ZA SUDOP PRÁHA	
ZÁPIS TDS: DNEŠ BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ PRÁCI	17.6.2017
A ZABEZPEČENÍ STAVBY. DOKLADY PRÁCI NA ZOO-LONCE	
VŠEHO TĚM. SUTĚNĚ DIO OPRVENO.	
TECHNOLOGICKÁ PAUZA — VÝKOST NOVÉ CHRÁNICIČY	
A JE ZAHODĚNÍ SKUTEČNOSTI.	
NA VYŠENÍ CHRÁNICIČE BUDE ZPRACOVÁN	
ZMĚNOVÝ LIST DLE SKUTEČNOSTI A NOVĚ	
CHRÁNICIČY A SEU NÁŠENÍ S PRODLOUŽENÍ	
TRVATÍ (VAK MB).	
18.6. - 28.6. — TECHNOLOGICKÁ PAUZA	

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zápis z 2.kontrolního dne stavby

JIŘICE, II/272 km 21,850 do km 22,150 – úprava nehodového místa

Kontrolní den

číslo 2 konaný dne 28.6.2021

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č.1 - Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů a prací
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) fotodokumentace
3. Kontrola kvality
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly

1. Kontrola úkolů a prací

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
SO 001		- Provedeny bourací práce a příprava staveniště pro realizaci objektů pozemní komunikace	Trvá
SO 101		- Provedena skryvka ornice (dokončení) - Provedeno odfrézování původních konstrukčních vrstev a odvoz vytěženého materiálu - Parapláň a aktivní zóna - výměnou nevhodné zeminy aktivní zóny za vrstvu homogenní nenamrzavé zeminy (vápnění) v celkové tloušťce 0,3m. - Na parapláň bude položena netkaná geotextilie zajišťující separační a filtrační funkci dle TP 97 o CBR > 3 kN. - Propustek v km 0,150 (zahájení prací)	Trvá Trvá Začátek 7.7.21 Začátek 7.7.21
DIO		- Provoz bude v úsecích rekonstrukce oddělen pomocí svislého dopravního značení Z4 a mobilního ocelového svodidla BG600. - na levé straně stávající komunikace (vnější straně oblouku) zůstane zachován jízdní pruh šířky min. 3,25 m pro dočasný obousměrný kyvadlový provoz	ANO ANO
Úprava chráničky a ochrany vodovodu OC 500		- Úprava stávající chráničky DN4000 (odlišný rozměr DN 1200) pro vodovod OC 500 ve správě VaK Mladá Boleslav, a.s.. Chráničku je nutné prodloužit tak, aby kryla vodovod v rozsahu nové trasy komunikace. Chránička bude prodloužena potrubím v dimenzi stávající	Změna a začátek realizace 30.6.2021 1

	chráničky (DN4000) s tloušťkou stěny 12 mm. Po obnažení stávající chráničky bude šetrně vybourána vyzdívka. Na OC 500 budou osazeny distanční plastové celoobvodové prvky v rozteči 1,5 m. Nová chránička bude podélně rozdělena a osazena na vodovod bez jeho odstávky. Osazena bude do betonového sedla 120°, podélně svařena a přivařena na stávající chráničku. Čelo chráničky bude opatřeno pryžovou manžetou na nerezové těmeny příslušné dimenze.	
	- Vydáno vyjádření VaK Mladá Boleslav (p. Fiala), instalace chráničky 28.6.2021 a následně připomínkování změnového listu a předložení ZBV....	12.7.21

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	Zhotovitel předložil aktuální HGM, Práce probíhají v souladu s předloženým HGM
b) popis provedených prací	Viz. 1. Kontrola úkolů a prací
c) finanční plnění	Zhotovitel předložil za měsíc červen čistopis soupisu prací k odsouhlasení TDS a Objednateli.
d) fotodokumentace	Je prováděna průběžně TDS, zhotovitelem a KooBOZP

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Práce jsou prováděny v souladu s PD a předloženými TePř.
b) odsouhlasené materiály a TePř+KZP	Průběžně je prováděno a evidováno, zhotovitel předává včas před zahájením prací TDI ke kontrole a odsouhlasení. Termín zkoušek bude včas oznámen TDS, nejméně 5 dnů předem.

4. Stav BOZP

KooBOZP předal plán BOZP a ohlášení OIP zhotoviteli. KooBOZP informuje, že závady řeší operativně na místě se zástupcem zhotovitele popř. zápisem do stavebního deníku a protokolem o provedené kontrole zasláné emailem. Zhotovitel předá kontakt na podzhotovitele a OZO BOZP. - trvá

5. Různé

Zhotovitel vždy na konci měsíce spolu s konceptem soupisu provedených prací předloží měsíční zprávu o postupu prací. První zpráva bude za období od 7.6.2021 do 30.6.2021.

Zhotovitel informuje, že průměr a délka chráničky má atypický rozměr oproti PDPS – obdrženo vyjádření od VAK Mladá Boleslav(p.Fiala). – Probíhá instalace chráničky a zpracování ZBV

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že veškeré změny oproti PD je předem nutno konzultovat s AD projektanta a objednatel.

IZS spustí výstražný maják a zvukový signál před dopravním omezením – stavba zastaví provoz a upřednostní průjezd IZS.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
1/1	Zaslání finančního a časového HMG	Zhotovitel zašle HMG emailem a nechá ho schválit objednatel.	Zhotovitel	Splněno
1/2	<u>RDS vč. dílenské dokumentace</u>	Zhotovitel předá RDS dle SOD objednateli a TDS ke schválení.	Zhotovitel	Trvá do 12.7.
1/4	Ohlášení nástupu zhotovitele	Koordinátor BOZP zašle Zhotoviteli vzor dokumentu k ohlašování nástupu podzhotovitelů k důvodu koordinace opatření	KBOZP	Trvá do 12.7.
1/8	Štítek stavební povolení+OIP	Umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště.	Zhotovitel	Splněno
1/13	Informační tabule	Zhotovitel zajistí označení logem a dle fondů EU https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 Zhotovitel doplní 2x tabuli s logem KSÚS na zač. a konec staveniště	Zhotovitel	Splněno Splněno

1/14	Podzhotovitelé	Zhotovitel zašle seznam schválených podzhotovitelů.	Zhotovitel	Trvá
1/15	Schválení týmu	TDS a Zhotovitele zaslat objednateli ke schválení.	Zhotovitel a TDS	Trvá
1/16	Změnové listy	Zhotovitel předloží Oznámení o změně a zpracuje změnový list Zaslat oznámení o změně Doložit změnový list dle směrnice	Zhotovitel	Nový úkol
1/17	Vodovod OC 500	Navýšení ceny z titulu délky a průměru chráničky	Zhotovitel	Nový úkol
1/18	Soupis prací za měsíc červen 21	Zhotovitel předloží za měsíc červen čistopis soupisu prací k odsouhlasení TDS a Objednateli.	Zhotovitel	Probíhá
1/19	Měsíční zpráva zhotovitele	Zhotovitel předloží měsíční zprávu o postupu prací. První zpráva bude za období od 7.6.2021 do 30.6.2021.	Zhotovitel	Nový úkol

7. Závěr

Datum konání příštího KD pondělí 12.7.2021 v 11:30hod v místě ZS stavby

Zapsala Ing.Kateřina Kotoučová
TDS

Podpis



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16-092 BESIP - Jířice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Rožpočet: SO 101 Silnice II/272

SO 101	618 240,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
8			Potrubi				618 240,00
27	86671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM	M	7,000	88 320,00	618 240,00

kompletní prodloužení chráničky vodovodu OC500 trubkou TR 1230x12 dle specifikace níže.

dle situace a požadavku VAK MB a.s.
po obnažení čela šetrně vybourat vyzdívkou. Na OC500 osadit distanční ocelovodové prvky v rozteči 1,50m. Nová chránička bude podélně rozdělená a bude osazena na vodovod bez jeho odstavky. Osazení do betonového sedla 120st. Chránička podélně svařena a přivařena na stávající chráničku. Čelo chráničky bude opatřeno pryžovou manžetou na nerezové těmeny příslušné dimenze. Čelo chráničky bude zaslepeno.
4=4,000 [A]

V HODNOTĚNÍ JME: 23.6.2021

CENOVÁ NABÍDKA

CN 05

Energie - stavební a báňská a.s.
Divize 1
273 04 Kladno

Tel. 312 612 380

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
Ondřej Málek

Váš dopis ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Kontakt

Kladno dne

p. Šimunek

21.04.2021

Prodloužení chráničky

Druh zboží	Množství	Jednotka	Jednot. cena	Celkem
Materiál	1,0	kpl.	72 300,00	72 300,00
Výroba	1,0	kpl.	25 000,00	25 000,00
Montáž	1,0	kpl.	42 500,00	42 500,00
Zinkování	1,0	kpl.	2 850,00	2 850,00
Zaměření na stavbě	1,0	kpl.	6 875,00	6 875,00
Pryžové těsnění	6,0	ks	650,00	3 900,00
Spojovací materiál	1,0	kpl.	4 180,00	4 180,00
Svářecí a brusný materiál	1,0	kpl.	8 442,00	8 442,00
Výkresová dokumentace	1,0	kpl.	8 600,00	8 600,00
Montážní mechanismy	1,0	kpl.	11 200,00	11 200,00
Doprava	1,0	kpl.	31 240,00	31 240,00

Poznámka:

Celkem **217 087,00**

Celkem bez. DPH 217 087,00

Dodavatel si vyhrazuje změnu ceny dodávky, jestliže se ceny vstupů navýší více než o 2 %

ENERGIE - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, tel.: 312 612 380, e-mail: simunek@enas.cz, www.energie-as.cz, IČO:45146802, DIČ:030-45146802, č.ú.: 1000-141/0100, spol. je zapsána v Obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Odd. B

DRŽITEL CERTIFIKÁTU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ISO 9002 UZNÁVANÉHO V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE

0,00
0,00
0,00
0,00

13 750,00 2x (3.6.2021, 7.6.2021)

3 900,00
0,00
0,00
8 600,00
0,00
0,00

26 250,00

26 250,00




Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 16-092 BESIP - Jilice, II/272 km 21,850 do km 22,150 - úprava nehodového místa
Rozpočet: SO 101 Silnice II/272

SO 101	589 645,00
--------	------------

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			Potrubi				589 645,00
27	88671		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM kompletní prodloužení chráničky vodovodu OC500 trubkou TR 1230x12 dle specifikace níže. <i>dle situace a požadavku VAK MB a.s. po obnovení čela šetně vybourat vyzdívkou. Na OC500 osadit distanční celoobvodové prvky v rozteči 4,50m. Nová chránička bude podélně rozdělená a bude osazena na vodovod bez jeho odstávky. Osazení do betonového sedla 120st. Chránička podélně svařena a přivařena na stávající chráničku. Čelo chráničky bude opatřeno pryžovou manžetou na nerezové těmeny příslušné dimenze. Čelo chráničky bude zaslepeno. 4=4,000 [A]</i>	M	7,000	84 235,00	589 645,00

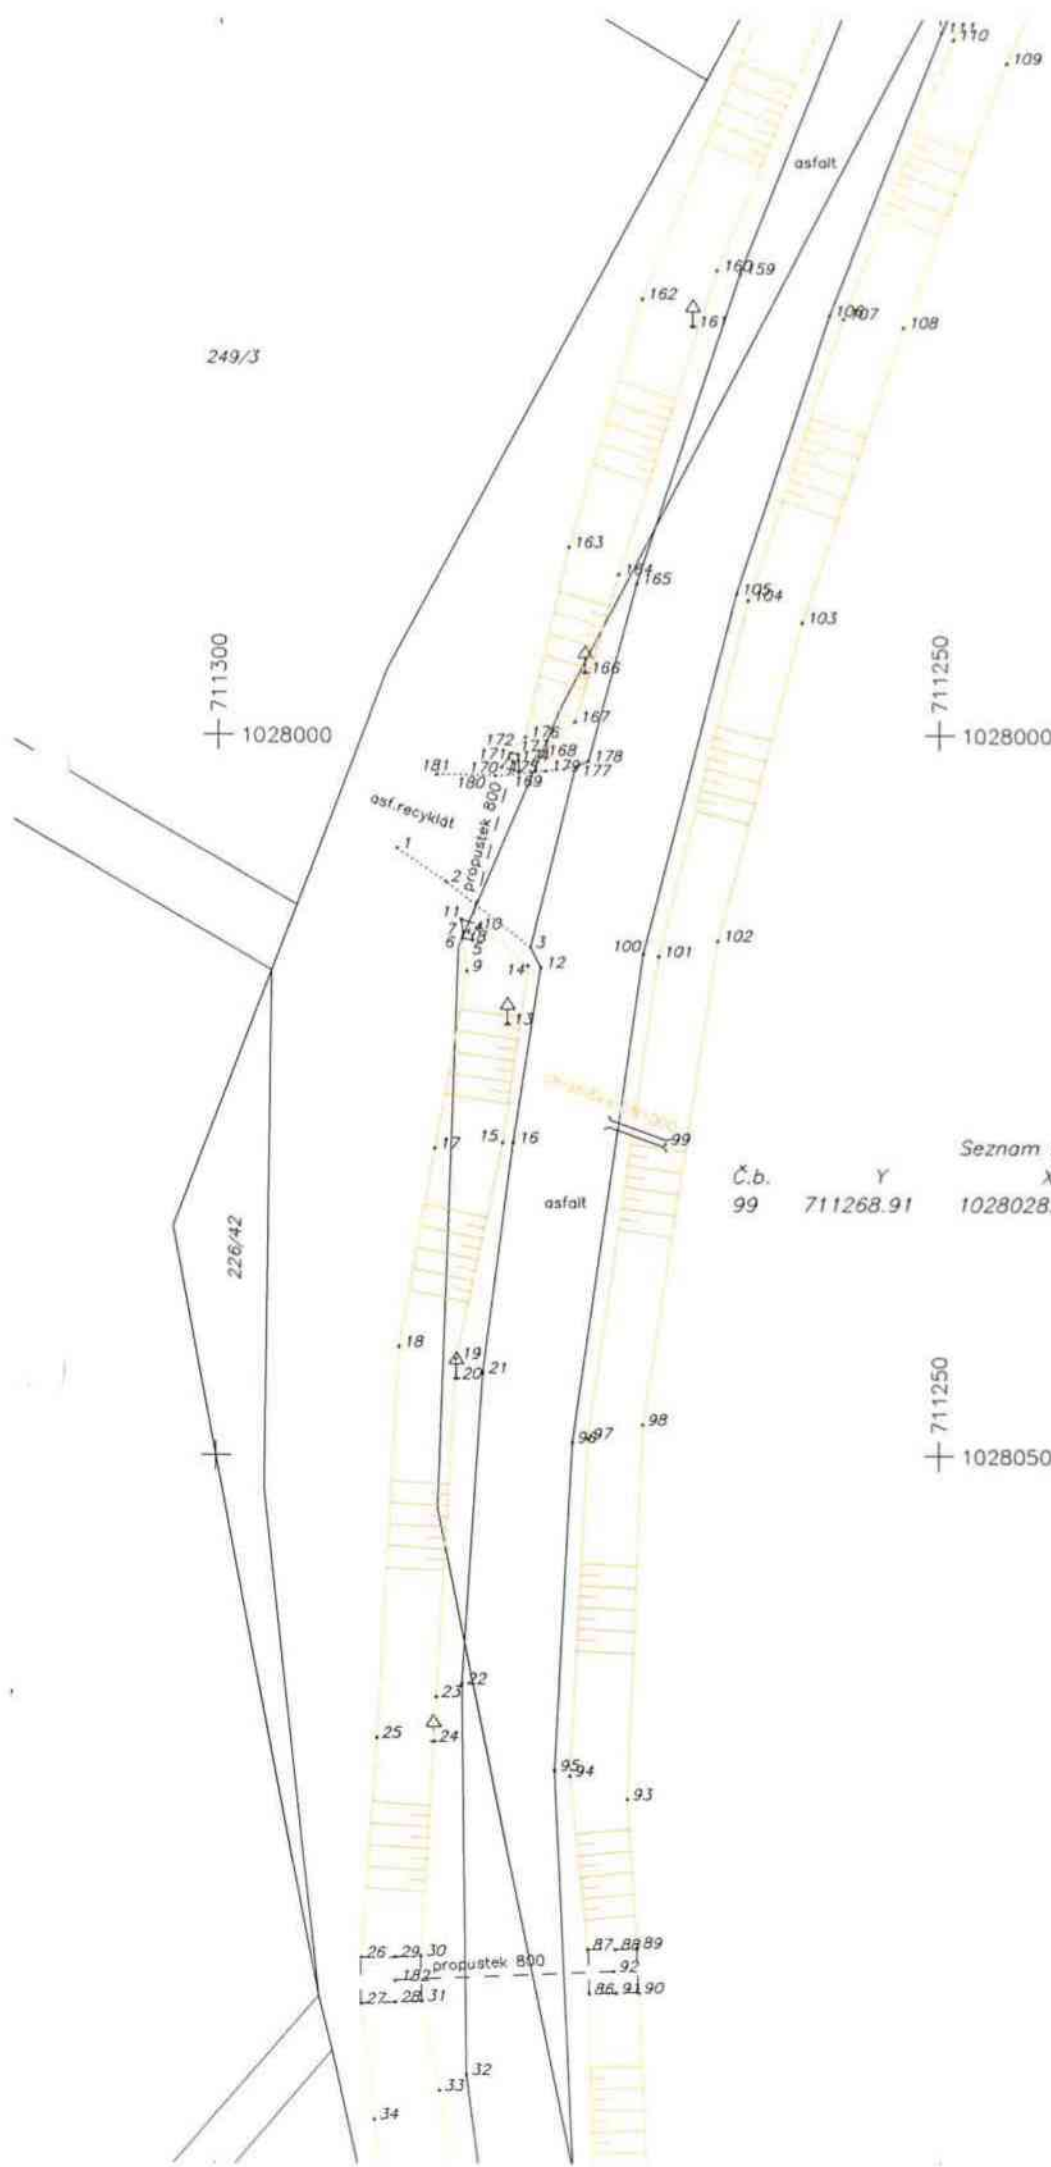

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Č.b.	Y	X	Z	Poznámka
99	711268.91	1028028.37	212.49	chránička DN 1000

711250
+ 1028050

249/3

711300
+ 1028000

711250
+ 1028000

226/42

26 29 30
182 propustek 800
27 28 31

87 88 89
92
86 91 90

