

DODATEK č.6
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 7. 2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany

- 1) Objednatel:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
zástupce ve věcech technických: Ing. Lenka Přikrylová
bank. spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

- 2) Zhotovitel:** **ESOX, spol. s r.o.**
sídlo: **Libušina třída 826/23, 623 00 Brno - Kohoutovice**
zastoupený: Ing. Jan Polický, jednatel
zástupce ve věcech technických: Tomáš Tschöpl, výrobní ředitel
bank. spojení: xxxx
č. ú.: xxxx
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 143
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v souladu s čl. XII. odst. 4 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 7. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2021, ve znění Dodatku č.2 ze dne 17. 12. 2021, ve znění Dodatku č.3 ze dne 26. 4. 2022, ve znění Dodatku č.4 ze dne 22. 6. 2022 a ve znění Dodatku č.5 ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem „Dostavba Fakulty životního prostředí – FŽP III.“ (dále jen „Stavba“).

Čl. I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 3 a čl. IV. odst. 5 Smlouvy dohodly, že v rámci Stavby je nezbytné uzavřít tento termínový a věcný dodatek z důvodu dalších změn, které nastaly v souvislosti s pokračující realizací Stavby.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že rozsah věcných změn, zahrnujících uživatelské změny, které nebyly obsahem původního závazku ze Smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, je definovaný obsahem změnového listu (dále jen „ZL“) č. 14, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 3) Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že ceny za provedení dodatečných prací (víceprací) a za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 2.2. článku II. tohoto dodatku činí:

TLZ č.14

celková cena víceprací TLZ č.14	474 705,32Kč
celková cena méněprací TLZ č.14	-324 757,83Kč
celková cena TLZ č.14 bez DPH	149 947,49Kč

Cena za zhotovení Díla tak nově činí po zaokrouhlení: **209 091 929,00Kč bez DPH.**

- 4) Dále se smluvní strany dohodly, v souvislosti s nepříznivými klimatickými (deštivými) podmínkami, na změně dílčího milníku plnění díla v rozsahu prodloužení termínu pro dokončení klíčového milníku č.20 "Dokončení hydroizolačního souvrství střechy 4.NP". Nový termín dokončení klíčového milníku č. 20 nově připadá na 7. 11. 2022. Seznam nepříznivých (deštivých) dnů je obsahem ZL č. 15, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, vč. aktualizovaného časového harmonogramu postupu provedení díla (dále jen „Harmonogram“).
- 5) Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu s čl. VII. odst.8 (po předchozím s písemným souhlasu Objednatele) a v souladu s Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, je aktualizován a zároveň opraven seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Díla. Aktualizovaný seznam je přílohou tohoto Dodatku.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy je zcela v souladu s ust. § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 7) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených víceprací řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle tohoto Dodatku.
- 2) Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě v jednom vyhotovení.
- 3) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:

- 1) příloha č. 1 - ZL č. 14
- 2) příloha č. 2 - ZL č. 15
- 3) příloha č.3 – aktualizovaný Harmonogram
- 4) příloha č. 3 – aktualizovaný seznam poddodavatelů

Zhotovitel:

Objednatel:

V dne

V Praze dne

Esox, spol. s r.o.
Ing. Jan Polický, jednatel

Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Stavba: ČZU - Dostavba fakulty životního prostředí - FŽP III
Zhotovitel: ESOX, s.r.o.
Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze
Projektant: Origon, s.r.o.
TDS: ESTE Design & Consulting, s.r.o.

ZL č. 14

Charakter ZL: VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE

Název ZL:

Zrušení koberců, změna na PVC

Odůvodnění ZL:

Objednatel požaduje z důvodu snadnější údržby a z hygienických důvodů změnu podlahové krytiny v kancelářích, koberecivé čtverce budou nahrazeny homogenním PVC

Nové řešení :

Homogenní PVC tl. 2,0 mm dodávané v rolich.

Technické parametry:

hmotnost 2,8 kg/m², protiskluznost třídy DS, barevná stálost - třída 6, zátěžová třída 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, odolnost vůči kolečkům

Původní řešení v PD:

V původním řešení byly v kancelářských prostorách navrženy koberecivé čtverce.

Technické parametry:

Výška vlasu minimálně 2,5 mm, počet vpichu minimálně 1500/dm², útlum kročejového hluku dle ISO 10140 minimálně 22 dB, rozměrová stálost maximálně 0,2%, reakce na oheň dle EN13501-1 nejhůře Bfl-s1, zátěžová třída dle EN1307 minimálně 33 (komerční - velmi vysoká zátěž), celoproparvená vlákna, vnitřní napětí dle ISO 6356 max 2kV.

Kalkulace ZL za použití nabídkových cen v rozpočtu, který je součástí SoD:

	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
viz přiložený položkový rozpočet	kpl	1,00	149 947,49	149 947,49
vicepráce celkem Kč (bez DPH)				474 705,32
Cenový dopad méněpráce celkem Kč (bez DPH)				-324 757,83
CELKEM Kč (bez DPH)				149 947,49

Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby

Přílohy ZL:

položkový rozpočet

Vyjádření dodavatele:

Dne: 26. 9. 2022

za dodavatele:

Podpis:

Vyjádření TDS:

Dne: 27. 9. 2022

za TDS:

Podpis:

Vyjádření projektanta:

Dne: 27. 9.

SOULCASIN

za projektanta:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Dne: 27. 9. 2022

za objednatele:

FIRBIL

Podpis:

ZÁVĚR:

Práce nemají vliv na termín dokončení Díla.

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.

<i>kod položky</i>	<i>popis</i>	<i>jednotka</i>	<i>výměra</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Celkem</i>
189	Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních dle PD: D.1.1 Koberec (pl) podlahy_B_pl Součet	m2	-590,380	100,16	-59 132,46
			590,380		
			590,380		
190	<i>Koberec ve čtvercích, typ dle požadavků investora</i> Koberec ve čtvercích, typ dle požadavků investora 590,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	-649,418	376,89	-244 759,15
191	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	649,418		
192	<i>PVC, typ dle požadavků investora</i> PVC, typ dle požadavků investora 590,380*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	m2	590,380	230,72	136 212,47
			649,418	412,34	267 781,02
196	<i>lišta soklová PVC (dle PD)</i> lišta soklová PVC (dle PD) dle PD: D.1.1 PVC - sokl (dl)	m	590,380	60,38	28 369,78
			469,854		
198	<i>lišta soklová kobercová (dle PD)</i> lišta soklová kobercová (dle PD) dle PD: D.1.1 Koberec - sokl (dl) podlahy_B_dl Součet	m	-469,854	44,41	-20 866,22
			427,140		
			427,140		
			469,854		
199	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstevným Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění včetně ošetření polymerním nátěrem dvousložkovým dvouvrstevným dle PD: D.1.1 PVC - údržba po pokládce (pl)	m2	590,380	71,72	42 342,05

Celkem 149 947,49 Kč

- 324 757,83 Kč
474 705,32 Kč
149 947,49 Kč

Stavba:	GZU - Dostavba Fakulty životního prostředí - FŽP III			ZL č.	15
Zhotovitel:	Esox s.r.o.				
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze				
Projektant:	Origon s.r.o.				
TDS:	ESTE Design & Consulting s. r. o.				
Charakter ZL: vícepráce / méněpráce změna termínu dokončení klíčového milníku					
NAZEV ZL: Změna dokončení klíčového milníku č.20					
Odůvodnění ZL: Generální dodavatel žádá o schválení změny termínu <u>dokončení</u> klíčového milníku plnění díla č.20. Důvodem jsou vytrvalé srážky během termínu provádění, kdy z 67 dní provádění dle stanoveného harmonogramu, tedy od 21.7. až doposud (tedy do 25.9.2022), nebylo možné práce provádět celkem v 30 dnech. Což znamená téměř 50% předpokládaného času provádění. Z tohoto důvodu dodavatel žádá o posun klíčového milníku. Deštivé dny jsou doloženy v příloze, data ze stanice Praha-Ruzyně.					
Nové řešení: Generální dodavatel žádá v tomto změnovém listu o schválení změnu dílčího milníku plnění díla. Termínově klíčový milník č.20 "Dokončení hydroizolačního souvrství střechy 4.NP" nově připadá na 7.11.2022.					
Původní řešení: V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo ze dne 21.7.2021, ve znění Dodatků č.1 až č.5, je stanoven termín dokončení klíčového milníku č.20 ke dni 3.10.2022.					
Odkaz na PD: Nepřikládá se.					
Kalkulace ZL ve smyslu SoD:					
	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Nepřikládá se.					
CELKEM Kč (bez DPH):					- Kč
Procentuální podíl prací ZL k celkové ceně stavby					0,00%
PŘÍLOHY ZL: Data ze stanice Praha - Ruzyně					
Vyjádření dodavatele/vliv na termín: Změnový list má vliv na dílčí termíny plnění díla. ne na celkový termín plnění díla.					
Dne: 26.9.2022	za dodavatele:	Ing. Jiří Moravanský	Podpis:		
Vyjádření TDS:					
Dne: 27.9.2022	za TDS:	František Čermák	Podpis:		
Vyjádření projektanta/ vliv na PD:					
Dne: 27.9.2022	za projektanta:	Ing. Václav Forman	Podpis:		
Vyjádření objednatele:					
Dne: 27.9.2022	za objednatele:	Ing. Tomáš Fibir	Podpis:		
ZÁVĚR: změna dokončení klíčového milníku č.20 v důsledku nepříznivých klimatických podmínek					
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.					


Deštivé dny v lokalitě.

Data ze stanice Praha - Ruzyně

Měsíční statistiky

[Teplota](#) [Viatr](#) [Snih](#) [Srážky](#) [Slunce](#)

Rok: 2022 Měsíc: Červenec

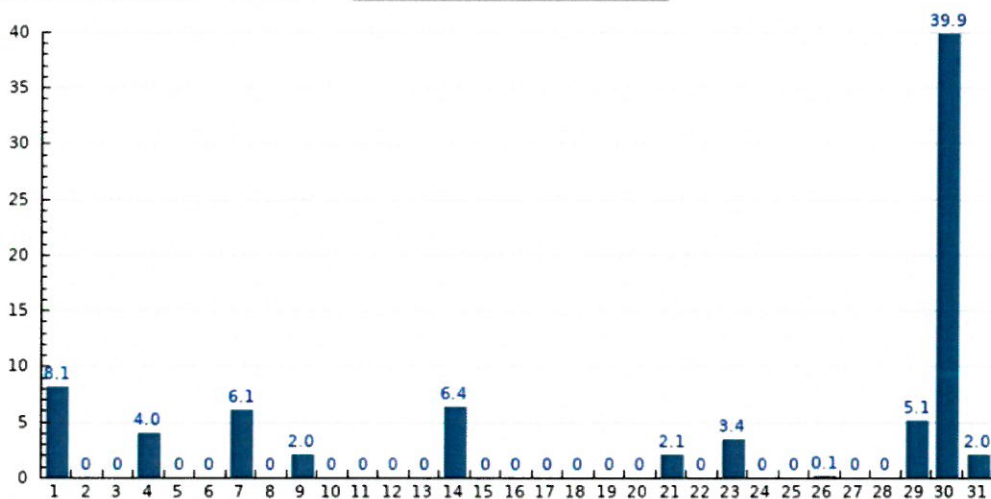


Graf zobrazuje denní srážkové úhrny v průběhu měsíce.

Červenec 5 dnů

Měsíční statistiky

[Teplota](#) [Viatr](#) [Snih](#) [Srážky](#) [Slunce](#)

Rok: 2022 Měsíc: Srpen

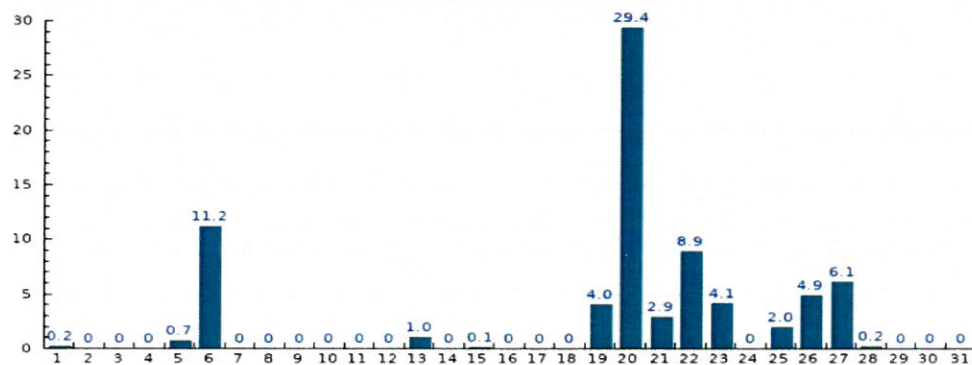

Graf zobrazuje denní srážkové úhrny v průběhu měsíce.

Srpen 13 dnů

Měsíční statistiky

🌡 Teplota

🌀 Větr

❄ Sníh

☔ Srážky


☀ Slunce

Rok:

2022

Měsíc:

Září

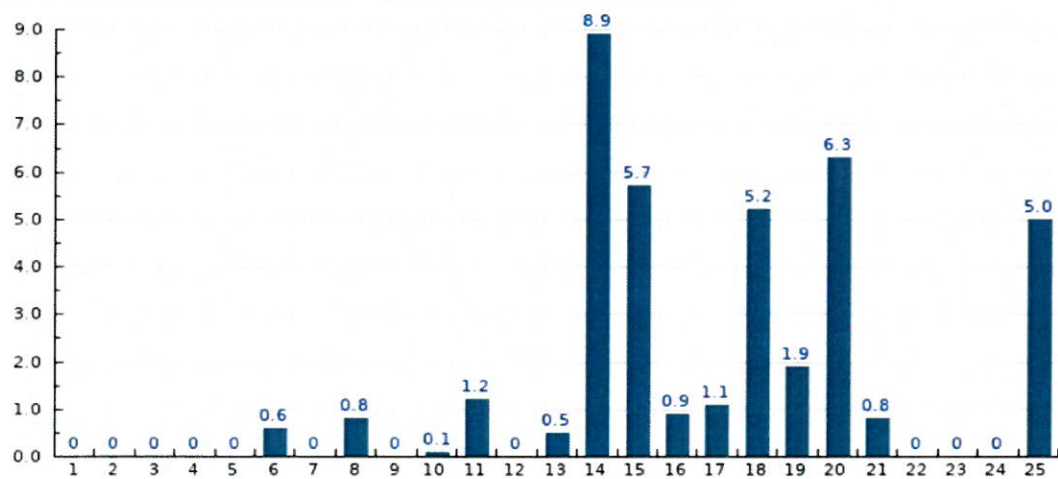

Graf zobrazuje denní srážkové úhrny v průběhu měsíce.

Zdroj:

https://www.in-pocasi.cz/archiv/praha_ruzyne/?detailed_typ=srazky&detailed_usek=720#daily_graph

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Účastník (obchodní název): ESOX, spol. s r.o.

Adresa, sídlo, místo podnikání: Libušina třída. 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno

IČ: 00558010

DIČ: CZ 00558010

Telefon, fax: 777 746 728

e-mail: esox@esox.red

Jméno oprávněné osoby: Ing. Jan Polický

Prohlašujeme,

že máme v úmyslu zdada část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavatel) a níže předkládáme seznam poddodavatelů, kteří jsou v tuto chvíli známi a budou se podílet na plnění předmětu veřejné zakázky:

Identifikační údaj poddodavatele (název, sídlo, právní forma, IČ/ obchodní firma nebo jméno a příjmení místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, IČ)	část předmětu veřejné zakázky, která bude plněna prostřednictvím poddodavatele:
Astex, spol. s r.o. Horova 1859 /42 616 00 Brno - Žabovřesky	Vzduchotechnika
Schindler CZ, a.s. Walterovo náměstí 329/3 158 00 Praha 5	Výtah
PORR a.s. Jahodová 523/58 620 00 Brno - Brněnské Ivanovice	pilotové založení, záporné pažení
ROCK SALT, s.r.o. K Třebonicům 97, 155 00, Praha 5 - Řeporyje	prefa schodiště
NWT a.s. nám. Míru 1217, 768 24 Hulín	silnoproudé a slaboproudé instalace
REMA spol. s r.o. Kojetínská 4195/13a, 796 01 Prostějov	hliníkové výplně otvorů
DRINK LOG, s.r.o. Jagellonská 895/9, 130 00 Praha	Zemní práce
KSK Praha inženýrské stavby s.r.o. Jinočany 246, 252 25 Jinočany	inženýrské sítě
TOPWET s.r.o. náměstí Viléma Mrštíka 62 664 81 Ostrovačice	záchytný systém
Stangl Technik Česko spol. s r.o. Dobronická 1256, Kunratice (Praha-Kunratice) 148 00 Praha	Zdravotechnika a vytápění
AZ KLIMA a.s. Tuřanka 115a 627 00 Brno	Vzduchotechnika a chlazení
Firecon International s.r.o. Americká 2548/1A 120 00, Praha	střešní světlíky
Siemens, s.r.o. Siemensova 1, 155 00 Praha 13	měření a regulace - systém

MaRfinal s.r.o. Sadová 135, 503 15 Sadová	měření a regulace - montáže
Pemont s.r.o. Vrátočná 325/8, 034 91 Lubochňa	Ocelové konstrukce lávek
Colsys s.r.o. IČO:147 99 634 Buštěhradská 109 272 03 Kladno-Dubí	Komplexní dodávka silnoproudých a slaboproudých instalací vyjma měření a regulace
Proman s.r.o. IČO:620 28 774 Za Pivovarem 830 537 01 Chrudim	Regálový systém
G Trade s.r.o IČO: 277 01 051 Vinohradská 90 618 00 Brno - Černovice	Dodávka a montáž provětrávané jižní fasády, realizace ostění kolem oken a nosný rošt pro zelenou fasádu
HELLA stínící technika s.r.o. IČO: 629 07 298 Türkova 828/20 14900 Praha 4	Dodávka a montáž exteriérových žaluzií vč. podomítkových boxů
LINEKO s.r.o. IČO: 416 03 877 Tvarožná 12, 664 05 Brno	Dodávka a montáž střešního pláště ST01a
Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o. IČO: 263 16 196 Chebská 2, 322 02 Plzeň - Křimice	Dodávka a montáž keramických obkladů a dlažeb
T- PARKET s.r.o. IČO: 277 27 432 Drozdovice 4306/81a, 796 01 Prostějov	Dodávka a montáž povlakových podlah
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. IČO: 045 99 021 Strojnická 633 516 01 Rychnov nad Kněžnou	Dodávka a montáž vnitřních hliníkových a ocelových dveří
