

<b>ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1</b>		<b>Lesy České republiky, s.p.</b> Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	<b>Oblastní ředitelství jižní Morava</b>		
Název akce	VN Rumunská bažantnice		
Zhotovitel akce	název: PB SCOM s.r.o., sídlo: Radniční 28, Hranice 753 01, IČO: 253 97 087, DIČ: CZ25397087		
Charakter akce (I/N)	I;N	Účetní číslo akce	952828; 753614
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00101-2022-942, 6.5.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	3 423 065,93
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		3 423 065,93	
<b>Specifikace (popis) změny</b>			
Situování: Předmětem je změna termínů pro oprávněně vyúčtované částky v průběhu stavby a týká se tedy stavby jako celku.			
Popis: Předmětem je změna termínů pro oprávněně vyúčtované částky v průběhu předmětné stavby. Stávající závazné termíny účtovaných částek uvedené v čl. IV odst. 2 SoD, tj. do 30. 9.2022 oprávněně vyúčtovat alespoň 45 % ceny za dílo a do 25. 10. 2022 alespoň 70 % ceny za dílo, budou změněny, a to takto: částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli bude činit do 25. 11. 2022 alespoň 70 % ceny za dílo.			
<b>Příčina - důvod vzniku změny</b>			
Změna je způsobená nemožností provádění zemních prací v zátopě vodní nádrže v předpokládaném termínu, tj. v srpnu a září běžného roku. Nemožnost provádět práce v uvedeném termínu byla způsobena výskytem larev čolka obecného (ZCHD) v zátopě nádrže ve stádiu vývoje, který vyžaduje závislost na vodním prostředí. Práce v zátopě byly oproti původnímu termínu povoleny provádějícím biologickým dozorem až ke dni 13.9.2022. Z výše uvedeného důvodu není možné dodržet stávající časový a finanční harmonogram stavby.			
<b>Přílohy</b>			
Příloha č. 1: Zjišťovací protokol provádějího biologického dozoru č. 2 ze dne 2.8.2022.			
Příloha č. 2: Situční zpráva pro potřeby KÚ JMK, vypracovaná biologickým dozorem stavby, ze dne 13.9.2022.			
Příroda č. 3: Oznámení o zahájení řízení k žádosti o změnu rozhodnutí KrÚ JMK č.j. JMK 146208/2020.			
Příroda č. 4: Záznamy ze SD			
<b>Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací</b>			
Vliv změny na cenu díla			ne
Vliv na závazné parametry			ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení			ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)			0,00
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)			0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)			0
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)			3 423 065,93
<b>Vypracování, potvrzení a schválení</b>			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel			
stavbyvedoucí			
TDS			
technik / specialista VH			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závodu			
<b>Záznamy o změnách ve SoD</b>			
datum	číslo strany SD		
20.07.2022	1528801		
02.08.2022	1528802		
09.08.2022	1528803		
17.08.2022	1528805		
13.09.2022	1528810/1528811		

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: VN Rumunská bažantnice  
K.Ú.: Měnin  
PŘEDMĚT DÍLA: Biologický dozor  
Termín: 1.8. 2022

**DETAILNÍ POPIS REALIZOVANÝCH PRACÍ:**

Dne 1. 8. byla provedena před zahájením prací v souladu s podmínkou č. 6 rozhodnutí KÚ JMK, Odboru životního prostředí (č.j.: JMK 146208/2020, sp. zn.: S-JMK 101150/2020/OŽP/Pok) ze dne 21.10.2020 kontrolní pochůzka staveniště, jejíž cílem bylo vyplašení příp. se vyskytujících se živočichů mimo plochu stavby. Výše uvedené se obešlo bez nutnosti odchyty, resp. transferu živočichů na náhradní lokality.

Zároveň byl proveden kontrolní průzkum tůně s ohledem na předchozí zjištění zvláště chráněných druhů (ZCHD), resp. na vyšší početnost larev čolka obecného (*Lissotriton vulgaris*, SO). Při odlovu hydrobiologickou sítí standardních rozměrů podél břehové linie v blízkosti vodní a mokřadní vegetace v délce cca 10 m byla zjištěna přítomnost cca 50 larev (viz foto v příloze), z toho část larev stále vykazovala závislost na vodním prostředí (přítomnost vnějších žaber). Dále bylo zjištěno několik málo pulců z komplexu zelených skokanů (*Pelophylax esculentus* complex, SO) v různé fázi vývoje.

**Nařízení biologického dozoru vyplývající z průběžné kontroly uskutečněné dne 1.8. 2022:**

- pro minimalizaci negativních vlivů na zjištěné obojživelníky (především pak juvenilní čolka obecného) nebudou do odvolání v rámci vodního prostředí tůně probíhat žádné stavební práce, a to včetně odčerpávání vody. Rovněž nebude zasahováno do břehových částí tůně. Práce budou umožněny až po dokončení vývoje larev čolků a opuštění tůně (současný předpoklad pozastavení prací do konce srpna – bude upřesněno na základě opětovných kontrol).
- zbylé stavební práce (např. v rámci potoka) nejsou nijak situačně ani časově omezeny, neb tyto nepředstavují z pohledu zjištěných ZCHD výraznější riziko

Fotodokumentace biologického dozoru je předložena na obrázcích níže.

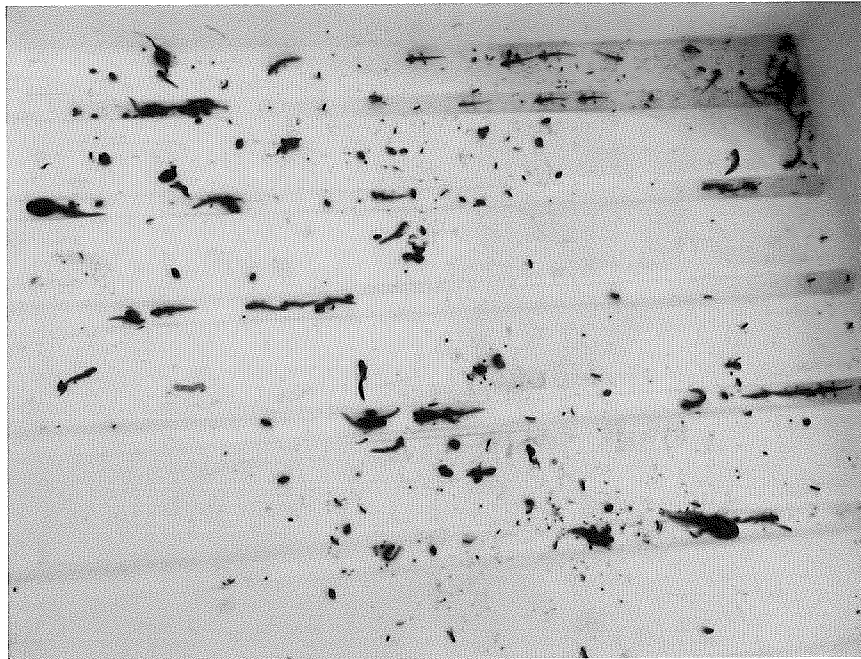
V Brně dne 2.8. 2022 zapsal [REDACTED]




*Obrázek 1 Pohled na tůň*



*Obrázek 2 Vysečené břehy koryta potoka*



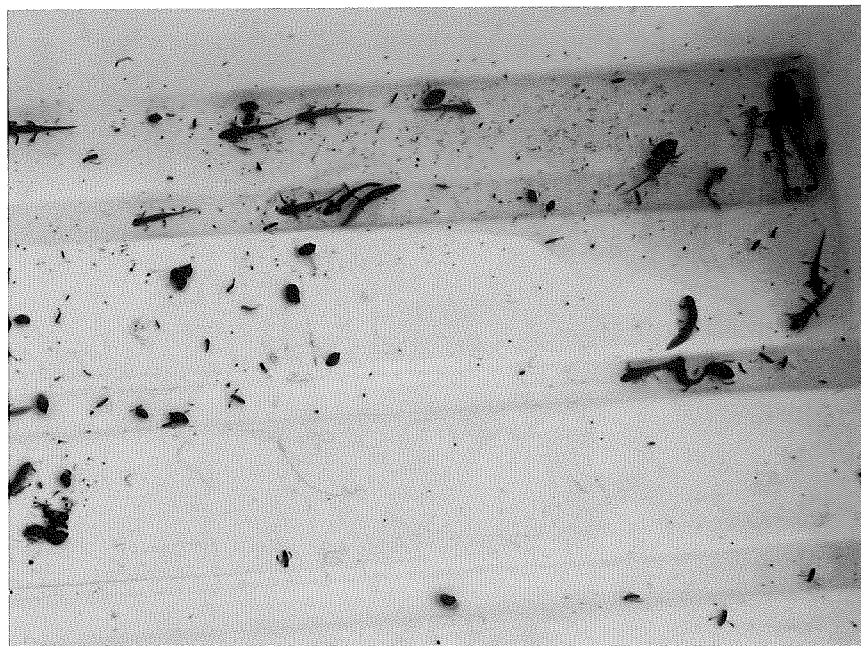*Obrázek 3 Desítky larev čolků obecných na bílé fotografické misce*



*Obrázek 4 Detailnější snímek larev čolka obecného*

NÁZEV A MÍSTO STAVBY: VN Rumunská bažantnice

K.Ú.: Měnin

PŘEDMĚT: **Situační zpráva pro potřeby KÚ JMK, Odboru životního prostředí**

**Popis vývoje situace, výkonu biologického dozoru a doposud provedených prací:**

Dne 13. 9. 2022 byla před konáním kontrolního dne provedena opětovná kontrola zájmového území za přítomnosti biologického dozoru Mgr. Lukáše Fice s cílem ověření aktuální přítomnosti zvláště chráněných druhů, především pak larev čolka obecného (*Lissotriton vulgaris*, SO).

V rámci hydrobiologického průzkumu **již nebyla přítomnost larev čolků zjištěna**. Obdobně nejsou přítomny ani metamorfované žáby v návaznosti na záměrem dotčenou plochu. V tůni jsou přítomni adulti „zelených“ skokanů (*Pelophylax esculentus complex*, SO) v početnosti vyšších jedinců až nízkých desítek. Jejich přítomnost však nepředstavuje z pohledu postupu dalších prací komplikaci. Adulti „zelených“ skokanů budou v návaznosti na čerpání vody a snižující se hladinu v tůni nuceni lokalitu opustit, příp. budou v rámci biologického dozoru na vhodné lokality transferovány.

**Zjištění a nařízení biologického dozoru:**

- **Přítomnost zvláště chráněných čolků obecných nebyla nadále v tůni zjištěna, nebyly tak zjištěny okolnosti bránící dalšímu postupu prací. K dnešními dni, tj. 13. 9. 2022, je tak odvoláno nařízení biologického dozoru z 1. 8. 2022 zakazující veškeré stavební práce v rámci vodního prostředí tůně, a to včetně odčerpávání vody.**

Fotodokumentace biologického dozoru je předložena na obrázcích níže.

V Brně dne 13.9. 2022 zapsal [REDACTED]



*Obrázek 1 Pohled na tůň*



*Obrázek 2 Pohled na manipulační objekt*



*Obrázek 3 Průzkum již neprokázal přítomnost čolků obecných*






a úpravách břehů vodní nádrže rovněž v podzimních měsících, tj. říjen a listopad. Současně požaduje dle § 85 odst. 2, písm. c) správního řádu vyloučení odkladného účinku odvolání.

K žádosti byly přiloženy Zjišťovací protokol č. 2 ze dne 02.08.2022, Ekopontis, s.r.o., zpracovaný Mgr. Lukášem Ficem. Tato příloha rozšířila podklady, které byly shromážděny k původnímu rozhodnutí správního orgánu (č. j. JMK 146208/2020).

Na základě obdržené žádosti přistoupil správní orgán k zahájení nového řízení s cílem vydání nového rozhodnutí ve výše uvedené věci podle § 101 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), ve smyslu § 84 písm. a) ZOPK.

Ve smyslu ustanovení § 71 odst. 3 ZOPK jsou ve svém územním obvodu účastníkem všech řízení vedených podle tohoto zákona obce, pokud v téže věci nerozhodují jako orgány ochrany přírody. Na základě tohoto ustanovení má postavení účastníka předmětného řízení obec Měnin se sídlem Měnin 34, 66 457 Měnin.

Správní orgán upozorňuje, že účastníci řízení, za které správní orgán považuje všechny účastníky předcházejícího řízení vedeného v dané věci, mohou činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména pak mají právo nahlížet do spisu, vyjádřit své stanovisko, seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Shromáždování podkladů pro rozhodnutí ve věci správní orgán ukončí ke dni 12.09.2022. Po tomto termínu se účastníci řízení budou moci ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu s kompletními podklady rozhodnutí seznámit a vyjádřit se k nim, a to nejpozději do 19.09.2022. Následně správní orgán přistoupí k vydání rozhodnutí ve věci.

Za správnost vyhotovení: 

## Rozdělovník

### Účastníci řízení:

1. Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové (DS)
2. Obec Měnin, Měnin 34, 66 457 Měnin (DS)



























Datum	Denní záznamy stavby
3.8.2022	POČASÍ RÁNO 11°C, ODPOLEDNE 29°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 2 [redacted]
	PRŮJEKT: BAGER TAKUCHI G6
	DOUSTAVBA OCHRANA STROMŮ DLE KAMER. OB.
	INVESTORA, DOPĚLNÁ ÚPRAVA VJEZDU U TRAVNÍ BRÁNY
	A ROZLETŮV PLOT PO DOHODĚ S P. SUBORDOU A
	BUDOU TĚDI PROBÍRAT NÁVOZ TECHNICKÝ A MATERIÁLU
	SKLIZ NEKRYTOUJÍCÍ ŠÍŘKOU BRÁNY, TOSKOVÁNÍ
	ZBYTKŮ TRAVIN NIMO VODNÍ PLOCHU, [redacted]
4.8.2022	NEPROBÍRÁ ZÁNOVÉ PRÁCE Z DŮVODU PORUCHY BAGERU [redacted]
5.8.2022	POČASÍ ZÁNO 15°C, ODPOLEDNE 32°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 1 [redacted] (10° - 13°)
	PRŮJEKT: BAGER TAKUCHI G6
	VYKONÁNÍ OBCHVAT PŮTOKU KOLEM MÍSTA OKOLU
	BUDOVACÍHO ODBĚRNÉHO OBJEKTU A VZDOLVACÍHO PRÁHU A
	NACVÝČKA PLOCHY PŘE VÝKOP ODBĚRNÉHO OBJEKTU A
	VZDOLVACÍHO PRÁHU, VE 30° DVOUZ DEMRERU TEREK
8.8.2022	POČASÍ RÁNO 12°C, ODPOLEDNE 28°C
	POČET PRACOVNÍKŮ: 3 [redacted]
	[redacted]
	PRŮJEKT: BAGER TAKUCHI G6
	ZAKÁZEK VÝKOPU NA VZDOLVACÍ PRÁHU KDE
	ZARUBA PO AN. KLASIKY OBJEKTU OBJEKTU STAVÍ
	BETONOVÝ OBJEKT, KTERÝ KOPÍRUJE PROFIL PŮTOKU
9.8.2022	Kontrola stavby TDI; přijímen David navštívil
	Práce na vykopání v neprobírají, zastaveny,
	na u řezce 9, prodávám provedení 1750mm
	měřno uprovit - bezhubové marušové boky,
	Kobitop práce na vykopání pro naplnění a
	rehabilitaci objektu - 1st. Koprojekt obrotím, bezrovoj,
	objekt, doplňující koprojektová práce - pro obrotím, boky,
	přidat obrotím.
	11.8. je představeno jednání za účasti KrV
	obchodní záměr výhledy z ZPRP pro dvoje v zadání
	VK - práce v zadání KVM neprobírají, [redacted]

WWW.OPTYS.CZ

Odebraly kopie číslo 1528803-3 [redacted]

Datum	Denní záznamy stavby
16.8.2022	POČASÍ PÁVLA 14°C, OBDOBĚ 24°C [REDAKCE]
	PROVEDENO DOČÍŠTĚNÍ KURTA TORU V ÚMĚRU 3,773 -- PO HOST
17.8.2022	<p>                     Jméno z inchozu obchodu sručený výpověď JAKO                      Příjmení: Mj. Dabber, Josef - IČP V U.                      Mj. Pavel (Machan, P. J. - IČP JAK                      Mj. Josef (Kocárek - IČP JAK                      : Petr (Kováč) - biologický dozor                      : Jaroslav (Mozný) - IČP JAK                      : Ondřej (Kučer) - IČP                      : Jolana (Voll) - IČP 2001. 9.4.0                      : Karel (Bartoš) - IČP 2001. 9.4.0                 </p>
	<p>                     Důležitá otázka probíhající jednání se všemi                      zúčastněnými zúčastněnými - povolení výpovědi                      ze strany ZELKO. Vzhledem k neexistence provádění                      prací zemních prací a důvodu výpovědi                      "Karel (Kováč) v zájmu práce bylo dohodnuto,                      že investor podle původní a zúčastněnými                      pracovním dohodnuto, která umožní pokračování                      práce rovněž v měsících říjen a listopad.                 </p>
17.8.2022	<p>                     Kontrola stavby TDI, účastník David navštívil                      Probito' ochrannou zónou z VI - ochranná zóna                      z celého úseku, v důležitých místech je nutno                      přesahovat hranice - ušší slon než 4.1.                      Probito' práce vra zúčastněnými a výpovědi objektu -                      probíhala výpovědi ochranné zóny - ochranná zóna                      ochranná zóna ochranné zóny - ochranná zóna                      ochranná zóna ochranné zóny - ochranná zóna                 </p>

WWW.OPTYS.CZ

Datum	Denní záznamy stavby
8.9.2022	Počasí ráno 11°C, odpoledne 20°C
	
	ŘEŠENÍ KARI SÍTÍ NA ODŽÍVNÍ OBJEKT A ČÁSTI NA
	MÍSTNÍ POTRUBÍ, KROVENÍ VZDUŠNACÍHO PRÁHU
	A BAKOVÉ FOLIE GEOTEXTILII
	
9.9.2022	Počasí ráno 11°C, odpoledne 21°C
	
	POVOLENÍ ŘEŠENÍ A ČÁSTI OB. ODŽÍVNÍ VZDUŠNACÍHO
	PRÁHU, KROVENÍ VZDUŠNACÍHO PRÁHU A
	BARIÉRY GEOTEXTILII
	
10.9.2022	Počasí ráno 11°C, odpoledne 25°C
	
	ODSTAVENÍ GEOTEXTILIE A ZAKRYTÍ, ODŽÍVNÍ NA
	ČÁSTI ŘEŠENÍ A VETÁNÍ DÍŘE NA VENKOVNÍ ÚČASTI DO
	VZDUŠNACÍHO PRÁHU, NASTAVENÍ V PROJEKTU NA
	VŠEČENÍ, ZAPRAVENÍ TONERU SPRÁVNÝM ÚSTROJÍM NA MÍSTNÍ
	KANCELÁŘI
	
13.9.2022	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V rámci KD prováděna bouřková povodňová
	oprávněná práce.
	Během práce provedl řemeslník výhled 2000
	místní v součase práce, ve směru 100m
	
