



MHMPXPJDRX9H

KONTROLNÍ ČÍSLO: P20V00177401

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

ENERGIE – STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S.

---

# DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově

etapa 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh

ZHOTOVITEL STAVBY

---

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/06/007066/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

**Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního MHMP  
dále jen jako „Objednatel“

*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):*

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha  
IČO: 47116901  
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

**Energie – stavební a báňská a.s.**

společnost vedená u MS v Praze pod spisovou značkou B 1399  
se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  
IČO: 45146802  
DIČ: CZ45146802, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Kladno  
číslo účtu: 1000141/0100  
zastoupená:

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově;**

## etapy 0005 Nátokový labyrint – pravý břeh

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „**Dodatek č. 2**“

### 1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

- 1.1. Oproti původně předpokládanému termínu zahájení stavby koncem roku 2020, který byl uvažován v době podání nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku, byla stavba z důvodů na straně Objednatele zahájena až v průběhu hlavní návštěvnické sezóny v červnu 2021. V souladu s požadavkem Zoo, na výrazné omezení prací v období hlavní návštěvnické sezóny, tedy od 1. dubna do 30. září, který byl uveden již v plánu organizace výstavby zadávací dokumentace stavby, není možné z důvodu zahájení prací až v červnu 2021 dodržet původně uvažovaný postup výstavby a tím ani termín ukončení stavby v říjnu 2022.

V období hlavní návštěvnické sezóny 2021 nebylo možno zahájit realizaci SO 01.1. a 01.4. Byly tak zahájeny práce na SO 01.3 a 01.5. Objekty SO 01.1 a 01.4 byly zahájeny začátkem vedlejší návštěvnické sezóny 2021/22. S ohledem na zachování funkčnosti pravobřežního labyrintu i v průběhu realizace stavby budou SO 01.2, 03.1 a 03.2 provedeny v průběhu vedlejší návštěvnické sezóny 2022/23, kdy bude dokončena i realizace SO 01.1. Ostatní objekty budou dokončeny do konce 02/2023 (viz příloha č. 3 Harmonogram).

- 1.2. V souvislosti s výše popsáním, v souladu s Částí V. odstavec 8.3. Smlouvy a na základě Oznámení Zhotovitele ze dne 25.4.2022 (příloha č. 1) měníme **termín dokončení stavby na 28.2. 2023. Tento posun termínu nemá vliv na cenu díla.**

### 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 2 a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to dnem připojení posledního z nich.
- 2.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

- 2.5 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
- 2.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě.
- 2.7 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14.3.2022 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.
- 2.8 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- 2.9 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datum jeho podpisu a plný text Dodatku č. 2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### 3. PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Oznámení Zhotovitele

Příloha č. 2 Plná moc pro Ing. Raclavského a Ing. Kdýra

Příloha č. 3 Harmonogram

za Objednatele:

**Ing. Petr  
Kalina**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Kalina  
Datum: 2022.10.04  
20:15:21 +02'00'

Ing. Petr Kalina, MBA  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy


za Zhotovitele:



Energie-stavební a báňská a.s.  
na základě plné moci



Energie-stavební a báňská a.s.  
na základě plné moci

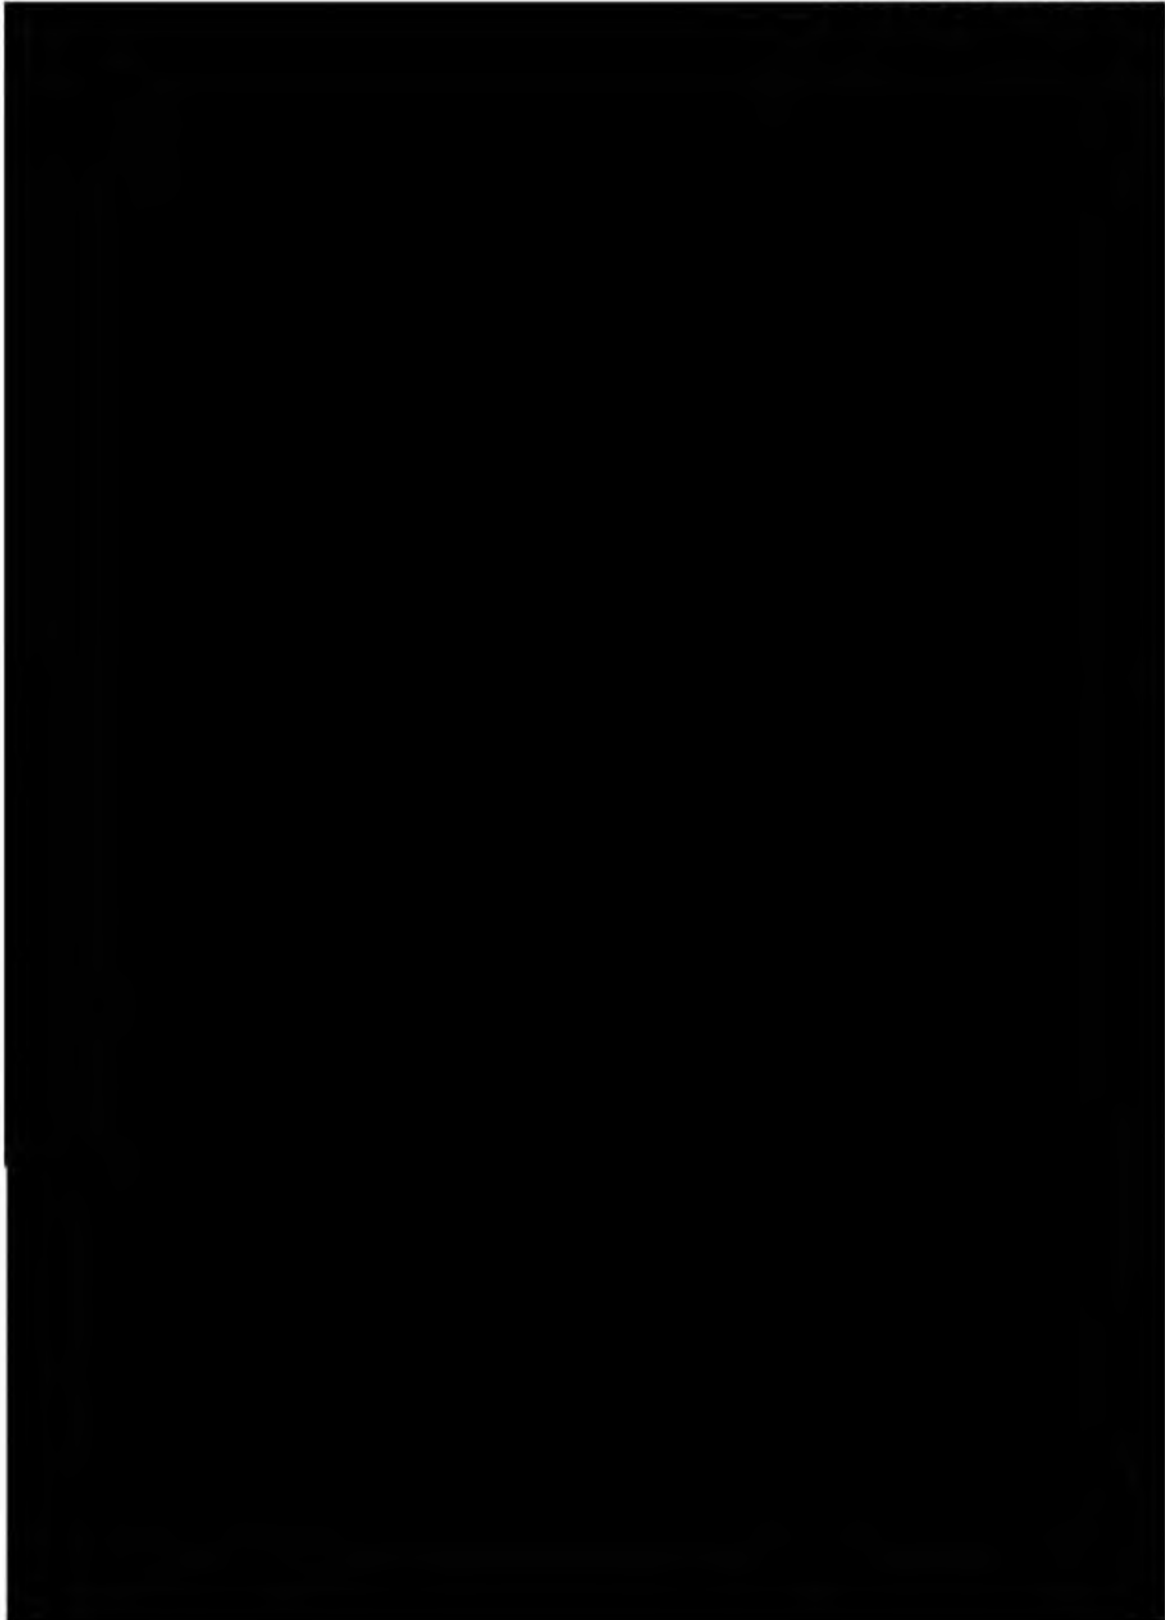

PLNÁ MOC

