



MHMPXPJLASGU

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00199194

Stejnopis č.:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

CETUS PLUS, A.S.

DODATEK Č. 2

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,
navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy,
etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007146/2021

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0183

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Objednatel**“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930

se sídlem: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zastoupená: Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyní představenstva; Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně jedné

a

CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B 6931

se sídlem: Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
IČO: 26419823
DIČ: CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2281352/0800
zastoupená: Karlem Muzikou, členem představenstva

dále jen jako „**Zhotovitel**“

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

tento

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 42124

**název stavby: Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,
navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006
Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;**

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Dodatek č. 2“

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o následující práce dle změnového listu č.1.

2. Předmětem Dodatku č. 2 se v souladu s článkem 4. Změny díla mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce:

Při zahájení prací na PPO opatření č. 149a bylo zjištěno, že došlo ke znečištění stávajícího žulového obkladu PPO stěny grafity. Grafity bylo odstraněno, aby bylo možné kámen použít pro obnovu obkladu. Dále bylo konstatováno, že gabionový obklad, kterým bylo provedeno zpevnění břehu na návodní straně zdi, musí být pro realizaci díla částečně demontován a následně vrácen zpět. Dále při demontáži spodní části žulového obkladu, začala být horní část nestabilní a z důvodu BOZP bylo nutné demontovat celý obklad. Následně bude nutné z návodní strany obnovit obklad na celou výšku zdi.

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla se navyšuje cena Díla. Tímto Dodatkem č. 2 se tak ruší původní ustanovení části IV. Cena díla a platební podmínky, čl. 6, odst. 6.1. a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č.j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22. 7. 2021 a v souladu se schváleným změnovým listem č. 1 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD vč. Dod. č. 1	4 800 442,63	1 008 092,95	5 808 535,58
Navýšení ceny dle Dodatku č.2	892 874,27	187 503,60	1 080 377,87
Nová cena díla dle Dodatku č. 2	5 693 316,90	1 195 596,55	6 888 913,45

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 2 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datech jeho podpisu a plný textu Dodatku č. 2.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 2

5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku 2, a to dnem připojení posledního z nich.
6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 2 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 2.

Počet stejnopisů Dodatku č. 2

8. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Dodatku č. 2

9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 2 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

V Praze dne 30.9. 2022


V Praze dne 10.10. 2022

PLUS

v.z. Mgr. Robert Sajač
vedoucí odd. právního

Priloh 5.1


Priloh 5.1

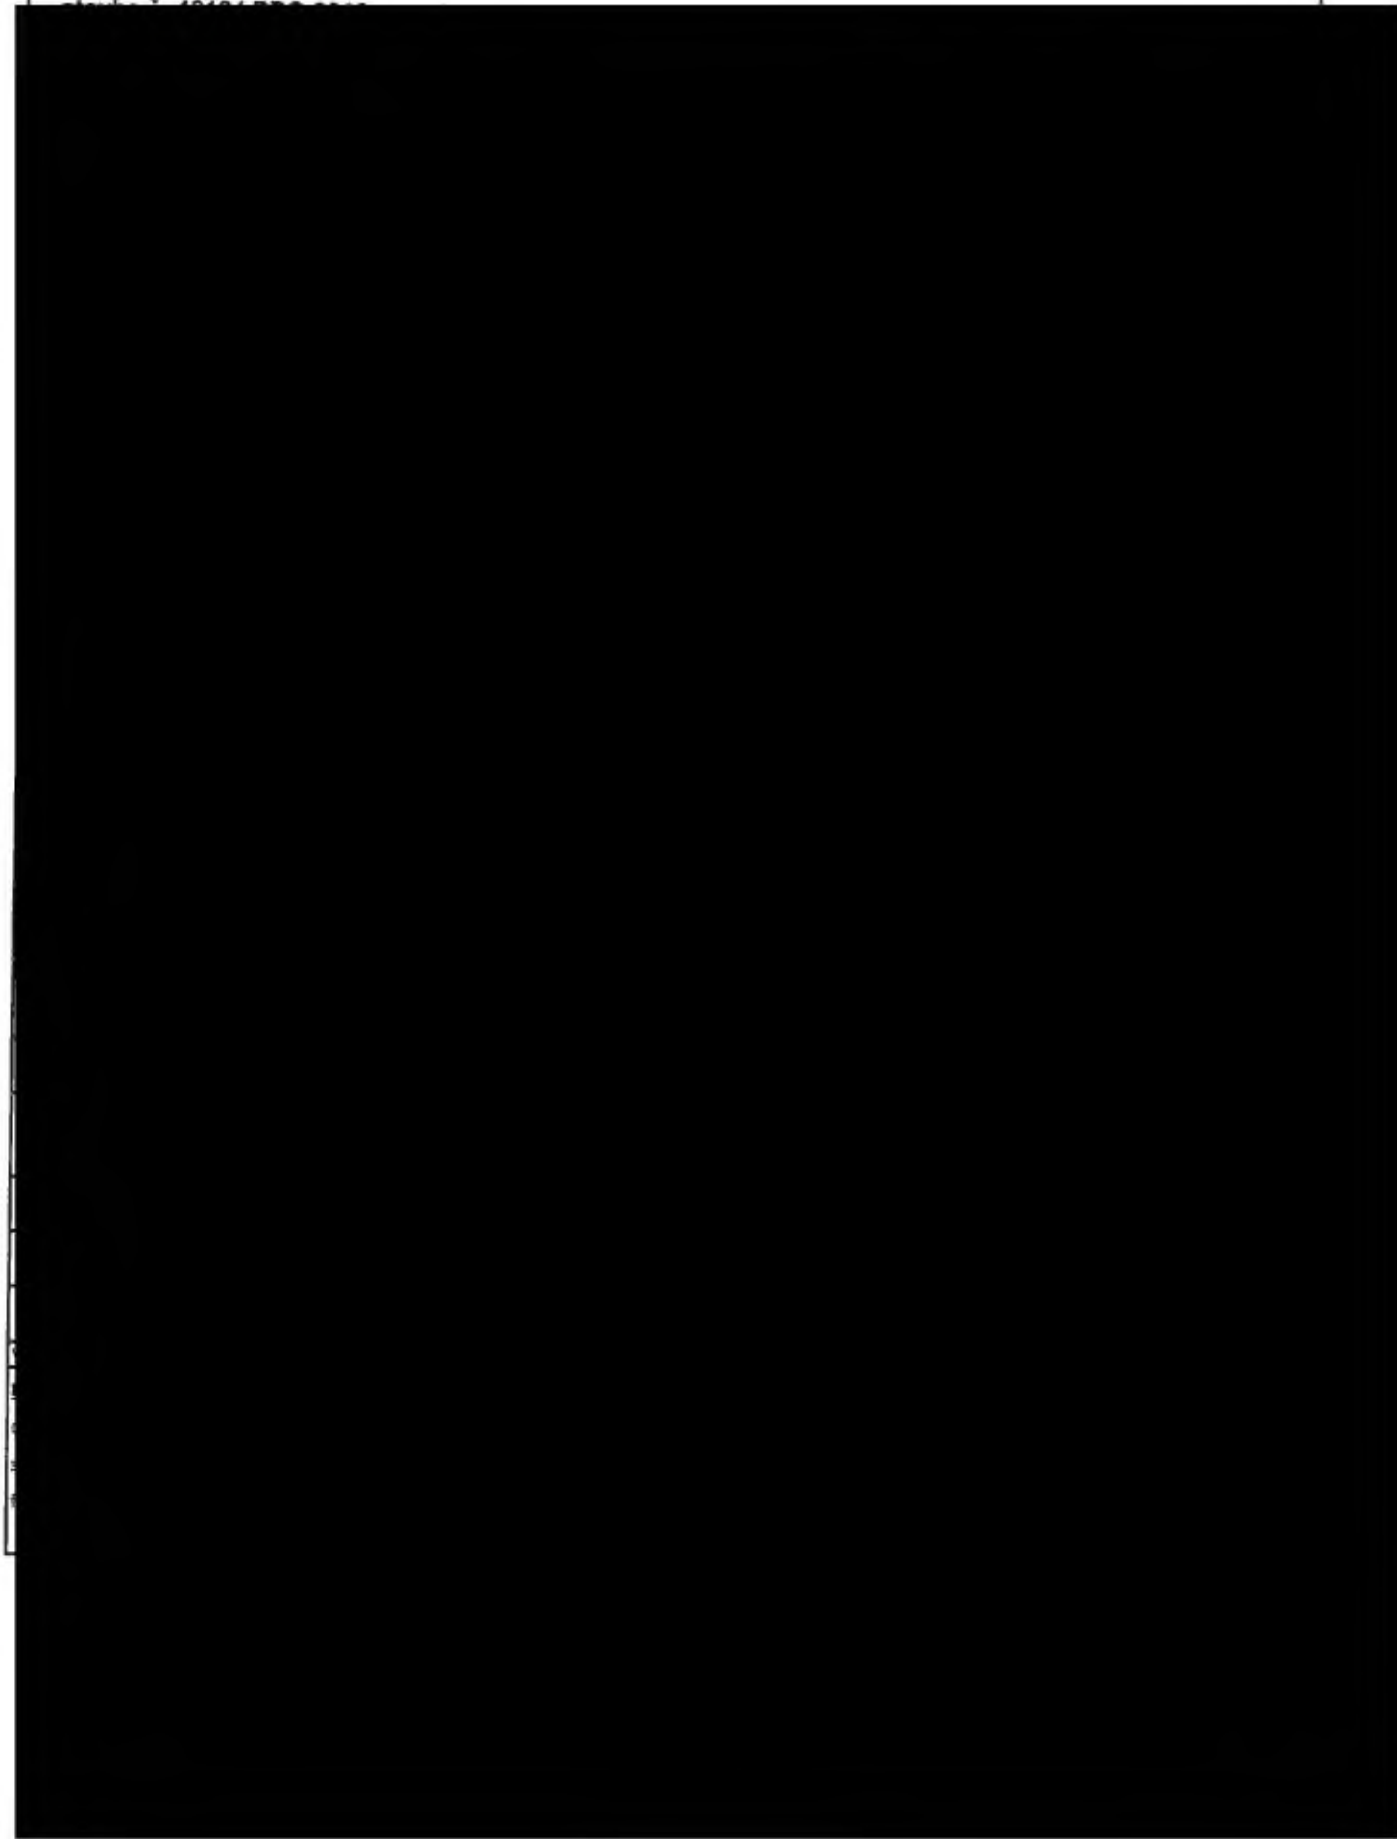

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 3A1424832A01 - Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012 oceněný

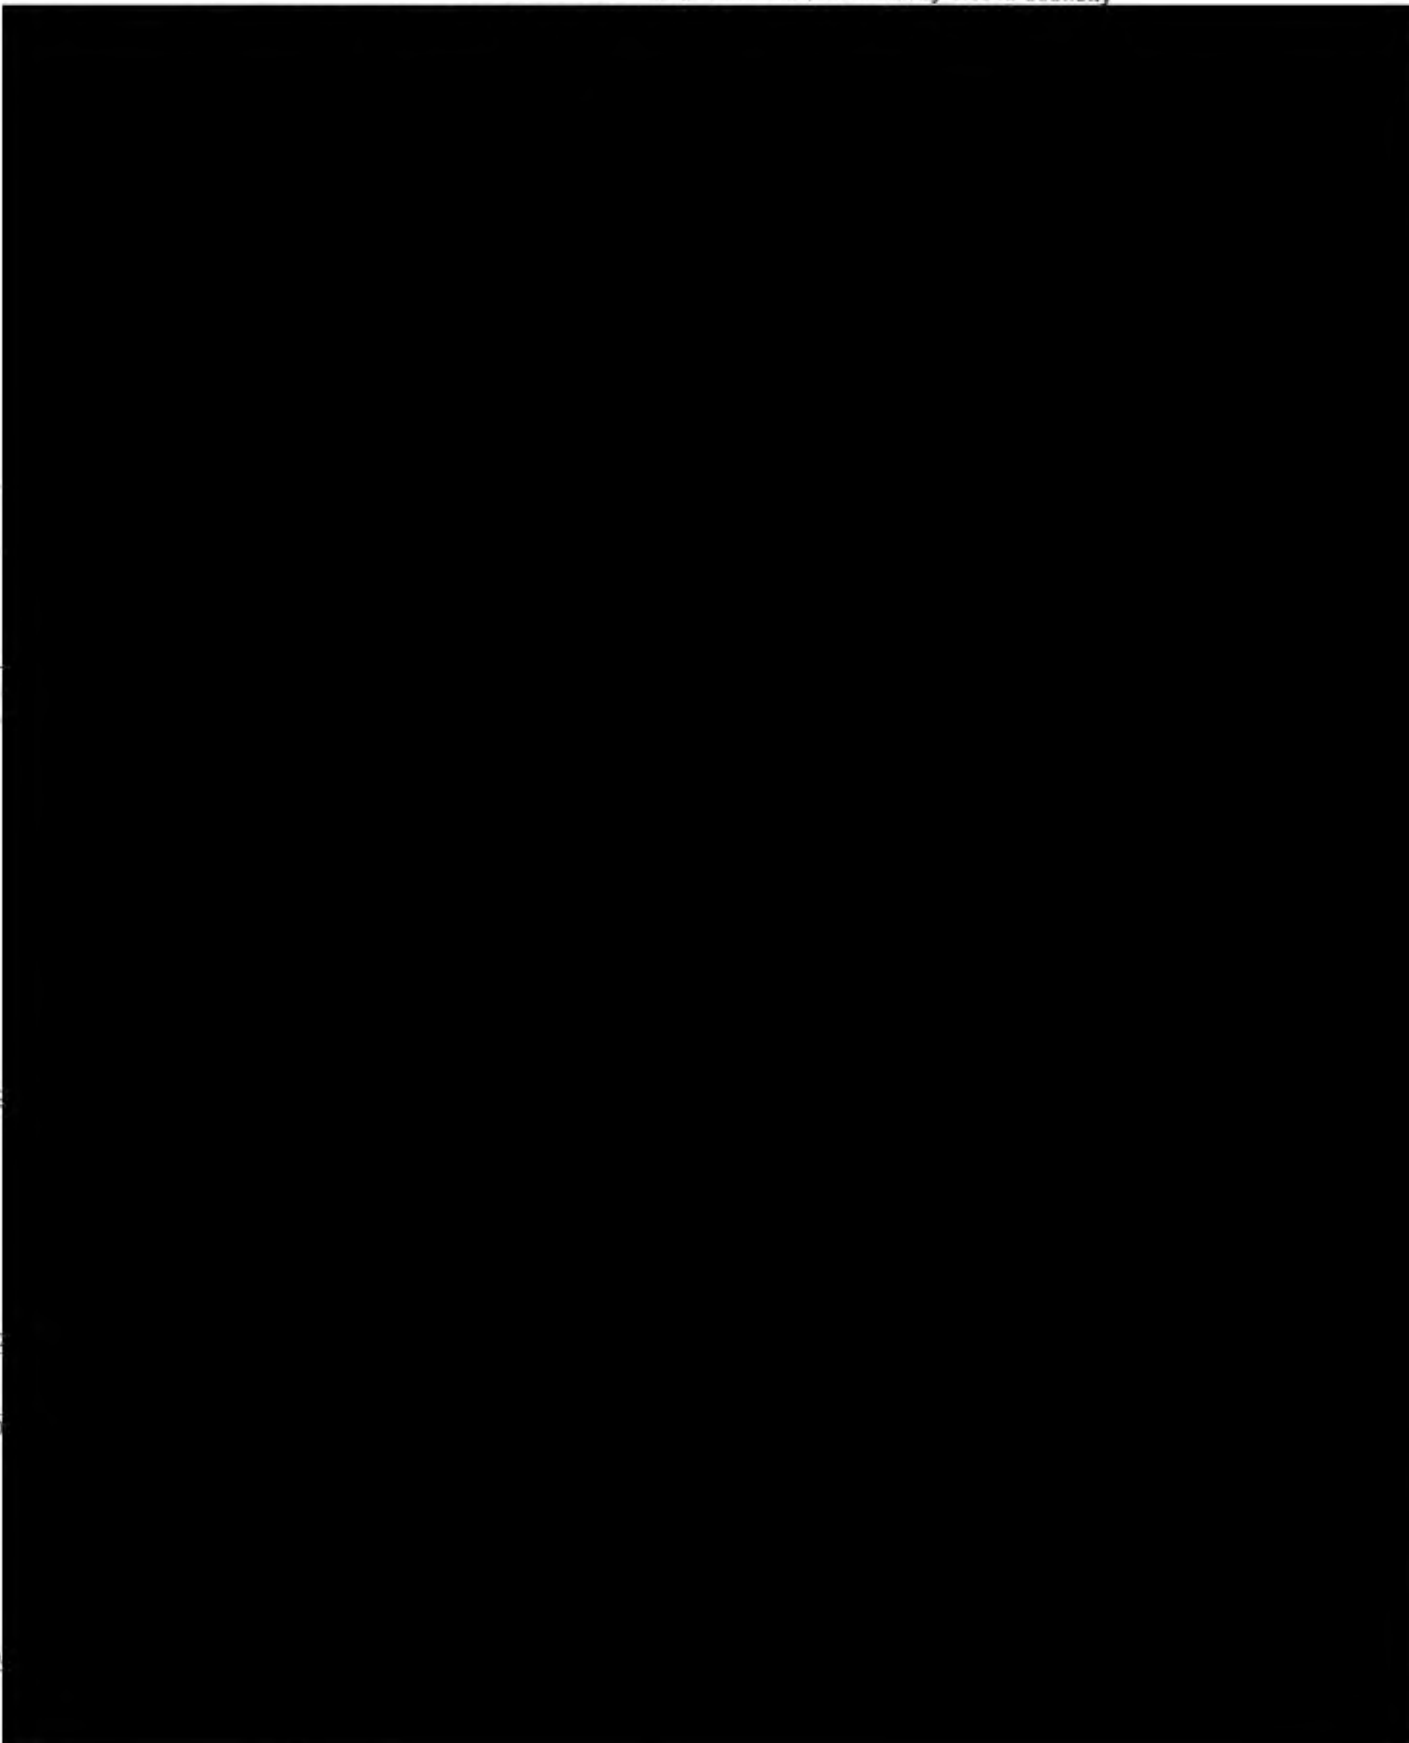

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 3A1424832A01 - Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012 oceněný

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:


Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		892 874,27	1 031 579,16
č.149a	Opatření č. 149a	877 874,27	1 013 429,16
č.149b	Opatření č. 149b	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní ...	15 000,00	18 150,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

3A1424832A01 - Navýšení PPO v úseku SO 10, opatření 149a, 149b stavby č.0012 oceněný




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:



VV		81 1,8 4					
VV		Součet			548,000		
					66,275		
43	K	783801651	Očistění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů z lícového zdiva	m2	149,800	755,00	113 099,00
VV		(1,4*2)+(12*3)+(5*3)+(32*3)			149,800		

2

5

O

D

O

P

Da

Ob

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

