

## **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
**na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ – Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2952/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0018

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949y

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **21-198**

(dále jen „**zhotovitel**“) společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 07. 2021 uzavřely Smlouvu, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun**“ – **Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem uzavření tohoto dodatku č. 3 je **prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení díla** podle Smlouvy o **4 měsíce**. Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací je zejména skutečnost, že k realizaci díla je zapotřebí přeložit stávající rozvod STL plynovodu, který je v kolizi s nově navrhovanou trasou kanalizace. Zhotovitel bude jednat o podmínkách pro přeložku STL plynovodu, na základě čehož budou zahájena jednání o realizaci přeložky s poddodavatelskou firmou, která bude realizovat práce na zařízeních ve správě vlastníka plynárenského zařízení. Vlastní realizace přeložky by měla proběhnout v průběhu července tohoto roku. Následně proběhnou práce na dokončení nových rozvodů kanalizace včetně jejího napojení na výpravní budovu a uvedení prostor do původního stavu.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **16,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací. Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

### I. Předmět Dodatku

a) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 16,5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **13,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

**Za objednatele:**

V Praze 04.05.2022

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
Ing. Jakub Svoboda  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)


### Harmonogram postupu prací

objekt	STRABAG																														
	srpen 2021							září 2021							říjen 2021							listopad 2021									
	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30
Stěhování mechanizace																															
Geodetické vytyčení stavby																															
Ruční sondy na ŠJ2 + ŠJ1 / kontrola výšky																															
Řezání asfaltu, demontáž ostrůvku																															
Bourání asfaltu																															
Výkop rýhy																															
Úsek IO 421 - kanalizace jednotná - obnova																															
Úsek IO 422 - kanalizace jednotná - nová																															
Úsek IO 425 - kanalizace splašková ŠJ4 - ŠS6																															
Úsek IO 425 - kanalizace splašková ŠJ5 - ŠS1																															
Úsek IO 425 - kanalizace splašková ŠS1 - ŠS2																															
Úsek IO 426 - kanalizace dešťová ŠD1 - ŠD6																															
Úsek IO 426 - kanalizace dešťová ŠD1 - ŠD2																															
Úsek IO 426 - kanalizace dešťová ŠD2 - ŠD3																															
Úsek IO 427 - kanalizace dešťová																															
Úsek IO 427 - retenční nádrž na dešťovou vodu																															
Obnova asfaltových povrchů																															
IO 422 - kanalizace jednotná - dokončení																															
Videoinspekce potrubí I.																															
Videoinspekce potrubí II.																															
Přečerpávací stanice kanalizace																															
Bourání betonů - vícepráce																															
<b>Dokončení stavby</b>																															
Finanční plnění																															

Stránka 1

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

NÁVRH NOVÝCH KANALIZAČNÍCH STOK pro odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstr.budovy ŽST Beroun

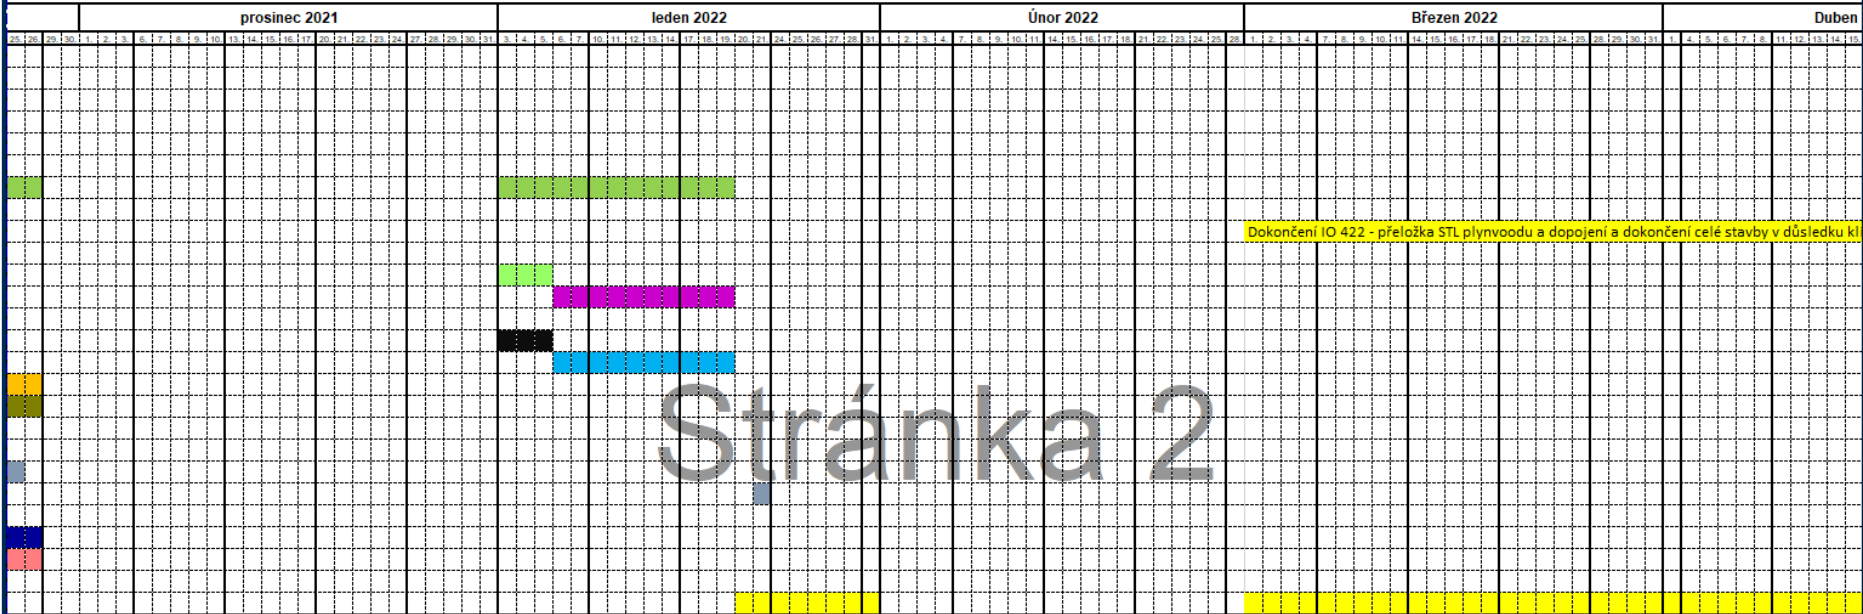

Stránka 2

15 864 998,37 Kč

2022				Květen 2022							Červen 2022							červenec 2022							Srpen 2022							Září 2022													
matických podmínek											Přeložka STL plynovodu							Dokončení kanalizace i celé stavby							Dokončení kanalizace i celé stavby							Předání a dokončení stavby-zkušební provoz													
				Obnova asfaltů+ vyrovnání chodníků																																									
				0,00							0,00							760 062,10														1 569 211,52													

Stránka 3
