

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210063
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 229150009

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **ROSSETA s.r.o.**
Adresa sídla: Školská 144/58, 013 06 Terchová, Slovenská republika
Statutární orgán: Jaroslav Michalek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Jaroslav Michalek, jednatel
Zástupce pro věci technické: Jaroslav Michalek, jednatel
IČ: 36284475
DIČ: CZ685381145
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: obchodný register vedený Okresním soudem v Žilině, oddíl Sro,
vložka 19139/L

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210063 na akci „Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **13 222 876,46 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Lukovna, ř. km 0,000 – 0,278	156 164,93 Kč
SO 02 Choteč – Dolní Ředice, ř. km 5,148 – 5,775	299 874,40 Kč
SO 03 Dolní Ředice – Horní Ředice, ř. km 5,775 – 11,700	12 766 837,13 Kč
CELKEM	13 222 876,46 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **13 491 215,87 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01 Lukovna, ř. km 0,000 – 0,278	176 330,55 Kč
SO 02 Choteč – Dolní Ředice, ř. km 5,148 – 5,775	355 182,27 Kč
SO 03 Dolní Ředice – Horní Ředice, ř. km 5,775 – 11,700	12 959 703,05 Kč
CELKEM	13 491 215,87 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (s výjimkou uvedenou níže v tomto odstavci 5.1 a v odstavci 8.1 této smlouvy), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 10. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **62.244.741,43 Kč**,

slovy: šedesát dva milionů dvě stě čtyřicet čtyři tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena díla se sníží za každý další zpětně využitý m³ kamene z kamenné dlažby nad objem uvedený a oceněný ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem v rámci nabídky na plnění zakázky, a to dle skutečnosti a na základě jednotkových cen adekvátních položek uvedených v tomto výkazu výměr. Výše uvedená celková cena díla se zvýší za každý m³ kamene z kamenné dlažby z objemu uvedeného a oceněného ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem v rámci nabídky na plnění zakázky, který nebylo prokazatelně možno zpětně využít pro realizaci zakázky, a to dle skutečnosti a na základě jednotkových cen adekvátních položek uvedených v tomto výkazu výměr.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (s výjimkou uvedenou níže v tomto odstavci 5.1 a v odstavci 8.1 této smlouvy), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 10. 2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 62 244 741,43 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 13 222 876,46 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 13 491 215,87 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **61 976 402,02 Kč**,

slovy: šedesát jeden milion devět set sedmdesát šest tisíc čtyři sta dva korun českých 02/100 bez DPH.

Výše uvedená celková cena díla se sníží za každý další zpětně využitý m³ kamene z kamenné dlažby nad objem uvedený a oceněný ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem v rámci nabídky na plnění zakázky, a to dle skutečnosti a na základě jednotkových cen adekvátních položek uvedených v tomto výkazu výměr. Výše uvedená celková cena díla se zvýší za každý m³ kamene z kamenné dlažby z objemu uvedeného a oceněného ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem v rámci nabídky na plnění zakázky, který nebylo prokazatelně možno zpětně využít pro realizaci zakázky, a to dle skutečnosti a na základě jednotkových cen adekvátních položek uvedených v tomto výkazu výměr.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

Dle zadávací projektové dokumentace mělo být v zájmových úsecích koryta Ředického potoka provedeno opevnění kamennou dlažbou na sucho opřenou o betonovou patku. V průběhu realizace po odstranění nánosů bylo zjištěno, že v celém zájmovém úseku toku Ředického potoka se nachází opevnění v celé šířce koryta, tj. včetně dna. Dle zadávací projektové dokumentace, která vycházela z původní dokumentace skutečného provedení z roku 1965, dno být opevněno nemělo.

Na základě této skutečnosti bylo následně zpracovatelem projektové dokumentace navrženo řešení dané problematiky v několika variantách, přičemž po posouzení variant vyšlo jako ekonomicky i časově nejefektivnější řešení s využitím nalezených konstrukcí spočívající ve změně v provedení betonové patky svahového opevnění na patku z lomového kamene. Takto provedená patka bude plynule navazovat na stávající opevnění dna z kamenné dlažby a zároveň zajistí zdrsnění koryta pro úkryt živočichů

Z důvodu nalezení kamenného opevnění dna v celé délce zájmového úseku Ředického potoka bude upuštěno od realizace příčných betonových zajišťovacích prahů.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210063 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Příloha:

1) Harmonogram prací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Jaroslav Michalek
jednatel
podepsán elektronicky

Stavba : Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0 - 11,7

Dodávateľ: ROSSETA s.r.o. , Školská 144/58 01306 Terchová, Slovenská republika


IČO: 36284475

DIČ: CZ685381145

Zahájenie výstavby : 11.04.2022

Ukončenie výstavby: 30.11.2023


Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 01:

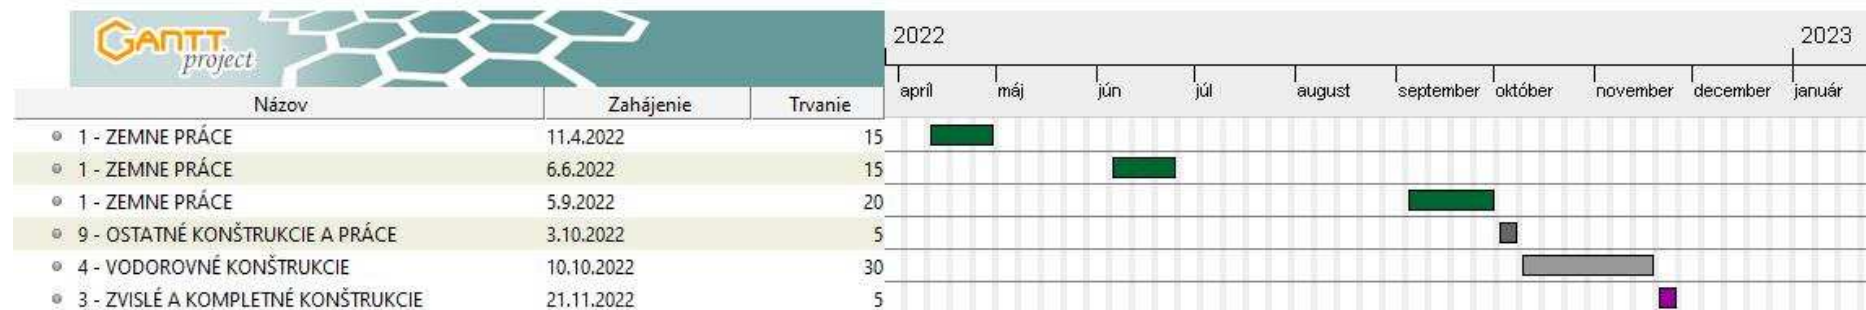

2022

Apríl 2022	Jún 2022	September 2022	Október 2022	November 2022
111 569,00 Kč	188 000,00 Kč	0,00 Kč	1 016 841,68 Kč	825 513,21 Kč
Spolu 2022 : 2 141 923,89 Kč				

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 02:



2022

Jún 2022	September 2022	Október 2022	November 2022
195 674,13 Kč	0,00 Kč	750 962,92 Kč	738 359,35 Kč

Spolu 2022 : 1 684 996,40 Kč

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch SO 03:



2022

Apríl 2022	Jún 2022	September 2022	Október 2022	November 2022
180 335,00 Kč	438 461,85 Kč	0,00 Kč	2 548 225,84 Kč	2 635 485,21 Kč
Spolu 2022 : 5 802 507,90 Kč				

2023

Apríl 2023	Máj 2023	Jún 2023	Júl 2023	August 2023	September 2023	Október 2023	November 2023
6 358 892,25 Kč	6 536 787,37 Kč	6 650 259,76 Kč	6 678 936,41 Kč	6 606 787,69 Kč	6 603 696,47 Kč	6 509 627,67 Kč	6 401 986,21 Kč
Spolu 2023 : 52 346 973,83 Kč							

Finančný objem prác realizovaných v jednotlivých mesiacoch, celá stavba:



2022

Apríl 2022	Jún 2022	September 2022	Október 2022	November 2022
291 904,00 Kč	822 135,98 Kč	0,00 Kč	4 316 030,44 Kč	4 199 357,77 Kč
Spolu 2022 : 9 629 428,19 Kč				

2023

Apríl 2023	Máj 2023	Jún 2023	Júl 2023	August 2023	September 2023	Október 2023	November 2023
6 358 892,25 Kč	6 536 787,37 Kč	6 650 259,76 Kč	6 678 936,41 Kč	6 606 787,69 Kč	6 603 696,47 Kč	6 509 627,67 Kč	6 401 986,21 Kč
Spolu 2023 : 52 346 973,83 Kč							

Spolu celá stavba : 61 976 402,02 Kč
