

ZBV 1

položka převzata z SO 186, č. pol. 6

rozšíření, dvě vrstvy a 200mm

L - staničení 0,500 až 0,715, šíře 700mm

P - staničení 0,714 až 0,800, šíře 500mm (návrh AD 300mm)

L - staničení 0,785 až 0,870, šíře 700mm

P - staničení 0,875 až 0,980, šíře 500mm (návrh AD 200mm)

P - staničení 0,980 až 1,060, šíře 500mm

L - staničení 1,170 až 1,240, šíře 500mm

L - staničení 1,335 až 1,400, šíře 700mm

L - staničení 1,640 až 1,725, šíře 700mm

 $(1750-500) \cdot (0,7+0,15) + (800-714) \cdot (0,5+0,15) + (870-785) \cdot (0,7+0,15) + (980-875) \cdot (0,5+0,15) + (1060-980) \cdot (0,5+0,15) + (1240-1170) \cdot (0,5+0,15) + (1400-1335) \cdot (0,7+0,15) + (1725-1640) \cdot (0,7+0,15) = 253,560$ [A]

Celkem: A=253,560[B]

- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti

- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané souřídce

- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrmuje postřiky, nálety

Komunikace

5				0,00	0,00	225 566,98	225 566,98	225 566,98
---	--	--	--	------	------	------------	------------	------------

Celkem - položky z jiných SO

0,00	0,00	225 566,98	225 566,98	225 566,98
------	------	------------	------------	------------

Nové položky

9

Ostatní konstrukce a práce

MRŮŽE LITINOVÉ SAMOSTATNĚ

ZBV 1

mříž na vtokovou jímku 1,000

DBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C20/25

ZBV 1

obetonování propustku staničení 0,500

(výška šířka délka) = n * DN + šířka stěny / 2 * délka

 $(1,250 \cdot 1,200 \cdot 12,000) + (3,14 \cdot 0,300 \cdot 0,100 \cdot 2 \cdot 12,000) = 11,251$ [A]

Celkem: A=11,251[B]

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH

ZBV 1

propusek staničení 0,500

12,000=12,000 [A]

Celkem: A=12,000[B]

ČELA KAMENNÁ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

ZBV 1

výtoková strana propustku staničení 0,500

1,000=1,000 [A]

Celkem: A=1,000[B]

VÝTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

ZBV 1

výtoková jímka propustku staničení 0,500

1,000=1,000 [A]

Celkem: A=1,000[B]

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

ZBV 1

zpevněný příkop

L - staničení 0,427 až 0,477

477-427=50,000 [A]

Celkem: A=50,000[B]

BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM

ZBV 1

bourání starého propustku staničení 0,500

12,000=12,000 [A]

Celkem: A=12,000[B]

Ostatní konstrukce a práce**Celkem - nové položky****Celkem - po započtení ZBV 2**

0,00

0,00

172 475,70

172 475,70

172 475,70

0,00

0,00

172 475,70

172 475,70

172 475,70

0,00

0,00

172 475,70

172 475,70

172 475,70

18 525 049,65

-973 139,70

1 498 329,94

19 050 239,89

525 190,24

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 11434 TŘEBŠICE

List číslo: 16

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: OBlačno + 12°C až +19°C

23.8.21

POČET TMC - TUP - SCOP (1), JELČIČI - 8 (112) DOČEKÁ

23.8.21

TMC DOBA - 7 - 17 (71424 II - 11³)

HECHNÍZACE - TRACTORAGR 2x, 44C, 4KČA 420 2x
LIBUČI, JELČI, TČI

POVIS - ROZSÍŘEČI, LELE STUČI, 4KČE 1,335 - 1,300

A 1,680 - 1,725 - PROJEČI, VÍČIČI

4KČI V S 0,5 až 0,97 A II 0,77

4KČI 0,6024 0,7126 2,57/47 4x

ROZSÍŘEČI TŘEBŠICE

- PROJEČI (TUP) TČIČI A 2 KČIČI

8) 0/63 V π 0,27

- ROZSÍŘEČI 4KČIČI 4x, 4KČIČIČI +

4KČIČI TČIČIČI, 2,760 - 2,850

4KČIČI A 2,870 - 2,900 TČIČIČI

4KČIČI 0,6024 4x ROZSÍŘEČI

- KONTROLA 7/10

POČASÍ: ZATÍŽENO + 10°C až +17°C JELČIČIČIČI

24.8.21

POČET TMC - TUP - SCOP (1), JELČIČI - 8 (112) DOČEKÁ

4x

TMC DOBA - 7 - 17 (71424 II - 11³)

HECHNÍZACE - TRACTORAGR 2x, 44C, 4KČA 420 2x
LIBUČI, JELČI + TČI

POVIS - ROZSÍŘEČI, LELE STUČI, 4KČE 1,640 - 1,600

PROJEČI, VÍČIČI, 4KČI V S 0,6024 4x

ROZSÍŘEČI TŘEBŠICE

- PROJEČI (TUP) TČIČI A 2 KČIČI

8) 0/63 V π 0,27

- ROZSÍŘEČI 4KČIČI 4x, 4KČIČIČI +

4KČIČI TČIČIČI, 2,870 - 2,750

TČIČIČI, 4KČIČI 0,6024 4x

ROZSÍŘEČI + LELE STUČI 1,500 - 1,640

Denní záznam stavby

Název akce: III/11434 - TĚBYSICE

List číslo: 18

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: ZATAŽENO + 13 C 9^h + 18 C 26.8.21

ROZET PRAC - TVŮ - ŠKOD, ŽEL - S VL. DOČEKÁ ČT

PRAC DOBA - 7 - 17 (PRÁCA 11 - 11^h)

TECHNICKÉ - BAGR VÍKRE, TRACTORAG9, VUC
VÍKRE AGTO 21

PRAC - ODPRAVDŮVĚNÍ KVOBY K1 ERVUČOČ

A ČIŠTĚNÍ TRÁVOPY V KŘECH

2,200 - 2,500 PRÁCA PRÁCE

OPROČ VTEŘENÍKŮ VĚTRNÁČU K1

PRACER TRÁVOPY

ZÁPIS ZBOŽOVNĚ PRÁCE PRAC PRAC PRAC PRAC 27.8.21

PRACER VĚTRNÁČ PRACER K1 VĚTRNÁČ 18

30 4/63 + 4/3 PRACER VĚTRNÁČ PRACER PRACER S

174044147, 171044147 - 47 PRACER - 82,2 479

A 27 0770 - 07,9 479 - 24870 PRACER O

PRACER PRACER PRACER VĚTRNÁČ - 2-47 PRACER

PRACER PRACER PRACER

KONTROLA STAVBY BOZP: PRÁCE PRÁCE PRÁCE PRÁCE 30.8.2021

BOZP V4 SO 020 A SO 001 - NEDOSTATEK BYL ODPRAVDŮVĚN

PRÁCE V4 ZÁDU 21 VĚTRNÁČ PRÁCE PRÁCE

JAKOB VĚTRNÁČ - BOZP

Denní záznam stavby

Název akce: III / 11434 TUBŠICE

List číslo: 19.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: 7.10.2014 +10°C až +18°C 30.8.21.
 ROZET TMC - TYP-2001, JEL - 13 VIZ DOČASNA 70
 TMC J0B1 - 7 - 17 (TAKA II - II²)
 MECHANIZACE - FRYZ A PRACY KONTROLA, ENORCA,
 BAGE KAJER, TUKTORA, LLC AŽTO V
 POPIS - FRYZOLIVY AFRANTOLEBO ENTY V R. OCA 1004
 V KRECH EN 0,500 - 2,150 VE OVLADY
 V TUKTORA A PRACY BEKROV
 - CISTEBY TUKTORA A OPRACOVANI KROV
 V ENTY ENTY V KRECH EN 2,100 - 2,200
 TUKTORA VE OVLADY KONTROLA
 KONTROLA A PRACY TUBŠICE
 - OPRACOVANI KONTROLA ENTY V
 KRECH 2,950 - 3,100 (KRECH)

POČASÍ: 21.8.2014 JEL. TUKTORA +10°C až +14°C 31.8.21.
 ROZET TMC - TYP-2001, JEL - 13 VIZ DOČASNA 47
 TMC J0B1 - 7 - 17 (TAKA II - II²)
 MECHANIZACE - FRYZ KONTROLA, ENORCA,
 BAGE KAJER, TUKTORA, LLC,
 AŽTO V
 POPIS - FRYZOLIVY AFRANTOLEBO ENTY V
 R. OCA 1004 V KRECH EN 0,500 - 2,150
 VE OVLADY V TUKTORA A PRACY
 BEKROV
 - KONTROLA AFRANTOLEBO KONTROLA V
 R. OCA V KRECH KONTROLA
 KONTROLA
 - KONTROLA ENTY ENTY ENTY

Denní záznam stavby

Název akce: 11/11434 - PŘÍPRAVA

List číslo: 20

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA STAVBY TDS

PROVEDENA POCHEPKA PO STAVBE A KONTROLA PRAVÁ DEJÍČK

ST. PRÁCE - DÁLE PROVEDENA KONTROLA DIO - BUKATE FUNKČNÍ -
PRAVY NEZJIŠTĚNÝ

ST. PRÁCE V SMLADU DE SCHVAL. TČP a KZP.

PRÁCE ODFREZOVÁNÍ ASFALT. STRUKTURY VŘEZE PŘI VOZOVKY

(ODVJEZDU NA SKL. PO K11 2,150) V TL 100 mm. ODVOD RECYKLÁTU

NA MEZI DEPONII

DÁLE ROZPROSTŘÁNÍ ASF. RECYKLÁTU V MÍSTECH KOTŘIŘENÍ

(TLcca 100 mm).

V PŘÍPRAVĚ, DNE 31.08.2021

ŽP. ING. P. JANKO, TDS

POČASÍ: TĚLOVÝŠKA 10°C vzduch 19°C

1.9.21

POČET PRÁCE - TČP - 5000, DĚL - 10 KČ. JOKA 200

PRÁCE JOKA - 7 - 17 (PRÁCE 11 - 17)

RECYKLÁT - FURMA WIRTGEN, KROTICA, BAGR KAMER
KČ. 1400 4x

TOPIS - FURMA WIRTGEN ASFALT. KOTŘIŘENÍ V TL. 100 mm v úběhu

č. 2,150 - 2,850 KČ. ODVOD 4x RECYKL.

- ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ č. 3,2 - 3,4 KČ. STAVBA

- VŘEZOVÁNÍ KOTŘIŘENÍ č. 3,0 - 3,2 - VŘEZOV.

KONTROLA STAVBY TDS

PROVEDENA KONTROLA STAVBY V RÁMCI POCHEPKY PO STAVENÍ ST.

DÁLE PROVEDENA KONTROLA DIO - PRAVY NEZJIŠTĚNÝ

PRÁCE ODFREZOVÁNÍ VOZOVKY MÍSTECH KOTŘIŘENÍ VŘEZEK

ST. PRÁCE V SMLADU DE SCHVAL. TČP a KZP.

RECYKLÁT ODVÁŽEN NA MEZI DEPONII

KČ. 3 - V RÁMCI KONTROLY STAVBY

ZADÁNÍ O PŘEDÁNÍ LAB. PŘÍKOPŮ ZE ŽRÁNKŮ NA MÍSTĚ

V PŘÍPRAVĚ, DNE 01.09.2021

ŽP. ING. P. JANKO, TDS

Denní záznam stavby

Název akce: 11 / 11434 - 7032002

List číslo: 21.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 10 C 12 + 21 C
 POČET PRAC. - TRP. 800A, DEL. 13 HR. DOČASNA
 PRAC. DOBA - 7 - 17 (PRACA 11 - 117)
 TECH. VÝKON - FURTA KINTGEU, GARDER, UVC,
 KURC ZA, KROPIČKA, MİKROKÓ ÖZGÜRLÜK
 CISTERNA EŞLEŞE, PAĞA KILAS,
 KILASIN AUTO
 POTIS - TROUBENI REKONSTR ZA STADNA V
 T. 20074 V KILASIN EN 0,500 - 2,150
 T.L. MİKROKÓ ÖZGÜRLÜK A MİKROKÓ ÖZGÜRLÜK
 DÖE RECEPTU, KONTROLI, STALAJIČKO
 ENJE DO 20074 + KONTROLI A KILASIN
 DO PROJEKTOVIČA KILASIN A STALAJIČKO
 - KONTROLI HOTELI KILASIN KONTROLI
 - CISTERNA PRILEŽI A STALAJIČKO ENJE
 V KILASIN 3,3 - 3,5 EN JEK STALAJIČKO

29. 21
 27

POČASÍ: JASNO + 10 C 12 + 21 C
 POČET PRAC. - TRP. 800A, DEL. - 13 HR. DOČASNA
 PRAC. DOBA - 7 - 17 (PRACA 11 - 117)
 TECH. VÝKON - FURTA KINTGEU, GARDER, UVC,
 KURC ZA, KROPIČKA, MİKROKÓ ÖZGÜRLÜK,
 CISTERNA EŞLEŞE, PAĞA KILAS, TRAKTORIČKO
 KILASIN AUTO ZA
 POTIS - TROUBENI REKONSTR ZA STADNA V
 T. 20074 V KILASIN EN 0,500 - 2,150
 T.L. MİKROKÓ ÖZGÜRLÜK A MİKROKÓ ÖZGÜRLÜK
 DÖE RECEPTU, KONTROLI, STALAJIČKO
 ENJE DO 20074 + KONTROLI A KILASIN
 DO PROJEKTOVIČA KILASIN A STALAJIČKO
 - KONTROLI HOTELI KILASIN KONTROLI
 - CISTERNA PRILEŽI A STALAJIČKO ENJE
 V KILASIN 3,3 - 3,5 EN JEK STALAJIČKO
 - KONTROLI KILASIN KILASIN KILASIN

3. 9. 21
 15

Denní záznam stavby

Název akce: III/11434 - TRIBS.02

List číslo: 22.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: ASUO + 10C ví + 24C 4.9.21.

POČET PRAC - PR. - 11 VE DOČASNĚ So

PRAC DOBA - 7-16 (PRAC 11-11²)

PRACOVNICE - FURTA WITGEN, GANDER, HÄGER
KROČKA, JÄKOVIC OŠTEJKA, ČISTEK
ASR EYGLER, LLC

POPIS - PRACOVNICE VE STAVBĚ V
KROČKA VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074
- KROČKA KROČKA WITGEN LOGO

POČASÍ: ASUO + 10C ví + 23C 6.9.21.

POČET PRAC - PR. - 8 VE DOČASNĚ To

PRAC DOBA - 7-17 (PRAC 11-11²)

PRACOVNICE - FURTA EYGLER, TRACTORRIG, LLC + PRAC
KROČKA, LLC ATO VE

POPIS - STAVBA VE STAVBĚ + ČISTEK

PRACOVNICE VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074

PRACOVNICE VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074

PRACOVNICE VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074

PRACOVNICE VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074

PRACOVNICE VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074

PRACOVNICE VE 0,500 - 2,150 JO VE 20074

KONTROLA STAVBY BOZP: PROBLEMY KONTROLA NA SO 020 A 6.9.2021

SO 101 PRACOVNICE SHLEDALI ZNAMKY BOZP. PŘEVĚŘENÍ FOTO-

DOKUMENTACE, VYŽADUJÍ DOPLETENÍ DO BOZP. OP

JAKUB LIND KOO-BOZP

Denní záznam stavby

Název akce: III/4.434 PŘÍSTAVBA

List číslo: 23.

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA ÚČASTI TB
 PŘÍPRAVA PŘÍKAZŮ PRO ÚSTAVBU S KONTROLOU PŘÍPRAVY ÚČASTI
 ÚČ. PRÁCE PŘÍKAZŮM ÚSTAVBY S RDS, T₀ P₀ + K₀P
 PŘÍPRAVA KONTROLA DIO - NEFUNKČNÍ, BLIKÁČE UVJEDL!
 DO ÚSTAVBY (ODPĚČKA NA HICADKU) - ŽADÁNÍ O ZPŘÍKOVĚNĚNÍ!
 DOKONČENÍ D.D. FRELŽOVÁNÍ ASF. STRUKTURY, PŘÍPRAVA RECYKLACE
 ZA STUPENŮ (km 0,500 - 2,150), PŘÍPRAVA LAB. PROTOKOLŮ NA
 RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ, ŽADÁNÍ O PŘEDÁNÍ LAB. PROTOKOLŮ
 DĚLE PŘÍPRAVA ÚČ. PŮSTRIK NA RECYKLACI.
 V ÚVĚKŮ (D.D. MOSTŮ - VAJEKŮ) PO D.D. FRELŽ. OBRUSŮ ZJIŠTĚNÝ
 PŘÍPRAVA PRÁSKLINŮ + SPADLE KRAJE VOKOVKY
 ZJ. ÚČ. (FOTO + ICHOMENTAR) BUDE ŽASUN AD KUTJA DŘENÍ -
 PODROBNĚN BUDE ŘEŠENO NA MŠ V RAMCI KDC 4.

V PŘÍPRAVĚ, DNE 17. 09. 2021

ZAPÍŠK: ING. P. JELÍNEK

POČASÍ: ASVO + 10°C 9h + 27°C

17. 9. 21

POČASÍ: TAV. - 10°C, TAV. - 10°C, TAV. - 10°C

17

POČASÍ: TAV. - 10°C, TAV. - 10°C, TAV. - 10°C

RECYKLACE - ŽADÁNÍ O PŘEDÁNÍ LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

LAB. PROTOKOLŮ NA RECYKLACI SVĚTL. VÝSLEDKŮ

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 11 434 - TRÁVBY SÍŤE

List číslo: 24.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 12°C vítr 24°C 8.9.21
 POČET TMC - TYP - ŠKODA MORGUE, JEL - 20 VIL DOCHLEBA ST
 TMC DOBA - 7 - 17 (TRÁVA 11 - 11²)
 MĚCHÁNÍKOS - BAGR ENISER, FIKUPEK, ENOPICIA
 KURC ZA, KÁCI AGTO 12x
 POPIS - POLUBEN VRSKY ACL 16 TL 6057
 v 4.800 - 2,150 - LELI TOLOLIKA
 - STRANU KÁCI ENOPICIA A
 CÍSTENÍ TRÁVY v 4.800 - 2,150
 LELI STRANA VE 0,100 - 0,150

MONTÁŽNÍ PRÁCE

PRÁCE DENA PŘIČINĚNÍ V PRÁCE SÍŤE TRÁVY
 PRÁCE + KONTROLA DIO - KÁCI NEFUNKČNÍ, PUKACE NA
 VLEČENÍ DO PRÁCE (SKLÁTKA)
 POLOŽENA LOŽNÁ VRSKA ACL 16 + V TL 6057 NA LEVÉ
 POLOVINĚ VOZOVKY (2 VRSKY) KM 0,500 - 2,150
 PRÁCE PŘIČINĚNÍ DLE PCH VÁLENE RDS PRÁCE TRÁVY KZP,
 PRÁCE NEZÁVĚRNĚ
 PRÁCE O PŘEDÁNÍ LAB. PRÁCE KÁCI ZE KURC NA RECYKLACI
 PRÁCE DENA S DOPLNĚNÍM DO LABOR DENÍKU

V PŘIČINĚNÍ PRÁCE 17.19.21 PRÁCE - 10.6. P. KÁCI TRÁVY

POČASÍ: JASNO + 12°C vítr 24°C 9.9.21
 POČET TMC - TYP - ŠKODA MORGUE, JEL - 20 ST
 TMC DOBA - 7 - 17 (TRÁVA 11 - 11²)
 MĚCHÁNÍKOS - FIKUPEK, KURC ZA, KÁCI, ENOPICIA
 KURC AGTO 12x
 POPIS - POLUBEN VRSKY ACL 16 TL 6057 v
 4.800 - 2,150 PRÁCE TOLOLIKA
 - KÁCI STRANA TRÁVY

Denní záznam stavby

Název akce: 11/ 11 434 - PŘÍBYSICE

List číslo: 25.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 11°C dít + 26°C 10.9.21
 POČET TMC - THP - ŠKOT, PLOCHÉ, DEL - 134230422, 70
 TMC JOB1 - T - 15% (TAKU 11 - 11%)
 MECHANIZACE - FURCA KIRGEB, CROCEA, KROIBER,
 KUC, TRACTORPAGH, GACE AGO 4,
 JORIS - FINEZOLU, ASFALTOVÉHO KUTU v R. 100,
 v úseku 2,800 - Kč Kč. ÚHOLU, 43
 PLOCHÉ A NEZPĚVOKU
 - ZAHĚRAT 17 FINEZOLUHO ROVNČA

TVORBA BOZP - PROBEHU KONTROLA SO 101, SO26, SO 610 10.9.2021
 PROBLÉM ZISTOVÍ PRÍKOP A FREZOVANÍ VOZOVKY. BIO ZKONTRO-
 LOVANIE A ČYRÍ "PRÁCE NA SILNICI" - DOPLET JINAK VÍE
 UPOZORNĚNÍ JAKUB LINA KOO-BOZP

KOMPANIA UPRAVY TDS
 PROVEDENÁ PRÁCA FO UPRAVĚ A KOMPANIA PRÁVEDENÝCH
 PRÁCI
 KOMPANIA POKRYVKA AČL 16-IVE Z PAVINE VOZOVKY.
 ST. PRÁCE V SMLADU SE VERNAL PD, Tz Pr + KZP -
 ŽÁVNY NEZHĚNT.
 PROVEDENÍ KONTROLA DIO - BLIKÁČE FUNKČNÍ - REI ŽÁVAD
 VRÁTETI KDI 4 PROVEDENÍ HS - PRAKLIKÝ VE VOZOVCE
 THYDRA KILAZNICE UPRAVĚ (km 2,150 - VATEKOV)
 NAVRH SANACE ŽUDE ŠPECIF. VZÁPISU Z KDI 4 <

V PŘÍBYSICÍCH, DNE 13.09.2021 ŽAPSAL: ING. P. FELINEK TDS

POČASÍ: JASNO + 12°C dít + 26°C 13.9.2021
 POČET TMC - THP - ŠKOT, PLOCHÉ, DEL - 54230422, 90
 TMC JOB1 - T - 15% (TAKU 11 - 11%)
 MECHANIZACE - TRACTORPAGH, KUC, GACE AGO

Denní záznam stavby

Název akce: III/ 11 434 (21878)CE

List číslo: 26.

Datum

Číslo akce: 2329

POPIS - VÝKOP RÝH PRO OSAZENÍ BET. OBRUB
- OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB DO BET.
LOŽE V KM 0,415 - 0,650

POČASÍ: JASNO +11°C AŽ +24°C 14.9.21

POČET PRAC. THP - ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5 ST

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTORBAGR, 440, NAKL. AUTO

POPIS - VÝKOP RÝH PRO OSAZENÍ BET. OBRUB
- OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB DO BET.
LOŽE V KM 0,650 - 0,550

POČASÍ: JASNO +18°C AŽ +24°C 15.9.21

POČET PRAC. THP - ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5 ST

PRAC. DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTORBAGR 440, NAKL. AUTO

POPIS - VÝKOP RÝHY PRO OSAZENÍ BET. OBRUB,
- OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB DO BETONU
LOŽE V KM 1,170 - 1,24 (100 m)

POČASÍ - ZATAŽENO +15°C AŽ +19°C 16.9.21

POČET PRAC. THP - DVORNÍK, DEL. - 4

PRAC. DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - NAKL. AUTO, UNC

POPIS - VÝKOP A ÚPRAVA RÝHY PRO OSAZENÍ
BET. OBRUB, OSAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB
DO BETONU LOŽE V KM 1,770 - 1,84 (100 m)

Denní záznam stavby

Název akce: III/II 434 70375102

List číslo: 28

Datum

Číslo akce: 2329

KONTROLA ROZP

20.9.21

PLOŠEHO KONTROLA (TRHU ROZP, NEBOJITNÝ
NEZJIŠTENÝ VÝZKUS JI DŮLEŽITĚHO MŮSTVÍ OOP
JAKOŽ LINA KOO-ROZP

POČASÍ - OBLAČNO - ZATAŽENO 10-14°C

20.9.21

POČET PRAC - THP ŠKODA, DVORNÍK DEL. 5

10

PRAC DOBA 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - NAKL. AUTO, TRACTOR BASR, UNC

POPIS - VÝKOP + ÚPRAVA RÝHY PRO USAZENÍ
BET. OBRUB

USAZENÍ SILNIČNÍCH OBRUB DO BET. LOŽE
V KM 1,64 - 1,7 (100 m)

ODVOZ SMETI NA SKLADKU

POČASÍ: ZATAŽENO + 10°C až + 17°C

21.9.21

POČET PRAC - THP ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5 HL. DOBŘÍČKA

PRAC DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTOR BASR, UNC, NAKL. AUTO

POPIS - VÝKOP RÝHY PRO PROVEDENÍ VC

KURSEK VÝSTUPI V KM 0,550

- ODVOZ VÝKOPNÍH SMETI NA SKLADKU

- PROVEDENÍ TROJVLÁČKOVÉ BETONOVÉ TOLYBY

- VYBOURÁNÍ STANČNÍHO VYFUKOVACÍHO PROVEDENÍ

Z BETONOVACÍHO KOPR V KM 0,550

POČASÍ: OBLAČNO + 11°C až + 18°C

22.9.21

POČET PRAC - THP ŠKODA, DVORNÍK, DEL. - 5 HL. DOBŘÍČKA

8

PRAC DOBA - 7⁰⁰ - 17⁰⁰ (PAUZA 11-11³⁰)

MECHANIZACE - TRACTOR BASR, NAKL. AUTO

POPIS - POCHEBA BETONOVACÍ KOPR DĚ 600 V

SMETI PROVEDENÍ KM 0,550

- OBRUBOVACÍ TOLYBY BETONOVÉ C 20/25

Denní záznam stavby

Název akce: III/II 434 TRIBŠICE

List číslo: 29.

Datum

Číslo akce: 2329

POČASÍ: JASNO + 8 C vĕ + 21 C
 POČET TAC - TYP-SCOT, DEJ. - 4 HL. DOČASLA
 TAC DOBA - 7 - 17 (TRAKTA II - 4²)
 RECHVIZICE - PNEVA KONTROLA S 1,09, KLIKALTO 2x
 MOTIS - PNEVOMĚR, ASFALTOVĚNO CESTY V TRIBE
 PNEVOMĚR KONTROLA - SÍLA 0,57 TL. 5077
 SÍLA 1,09 TL. 10077 V KLIKALTO 2,150 -
 2,280 OBE STRAN A 2,300 - 2,870
 TRIBE STRAN

23.9.21
 ČT

POČASÍ: POLOJASNO + 10 C vĕ + 20 C
 POČET TAC - TYP-SCOT, DEJ. - 2
 TAC DOBA - 7 - 17 (TRAKTA II - 11²)
 RECHVIZICE - KONTROLA, DISTRIBUTOR ASF. KLIKALTO
 MOTIS - ZAKRTELI, PNEVOMĚR V TRIBE STRAN
 KONTROLA KONTROLA A PNEVOMĚR, PNEVOMĚR
 PNEVOMĚR 2,150 - 2,870

29.9.21
 ST

POČASÍ: JASNO + 9 C vĕ + 20 C
 POČET TAC - TYP-SCOT, DEJ. - 7 HL. DOČASLA
 TAC DOBA - 7 - 15² (TRAKTA II - 11³)
 RECHVIZICE - TRAKTOR PAGA, KONTROLA, KLIKALTO 2x
 MOTIS - PNEVOMĚR KONTROLA ACE 16 TL. 5077 V
 SÍLA 1,09 2,150 2,280 OBE STRAN
 A 2,300 - 2,870 TRIBE STRAN -
 KONTROLA PNEVOMĚR, PNEVOMĚR
 - KONTROLA PNEVOMĚR, PNEVOMĚR

30.9.21
 ČT
 1.10.21
 Pa










SO 101
 ÚSEK II KM 2,150 - 2,860
 OPRAVA ROZLÁMANÝCH KRAJŮ VOZOVKY

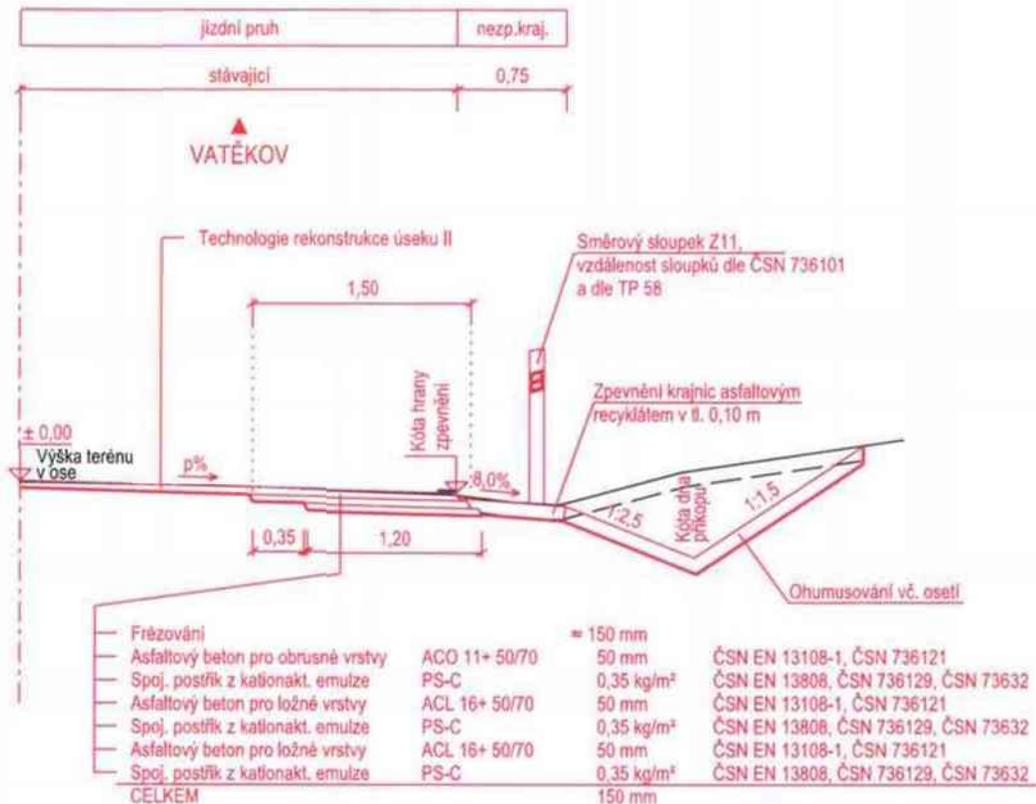

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:		ZHOTOVITEL:	
 KSÚS KRAJSKÁ SPRÁVA A DOPRAVNÍ ÚSTAV Středočeský územní úřad ZBOROVSKÁ 81/11 150 21 PRAHA 5 - SMÍCHOV IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 www.ksus.cz		 AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afrycz.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. JAKUB VYHNÁLEK	Ing. JAKUB VYHNÁLEK	JAN KUBÁSEK	Ing. JAKUB VYHNÁLEK
NÁZEV PROJEKTU:			
III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614			
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE		
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ ŘEZ		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	09/2021	D.1.1	4.3
STUPEŇ:	AD		
MĚŘÍTKO:	1:50		
Č. ZAKÁZKY:	2019/0037		
		ČÍSLO PARE:	

Zápis z kontrolního dne KD č. 3 stavby III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den	
Číslo	3 konaný dne 01.09.2021
Účastníci	
Seznam účastníků KD č.3 viz Prezenční listina KD č.3	

Program kontrolního dne/operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby a) popis provedených prací b) plnění věcného HMG c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 101.A Rekonstrukce komunikace (2. úsek) - protahování a čištění příkopů (s odvozem mat. na mezideponii) - úprava svahů příkopů (s odstraněním kořenů) - čištění krajnic (s odvozem mat. na mezideponii) - navážení a rozprostírání recyklátu (v místě krajnic podél vozovky) - frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii SO 180 DIO - posun blikačů na zač. úseku 2, blikače funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 101. A : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021 .

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH/AD	trvá splněno, bude vyp.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/6

5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33 týdne.	Obj/ZH/TDS	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoscace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah kam. přídlažby v místě nezp. krajnice (dl. přídlažby je cca 737 bm). Z pochůzky bude pořízen podrobnější Zápis, který bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne.	ZH/SÚS	splněno bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci. Jedná se o inv. do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost m. Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Historický propustek vlevo (2. úsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
15.	Prodloužení recyklace za studena (před obcí Vatěkov)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za odbočkou vlevo	ZH/AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
 Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
 Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
 Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
 Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
 Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stáv. zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci.	ZH, AD	trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021		III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD	
		KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 2/6	

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:730 857 716).

7. Závěr

KD č. 4 - pondělí 13.09. 2021, 09:00 hod.,stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6



info-tabule stavby



odkop krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 4/8



strojn   prva svahu vlevo (2.  sek)



protahov  n   a  ištění krajnice (2.  sek)

KRAJSK�� SPR��VA A UDR��BA SILNIC	Z��PIS Z KONTROLN��HO DNE KD �. 3 STAVBY	FORMUL��R KD
EVIDEN �N��I �ISLO KD 3/2021	III/11434 P��IBYŐ�ICE - KRIŐ�OVATKA S III/10614	STRANA; 5/6
	KLASIFIKACE PROVOZN�� INFORM��CE	



frézování asf. souvrství (2. úsek)



vozovka po odfrézování obrusu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBÝSICE - KŘIŽOVÁTKA S III/10614	STRANA: 6/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 4 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den

 Číslo **4** konaný dne 13.09.2021

Účastníci

Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.4

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací

SO 101.A Rekonstrukce komunikace

úsek km 0,500 - 2,150

- frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii (dokončení)
- recyklace za studena + lab. zkoušky
- provedení spoj. postřiku s vyštěpením na očištěný povrch
- pokládka ACL 16+ po polovinách vozovky (tl. 60 mm) finišerem se zaválcováním a zhut. vibračními válci (s kontrolou teploty asf. směsi) při pokládce a dovezené asf. směsi)

úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov)

- čištění příkopů (km 2,800 - 3,100) vlevo s odvozem mat. na skládku
- frézování asfaltového souvrství (tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii
- po odfrézování zjištěny podélné vlasové trhliny a propadá krajnice vpravo

SO 180 DIO

blíkače na vjezdu do stavby (vjezd na skádku) dočasně nefunkční, závada odstraněna

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou	ZH/AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/6

		dokumentaci (RDS) během 38. týdne.		
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv., bet. římsy (na chem. kotvy). AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na jeho realizaci. Do SD bude Zhot. zakresleno zjed. schema zábradlí se zákl. rozměry a uvedením materiálu. Jedná se o investici do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost městu Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stávající zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci do konce 37. týdne.	ZH, AD	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asfaltovém souvrství (úsek č.1). Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek předány.

4. Stav BOZP a PO

Závažným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD). Společná PL.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Podélné trhliny na okraji vozovky (km 2,150 - Vatěkov) a propadlé krajnice vpravo	Po odfrézování asf. souvrství dle RDS byly při prohlídce zajištěny na vozovce podélné praskliny vpravo (cca 0,50 m -1,00 od okraje zpevnění) a propadlá krajnice na několika místech. Po KD se uskuteční MŠ za účelem posouzení závažnosti poruch s ev. návrhem sanací.	ZH, TDI,AD	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.:) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.:).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/6

7. Závěr

KD č. 5 - pondělí 04.10. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 14.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelná a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.



frézování asf. souvrství

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6
