

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Okružní křižovatka

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

121/1

Číslo ZBV:

6

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	323 143,77	323 143,77

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	323 143,77	323 143,77

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 121/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 6.3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS. a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů		
6. Přehled dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	11	počet listů		

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Bourání stávajícího betonového základu podél větve D

Při výkopových pracích (viz. zápis ze SD příloha č. 11) v rámci SO 121 – Okružní křižovatka byla na větvi D v KM cca 0,010 – 0,070 vpravo nalezena podzemní betonová konstrukce o objemu 69 m3 (viz příloha č. 10), která znemožňuje provedení ocelových svodidel a budoucího vedení podzemní sítě NN. Tato betonová konstrukce nebyla uvedena v PDPS.

Pro pokračování stavebních prací je nutné tuto betonovou konstrukci vybourat a vybouraný materiál odvoztit a uložit na skládku.

Zdůvodnění:

Jedná se o nepředvídatelné skutečně zastížené fyzické podmínky na stavbě zjištěné až v průběhu realizace výkopových prací.

Výše uvedené skutečnosti oznámil Zhotovitel Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZGO/09_22 ze dne 23.6.2022 (viz. příloha č. 9).

Dle vyjádření a doporučení TDS ze dne 26.9.2022 (viz. příloha č. 12) Zhotovitel zpracoval toto ZBV p.č. 6. Následně vydal AD sdělení ze dne 15.11.2022, že souhlasí se ZBV p.č. 6 (viz příloha č. 13).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	323 143,77	323 143,77	323 143,77

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol. s r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jiřímský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatelů č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatelů č. 2:	jméno	Roman Bárta	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.				
Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Robert Pecha	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6**

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 121/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
18 970 659,88

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	18 970 659,88	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	323 143,77	323 143,77	1,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	19 293 803,65	323 143,77	1,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Zbyněk Goldberger	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hrdina	souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský	souhlasím
Zástupce Objednatele č. 1:	Ing. Marek Hanuš, MPA	souhlasím
Zástupce Objednatele č. 2:	Roman Bárta	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Jurková	souhlasím
Zaměstnanec města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav odpovědný za cenové projednání Změny:	Roman Bárta	souhlasím

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Číslo a název SO/PS: SO 121 - Okružní křižovatka Číslo a název rozpočtu: SO 121 - Okružní křižovatka								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
56	015140a N	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	158,700	158,700	107,910	0,00	0,00	17 125,32	17 125,32	17 125,32	100,00
57	96711 N	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ	M3	0,000	69,000	69,000	4 435,050	0,00	0,00	306 018,45	306 018,45	306 018,45	100,00
		Celkem							0,00	323 143,77		323 143,77	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)

Za Objednatelů: Petr Jiřimský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Okružní křižovatka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	121/1

Doklad	počet listů
07 - Soupis prací SO po změnách	2
08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen	1
09 - Oznámení Zhotovitele čj.: 1030818ZGO/09_22 ze dne 23.6.2022	2
10 - Geodetické zaměření betonového základu, protokol č. 12/OK/2022	2
11- Zápisy ze SD	2
12- Vyjádření TDS	1
13 - Vyjádření AD	1
Počet listů celkem	11

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Číslo a název SO/PS: SO 121 - Okružní křižovatka

Číslo a název rozpočtu: SO 121 - Okružní křižovatka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

celkem po všech změnách

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEHONTÁMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TEŽITELNOSTI	T	13 790,088	13 790,088	0,000	10 790	148 795,05	0,00	0,00	148 795,05	0,00	100,00
2	113763	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	402,730	402,730	0,000	53,950	21 727,28	0,00	0,00	21 727,28	0,00	100,00
3	113765	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮREZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	917,860	917,860	0,000	59,350	54 474,99	0,00	0,00	54 474,99	0,00	100,00
4	12373	ODKOP PRO ŠPŮD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	6 308,420	6 308,420	0,000	241,930	1 526 196,05	0,00	0,00	1 526 196,05	0,00	100,00
5	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADEK TR. I. ODVOZ DO 5KM	M3	416,336	416,336	0,000	141,140	58 761,66	0,00	0,00	58 761,66	0,00	100,00
6	13273	HLoubENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PÁZ I NEPAZ TR. I	M3	431,592	431,592	0,000	350,350	151 208,26	0,00	0,00	151 208,26	0,00	100,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 740,012	6 740,012	0,000	3,240	21 837,64	0,00	0,00	21 837,64	0,00	100,00
8	17180 a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3 683,368	3 683,368	0,000	210,850	776 638,14	0,00	0,00	776 638,14	0,00	100,00
9	17180 b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	28,835	28,835	0,000	333,440	9 614,74	0,00	0,00	9 614,74	0,00	100,00
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	289,106	289,106	0,000	324,370	93 777,31	0,00	0,00	93 777,31	0,00	100,00
11	17481	ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	124,362	124,362	0,000	324,370	40 339,30	0,00	0,00	40 339,30	0,00	100,00
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	62,398	62,398	0,000	324,370	20 240,04	0,00	0,00	20 240,04	0,00	100,00
13	18110	UPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	18 762,978	18 762,978	0,000	13,870	260 242,50	0,00	0,00	260 242,50	0,00	100,00
14	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	2 775,570	2 775,570	0,000	20,610	57 204,50	0,00	0,00	57 204,50	0,00	100,00
15	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VYSEVEM	M2	2 775,570	2 775,570	0,000	16,190	44 936,48	0,00	0,00	44 936,48	0,00	100,00
16	18247	OSETROVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	2 775,570	2 775,570	0,000	4,320	11 990,46	0,00	0,00	11 990,46	0,00	100,00
17	21197	OPLASTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 330,815	2 330,815	0,000	38,480	89 689,76	0,00	0,00	89 689,76	0,00	100,00
18	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	266,790	266,790	0,000	714,280	190 582,76	0,00	0,00	190 582,76	0,00	100,00
19	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	9 288,519	9 288,519	0,000	49,260	457 552,45	0,00	0,00	457 552,45	0,00	100,00
20	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	0,737	0,737	0,000	3 204,890	2 362,00	0,00	0,00	2 362,00	0,00	100,00
21	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C20/25	M3	26,874	26,874	0,000	3 323,590	89 318,16	0,00	0,00	89 318,16	0,00	100,00
22	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	382,067	382,067	0,000	1 057,510	404 039,67	0,00	0,00	404 039,67	0,00	100,00
23	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,142	2,142	0,000	5 602,830	12 065,52	0,00	0,00	12 065,52	0,00	100,00
24	561421	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 100MM	M2	855,300	855,300	0,000	156,290	133 674,84	0,00	0,00	133 674,84	0,00	100,00
25	561441	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 200MM	M2	8 632,401	8 632,401	0,000	334,000	2 883 221,93	0,00	0,00	2 883 221,93	0,00	100,00
26	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	589,355	589,355	0,000	119,580	70 475,07	0,00	0,00	70 475,07	0,00	100,00
27	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM	M2	425,703	425,703	0,000	139,520	59 394,08	0,00	0,00	59 394,08	0,00	100,00
28	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2	8 778,984	8 778,984	0,000	221,080	1 940 857,78	0,00	0,00	1 940 857,78	0,00	100,00
29	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	735,240	735,240	0,000	98,540	72 450,55	0,00	0,00	72 450,55	0,00	100,00
30	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 591,343	7 591,343	0,000	13,160	99 902,07	0,00	0,00	99 902,07	0,00	100,00
31	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK. EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	14 619,933	14 619,933	0,000	10,680	156 140,88	0,00	0,00	156 140,88	0,00	100,00
32	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+ 11S TL 40MM	M2	7 382,704	7 382,704	0,000	183,300	1 353 249,64	0,00	0,00	1 353 249,64	0,00	100,00
33	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACL 22+ 22S TL 70MM	M2	7 133,256	7 133,256	0,000	280,800	2 003 018,28	0,00	0,00	2 003 018,28	0,00	100,00
34	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 70MM	M2	325,014	325,014	0,000	246,960	80 265,46	0,00	0,00	80 265,46	0,00	100,00
35	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 80MM	M2	7 212,073	7 212,073	0,000	285,240	2 057 171,70	0,00	0,00	2 057 171,70	0,00	100,00
36	58212	DLAŽĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	843,510	843,510	0,000	1 812,870	1 529 173,97	0,00	0,00	1 529 173,97	0,00	100,00
37	58222	DLAŽĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	184,310	184,310	0,000	1 262,530	232 696,90	0,00	0,00	232 696,90	0,00	100,00
38	582812	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	59,680	59,680	0,000	616,160	36 772,43	0,00	0,00	36 772,43	0,00	100,00
39	81111R	ZASAKOVACÍ JIMKA	M3	74,985	74,985	0,000	6 751,170	506 348,99	0,00	0,00	506 348,99	0,00	100,00

40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	88.830	88.830	0.000	373.360	33.165,57	0.00	0.00	33.165,57	0.00	100.00
41	87542	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH	M	104.320	104.320	0.000	351.780	36.697,69	0.00	0.00	36.697,69	0.00	100.00
42	89712	VYPUST KANALIZAČNÍ ÚPČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	4.000	4.000	0.000	9.852.060	39.408,24	0.00	0.00	39.408,24	0.00	100.00
43	897541 a	VYPUST ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	3.000	3.000	0.000	10.326.860	30.980,58	0.00	0.00	30.980,58	0.00	100.00
44	897541 b	VYPUST ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	3.000	3.000	0.000	10.326.860	30.980,58	0.00	0.00	30.980,58	0.00	100.00
45	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2- DODÁVKA A MONTÁŽ	M	247.000	247.000	0.000	906.430	223.888,21	0.00	0.00	223.888,21	0.00	100.00
46	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	2.000	2.000	0.000	370.130	740,26	0.00	0.00	740,26	0.00	100.00
47	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT- NASTAVČE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	14.000	14.000	0.000	278.400	3.897,60	0.00	0.00	3.897,60	0.00	100.00
48	917204	SILNĚNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM	M	513.740	513.740	0.000	412.210	211.768,77	0.00	0.00	211.768,77	0.00	100.00
49	91725	NASTUPNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	40.000	40.000	0.000	3.226.470	129.058,80	0.00	0.00	129.058,80	0.00	100.00
50	91726	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	315.740	315.740	0.000	772.630	243.950,20	0.00	0.00	243.950,20	0.00	100.00
51	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJINŮ	M	90.290	90.290	0.000	643.140	58.069,11	0.00	0.00	58.069,11	0.00	100.00
52	931323	TĚSNĚNÍ DILTAČ. SPAR ASF. ZÁPLV. MODIFIK. PRŮŘ. DO 300MM2	M	402.730	402.730	0.000	42.160	17.381,83	0.00	0.00	17.381,83	0.00	100.00
53	931325	TĚSNĚNÍ DILTAČ. SPAR ASF. ZÁPLV. MODIFIK. PRŮŘ. DO 600MM2	M	917.860	917.860	0.000	53.950	49.518,55	0.00	0.00	49.518,55	0.00	100.00
54	93641	ŽLABY Z DILCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MRIZI	M	26.480	26.480	0.000	3.052.820	80.804,08	0.00	0.00	80.804,08	0.00	100.00
55	93530	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	4.700	4.700	0.000	4.672.450	21.960,52	0.00	0.00	21.960,52	0.00	100.00
Nové položky						0.000					0.00	0.00	100.00
56	015140a N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ ZÁKLADU TV	T	0.000	158.700	158.700	107.910	0.00	0.00	17.125,32	17.125,32	17.125,32	100.00
ZBV 6 Bourání betonového základu					158.700								
2.3%9=158.700 [A] T													
57	96711 N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI Z BETON DILCŮ	M3	0.000	69.000	69.000	4.435.050	0.00	0.00	306.018,45	306.018,45	306.018,45	100.00
ZBV 6 Bourání betonového základu						69.000							
geod. protokol č. 12/OK/2022													
69.000=69.000 [A] M3													
Celkem								18.970.659,88	0.00	323.143,77	19.293.803,65	323.143,77	101,70

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:			Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav					
SO číslo a název :			SO 121 Okružní křižovatka					
ROZPOČET číslo a název :			SO 121 Okružní křižovatka					
Číslo ZBV na SO:			1 Bourání betonového základu					
C. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
57	96711	N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE Z BETON DILCŮ Poznámka: vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku v pol. č. 015140.a Výpočet geod. protokol č. 12/OK/2022 = 69,000 m3	M3	69,000	4 435,05	306 018,45	JC dle výskytu SoD SO001.1
56	015140a	N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLICE OBJEKTU, ZÁKLADU TV Výpočet: 2,3*69=158,7 T	T	158,700	107,91	17 125,32	JC dle výskytu SoD SO001.1

Zhotovitel:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 23.6.2022

Dopis č. 1030818ZGO/09_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla v rámci „SO 121 – Okružní křižovatka“ byla zjištěna nepředvídatelná betonová konstrukce, která znemožňuje provedení ocelových svodidel a budoucího vedení podzemní sítě NO.

Při výkopových pracích byla na větvi D km 0,010 – 0,070 vpravo zastižena podzemní betonová konstrukce o rozměrech cca š= 1,0m, hl = 1,5m a délky 60m. Tato konstrukce musí být před pokračováním následných prací odstraněna.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení položky z výskytu související s bouráním železobetonových konstrukcí o objemu cca 90 m³.

Objednatel byl o tomto stavu informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,34 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), o **udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající v odstranění zastižené betonové konstrukce o objemu cca 90 m³** tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

EUROVIA CS, a.s.

Odštěpný závod oblast Čechy střed

Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9



Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto o **souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 3 dny.** Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do **8.7.2022**. Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

ISO 9001:2016

PROTOKOL č. 12 / OK / 2022

1. Stavba: OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SIL. II / 610 V UL. BOLESLAVSKÁ – STARÁ BOLESLAV
2. Úsek, SO, PS : SO 121 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
3. Objednatel : EUROVIA CS, a.s.
4. Souřadnicový systém : JTSK
5. Výškový systém : Bpv
6. Použité body vytyčovací sítě : 5004, 5007, 5008, 5009
7. Použité přístroje a pomůcky : Totální stanice Trimble S5 2" DR plus (v.č. 36940158)
8. Přesnost měření : 2,3 TP
9. Popis prací:

Dne 10.6.2022 bylo provedeno zaměření stávajícího betonového základu podél větve D. Rozměry základu jsou 60 x 1,15 x 1 m a objem 69 m³.

10. Použité normy a předpisy:

ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti – část 4: liniové st. objekty
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky
ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
ČSN ISO 4463 měřicí metody ve výstavbě – vytyčování a měření

11. Přílohy:

Přehledná situace v měř. 1 : 1000

Vytyčení bylo předáno zástupci objednatele pochůzkou v terénu.
Předávací protokol má náležitosti technické zprávy.

Specifikace:

pol.	Výkon	MJ	poč.	Poznámka
1	Připojení	bod	1	
6	Zaměření	bod	4	
11	hod.sazby	hod	1	ověření , kontrola
12	hod.sazby	hod	2	příprava, zpracování

Vyhotovila dne: 20.6.2022

Ověřil dne : 20.6.2022

Převzal dne:

Šárka Wintrová

Číslo ověření : 337 / 2022
Ing. Jan Hamerník



za objednatele

podpis:

podpis:

podpis:

ověřený zeměměřič

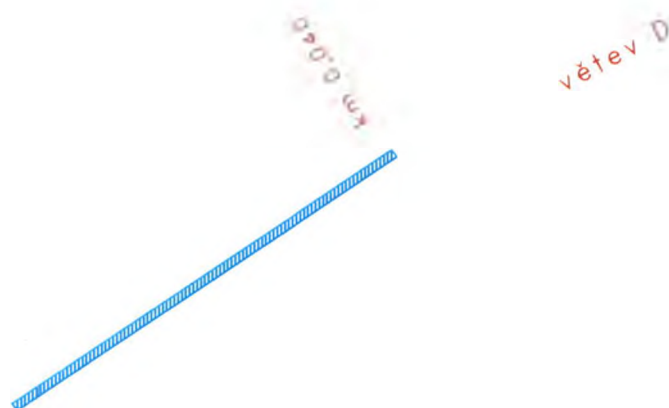

BETONOVÝ ZÁKLAD

rozměry (DxŠxV)...60x1.15x1 m

kubatura...69.0 m³

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

Príloha k PP PP 12	Akce Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská Stará Boleslav	Formát	1xA4	 • Újezd nad Lesy, Poříčská 2143, 190 16 • Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9
		Datum	06/2022	
		Č.smlouvy		
ÚOZÍ ing. J. Hamerník	Príloha ZAMĚŘENÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU	Měřítko	1 : 1000	
		Príloha	č. 1	Tel./fax e-mail :

DENNÍ ZÁZNAMY					
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:		Datum
	OK	SO 121	č. 1	* 496203	
	ST. BOLESLAV	OK			

POČASÍ: JASNO - POLOJASNO. 9-25°C. MÍRNÝ VÍTR PRAC.: 2x THP, 14x DŽSU, 5x STROSNÍK, 12x ŘÍDÍC - SPĚNA PŘÍLOŽNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY MECH: 1x KOL. ZPADOV, 1x TRAKTORACER, 1x BOJAT, 1x TEN. VÁLEC, 1x SIL. FRÉZA DOPRAVA: 4x NÁVES, 2x P3 (8x4), 4x P3 (6x6), 1x KRUPICE PRAC. DOBA: 700-1700 PRÁCE: 7⁰⁰-7⁰⁵ SKOKEM DOZP ZAMĚSTNANCI EUROVIA A SUSODAVATEL, KONTROLA ZABEZPEČ. STAVENÍSTĚ - BEZ ZÁVAD ZÁPIS DO KONTROLNÍHO - BOZ ZPRÁVČIČKA					2.6.2022
ZÁPIS KDO DOZP - PROVEDENA KONTROLA STAVBY - BEZ ZPRÁVČIČKA					
FRÉZOVÁNÍ STÁVASICÍ CEN. STABILIZACE V - VĚTVI "C" + "D" + "OK" VČ. ODVOZU NA DEPONII FRÉZOVÁNÍ STÁV. AHV NA VĚTVI "A" V MÍSTĚ PLANOVANÉ BUS. ZASTÁVKY (SMĚR ST. BOLESLAV), VČ. ODVOZU MAT. NA SKLADU. BOUŘIM STÁV. BET. VĚNCE PODÉL VĚTVI "D" GEODET. PRÁCE, ODEBTÁNÍ VZORKŮ A NOVÁDEM ZK. PROSITA V SOUVISL. S KZP. ÚKL. ČIŠTĚNÍ A SKLÁPĚNÍ KOMUNIKACÍ. ZÁPIS ZHOTOVITELÉ: STÁVASICÍ CEN. STABILIZACE NA VĚTVI "C" DOSAHOVALA VĚTŠÍ TL. NEŽ PŘEDPOKládala PD (AŽ TL. 34 CM) STÁVASICÍ BET. VĚNCE PODÉL VĚTVI "D" - TYTO PRÁCE NESSOU ZAHNUTY V PDPS					
ZÁPIS TBSI TBSI TBSI TBSI TBSI TBSI TBSI TBSI POLOŽIT GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					

DENNÍ ZÁZNAMY					
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	* 496204	Datum
	OK ST. BOLESLAV	SO 121 OK	C. 1		

POČASÍ: JASNO - POLOJASNO. 9 - 30°C. MÍRNÝ VÍTR PRAC.: 2x THP, 14x DŽSU, 4x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ - JMÉNA PRACOVNÍKŮ VVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY MECH: 1x KOL. RYPALO, 2x M5 (6x6), 1x BEN. VÁLEC 1x TRAKTOR MAGER, 1x SOBCAT PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ PRACE: 7 ⁰⁰ - 7 ⁰⁵ ŠKOLEM DOŽP ZAMĚSTNANCŮ EUROVIA A SUBDODAVATELŮ, KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ - BEZ ZÁVAD DOBOURÁVÁNÍ ČÁSTÍ ZE STAV. CEN. STABILIZACE ODKOPÁVKY NA ÚROVĚŇ PÁNE VĚTVI C ^H V ST. 0,020 - 0,040 VČ. SVÁHOVÁNÍ DO POŘAD. SKLONU NAKL. VÝKOPKY A ODVOZ NA DEPONII + HUTNĚM ZP BOURÁNÍ STAV. SET. VĚVCE NA VĚTVI D ^H VČ. NALOŽENÍ A ODVOZU NA DEPONII GEODET. PRACE: ODEŠÍRÁNÍ VZORKŮ A KZ PROSÍHANI V SOULADU S KZP, UKLID. ČISTĚNÍ A SKLÁPĚNÍ KONUMILACÍ A STAVENIŠTĚ 					3.6.2022
POČASÍ: OBlačno - ZATAŽENO. 16 - 26°C. MÍRNÝ VÍTR PRAC.: 1x THP, 8x DŽSU, 2x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ - JMÉNA PRACOVNÍKŮ VVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY MECH: 2x KOL. RYPALO DOPRAVA: 2x M5 (6x6) PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ PRACE: 7 ⁰⁰ - 7 ⁰⁵ ŠKOLEM DOŽP ZAMĚSTNANCŮ EUROVIA A SUBDODAVATELŮ, KONTROLA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ ODKOPÁVKY NA ÚROVĚŇ BEN. PÁNE NA VĚTVI "C" DO POŘAD. SKLONU VČ. HUTNĚM, NAKL. A ODVOZ VÝKOPKY NA DEPONII - V ST. 0,040 - 0,100 ZÁVĚR: KONTROLA TĚLES. 					4.6.2022

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 26. září 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 23.6.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 23.6.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v odstranění zakryté betonové konstrukce.

V průběhu zemních prací byla na SO 121 – Okružní křižovatka, na větvi D v krajnici objevena zakrytá betonová konstrukce. Její odstranění bylo nutné z důvodu provádění konstrukčních vrstev vozovky, výkopu pro vedení kabelů NN pro nově budované veřejné osvětlení a výškového řešení konečných terénních úprav.

Za TDS doporučuji zpracovat změnu.

.....
Petr Jiřímský
TDS

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Ing. Aleš Čermák Ph.D. MBA

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj: PX 2022

V Praze: 15. listopadu 2022

Vyřizuje: Ing. Petr Kunc

e-mail:

Akce: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Vyjádření AD č. 4

Vážený pane řediteli,

dne 3. 11. 2022 AD obdržel návrh ZBV č. 6 (v rozsahu příloh č. 1 – 7), který řeší demolici podzemní betonové konstrukce, která je v kolizi s navrženými ocelovými svodidly.

V rámci zadávací dokumentace nebyly zjištěny žádné informace o podzemním betonovém objektu. Při realizaci výkopových prací byl objekt nalezen a byla zjištěna jeho kolize s beraněnými sloupky ocelového svodidla.

AD sděluje, že návrh ZBV č. 6 je akceptovatelný.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdin
