

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 511 372 0011

a

Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“

vedoucí společník

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758,

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
a **Ing. Jaroslav Heranem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **20050050**

a

druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,

IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B6229

zastoupena: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

číslo smlouvy: **D5A035/INV/2020/3**

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je **prodloužení Doby pro dokončení Díla do 04. 12. 2022.**

K tomu smluvní strany uvádějí následující skutečnosti:

1) Dne 20. 06. 2022 předal Zhotovitel Správci stavby dle pod-čl. 20. 1 Smluvních podmínek oznámení claimu č. 8, který věcně spočíval v uplatnění nároku na:

- a) prodloužení Doby pro dokončení v souladu s pod-čl. 8.4 písm. e) Smluvních podmínek;
- b) dodatečnou platbu Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny v souladu s pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

Claimová událost pak dle oznámení Zhotovitele spočívala v tom, že Objednatel dodatečně upřesnil nezbytnost provedení dodatečných prací nutných k provedení Díla spočívajících v zapojení rozvaděče OV7, osazení 3 ks odpadkových košů, instalaci výstražníku se závorou na rampě pro pěší SO 207 a úprav architektonického ztvárnění výsadbových ploch.

Dále claimová událost dle oznámení Zhotovitele spočívala v neukončené administraci na straně Objednatele vztahující se k dosud nevypořádaným nárokům Zhotovitele vyplývajících z variace dle pod-čl. 8.4 písm. e), 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

2) Dne 21. 06. 2022 vydal Správce stavby určení dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek. Tímto určením Správce stavby v rámci řízení vůči Zhotoviteli claimu ze dne 20. 06. 2022 rozhodl o tom:

a) že Doba pro dokončení Díla se prodlužuje do 04. 12. 2022.

b) že cenové dopady přerušení, ocenění/harmonogram změny předmětu Díla, včetně jakýchkoliv Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny, budou řešeny cestou Variace dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

Účelem tohoto dodatku č. 4 je deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby ze dne 21. 06. 2022.

Řešení cenových dopadů claimové události č. 8 oznámené dne 20.06.2022, aktualizace harmonogramu změny předmětu Díla včetně jakýchkoliv Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny, budou řešeny cestou Variace dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy o dílo (Harmonogram postupu prací) a pod-čl. 8.2 (Doba pro dokončení) oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce a v dodatku č. 3 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením článku 16, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3 uzavřené dne 09. 04. 2020, ve znění dodatků č. 1, až č. 3, takto:

1) Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Doby pro dokončení oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce a v dodatku č. 3 Smlouvy:

8.2, 1.1.3.3 Doba pro dokončení, 8.4 Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-čl. 7.9 Smluvních podmínek do **04.12.2022**.

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Mění se znění Přílohy č. 4 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 3 na znění uvedené v dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabyvá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčená tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
- Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:
Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy o dílo*): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

V Praze

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“
Vedoucí společník Druhý společník
Metrostav a.s. HOCHTIEF CZ a.s.**

V Praze

05.12.2022
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

22.11.11

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.11.24

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

2022.11.11

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.


Digitally signed by
Date: 2022.11.24

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2020			Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021			Půlrok 1, 2022			Půlrok 2, 2022		
						L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L
1		Prodloužení podchodu v žst, Praha Hlavní n. - Etapa 1A																					
2		Zahájení stavby																					
3		Stavební postup 0																					
4		Příprava staveniště, oplocení staveniště.																					
5	SO 110 1A	Provizorní přeložka koleje 40b,																					
6	SO 110 1A	Snesení koleje v místě přeložky vodovodu																					
7	SO 161	Přeložka vodovodu, včetně snesení opuštěné části vodovodu																					
8	SO 160	Výstavba kanalizace v místě snesené koleje po napojovací šachtu																					
9	SO 310.1A	Základy a provizorní stožáry mezi koleje 32 a 34 (P66, P76)																					
10	SO 310.1A	Úprava TV nad kolejí 32b, 36b a částí 34 pro vložení MP - krátkodobá výluka těchto kolejí																					
11	PS 350 1A	Úprava rozvodny R61																					
12		SP 01 Prodloužení severního podchodu včetně chodníku																					
13	SO 140	Vložení MP do koleje 32 b																					
14	SO 110 1A	Snesení části koleje 34 (v rozsahu haly)																					
15	SO 310 1A, SO 375 1A	Provizorní zakotvení trakčního vedení na provizorní stožáry mezi kolejemi 32 a 34																					
16	SO 140	Kotvené záporové pažení pro 1. část podchodu v rozsahu haly																					
17	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu obnažení kolektoru																					
18	SO 190.2	Ochranná hala																					
19	SO 190.1	Rekonstrukce kolektoru																					
20	SO 361	Zrušení kabelového kanálu mezi kolektorem a podchodem včetně kabelů																					
21	SO 190.2	Zřízení ocelové konstrukce pro vyvěšení kabelů,																					
22	PS 110, PS 220, SO 361	Přeložení kabelů, jejich provizorní zavěšení na samostatnou konstrukci																					
23	SO 140	Výkop prodlužovaného podchodu v rozsahu 1.části podchodu a zrušení kolektoru v překládané části, včetně odstranění původních pilotů																					
24	SO 140	Betonáž - Betonová konstrukce 1. části podchodu,																					
25	PS 110, PS 220, SO 361	Definitivní přeložka kabelů nad strop konstrukce																					
26		Technologická přestávka																					
27	SO 190.2	Odstranění provizorní haly																					
28	SO 140	Hydroizolace podchodu a následný zásyp																					
29	SO 140	Kotvené záporové pažení po 1. části podchodu (pro přeložku koleje)																					
30	SO 110 1A	Přeložka koleje 40 b pro autocouchet do původní polohy.																					
31	SO 190.1	Obnovení komunikace po kolektoru (bude dočasně sloužit jako cesta pro složky IZS). Pojezd po kabelových kanálech																					
32	SO 140	Kotvené záporové pažení a výkop 2.části prodlužovaného podchodu.																					
33	SO 140	Betonová konstrukce 2. části prodlužovaného podchodu,																					
34	SO 160	Napojení na kanalizaci																					
35	SO 140	Hydroizolace, zásyp																					
36	SO 140	Definitivní povrchy a obklady																					
37	PS 416	Výtahy																					
38	PS 415	Eskalátory																					
39	SO 221	Zastřešení výstupu z podchodu, korordinance PS 416, PS 415																					
40	SO 180	Chodník směr Seifertova																					
41	SO 369	Osvětlení k prodlouženému severnímu podchodu																					
42	PS 230 1A	Orientační a informační systém																					
43		SO 207 Zárubní zeď severozápad - Etapa 3																					
44		Železobetonová konstrukce																					
45		Izolace																					

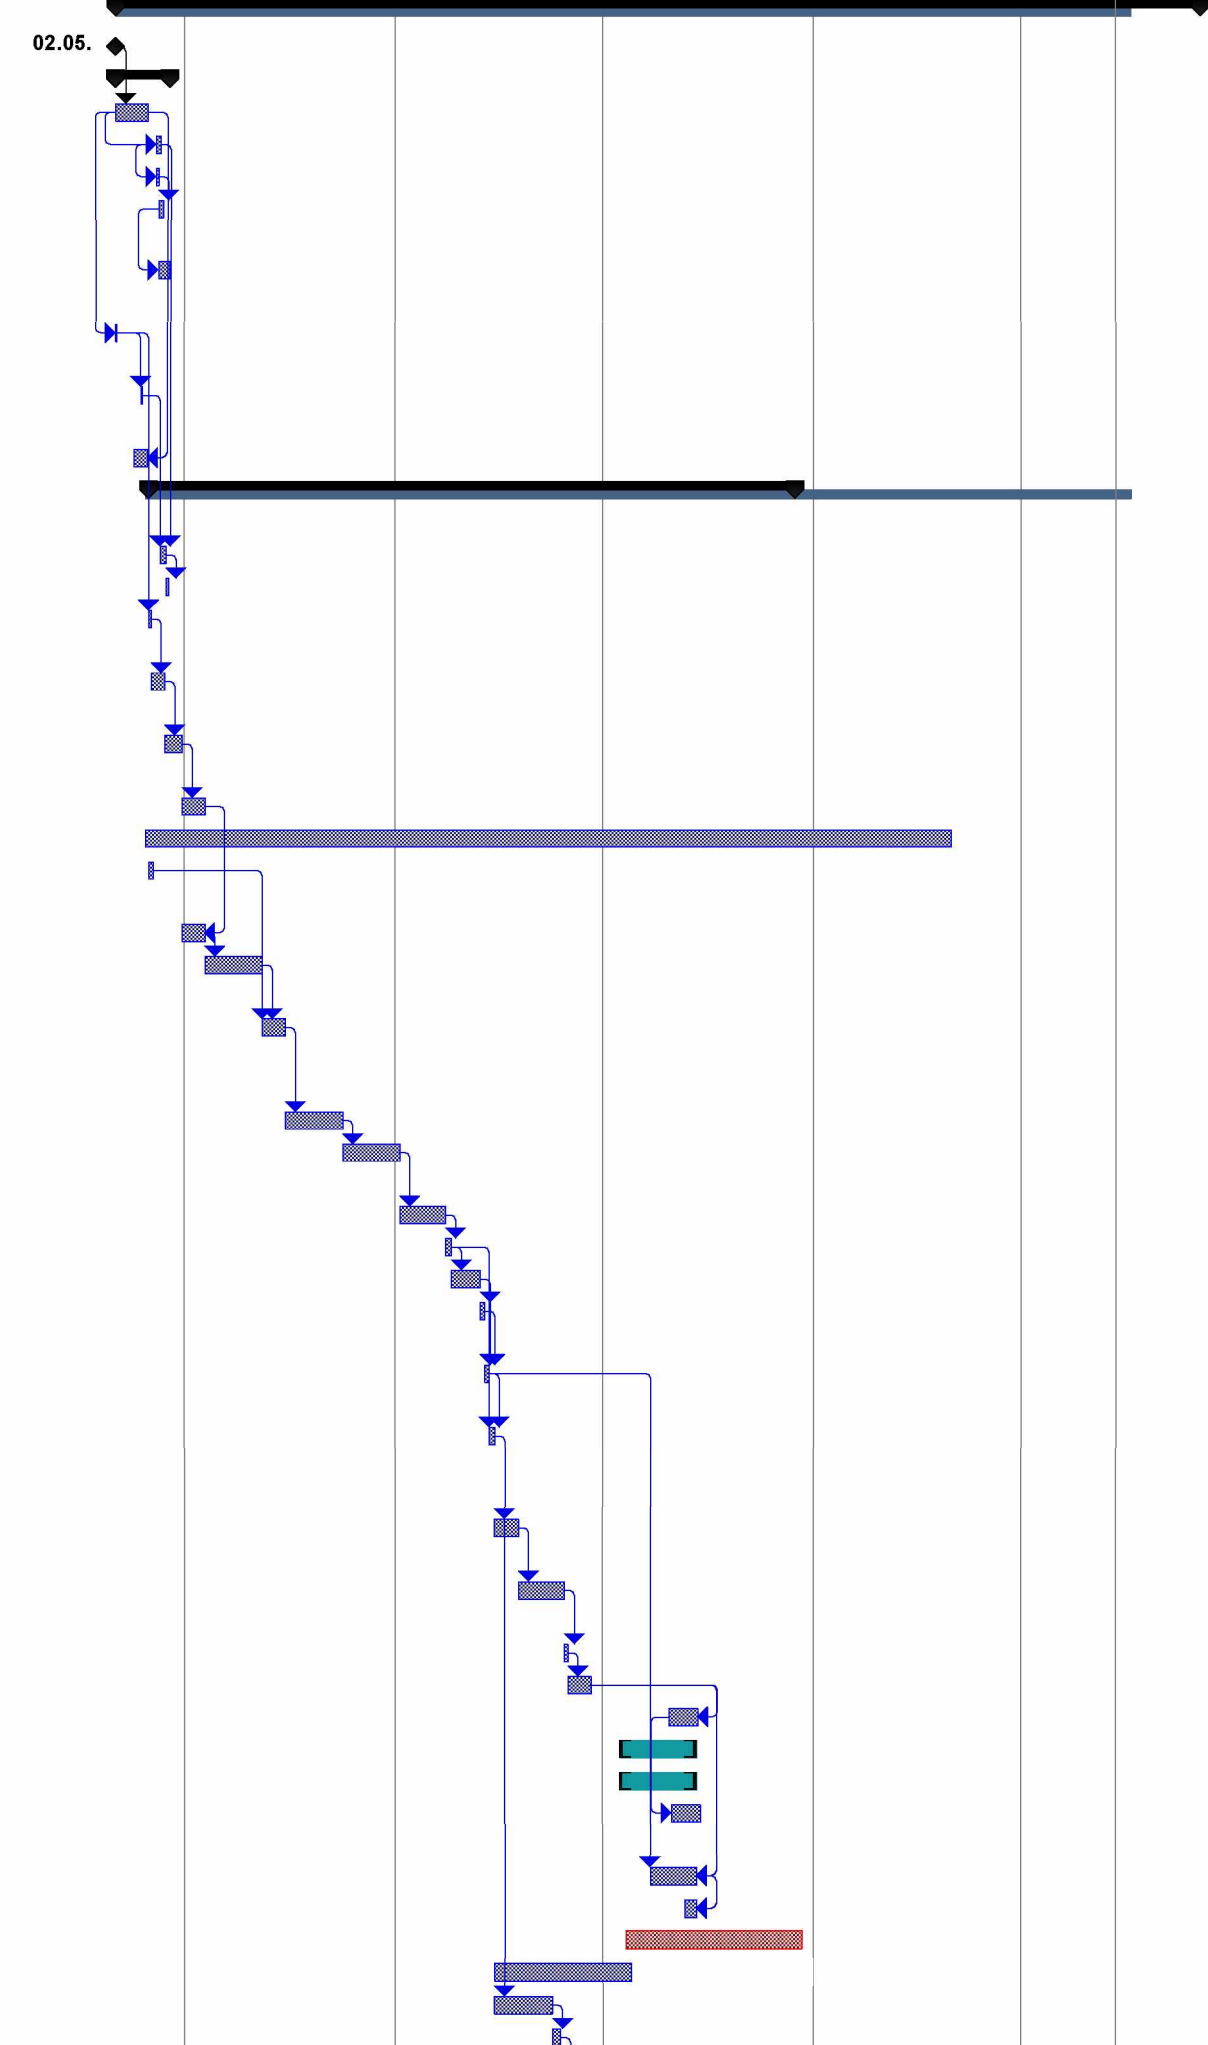

ID	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půlrok 1, 2020			Půlrok 2, 2020			Půlrok 1, 2021			Půlrok 2, 2021			Půlrok 1, 2022			Půlrok 2, 2022		
						L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L	L	B	K	Č	Z	L
46		Zásypy hutnění	██████	██████	██████																		
47		Komunikace	██████	██████	██████																		
48		Odvodnění	██████	██████	██████																		
49		Osvětlení	██████	██████	██████																		
50		Mobiliář	██████	██████	██████																		
51		Sadové úpravy	██████	██████	██████																		
52		pobytové schody	██████	██████	██████																		
53		provizorní otevření	██████	██████	██████																		
54		Dokončovací práce - Etapa 1A a 3	██████	██████	██████																		
55		Ukončení stavby, dokumentace, finanční vypořádání	██████	██████	██████																		

