



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

„III/18329 Chválenice - průtah“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000990

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500006892

číslo smlouvy objednatele č.2: 1/2022

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Chválenice

sídlo: Chválenice 21, 332 05 Chválenice

zastoupený: Ing. Pavlem Kvíderou, starostou

IČO: 002 56 714 DIČ: CZ00256714

tel: [REDACTED]

datová schránka: meqbwqp

kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kvídera, tel.: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radkem Kozákem

IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba:

Ing. Radek Kozák, tel.: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28. října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: III/18329 Chválenice - průtah (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Z důvodu chybného zaměření obrub a na základě požadavku o rozšíření zámkové plochy vznikly vícepráce pro objednatele č.2.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 103 chodníky. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 341 972,03 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD a znění dod.č. 1 o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 19 544 581,25 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 341 972,03 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 19 886 553,28 Kč
 - 3.5.3. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD a dod.č. 1
bez DPH: 13 926 825,21 Kč
se tímto dodatkem nemění.
 - 3.5.4. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 13 926 825,21 Kč

3.5.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD a dod.č. 1
bez DPH: 5 617 756,04 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 341 972,03 Kč.

3.5.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem
tak činí:

bez DPH 5 959 728,07 Kč

3.6. Ostatní ujednání smlouvy a znění dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílové výkazy výměr - rozpočty
- změnový list č. 1

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Obec Chválenice

Ing. Pavel Kvídera

starosta


podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: XXXXXXXXXX dne 6.12. 2022

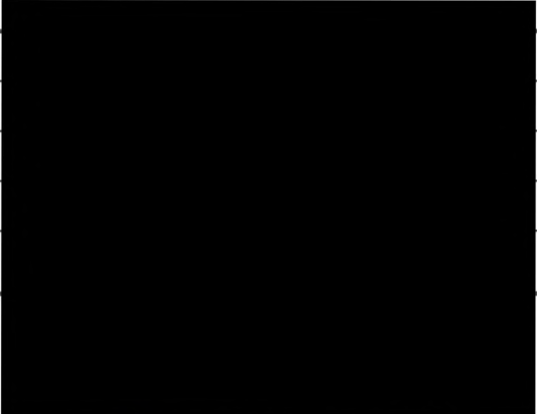
Změnový list č. 2

Předmět díla:	III/18329 Chválenice - průtah
Objekt:	SO 103 Chodníky
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Objednatel č. 2:	Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany
TDS:	Jílám s.r.o.
Autorský dozor:	Ing. Martina Pavlíková

Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních a zahradních obrub. Na základě požadavku objednatele č. 2 došlo k rozšíření zámkové plochy v prostoru křižovatky se silnicí I/20.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č.2		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č.2		
	náklady na změnu bez DPH	341 972,03 Kč		
	Výše DPH	sazba:	21%	71 814,13 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	413 786,16 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 925 024,81 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	19 544 581,25 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	19 886 553,28 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	24 062 729,47 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	341 972,03 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	341 972,03 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 pro objednatel č.2		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:ROBSTAV k.s.			
	TDS: Jílám s.r.o.			
	Autorský dozor: Ing. Martina Pavlíková			
	Objednatel č.2: Obec Chválenice			
Přílohy	Přílohy:			
	Rozpočty ke Změnovému listu č.2			

Změnový list č. 2-objednatel č.2

Předmět díla:	III/18329 Chválenice - průtah		
Objekt:	SO 103-Chodníky		
Objednatel č. 2:	Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice		
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 - Modřany		
TDS:	Jílám s.r.o.		
Autorský dozor:	Ing. Martina Pavlíková		
Popis změny: Z důvodu chybného oměření obrub ze situace, došlo k navýšení výměry silničních a zahradních obrub. Na základě požadavku objednatele č. 2 došlo k rozšíření zámkové plochy v prostoru křižovatky se silnicí I/20.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel č.2	
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4	
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis SD a KD	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH pro objednatele č. 2	
	náklady na změnu bez DPH	341 972,03 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	71 814,13 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	413 786,16 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 617 756,04 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	5 617 756,04 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	5 959 728,07 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	7 211 270,96 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	341 972,03 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	341 972,03 Kč	
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Termín na stavební práce se prodlužuje o 14 pro objednatel č.2	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel:ROBSTAV k.s.		
	TDS:Jílám s.r.o.		
	Autorský dozor:Ing. Martina Pavlíková		
	Objednatel č.2: Obec Chválenice		
Přílohy	Přílohy:		
	Rozpočty ke Změnovému listu č.2		

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 objednatel č.2

Název díla:

III/18329 Chválenice - průtah

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt - SO 103 Chodníky										
1-SO 103	12201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	372,810	390,310	17,500	289,00	107 742,00	112 799,59	5 057,59
4-SO 103	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	383,670	401,170	17,500	98,00	37 600,00	39 314,66	1 714,66
5-SO 103	162701109	Přplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 534,680	1604,680	70,000	0,30	460,00	481,40	21,40
8-SO 103	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	383,670	401,170	17,500	19,80	7 597,00	7 943,17	346,17
9-SO 103	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	690,606	722,106	31,500	54,00	37 293,00	38 993,72	1 700,72
10-SO 103	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 a 4 se zhutněním	m2	1 258,460	1308,460	50,000	35,50	44 675,00	46 450,33	1 775,33
23-SO 103	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 610,170	1667,170	57,000	141,75	228 242,00	236 321,35	8 079,35
32-SO 103	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	234,840	291,840	57,000	379,00	89 004,00	110 607,36	21 603,36
33-SO 103	59245017	Dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	162,812	220,952	58,140	271,80	44 252,30	60 054,75	15 802,45
43-SO 103	916131213	Osazení silničního betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,500	435,000	384,500	389,00	19 645,00	169 215,00	149 570,00
44-SO 103	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300 mm	m	51,000	436,000	385,000	200,00	10 200,00	87 200,00	77 000,00
45-SO 103	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	265,100	393,000	127,900	387,00	102 594,00	152 091,00	49 497,00
46-SO 103	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	215,000	344,000	129,000	76,00	16 340,00	26 144,00	9 804,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										341 972,03
Celkový rozdílné oproti SoD celkem Kč:										341 972,03
