



KUJCP01G7FRE

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 2

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

č. účtu (podíl Jčk) 199783072/0300

č. účtu (dotace SFDI) 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, t. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Spol. TES Consulting, s.r.o., IČ: 17059071

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Martin Dostál, dopravní stavby

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 7634

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy [REDACTED]

Ing. Pavel Klas, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]


Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar, tel. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“ ze dne 5.8.2022 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále nutnost posunu termínu části „Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada“ do roku 2023, předpoklad předání staveniště 04-05/2023. Důvodem je realizace kanalizace v průtahu obcí v letošním roce, investorem kanalizace je Obec Borová Lada, dokončení kanalizace je předpokládáno v květnu 2023.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada	15 998 579,29 Kč	3 359 701,65 Kč	19 358 280,94 Kč
Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec	17 536 672,96 Kč	3 682 701,32 Kč	21 219 374,28 Kč
Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín	35 306 669,17 Kč	7 414 400,53 Kč	42 721 069,70 Kč
Celkem	68 841 921,42 Kč	14 456 803,50 Kč	83 298 724,92 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada	15 998 579,29 Kč	3 359 701,65 Kč	19 358 280,94 Kč
Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec	17 536 672,96 Kč	3 682 701,32 Kč	21 219 374,28 Kč
Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice - Přečín	35 451 797,73 Kč	7 444 877,52 Kč	42 896 675,25 Kč
Celkem	68 987 049,98 Kč	14 487 280,50 Kč	83 474 330,48 Kč

Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada do 35 kalendářních dnů
- Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec do 60 kalendářních dnů
- Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přečín do 50 kalendářních dnů

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1 písm. b):

b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku:

- Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada – Pravětínská Lada do 35 kalendářních dnů – **předpoklad předání staveniště 04-05/2023**
- Modernizace silnice II/170 Přečín – Vacov, Most ev. č. 170-016 - Zdíkovec do 60 kalendářních dnů – **dokončení 2022**
- Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přečín do 50 kalendářních dnů - **dokončení 2022**

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/331/22, č. zhotovitele 841/TD/TC/22/42 ze dne 5.8.2022, jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1536/1022/44-56 ze dne 15.12.2022.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.2.

V Českých Budějovicích dne 15.12.2022

za objednatele:

.....
M
hejtn



V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:
STRABAG a.s.

.....

Ing. Pavel Klas
prokurista

Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba: Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice

č. smlouvy objednatele:

SDL/ODSH/331/22

Úsek: Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přečín

č. smlouvy zhotovitele:

841/TD/TC/22/42

Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS: TES Consulting s.r.o.

V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10, 370 76 České Budějovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Předmět změny:

Po zpřesnění skutečně provedených prací došlo ke snížení položky demontáže dopravních značek z původních 314 na 90 ks, odečítá se 224 ks.

Dotčené místo:

Doplňující údaje - DIO

Odkaz na výkresy:**Odkaz na soupis prací:**

viz.příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:**Návrh ocenění:**

Méněpráce:

-30 755,20

Vícepráce:

0,00

Celkem bez DPH

-30 755,20

DPH 21%

-6 458,59

Celkem včetně DPH

-37 213,79

Podpis navrhovatele:**Datum:****Vyjádření:****TDS:** Ing. Martin Dostál

datum:

3.10.2022

podpis:

Projektant: Robert Vavřík**JIHOČESKÝ KRAJ**
KRAJSKÝ ÚŘAD

3.10.2022

podpis:

Investor: Jihočeský kraj - Bc. Pavla PulcováOdbor dopravy
silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (25)

15.12.2022

podpis:

Přílohy:

položkový rozpočet

Změnový list 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace silnice II/170 Čestice - Chvalšovice - Přečín						
Číslo a název objektu: Doplnující údaje - DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
24	03.10.2022	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	méněpráce	skutečně provedené práce	

* může být doloženo na samostatném listu

TES
CONSULT

Ing. Jaroslav
Mokrá
předseda

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00
IČ: 60838744
(537)



Akce je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury



SFPI A JEDNA SILNIČ

příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1 7 2002
závod Strakonice
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice

Vyjádření k počtu použitých přenosných dopravních značek-méněpráce

Stavba: Modernizace silnice II/170 Čestice-Chvalšovice-Přečín

V krycím listu soupisu prací doplňující údaje-DIO je uveden v položce č. 24 „DOPRAVNÍ ZNAČKY
ZÁKLADNÍ VELIKOSTI – DEMONTÁŽ“ počet 314 ks.

Při realizaci stavby bylo použito z této položky dle skutečnosti 90 ks přenosných dopravních značek.
Došlo ke snížení 224 ks z výše uvedené položky.

Zpracovatel zadání: Robert Vavřík

Robert
Vavřík

Digitálně
podepsal Robert
Vavřík
Datum:
2022.11.29
06:53:47 +01'00'

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,
370 10 České Budějovice
K rukám Bc. Pavly Pulcové

Věc: Vyjádření TDS k množství skutečně provedených prací. Stavební akce „Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres Prachatice“:

Na stavební části „Modernizace silnice II/170 Čestice – Chvalšovice – Přechín“, stavební část DIO.

Po realizaci DIO bylo dle skutečně provedených prací upraveno množství položky č. 24 – DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI – DEMONTÁŽ z počtu 314 ks deklarovaného ve skenu SOD na straně č 24 dle skutečně provedených prací. Toto množství činí 90 ks a dojde tedy k nefakturování 224 ks á 137,3 Kč bez DPH za kus.

Nevyfakturovaná částka bude tedy činit 30.755,2 Kč bez DPH.

TDS překontroloval tyto podklady, zkontroloval výměry položky a odsouhlasil jejich množství. Pro ocenění položky byla použita položka dle nabídkového rozpočtu. Doporučujeme tedy tuto změnu v počtu kusů ke schválení.

TES
CONSULTING

Technický dozor stavebníka (TDS)
Ing. Martin Dostál
Tel: 775 89 44 50
martin.dostal@tes-consulting.cz


VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	SLO PARE
ING. JIŘÍ RUDČKA	ING. JIŘÍ RUDČKA	
OBEC: BOROVÁ LADA		
HORNÍ VLTAVICE		
OKRES: PRACHATICE	KRAJ: JIHOČESKÝ	
INVESTOR: JIHOČESKÝ KRAJ, U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE		
AKCE:	DATUM:	LEDEŇ 2022
MODERNIZACE SILNICE II/187 SVINNÁ LADA	STUPEŇ:	DSP, ZDS, POPS
BOROVÁ LADA-PRÁVĚTINSKÁ LADA-HORNÍ VLTAVICE	FORMÁT:	A4
CELKOVÁ SITUACE	MĚŘÍTKO:	1 : 80 000



OVĚŘENÉ
PROJEKT
MĚŘENÍ
MĚŘENÍ
MĚŘENÍ

0,5 km

Krajský úřad

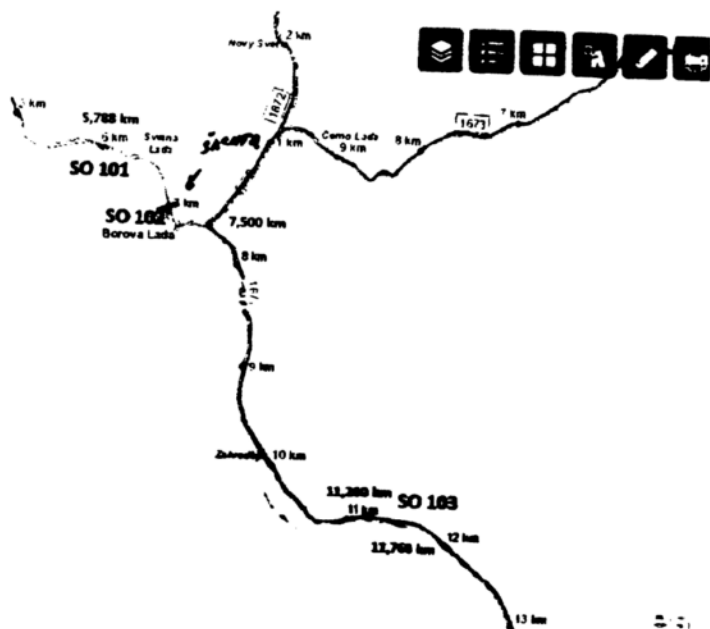

Obecní úřad Borová Lada, Borová Lada 38, 384 92

Vyřizuje: Ing. Hrazánková Jana
Telefon/fax: [REDACTED]
e-mail: borovalada@sumavanet.cz

Borová Lada 30.09.2022

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor dopravy
Bc. Alena Frdlíková
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

Akce: Modernizace silnice II/167 Svinná Lada – Borová Lada

Obec Borová Lada zastoupená starostkou obce Ing. Janou Hrazánkovou žádá o zvážení realizace výše uvedené akce z důvodu probíhající dotační akce Kanalizace Borová Lada – Svinná Lada, která bude dle SOD ukončena v květnu 2023. V rámci této akce dojde podle platného harmonogramu v průběhu listopadu 2022 k zásahu do tělesa II/167, kdy zde bude zřízena šachta na výtlačném potrubí. Dále v obci probíhá akce Rekonstrukce hasičské zbrojnice, u které je také nutnost přístupnosti silnice II/167.

Upozorňujeme na klimatické podmínky, kdy máme obavu, aby bylo možné plánovanou modernizaci silnice dokončit v plánovaném termínu a požadované kvalitě.

Z výše uvedených důvodů žádám o přehodnocení termínu plánované realizace a její přesunutí na jarní měsíce 2023.

Předem děkuji

Ing. Jana
Hrazánko
vá

Digitálně podepsal
Ing. Jana
Hrazánková
Datum: 2022.09.30
14:10:13 +02'00'

Ing. Hrazánková Jana
Starostka Borových Lad
