



KUJIP01J8D63

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba “

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 145648
Číslo smlouvy zhotovitele: 211120609
Číslo dodatku č.1 : 147932
Číslo dodatku č.2: 150201

ku ml 0457/21
7. 12. 1834

„dále jen Smlouva o dílo“

Článek 1 - Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**
Adresa: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA hejtman
K podpisu pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 217816713 / 0300
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**
Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství
Zástupce pro věci technické: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodily na této nepodstatné změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo je úprava ceny za dílo z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací, které vznikly v průběhu realizace.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 1 původní smlouvy o dílo **se mění o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění takto:

PŮVODNÍ CENA dle dodatku č. 2:

Cena bez DPH	60 528 511,74 Kč
DPH	12 710 987,46 Kč
Cena s DPH	73 239 499,20 Kč

CENA VÍCEPRACÍ:

Cena bez DPH	1 811 082,32 Kč
DPH	380 327,29 Kč
Cena s DPH	2 191 409,61 Kč

CENA MÉNĚPRACÍ:

Cena bez DPH	1 700 717,53 Kč
DPH	357 150,68 Kč
Cena s DPH	2 057 868,21 Kč

NOVÁ CENA:

Cena bez DPH	60 638 876,53 Kč
DPH	12 734 164,07 Kč
Cena s DPH	73 373 040,60 Kč

Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek 4 – závěrečné ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, jsou tímto dodatkem č.3 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění..
- 4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo,. nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 5 stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Číslo dodatku č.3 objednatele: 157480

Číslo dodatku č.3 zhotovitele:211120609D003

4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách objednatele.

4.5 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.6 Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek č.3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne

09. 12. 2022

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana


Kraj Vysočina
Žitbova 1882/57, 586 01 Jihlava

V Praze dne

- 09. 12. 2022

Zhotovitel:

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství



COLAS CZ, s.r.o.
Ruděška 215/1, 100 00 Praha 6
DIČ: CZ26177005-1091
Tel: 420 226 003 50
www.colas.cz

čení o
ovém

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Odsouhlasení Autorského dozoru – email – 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při pochůzce na stavbě dne 21.4.2022 bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD dohodnuto, že propustek v km 3,660 bez evidenčního čísla a nezjištěného profilu bude nahrazen novým propustkem a tento bude vybourán.

Výpočet:

pol.č.57 $13m \cdot 0,7m \cdot 0,5m = 4,55 m^3 \cdot 1050 Kč = 4777,50 Kč$

pol.č.58 $13m \cdot 1050 Kč = 13650 Kč$

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	18 427,50 Kč	18 427,50 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 8. 11. 2022	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 8. 11. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 8. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 11.	podpis



Asne

Firma: Nabídky Marek

Strana: 1

3.13.1

Datum: 11.10.2022

Čas: 8:30:26

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)								č. ZBV č.9					
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl cen celkem v Kč	rozíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	12,000	16,550	4,550	1 050,00	12 600,00	0,00	4 777,50	17 377,50	4 777,50	37,92
58	966358.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	36,700	49,700	13,000	1 050,00	38 535,00	0,00	13 650,00	52 185,00	13 650,00	35,42
		Celkem						51 135,00	0,00	18 427,50	69 562,50	18 427,50	36,04
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	18 427,50	44 188 492,78	18 427,50	0,04
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	534 484,70	44 704 549,98	18 427,50	0,04

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, provozovna Třebíč

Brněnská 343, 674 01 Třebíč

DI 7005 (1)

Za zhotovitele: 568823921. Fax: 568821922

Aleš Novák

Datum:

8. 11. 2022

Za objednatele:

Datum:

8. 11. 2022

NOVÁK, Aleš (SGCZE)

Od: Martin Staněk <m.stanek@dpova.cz>
Odesláno: pátek 22. dubna 2022 12:15
Komu: NOVÁK, Aleš (SGCZE); Břetislav Mutl; Dokulil Miroslav Ing.
Kopie: Katrin Žeberová
Předmět: II/152 Hrotovice - Dukovany

Message sent from Internet with m.stanek@dpova.cz email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, na včerejší pochůzce na stavbě bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD dohodnuto.

1. Propustek bez evidenčního čísla nezjištěného profilu cca v km 3,660 bude nahrazen novým proustem DN600. Technické řešení bude obdobné jako u dalších propustů na stavbě, tzn. plastová trouba DN600 se zkosenými čely a odlážděním vtoku a výtoku. Za výtokem bude realizován vsakovací příkop, který bude lomovým kamenem doveden až k přilehlé meliorační šachtě. Zhotovitel provede zaměření zájmového území a AD zpracuje výkres propustu a soupis prací. Na základě zaměřených výšek bude rozhodnuto o obsypu trouby nebo o obetonování. Projektant prověří nutnost osazení příkopové tvárnice před vtokem v km 3,660-3,800 vlevo.
2. V km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací na p.č. 691 k.ú Slavětice byl nalezen nefunkční propustek. Bylo dohodnuto, že tento propustek bude obnoven a upraven tak, aby byl propustek napojen do odláždění vtoku propustu pod silnicí II/152 v km 3,483. V souladu s vyhláškou č. 107/1997 Sb. § 12 odst. 2. navrhujeme propustek s plastovou troubou DN 400 s obsypem.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí střediska

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Masarykovo nám. 5/8
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 595 132 085
+420 777 116 230
e-mail: m.stanek@dpova.cz
www: www.dpova.cz

Tato zpráva a veškeré příložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odesílala.

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-09

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany,PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.9 – SO 101**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 9 týkající se objektu SO 101. Během realizace stavby bylo dohodnuto, že propustek zastižený v km 3,660 bude vybourán a nahrazen propustem novým ve stejném místě. Toto ZBV řeší vybourání uvedeného propustu.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 10
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 005		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Odsouhlasení Autorského dozoru – email - počet stran A4 1x

Fotodokumentace - počet stran A4 4x

Výkres – řez - počet stran A3 1x

Geodetické zaměření - počet stran A3 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při pochůzce na stavbě dne 21.4.2022 bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD dohodnuto, že propustek v km 3,660 bez evidenčního čísla a nezjištěného profilu bude nahrazen novým propustkem.

Výpočet:

pol.č.2 $(11,6m \cdot 2m \cdot 1,5m) = 34,8m^3 \cdot 1095kč = 38106 kč$
 pol.č.3 $(0,4m \cdot 0,6m \cdot 2m) + (1m \cdot 2,5m \cdot 7,75m) = 19,855m^3 \cdot 190kč = 3772,45 kč$
 pol.č.4 (pol.č.2+pol.č.3) $= 34,8 + 19,855 = 54,655m^3 \cdot 100kč = 5465,50 kč$
 pol.č.5 $(1,5m \cdot 2 + 0,5m \cdot 2) \cdot 11,6m = 23,2m^3 \cdot 681kč = 15799,20 kč$
 pol.č.7 $(11,6m \cdot 1m \cdot 0,5m) = 5,8m^3 \cdot 897kč = 5202,60 kč$
 pol.č.8 $(2,5m \cdot 1m \cdot 7,75m) = 19,375m^3 \cdot 1047kč = 20285,625 kč$
 pol.č.9 $(1m \cdot 2,5m) + (2,5m \cdot 7,75m) \cdot 2 \text{ strany} = 43,75m^2 \cdot 29kč = 1268,75 kč$
 pol.č.11 $(1,8m \cdot 0,25m \cdot 2m) + (0,26m \cdot 2 \cdot 11,6m) + (0,1m \cdot 11,6m \cdot 1m) + (0,22m \cdot 2 \cdot 11,6m) = 7,628m^3 \cdot 4451kč = 33952,23 kč$
 pol.č.12 $(3 \cdot 0,9 \cdot 8 \cdot 4,5) / 1000 = 0,098t \cdot 30921kč = 3030,26 kč$
 pol.č.13 $(0,6m \cdot 7,75m) = 4,65m^3 \cdot 4000kč = 18600 kč$
 pol.č.14 $(10,2m \cdot 2 + 19m \cdot 2 \cdot 0,3m) = 8,76m^3 \cdot 6000kč = 52560 kč$
 pol.č.15 $11,6m \cdot 5691kč = 66015,60 kč$

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:


Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	264 058,22 Kč	264 058,22 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum: 11.	podpis:
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum: 11. 1.	podpis:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jež součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy.

Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 8. 11. 2022	podpis 
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 8. 11. 2022	podpis



Aspe

Firma: Nabídka Marek

Strana: 1

3.13.1

Datum: 11.10.2022

Čas: 9:22:35

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152

Číslo a název rozpočtu: 005 - Propustky 152-049-050-051

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl cen celkem v Kč	rozíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	108,300	143,100	34,800	1 095,00	118 588,50	0,00	38 105,00	156 694,50	38 105,00	32,13
3	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	42,140	61,995	19,855	190,00	8 006,60	0,00	3 772,45	11 779,05	3 772,45	47,12
4	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	150,400	205,055	54,655	100,00	15 040,00	0,00	5 465,50	20 505,50	5 465,50	36,34
5	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,980	43,180	23,200	681,00	13 606,38	0,00	15 799,20	29 405,58	15 799,20	116,12
7	21450.	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	19,500	25,300	5,800	897,00	17 491,50	0,00	5 202,60	22 694,10	5 202,60	29,74
8	21451.	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	40,250	59,625	19,375	1 047,00	42 141,75	0,00	20 285,63	62 427,38	20 285,63	48,14
9	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	90,500	134,250	43,750	29,00	2 624,50	0,00	1 268,75	3 893,25	1 268,75	48,34
11	272314.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	9,138	16,766	7,628	4 451,00	40 673,24	0,00	33 952,23	74 625,47	33 952,23	83,48
12	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,097	0,195	0,098	30 921,00	2 999,34	0,00	3 030,26	6 029,60	3 030,26	101,03
13	46321.	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	9,660	14,310	4,650	4 000,00	38 640,00	0,00	18 600,00	57 240,00	18 600,00	48,14
14	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	67,000	75,760	8,760	6 000,00	402 000,00	0,00	52 560,00	454 560,00	52 560,00	13,07
15	918358.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	39,000	50,600	11,600	5 691,00	221 949,00	0,00	66 015,60	287 964,60	66 015,60	29,74
		Celkem						923 760,81	0,00	264 058,22	1 187 819,03	264 058,22	28,59
		Celkem ve změně						955 792,54	0,00	264 058,22	1 219 850,76	264 058,22	27,63
		Všechny změny celkem						955 792,54	0,00	264 058,22	1 219 850,76	264 058,22	27,63

COLAS CZ, a.s.

oblast Jih, provozovna Třebíč

Brněnská 343, 674 01 Třebíč

DIČ: CZ261775 (1)

Tel.: 52 222 222 Fax: 568821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

8. 11. 2022

Za objednatele:

Datum: 8. 11. 2022

NOVÁK, Aleš (SGCZE)

Odi: Martin Staněk <m.stanek@dpova.cz>
Odesláno: pátek 22. dubna 2022 12:15
Komu: NOVÁK, Aleš (SGCZE); Břetislav Mutl; Dokulil Miroslav Ing.
Kopie: Katrin Žeberová
Předmět: II/152 Hrotovice - Dukovany

Message sent from Internet with m.stanek@dpova.cz email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, na včerejší pochůzce na stavbě bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD dohodnuto.


1. Propustek bez evidenčního čísla nezjištěného profilu cca v km 3,660 bude nahrazen novým proustem DN600. ~~Technické řešení bude obdobné jako u dalších propustů na stavbě, tzn. plastová trouba DN600 se zkosenými čely a odlážděním vtoku a výtoku. Za výtokem bude realizován v kovací příkop, který bude lomovým kamenem doveden až k přílehlé meliorační šachtě. Zhotovitel provede zaměření zájmového území a AD zpracuje výkres propustu a soupis prací. Na základě zaměřených výšek bude rozhodnuto o obsypu trouby nebo o obetonování. Projektant prověří nutnost osazení příkopové tvárnice před vtokem v km 3,660-3,800~~
2. V km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací na p.č. 691 k.ú Slavětice byl nalezen nefunkční propustek. Bylo dohodnuto, že tento propustek bude obnoven a upraven tak, aby byl propustek napojen do odláždění vtoku propustu pod silnicí II/152 v km 3,483. V souladu s vyhláškou č. 107/1997 Sb. § 12 odst. 2. navrhujeme propustek s plastovou troubou DN 400 s obsypem.


S pozdravem


Ing. Martin Staněk
Vedoucí střediska


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 595 132 085
+420 777 116 230
e-mail: m.stanek@dpova.cz
www: www.dpova.cz

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala.

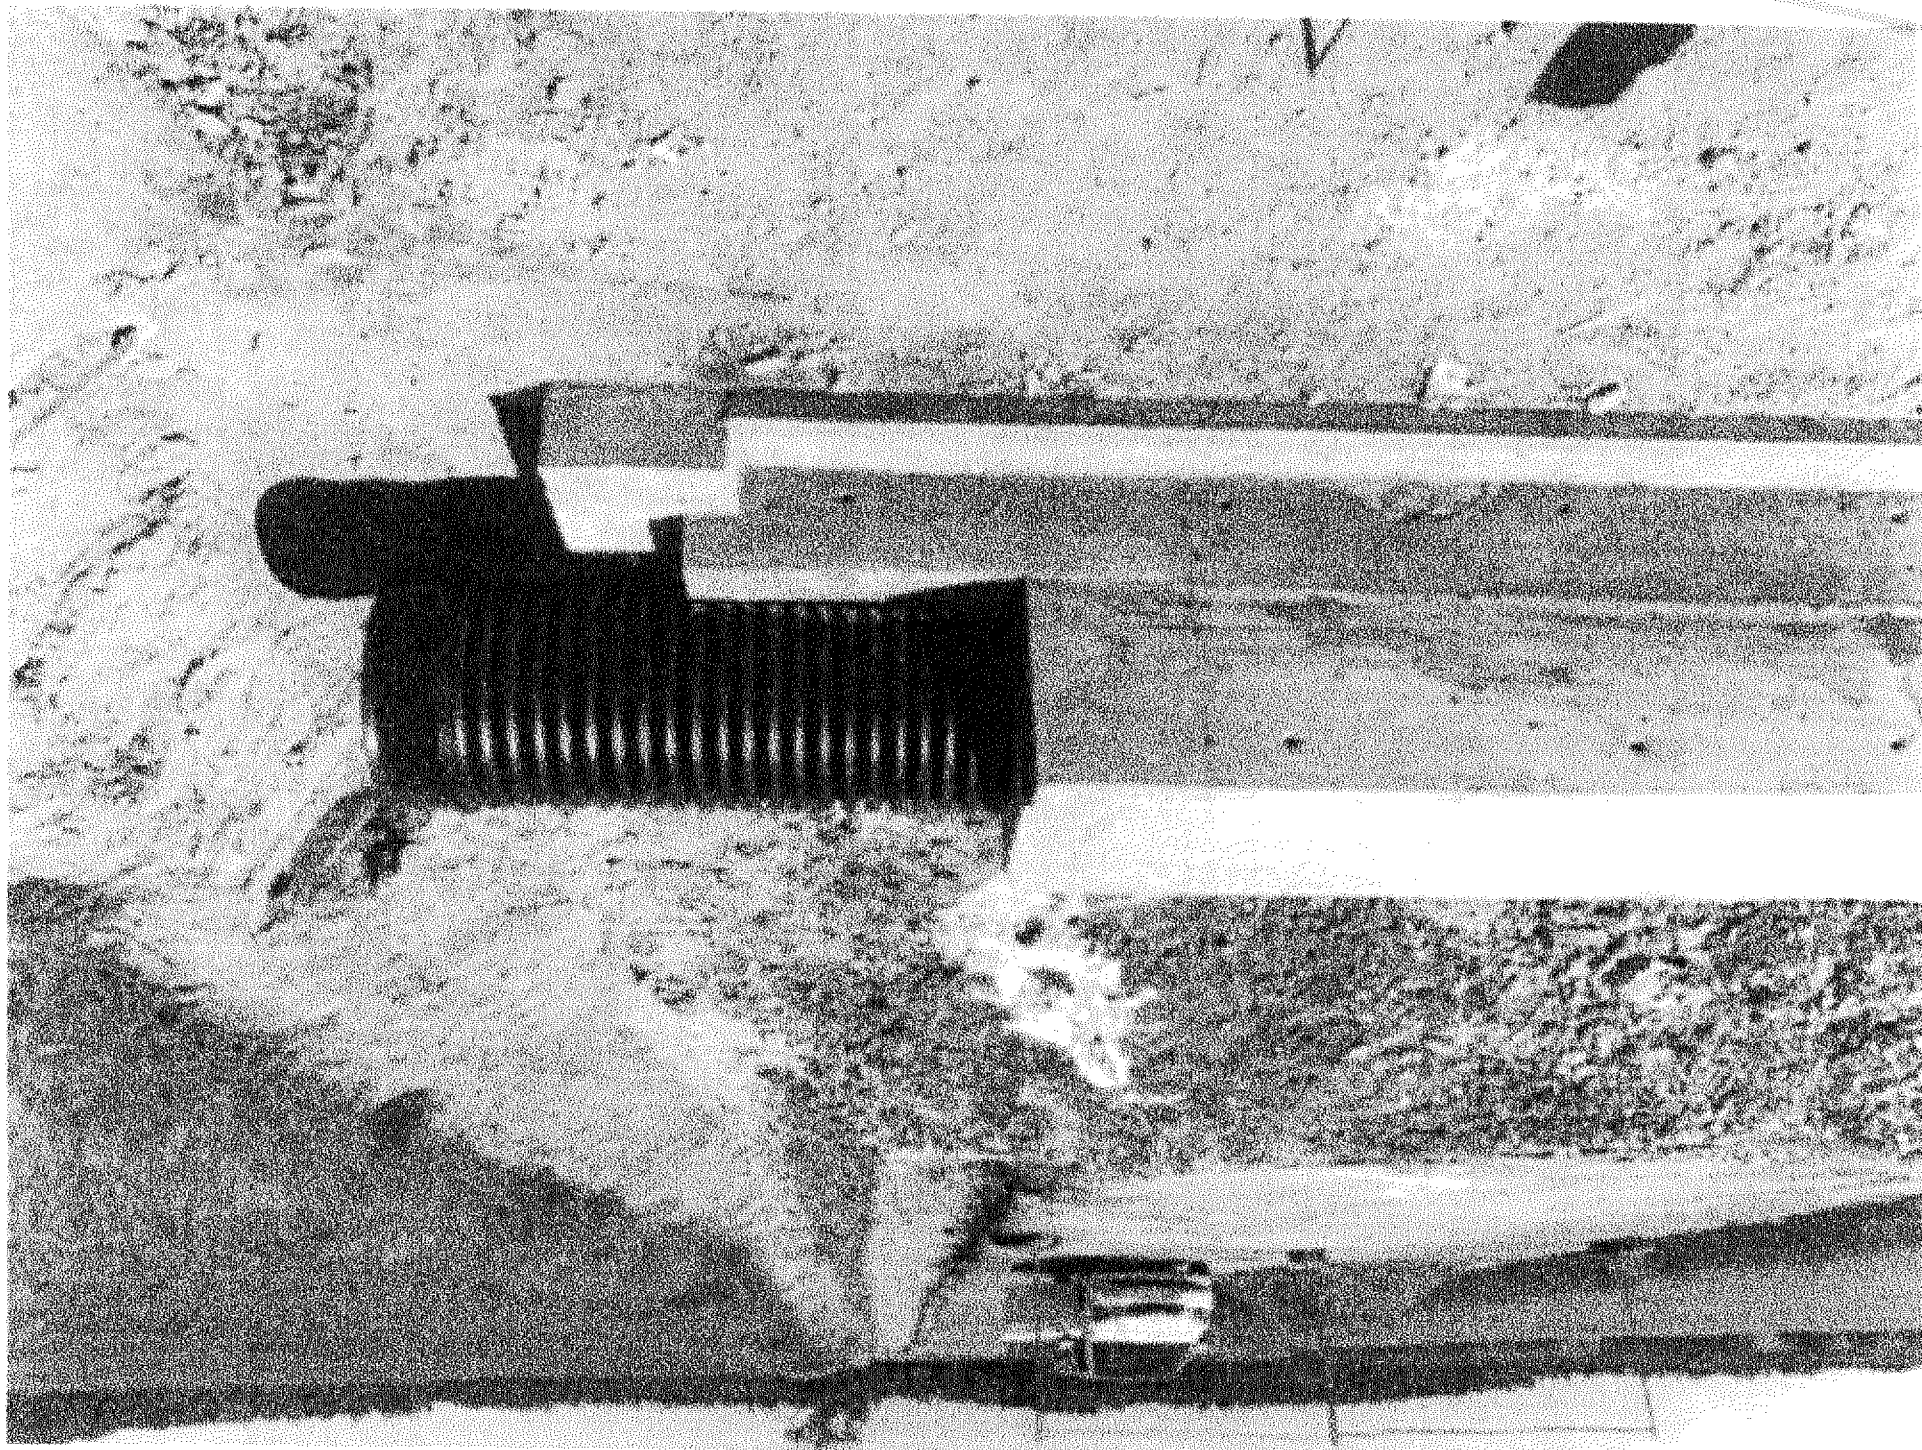

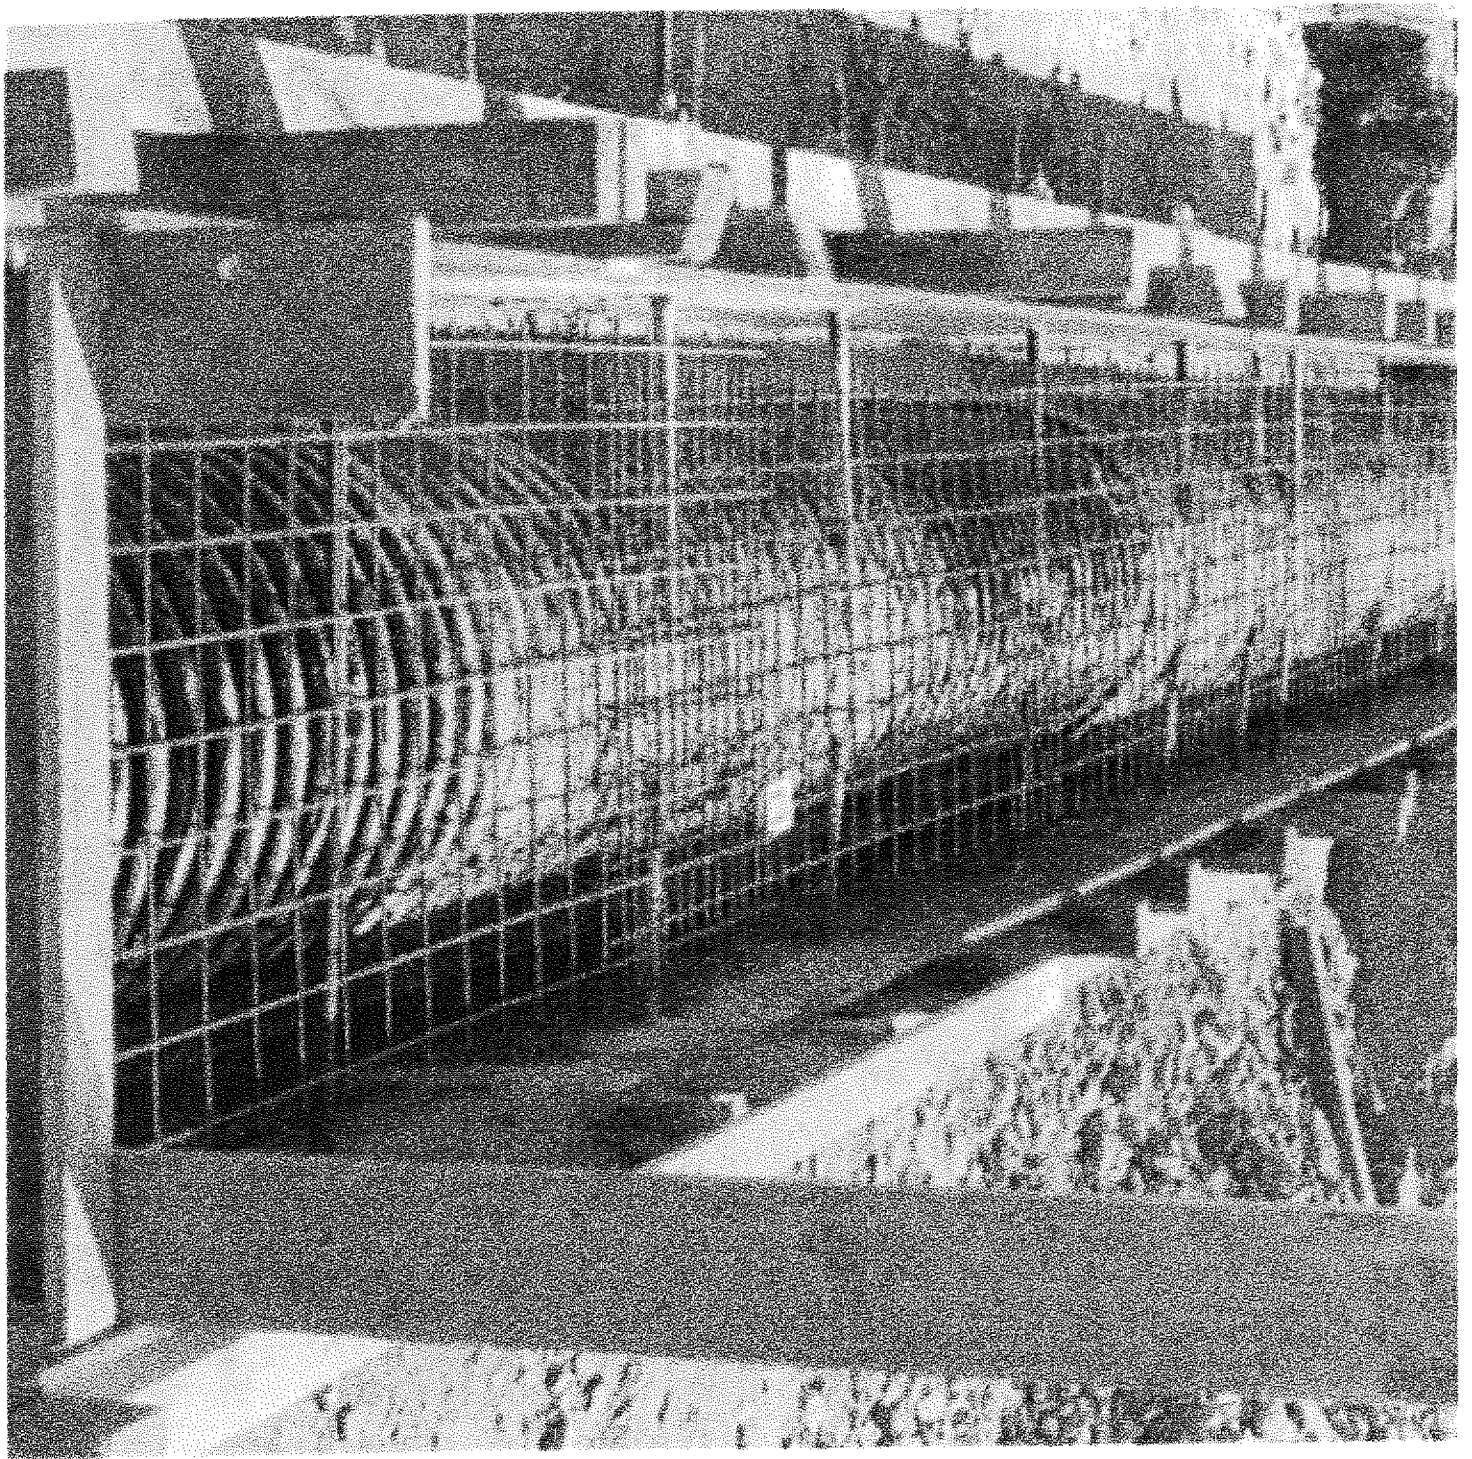

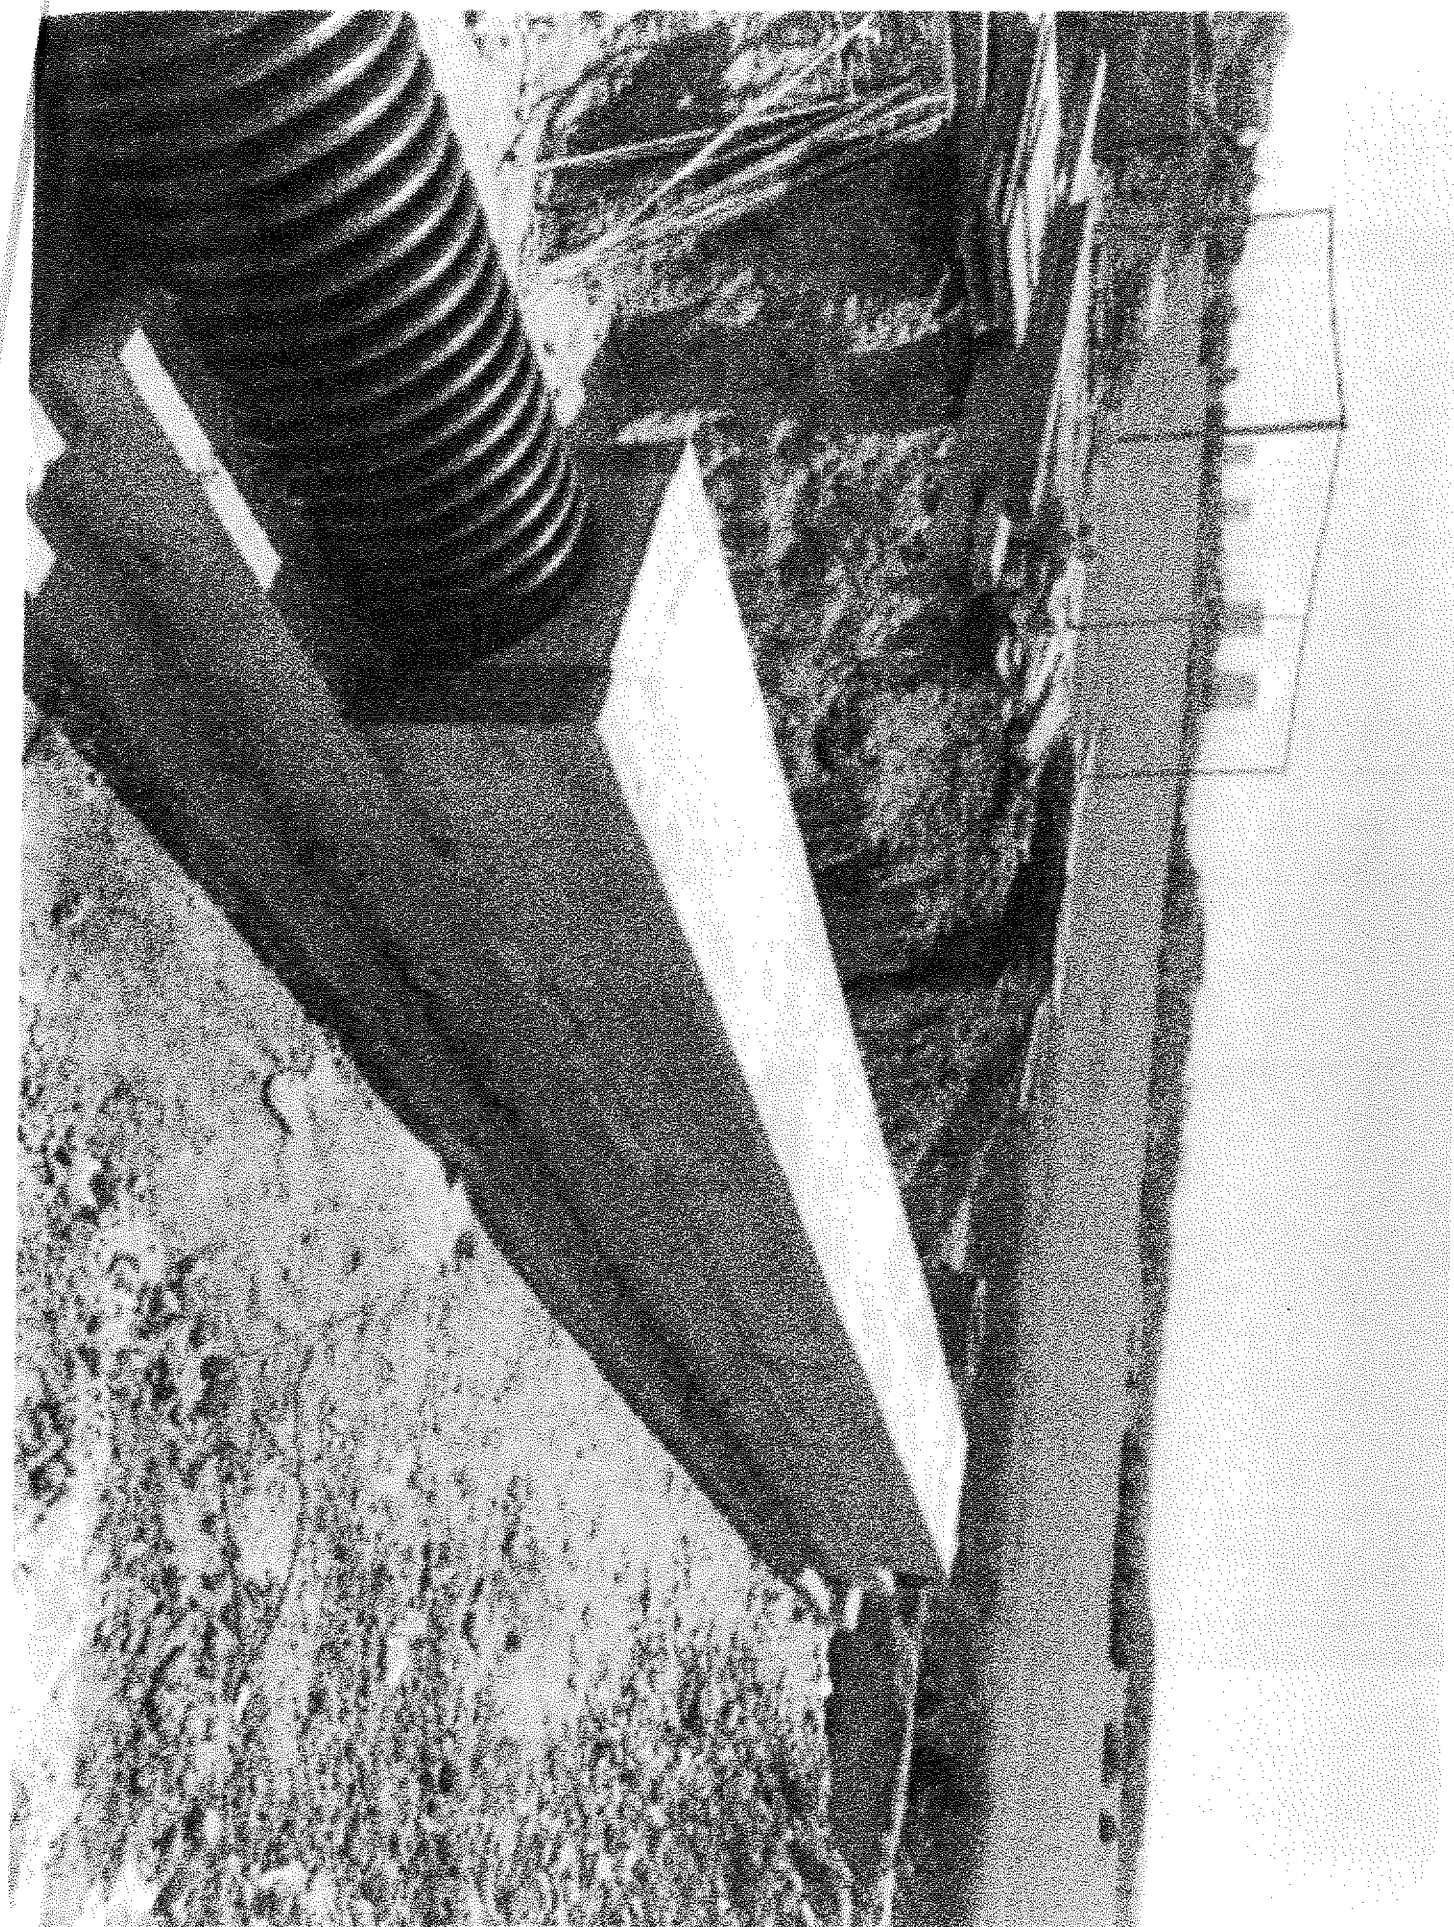

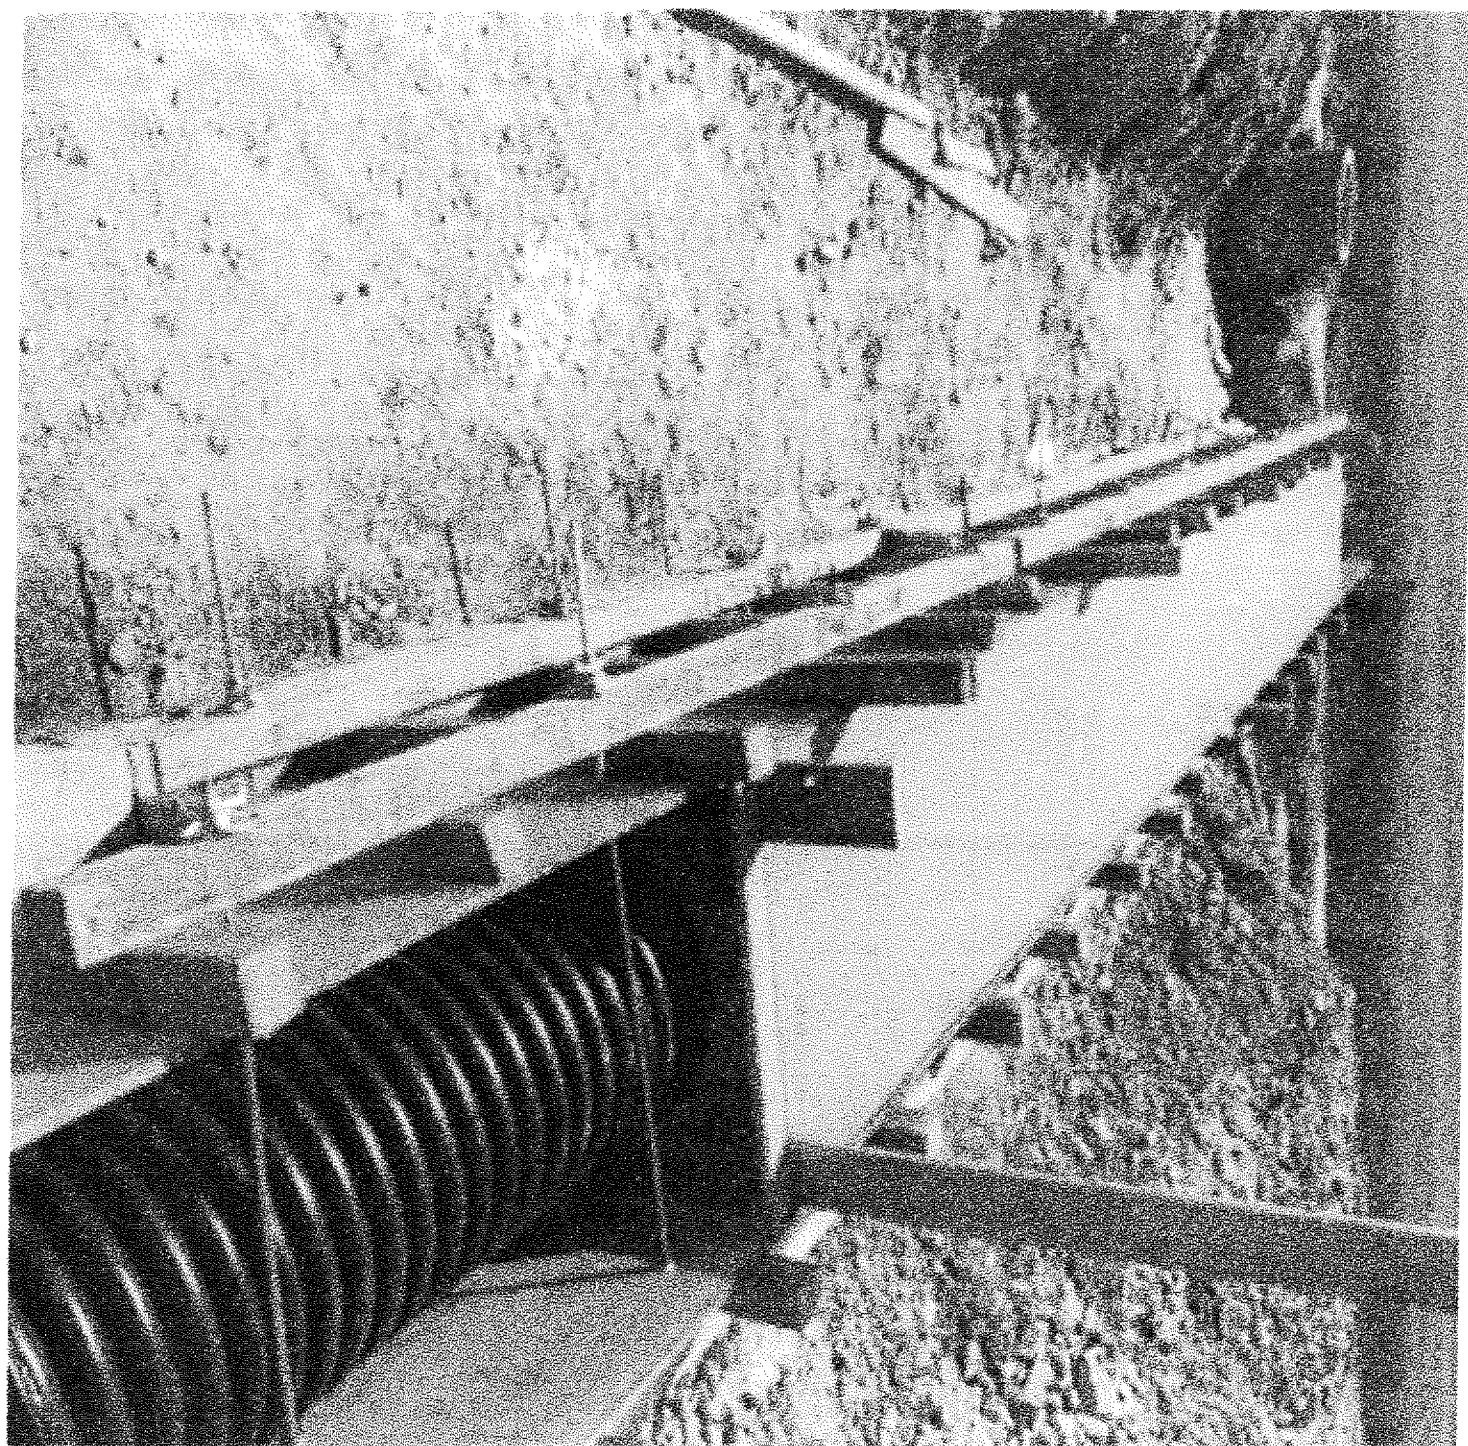

KAMENNÁ DLAŽBA TL. 150mm
DO BETONU C20/25sXF3 TL. 150 mm
výplň spár zábrtkou s odolností XF4

383.95

1:1.5

0.40

1:1.5

382.61

1.00%

0.6

0.40

ULOŽNÝ BETON. PŘÁH C25/30-XF2

11.80

380.00

ROVNACOVÁ ROVNA 380.00

BETONOVÝ K8 C25/30 XF3 V TL 100 mm
VYZTUŽENÉ NADÝBANOU KARI SÍŤ 6/100/100
POLYETYLENOVÁ TROUBA DN 600
SEDOVÉ LOŽE C25/30-XF3 V TL 150 mm
BETON C25/30-XF3 VYZTUŽENÝ KARI SÍŤ

ULOŽNÝ BETON. PŘÁH C25/30-XF2

82.58

0.50

KAMENNÁ ROVNANINA - LOMOVÝ KÁMEN
m>80kg s VYKLENANÍM
TL. 300mm

VÝPLŇ VSAKOVACÍ PRÍROPY - LOMOVÝ KÁMEN

2.50


PELIRACNÍ
GEBTEXPLIE

1.00

TABULKA VÝŠEK

	VTOK	VÝTOK	DĚLKA	SKLON
PROPUSTEK 3,670	392,64	382,58	11,60	0,50%

	X	Y	Z
VTOK	1166899,560	636279,134	382,64
VÝTOK	1166911,020	636277,447	382,58



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Projektová

konzultační organizace

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-10

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.10 – SO 101**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 10 týkající se objektu SO 101 části propustu. Během realizace stavby bylo dohodnuto, že propustek zastižený v km 3,660 bude vybourán a nahrazen propustem novým ve stejném místě. Toto ZBV řeší vybudování nového propustu.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 11
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Stávající rozpočet - počet stran A4 2x

Odsouhlasení AD a investora – email - počet stran A4 3x

Geodetické zaměření – email - počet stran A3 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: V projektové dokumentaci č.v. 04 Vzorové příčné řezy a ač.v. 05.4 příčné řezy bylo zakresleno odstranění obrub z dlažebních kostek a osazení krajníků v km 4,550 – km 4,993. Ovšem z důvodu překrytí dvojitádku asfaltovým betonem, na který se posléze přišlo při frézování, toto chybí v rozpočtu. A jelikož u všech obrubníků v obci Slavětice realizujeme betonové krajníky bylo vhodné toto provést i v této části stavby.

Výpočet:

pol.č.6 km 3,875 – km 3,900 vlevo – 73,2m, km 4,552 – km 4,993 vlevo – 440,1m, km 3,790 – km 3,802 vpravo – 12,1m, km 4,565 – km 4,630 vpravo – 64,6m, celkem 590 m *2 strany = 1180m*90kč=106200 Kč
pol.č.51 celkem 590 m*2 strany = 1180m*1128m z rozpočtu=784,1*309kč=242286,80 Kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	348 486,90 Kč	348 486,90 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 11. 1.	podpis
Technický dozor investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 1. 1.	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 11. 1.	podpis



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 24.10.2022

Čas: 8:56:13

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)								č. ZBV č.11					
poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH	M	1 971,600	3 151,600	1 180,000	90,00	177 444,00	0,00	106 200,00	283 644,00	106 200,00	59,85
51	91723.	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	1 128,000	1 912,100	784,100	309,00	348 552,00	0,00	242 286,90	590 838,90	242 286,90	69,51
		Celkem						525 996,00	0,00	348 486,90	874 482,90	348 486,90	66,25
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	348 486,90	44 518 552,18	348 486,90	0,79
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	892 421,60	45 062 486,88	348 486,90	0,79

COLAS CZ, a.s.
 společnost Jih, provozovna Třebíč
 Brněnská 343, 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel: 565223921, Fax: 566821822

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

14. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum:

8. 11. 2022



POLOŽKY ODHADU STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: 180005 II/152 Hrotovice - Dukovany, PD - I. etapa (km 0,000 - 5,950)
Objekt: SO 101 Silnice II/152
Rozpočet: 002 SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			P1.....1 ks E2b.....2 ks IS 3a.....2 ks IZ 4a.....3 ks IZ 4b.....2 ks P2.....1 ks B13.....2 ks E13.....2 ks ev.č. mostů..... 2 ks 3+1+1+1+2+1+2+2+3+2+1+2+2+2=25,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
50	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění stáv. sloupků SSZ vč. odvozu na zhotovitelem předepsané místo 19=19,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	19,000		
51	91723		OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ vč. bet. lože C20/25nXF3 tl. min 100mm obec Slavětice vpravo: km 3,819-3,960 km 3,968-4,057 km 4,085-4,125 km 4,135-4,234 km 4,249-4,340 km 4,354-4,548 vlevo: km 3,809-3,875 km 4,085-4,120	M	1 128,000		



POLOŽKY ODHADU STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: 180005 II/152 Hrotovice - Dukovany, PD - I. etapa (km 0,000 - 5,950)
Objekt: SO 101 Silnice II/152
Rozpočet: 002 SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			km 4,135-4,150 km 4,168-4,526 141+89+40+99+91+194+66+35+15+358=1 128,000 [A] planimetrováno ze situace př. 02 Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
52	91772	a	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH doplnění poškozených dl.kostek využití stávajících kostek viz. pol. 11355 předpoklad 30% z pol. 91785 fakturace proběhne na základě skutečného množství použitých kostek na stavbě při realizaci po dosouhlasení investorem a TDS 2248*0,3=674,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - OTSKP 2019 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	674,400		
53	91785		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH stáv. dvouřádek ze žul. kostek Hrotovice vlevo: km 0,472-0,680 km 0,688-0,710 km 0,728-0,836 km 0,847-0,906 km 0,938-0,980 km 1,012-1,082 vpravo: km 0,472-0,852	M	2 248,000		

NOVÁK, Aleš (SGCZE)

Od: Dokulil Miroslav Ing. <Dokulil.M@kr-vysocina.cz>
Odesláno: středa 15. června 2022 7:24
Komu: NOVÁK, Aleš (SGCZE)
Předmět: FW: II/152 Hrotovice - Dukovany
Přílohy: 3-3a_Obec Slavětice_silniční obruby.pdf

Message sent from Internet with Dokulil.M@kr-vysocina.cz email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den,

Přeposílám stanovisko projektanta, za mě souhlas.

Ing. Miroslav Dokulil
Oddělení investiční a správy komunikací
tel.: +420 564 602 222
mobil +420 734 694 517

From: Martin Staněk <m.stanek@dpova.cz>
Sent: Tuesday, June 14, 2022 5:20 PM
To: Dokulil Miroslav Ing. <Dokulil.M@kr-vysocina.cz>
Subject: RE: II/152 Hrotovice - Dukovany

Dobrý den, souhlasíme se zhotovitelem a přikláníme se k osazení betonové přídlažby podél obrubníku v celém intravilánu obce Slavětice. Bude tak zajištěna shodná úprava komunikace v celém průtahu obce, podložená požadavkem obce Slavětice – viz. příloha.

S pozdravem.

Ing. Martin Staněk
Vedoucí střediska

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 595 132 085
+420 777 115 230
e-mail: m.stanek@dpova.cz
www: www.dpova.cz

Tato zpráva a veškeré přílohy jsou součástí důvěrné a určité pouze osobě adresátovi. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorňuji na to odesílatele a veškeré informace obsažené v e-mailu odestráňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odesílá.



DOPRAVNÍ PROJEKTY
A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE
V OBOŘI DOPRAVNÍCH
STAVEB
OSTRAVA

VÝZNAMNÁ PROJEKTOVÁ A KONSULTAČNÍ ORGANIZACE V OBOŘI DOPRAVNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ
PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ
PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ

From: Dokulil Miroslav Ing. <Dokulil.M@kr-vysocina.cz>
Sent: Monday, June 13, 2022 7:23 AM
To: Martin Staněk <m.stanek@dpova.cz>
Subject: FW: II/152 Hrotovice - Dukovany

Dobrý den pane inženýre,

Chtěl bych Vás požádat o vyjádření k níže popsanému problému.

Předem děkuji a přeji hezký den

Ing. Miroslav Dokulil
Oddělení investiční a správy komunikací
tel.: +420 564 602 222
mobil: +420 734 694 517

From: NOVÁK, Aleš (SGCZE) <ales.novak@colas.cz>
Sent: Sunday, June 12, 2022 5:08 PM
To: Dokulil Miroslav Ing. <Dokulil.M@kr-vysocina.cz>
Subject: FW: II/152 Hrotovice - Dukovany

Dobrý den,

Potřebuji info., zda máme provést silniční betonovou přídlažbu v úseku staničení Km 4,550 – Km 4,993 vlevo. Ze soupisu prací, někde cestou k realizaci stavby, vypadlo odstranění obrub z dlažebních kostek a osazení krajníků v dané části stavby. V PD č.v. 04. Vzorové příčné řezy a č.v. 05.4 Příčné řezy je zakresleno odstranění obrub z dlažebních kostek a osazení krajníků, ovšem v soupisu prací to v daném staničení není (viz. přílohy). Zřejmě z důvodu, že dvojřádek byl překryt vrstvou asfaltového betonu. Při frézování jsme na tyto dlažební kostky narazili a odstranili jsme je. A jelikož u všech obrubníků v obci Slavětice realizujeme krajníky, z mého pohledu by bylo vhodné provést je i v této části stavby. Čekám na vaše vyjádření.
Děkuji a hezký den přeji.

Aleš Novák

Stavbyvedoucí

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Kancelář: Brněnská 343, Třebíč, 67401

Tel.: +420 733 780 763

ales.novak@colas.cz

COLAS

COLAS CZ

From: NOVÁK, Aleš (SGCZE) <ales.novak@colas.cz>

Sent: Friday, June 10, 2022 4:48 PM

To: NOVÁK, Aleš (SGCZE) <ales.novak@colas.cz>

Subject: FW: II/152 Hrotovice - Dukovany

Aleš Novák

Stavbyvedoucí

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Kancelář: Brněnská 343, Třebíč, 67401


Tel.: +420 733 780 763

ales.novak@colas.cz

COLAS

COLAS CZ

7 ZEP - 51 1912, III

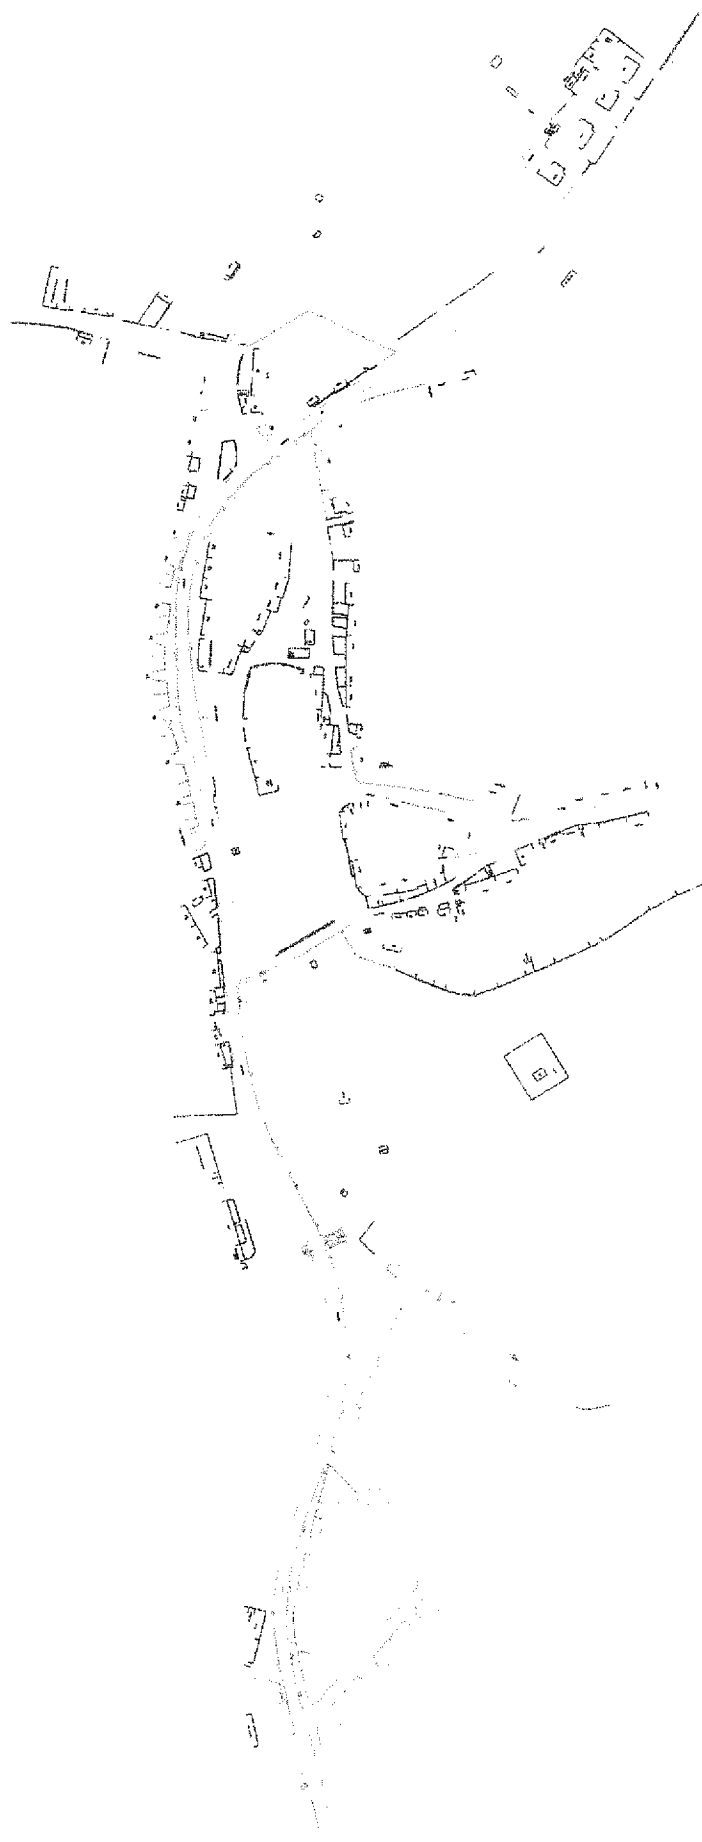

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

organizace

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-11

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotopice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.11 – SO 101.2**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 11 týkající se objektu SO 101.2. Během realizace stavby byl v některých místech zastižen dvouřádek z dlažebních kostek, který byl překryt vrstvou asfaltobetonu. Z důvodu sjednocení s ostatními intravilánovými úseky byl dvouřádek vybourán a nahrazen betonovými krajníky. Skutečný rozsah prací je doložen geodetickými protokoly.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Odsouhlasení AD – email - počet stran A4 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při pochůzce na stavbě dne 21.4.2022 bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD byl v km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací nalezen nefunkční propustek. Bylo dohodnuto, že tento propustek bude obnoven a upraven tak, že bude napojen do odláždění vloku propustku pod silnicí II/152 v km 3,483. V souladu s vyhláškou č. 107/1997 Sb. par. 12 odst 2 byl navržen propustek s plastovou rourou DN400 s obsypem. Nefunkční propustek bude odstraněn.

Výpočet:

pol.č.58 9m*1050kč=9450 Kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	9 450,00 Kč	9 450,00 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum	1. 7.	podpis	
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	1. 7.	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jež součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	1. 7.	podpis	
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum	1. 7.	podpis	



Aspe

Firma: Nabídky Marek

Strana: 1

3.13.1

Datum: 11.10.2022

Čas: 12:17:00

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152

Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.12

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	36,700	45,700	9,000	1 050,00	38 535,00	0,00	9 450,00	47 985,00	9 450,00	24,52
		Celkem						38 535,00	0,00	9 450,00	47 985,00	9 450,00	24,52
		Celkem ve změně						44 170 055,28	0,00	9 450,00	44 179 515,28	9 450,00	0,02
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	832 444,70	45 002 509,98	9 450,00	0,02

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 Brněnska 343, 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 IČ: 568823921, IČV: 568821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

8.11.2022

Za objednavatele:

Datum:

11.2022

NOVÁK, Aleš (SGCZE)

Od: Martin Staněk <m.stanek@dpova.cz>
Odesláno: pátek 22. dubna 2022 12:15
Komu: NOVÁK, Aleš (SGCZE); Břetislav Mutl; Dokulil Miroslav Ing.
Kopie: Katrín Žeberová
Předmět: II/152 Hrotovice - Dukovany

Message sent from internet with m.stanek@dpova.cz email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, na včerejší pochůzce na stavbě bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD dohodnuto.

1. Propustek bez evidenčního čísla nezjištěného profilu cca v km 3,660 bude nahrazen novým proustem DN600. Technické řešení bude obdobné jako u dalších propustů na stavbě, tzn. plastová trouba DN600 se zkosenými čely a odlážděním vtoku a výtoku. Za výtokem bude realizován vsakovací příkop, který bude lomovým kamenem doveden až k přilehlé meliorační šachtě. Zhotovitel provede zaměření zájmového území a AD zpracuje výkres propustu a soupis prací. Na základě zaměřených výšek bude rozhodnuto o obsypu trouby nebo o obetonování. Projektant prověří nutnost osazení příkopové tvárnice před vtokem v km 3,660-3,800 vlevo.
2. V km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací na p.č. 691 k.ú Slavětice byl nalezen nefunkční propustek. Bylo dohodnuto, že tento propustek bude obnoven a upraven tak, aby byl propustek napojen do odláždění vtoku propustu pod silnicí II/152 v km 3,483. V souladu s vyhláškou č. 107/1997 Sb. § 12 odst. 2. navrhujeme propustek s plastovou troubou DN 400 s obsypem.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí střediska

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel.: +420 595 132 095
+420 777 118 230
e-mail: m.stanek@dpova.cz
www: www.dpova.cz

Tato zpráva a veškeré přílohy jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresátovi. Zpráva může obsahovat osobní údaje nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zmiňovaným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v e-mailu odestráňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odesílá.

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-12

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.12 – SO 101**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 12 týkající se objektu SO 101. Během realizace stavby bylo dohodnuto, že propustek zastižný v km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací bude vybourán a nahrazen propustem novým ve stejném místě. Toto ZBV řeší vybourání uvedeného propustu.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 005		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Odsouhlasení AD – email - počet stran A4 1x

Geodetické zaměření - počet stran A4 1x

Fotodokumentace - počet stran A4 2x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při pochůzce na stavbě dne 21.4.2022 bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD byl v km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací nalezen nefunkční propustek. Bylo dohodnuto, že tento propustek bude obnoven a upraven tak, že bude napojen do odláždění vtoku propustku pod silnici II/152 v km 3,483. V souladu s vyhláškou č. 107/1997 Sb. par. 12 odst 2 byl navržen propustek s plastovou rourou DN400 s obsypem.

Výpočet:

pol.č.2 (9m*1m*1m) = 9m³*1095kč=9855 kč

pol.č.4 (9m*1m*1m) = 9m³*100kč=900 kč

pol.č.5 5,17m³*681kč=3520,77 kč

pol.č.14 8,1m²*0,3m=1,83m³*6000kč=10980 kč

Nové položky:

pol.č.16 9m*2303,50(Cena OTSKP2021 tj. 2710-15%)=20731,50 kč

Měněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	45 987,27 Kč	45 987,27 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 11. 4. 22	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 11. 4. 22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 11. 4. 22	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 11. 4. 22	podpis



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 24.10.2022

Čas: 9:00:38

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotopice - Dukovany DI2

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152

Číslo a název rozpočtu: 005 - Propustky 152-049-050-051

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.13

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílnost celkem v Kč	rozdílnost celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	108,300	117,300	9,000	1 095,00	118 588,50	0,00	9 855,00	128 443,50	9 855,00	8,31
4	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	150,400	159,400	9,000	100,00	15 040,00	0,00	900,00	15 940,00	900,00	5,98
5	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	19,980	25,150	5,170	681,00	13 606,38	0,00	3 520,77	17 127,15	3 520,77	25,88
14	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	67,000	68,830	1,830	6 000,00	402 000,00	0,00	10 980,00	412 980,00	10 980,00	2,73
Nové položky													
16	918346.	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	0,000	9,000	9,000	2 303,50	0,00	0,00	20 731,50	20 731,50	20 731,50	100,00
Celkem								549 234,88	0,00	45 987,27	595 222,15	45 987,27	8,37
Celkem ve změně								955 792,54	0,00	45 987,27	1 001 779,81	45 987,27	4,81
Všechny změny celkem								955 792,54	0,00	310 045,49	1 265 838,03	45 987,27	4,81

COLAS CZ, a.s.

ontast Jih, provozovna (řebíč

Borohov

DIČ: CZ26177005 (1)

tel: 568823921, Fax: 568821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

8. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum:

8. 11. 2022

NOVÁK, Aleš (SGCZE)

Od: Martin Staněk <m.stanek@dpova.cz>
Odesláno: pátek 22. dubna 2022 12:15
Komu: NOVÁK, Aleš (SGCZE); Břetislav Mutl; Dokulil Miroslav Ing.
Kopie: Katrin Žeberová
Předmět: II/152 Hrotovice - Dukovany

Message sent from Internet with m.stanek@dpova.cz email address

Security warning : Do not click on the links or attachments contained in this message unless you are sure of the sender's address.

Dobrý den, na včerejší pochůzce na stavbě bylo za účasti zhotovitele, TDS a AD dohodnuto.

1. Propustek bez evidenčního čísla nezjištěného profilu cca v km 3,660 bude nahrazen novým proustem DN600. Technické řešení bude obdobné jako u dalších propustů na stavbě, tzn. plastová trouba DN600 se zkosenými čely a odlážděním vtoku a výtoku. Za výtokem bude realizován vsakovací příkop, který bude lomovým kamenem doveden až k přilehlé meliorační šachtě. Zhotovitel provede zaměření zájmového území a AD zpracuje výkres propustu a soupis prací. Na základě zaměřených výšek bude rozhodnuto o obsypu trouby nebo o obetonování. Projektant prověří nutnost osazení příkopové tvárnice před vtokem v km 3,660-3,800 vlevo.
2. V km 3,484 vlevo pod účelovou komunikací na p.č. 691 k.ú Slavětice byl nalezen nefunkční propustek. Bylo dohodnuto, že tento propustek bude obnoven a upraven tak, aby byl propustek napojen do odláždění vtoku propustu pod silnicí II/152 v km 3,483. V souladu s vyhláškou č. 107/1997 Sb. § 12 odst. 2. navrhujeme propustek s plastovou troubou DN 400 s obsypem.


S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí střediska

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Masarykovo nám. 5/5
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
tel. +420 595 132 085
+420 777 110 230
e-mail: m.stanek@dpova.cz
www: www.dpova.cz

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odesílala.



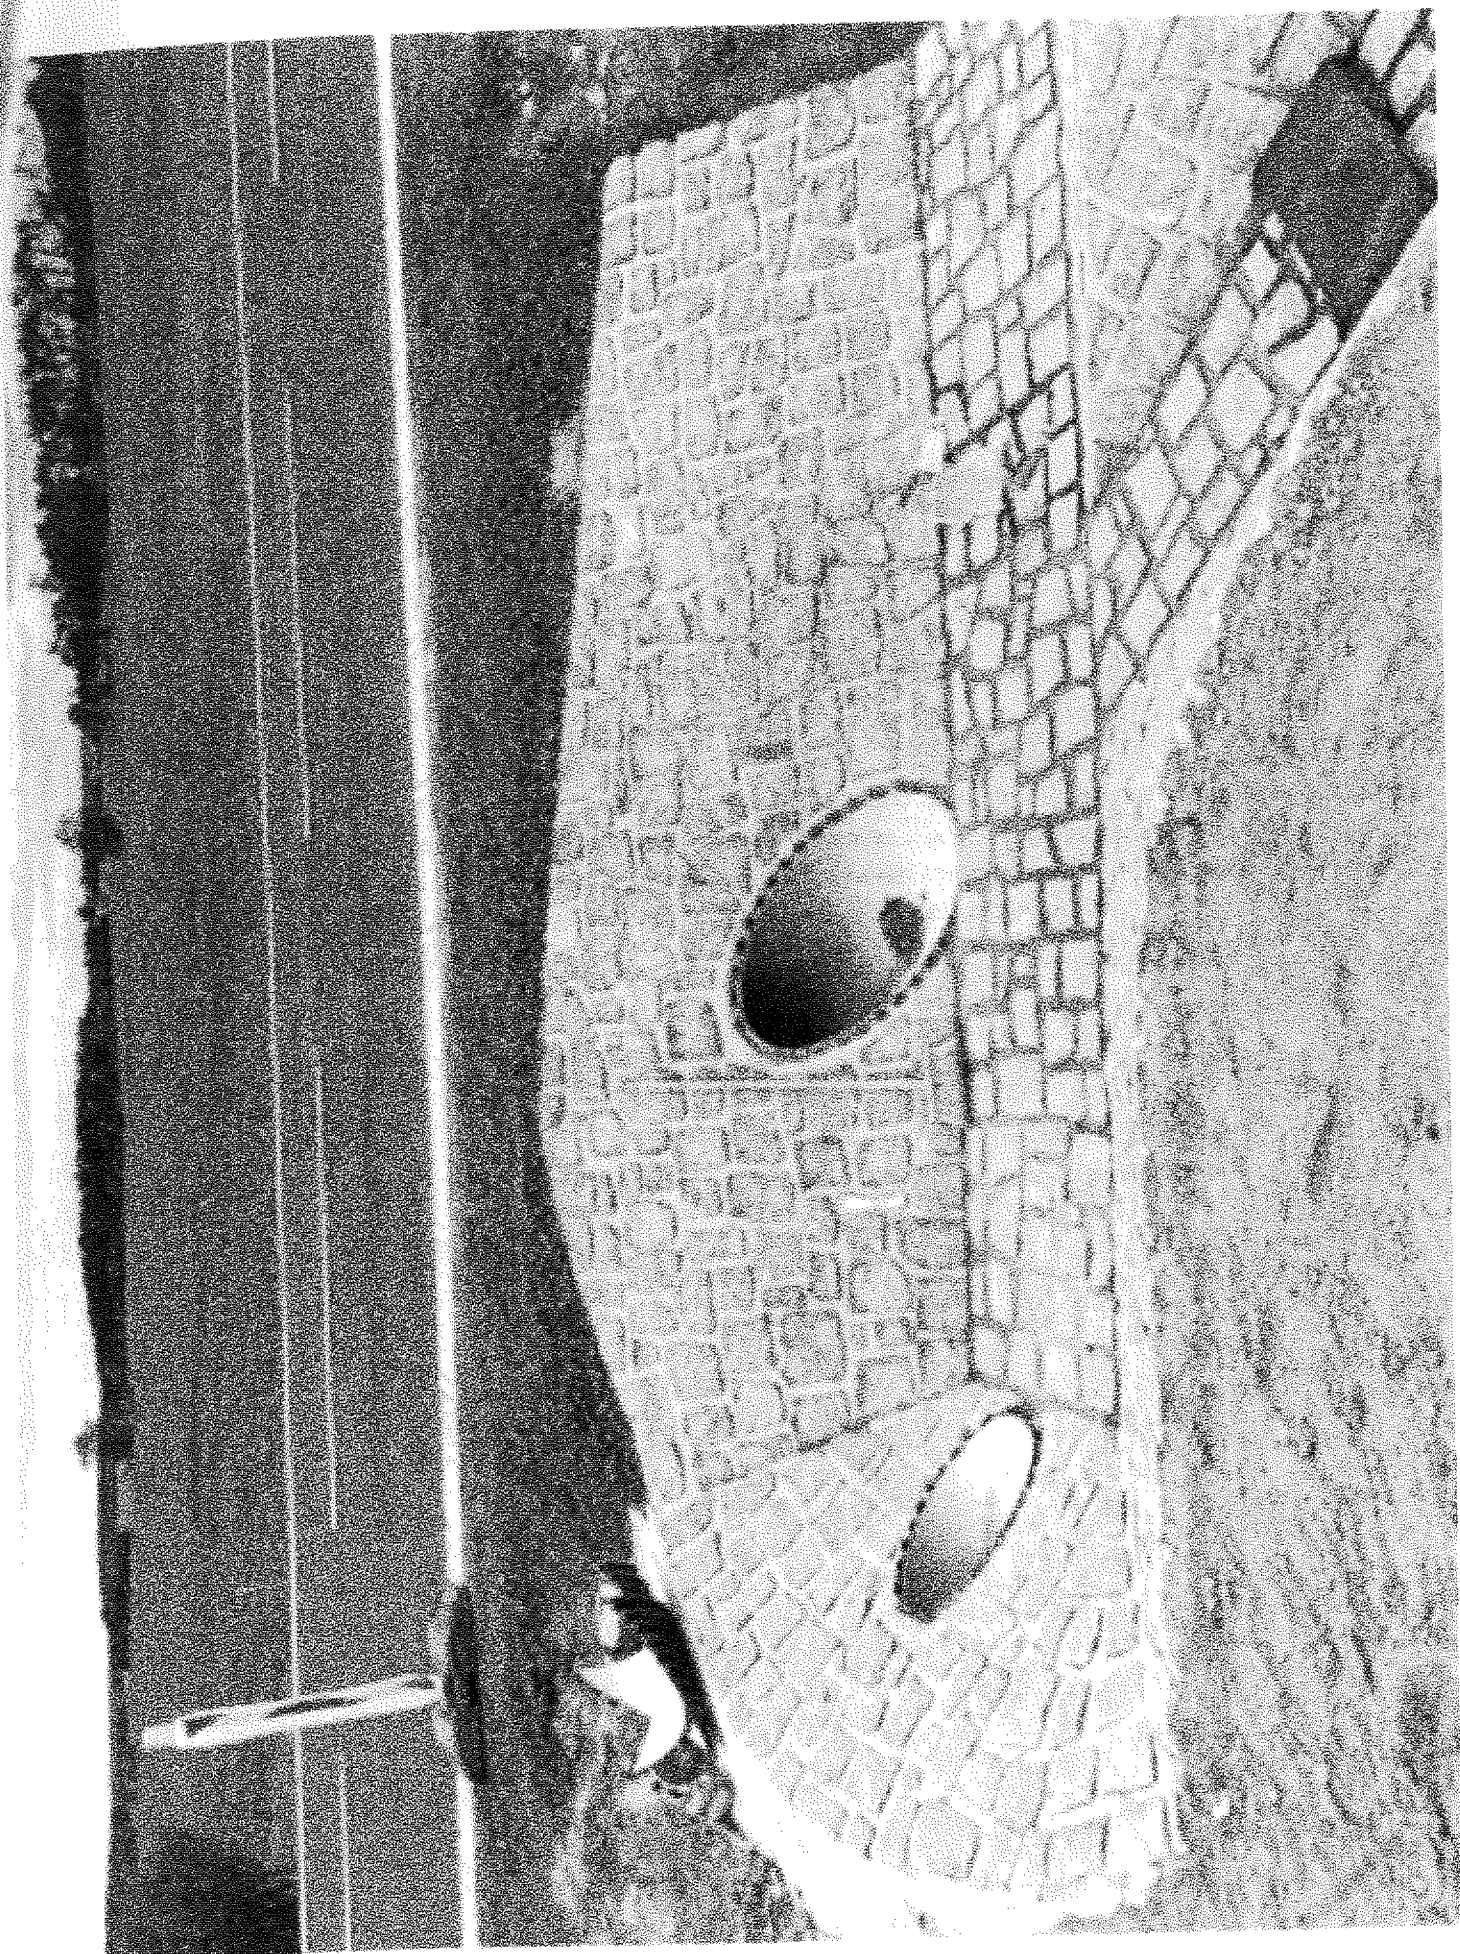

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY U ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-13

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.13 – SO 101**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 13 týkající se objektu SO 101 části propustu. Během realizace stavby bylo dohodnuto, že propustek zastižený v km 3,484 pod účelovou komunikací bude vybourán a nahrazen propustem novým ve stejném místě. V rámci tohoto ZBV je řešeno vybudování nového propustu.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 14
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 006		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Technická zpráva - počet stran A4 1x

Geodetické zaměření - počet stran A3 2x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Úprava hospodářských sjezdů v extravilánech byla provedena dle technické zprávy a to v položení vrstev v nutné délce potřebné pro plynulé napojení.

Výpočet:

pol.č.1 rozpočet 1016,6m² – skutečnost 932,7*1,3=1212,51m²) =1212,51-1016,6=195,91*296kč=57 989,36kč

pol.č.2 rozpočet 782m² – skutečnost 932,7m²=932,7-782=150,7*114kč=17179,80kč

pol.č.4 rozpočet 782m² – skutečnost 932,7m²=932,7-782=150,7*46kč=6932,20kč

pol.č.7 rozpočet 792m² – skutečnost 932,7m²=932,7-792=140,7*6kč=844,20kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	82 945,56 Kč	82 945,56 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum	11.7.2021	podpis	
Technický dozor investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	11.7.2021	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	11.7.2021	podpis	
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum	11.7.2021	podpis	



Aspe

Firma: Nabídka Marek

Strana: 1

3.13.1

Datum: 11.10.2022

Čas: 12:58:22

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 006 - místní komunikace a hospodářské sjezdy								č. ZBV č.14					
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	1 016,600	1 212,510	195,910	296,00	300 913,60	0,00	57 989,36	358 902,96	57 989,36	19,27
2	567326.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	782,000	932,700	150,700	114,00	89 148,00	0,00	17 179,80	106 327,80	17 179,80	19,27
4	572731.	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	782,000	932,700	150,700	46,00	35 972,00	0,00	6 932,20	42 904,20	6 932,20	19,27
7	57621.	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	792,000	932,700	140,700	6,00	4 752,00	0,00	844,20	5 596,20	844,20	17,77
		Celkem						430 785,60	0,00	82 945,56	513 731,16	82 945,56	19,25
		Celkem ve změně						890 992,60	0,00	82 945,56	973 938,16	82 945,56	9,31
		Všechny změny celkem						890 992,60	0,00	82 945,56	973 938,16	82 945,56	9,31

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 Brněnská 343, 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ617700 (1)
 tel: 568823921, Fax: 568821007

Za zhotovitele: Aleš Novák

Datum: 8.11. 2022

Za objednatele:

Datum: 11.10.2022

- km 1,19000 vpravo
- km 1,33500 vlevo
- km 1,38200 vpravo
- km 3,80140 vlevo
- km 3,81100 vpravo
- km 3,96400 vpravo
- km 4,06300 vpravo
- km 4,12900 vpravo
- km 4,12900 vlevo
- km 4,16100 vlevo
- km 4,24100 vpravo
- km 4,34700 vpravo
- km 4,54300 vlevo
- km 4,55700 vpravo

Sjezdy k nemovitostem a hospodářské sjezdy

Součástí silnice II/152 je plynulé napojení okolních pozemků hospodářskými sjezdy ve extravilánech a sjezdy k nemovitostem. Jedná se pouze o obnovení stávajících sjezdů ve stávajících místech, se zřizováním nových sjezdů není uvažováno.

V intravilánech obcí je rekonstrukce navržena mezi stávajícími dvouřádky ze žulových kostek. Je nutné, aby v případě, že by bylo nutné tento dvouřádek vybourat a osadit znovu, byl výškový rozdíl mezi vozovkou a silniční obrubou u sjezdů k nemovitostem v rozmezí 20-50mm, v odůvodněných případech max. 70mm.

V extravilánech je délka úprav hospodářských sjezdů navržena s ohledem na stávající výškové poměry.

Úprava hospodářských sjezdů v extravilánech představuje vybourání celé stávající vozovky sjezdů a následné položení všech konstrukčních vrstev v nutné délce potřebné pro plynulé napojení.

Konstrukce vozovky hospodářských sjezdů je navržena:

Dopravní zatížení VI, úroveň porušení vozovky D2, Katalogový list PN 6-3:

Nátěr dvouvrstvový asfaltový	N DV-A fr.kameniva (8/11-4/8) mm. kameniva (6-13 kg/m ² a 4-10 kg/m ²) pojivo 1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m ²	ČSN EN 12271, ČSN 73 6129
R-materiál	R-mat TP 208	100 mm
Štěrkodř	ŠD _A 0/32 GE	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285 200 mm
Celkem		min. 360 mm

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min 45 MPa.

Na stávající sil. II/152 se napojují následující hospodářské sjezdy a sjezdy k nemovitostem:

- km 0,03900 vpravo
- km 0,04950 vpravo
- km 0,16650 vlevo
- km 0,21250 vpravo

STEDY 2021 - DROUŽEVÝ ÚSTED

Asfaltová vrstva obrusná tl.40mm
2562,14m

Asfaltová vrstva obrusná tl.40mm
5189,4m²

SJEZD 295,6m²



15m



**DOPRAVO PROJEKT
OSTRAVA**

Projektová inženýrská a konzultační

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-14

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.14 – SO 101**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 14 týkající se objektu SO 101 část místní komunikace a hospodářské sjezdy. Úprava hospodářských sjezdů byla v souladu s PD provedena v nezbytně nutném rozsahu pro plynulé napojení sjezdů na navazující komunikace. Skutečný rozsah prací je doložen geodetickými protokoly. Jedná se o doměření zařaditelné do skupiny do skupiny 1 – Vyhrazené změny.
Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 15
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 002		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Fotodokumentace - počet stran A4 3x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Pro budoucí využití a instalaci dalších sítí (internet, kabelová televize atp.) je vhodné přidat ještě jeden kus chráničky do římsy mostu – pozdější realizace by nebyla možná.

Výpočet:


pol.č.3 délka římsy mostu 8m*250kč=2000kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum 6. 11.	podpis 
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 11. 11.	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 6. 11.	podpis 
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 8. 11.	podpis 



Aspe

Firma: Nabídky Marek

Strana: 1

3.13.1

Datum: 11.10.2022

Čas: 13:19:48

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 152-023													
Číslo a název rozpočtu: 002 - vedlejší aktivita								č. ZBV č.15					
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl cen celkem v Kč	rozíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	48,000	48,000	8,000	250,00	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00	2 000,00	20,00
		Celkem						10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00	2 000,00	20,00
		Celkem ve změně						10 781,20	0,00	2 000,00	12 781,20	2 000,00	18,55
		Všechny změny celkem						10 781,20	0,00	2 000,00	12 781,20	2 000,00	18,55

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 Brněnská 10, 672 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel: 566823921, Fax: 566821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák


Datum:


8.11. 2022


Za objednatele:

Datum:

11. 2022

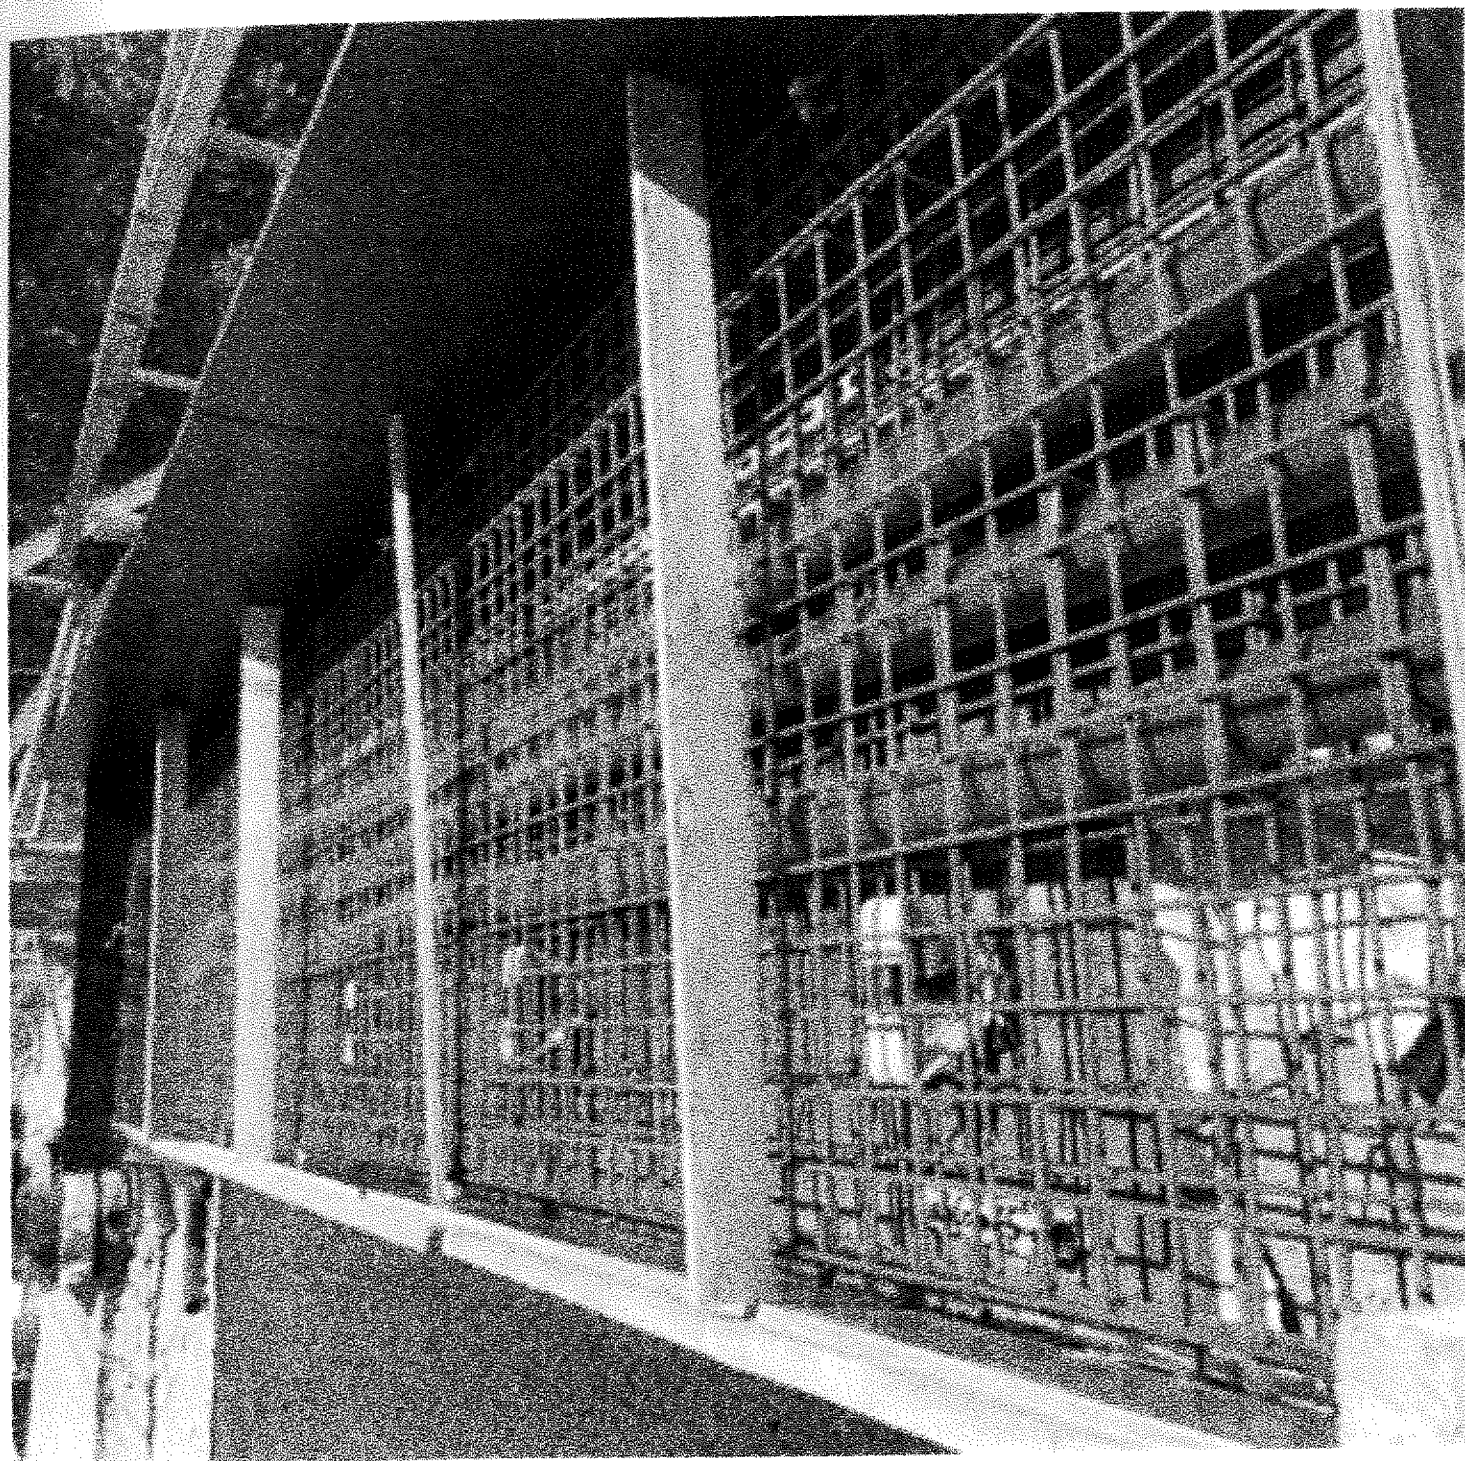

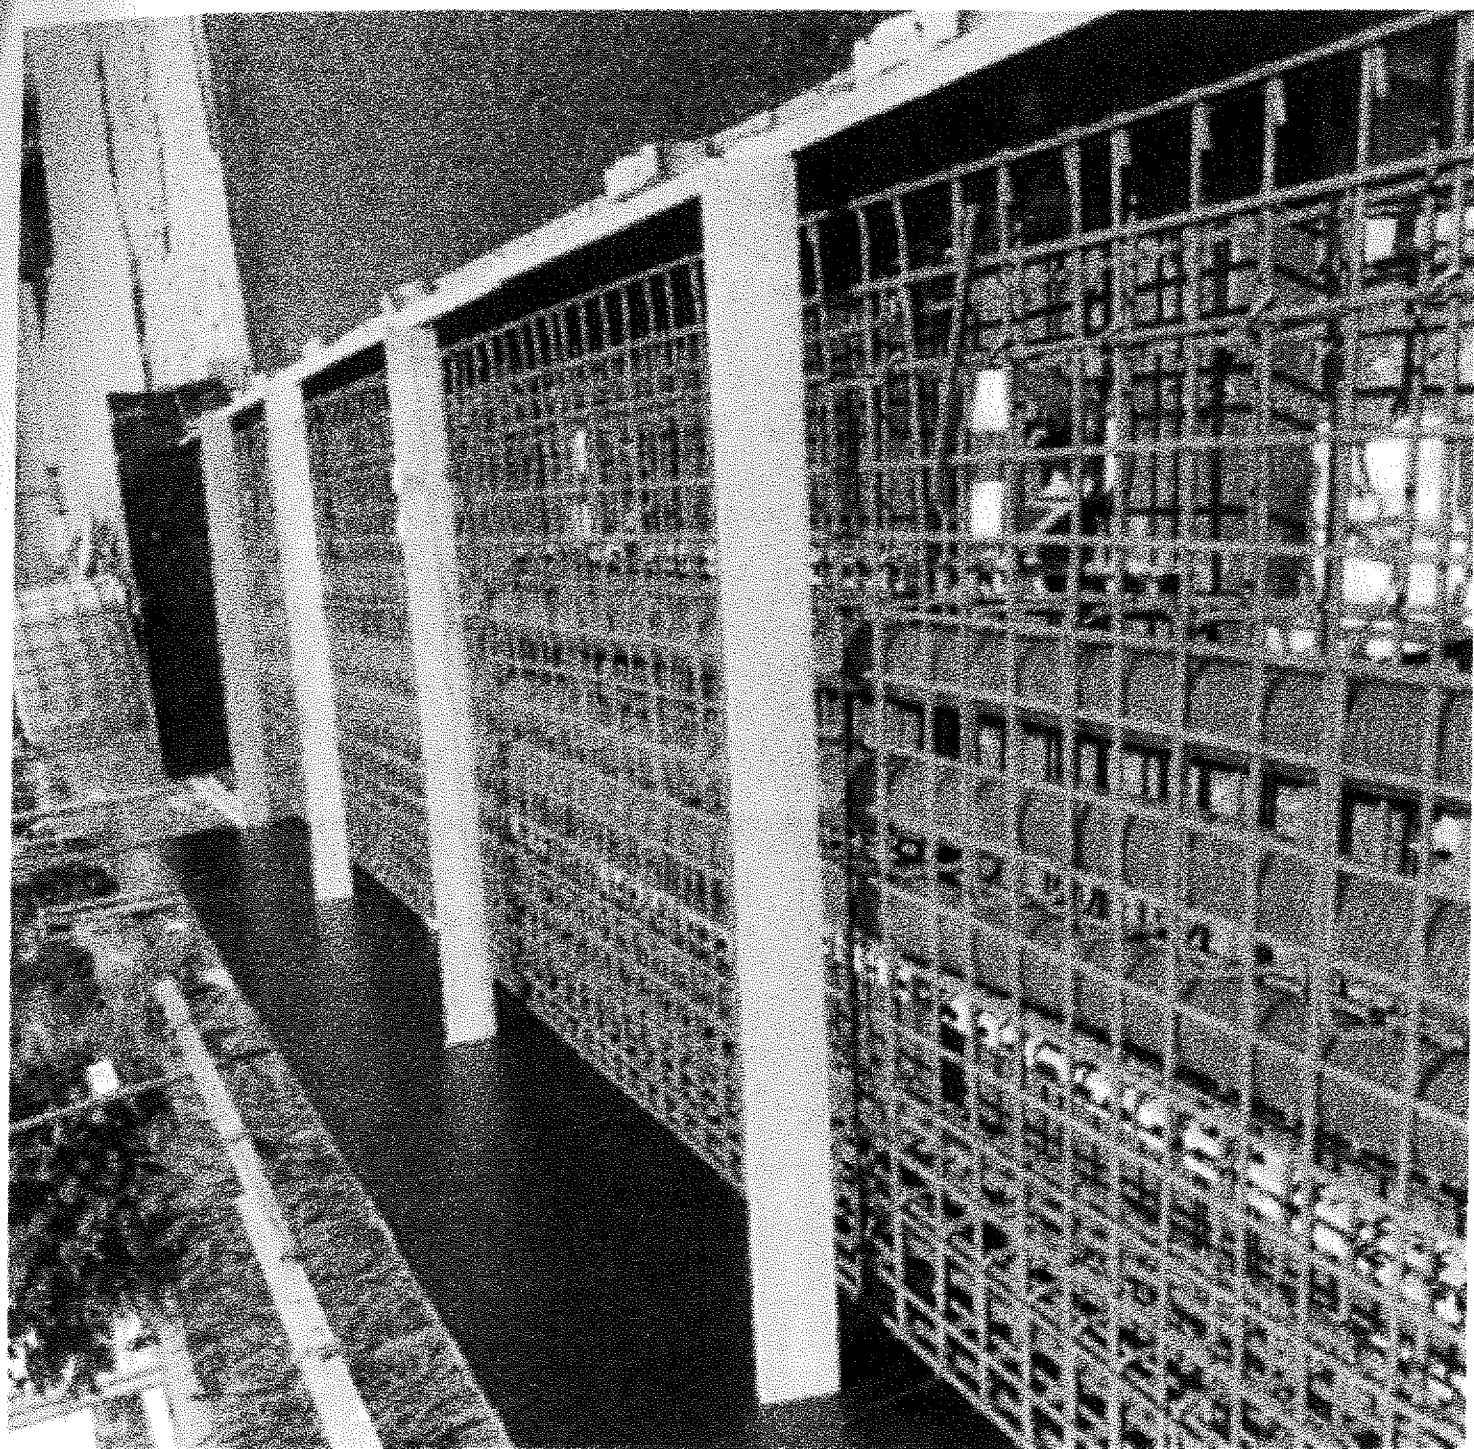

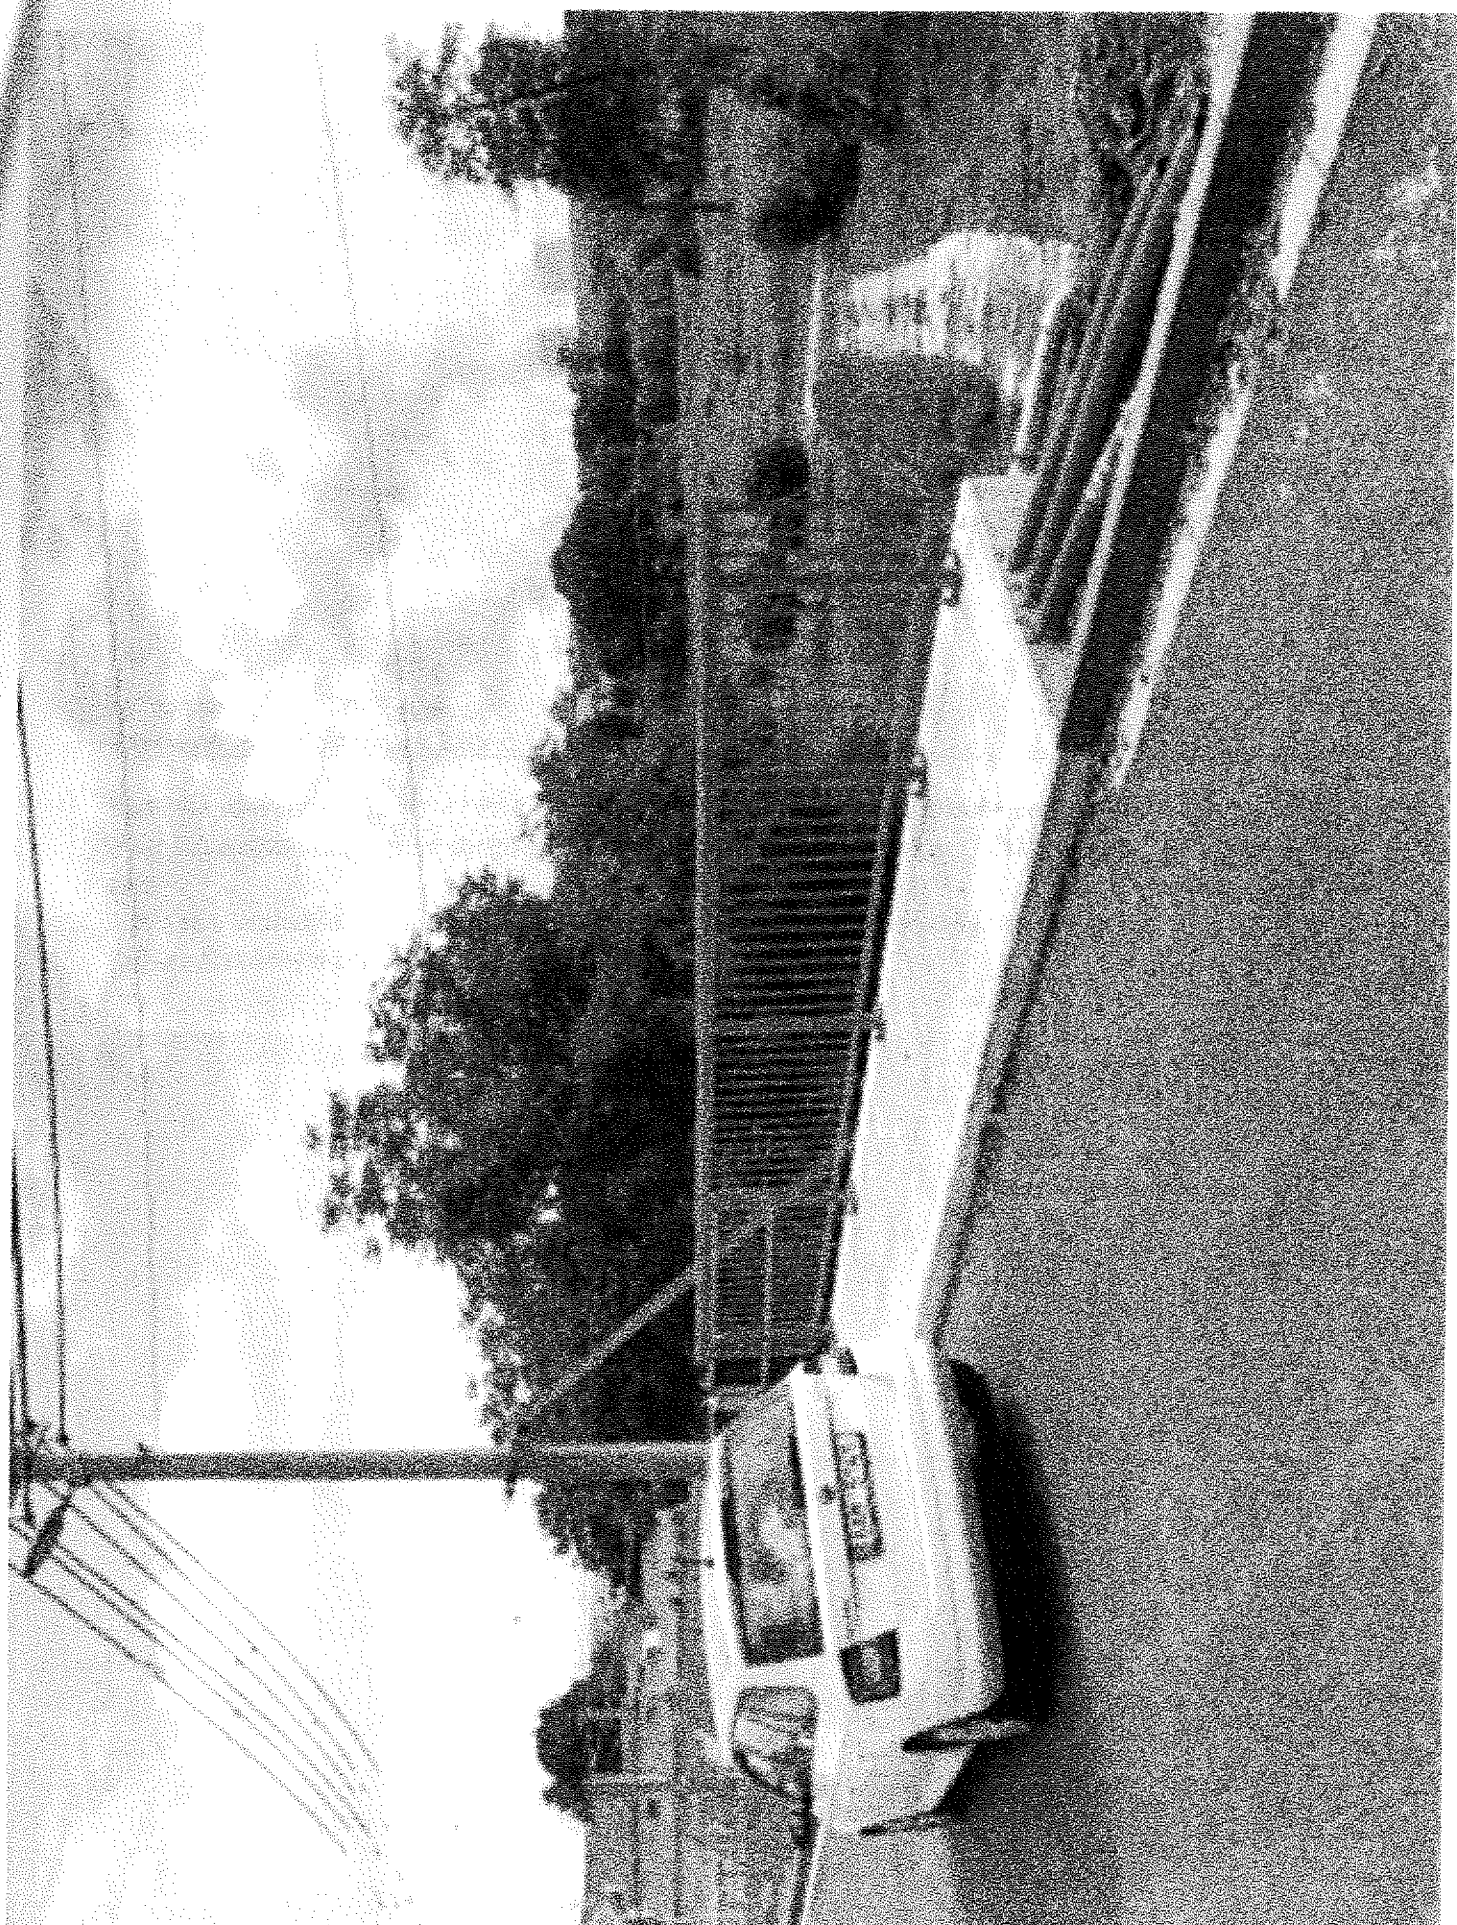

**DOPRAVO PROJEKT
OSTRAVA**

o b e d o v a

a k o n z u l t a c i o n e r g n i z a c e

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-15

VYŘÍZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**III/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.15 – SO 201**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 15 týkající se objektu SO 201. Na základě požadavku správce mostu bylo dohodnuto přidání dodatečné chráničky do římsy mostu pro možnou budoucí instalaci dalších telekomunikačních sítí.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.
Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem


Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 16
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Geodetické zaměření- počet stran A4 3x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala nutnost sejmutí dmu na místech, kde to projekt nepředpokládal.

Výpočet:

pol.č.4 rozpočet 13109m2-zaměření 20361,1m2=7252,1m2*23kč=166798,3kč

pol.č.13 7252,1m2*0,1m=725,21m3*100=72521kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných
Méněprací

-0,00 Kč

Cena navrhovaných
Víceprací

239 319,30 Kč

Cena navrhovaných Méně
a Víceprací celkem

239 319,30 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum	podpis
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum	podpis

3.13.1

Datum: 12.10.2022

Čas: 7:21:20

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)								č. ZBV č.16					
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	13 109,000	20 361,100	7 252,100	23,00	301 507,00	0,00	166 798,30	468 305,30	166 798,30	55,32
13	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 173,700	6 898,910	725,210	100,00	617 370,00	0,00	72 521,00	689 891,00	72 521,00	11,75
		Celkem						918 877,00	0,00	239 319,30	1 158 196,30	239 319,30	26,04
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	239 319,30	44 409 384,58	239 319,30	0,54
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	1 071 764,00	45 241 829,28	239 319,30	0,54

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 Brněnská 111, 672 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel.: 568823921, Fax: 568821000


Za zhotovitele:


Aleš Novák


Datum: 8. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum: 8. 11. 2022

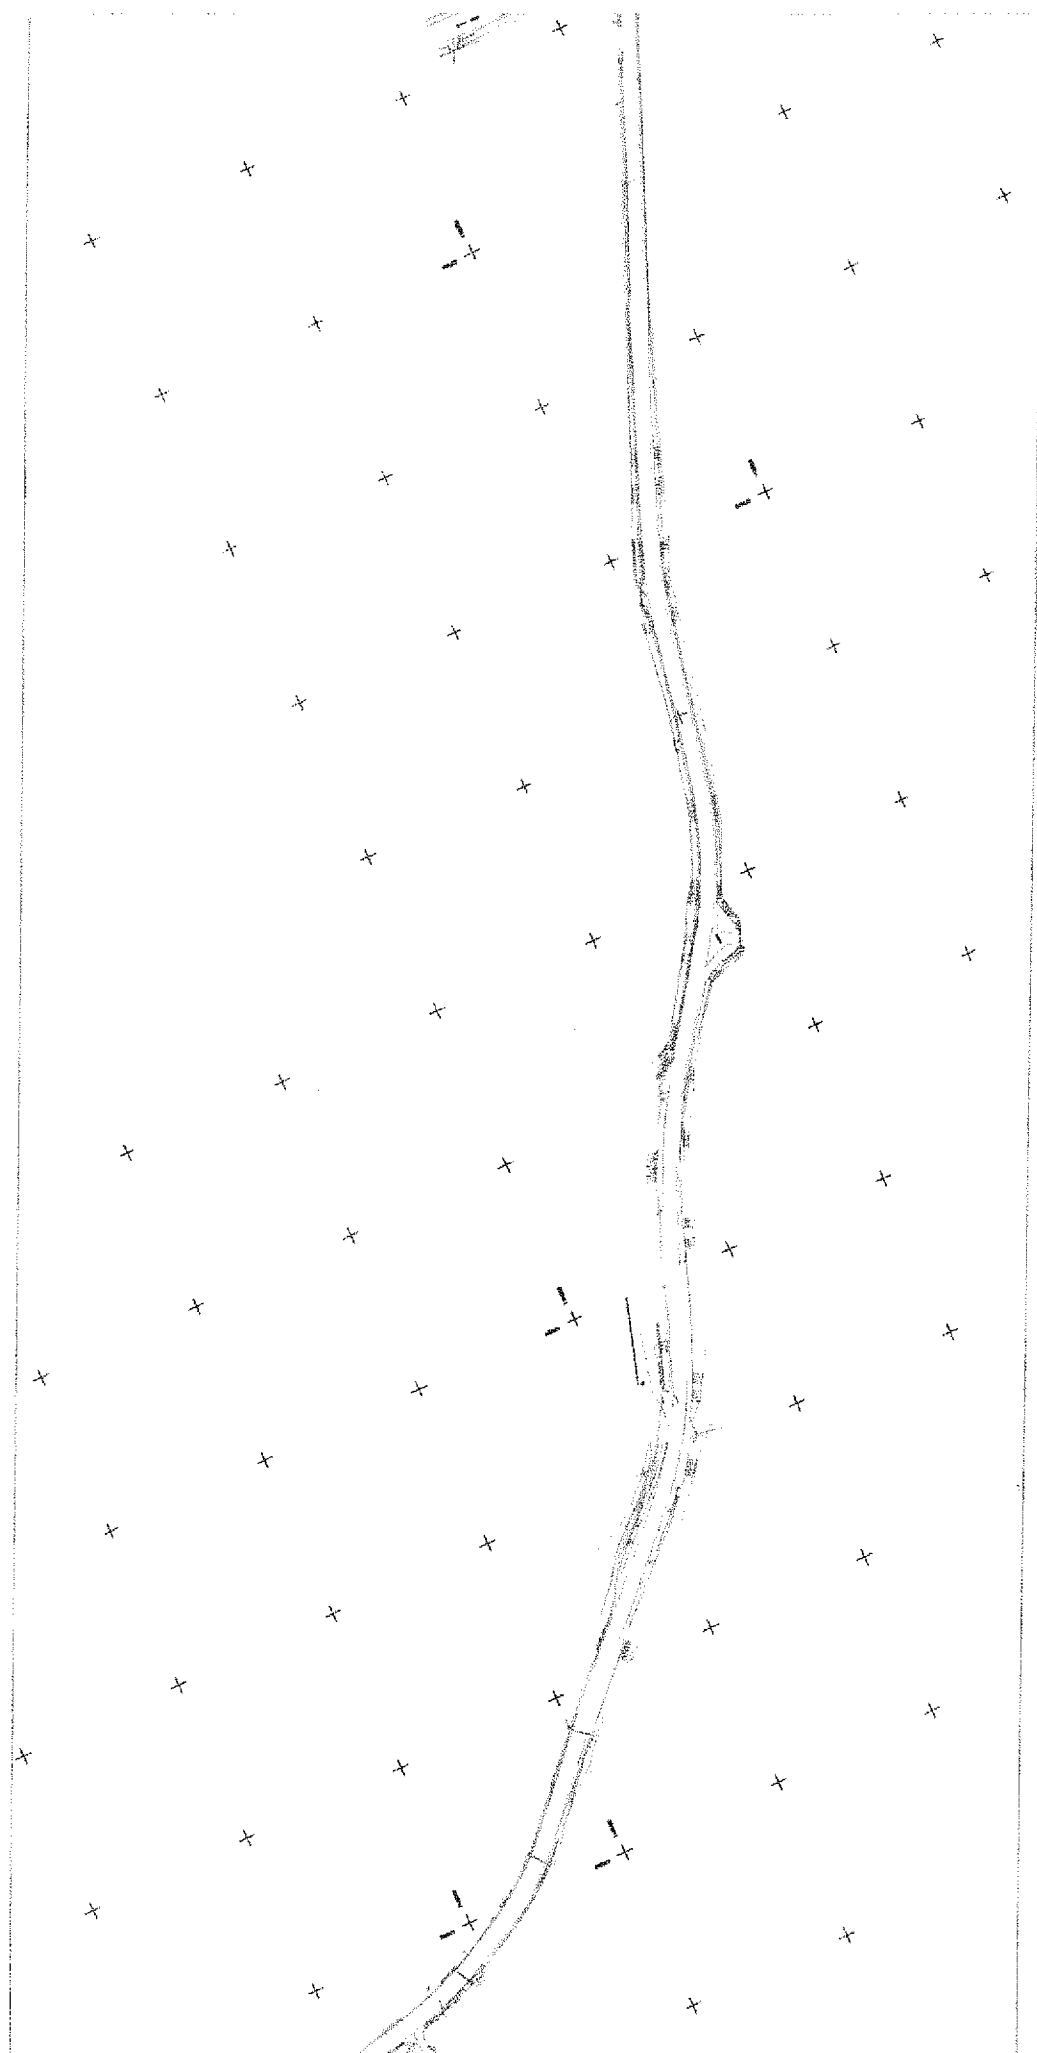

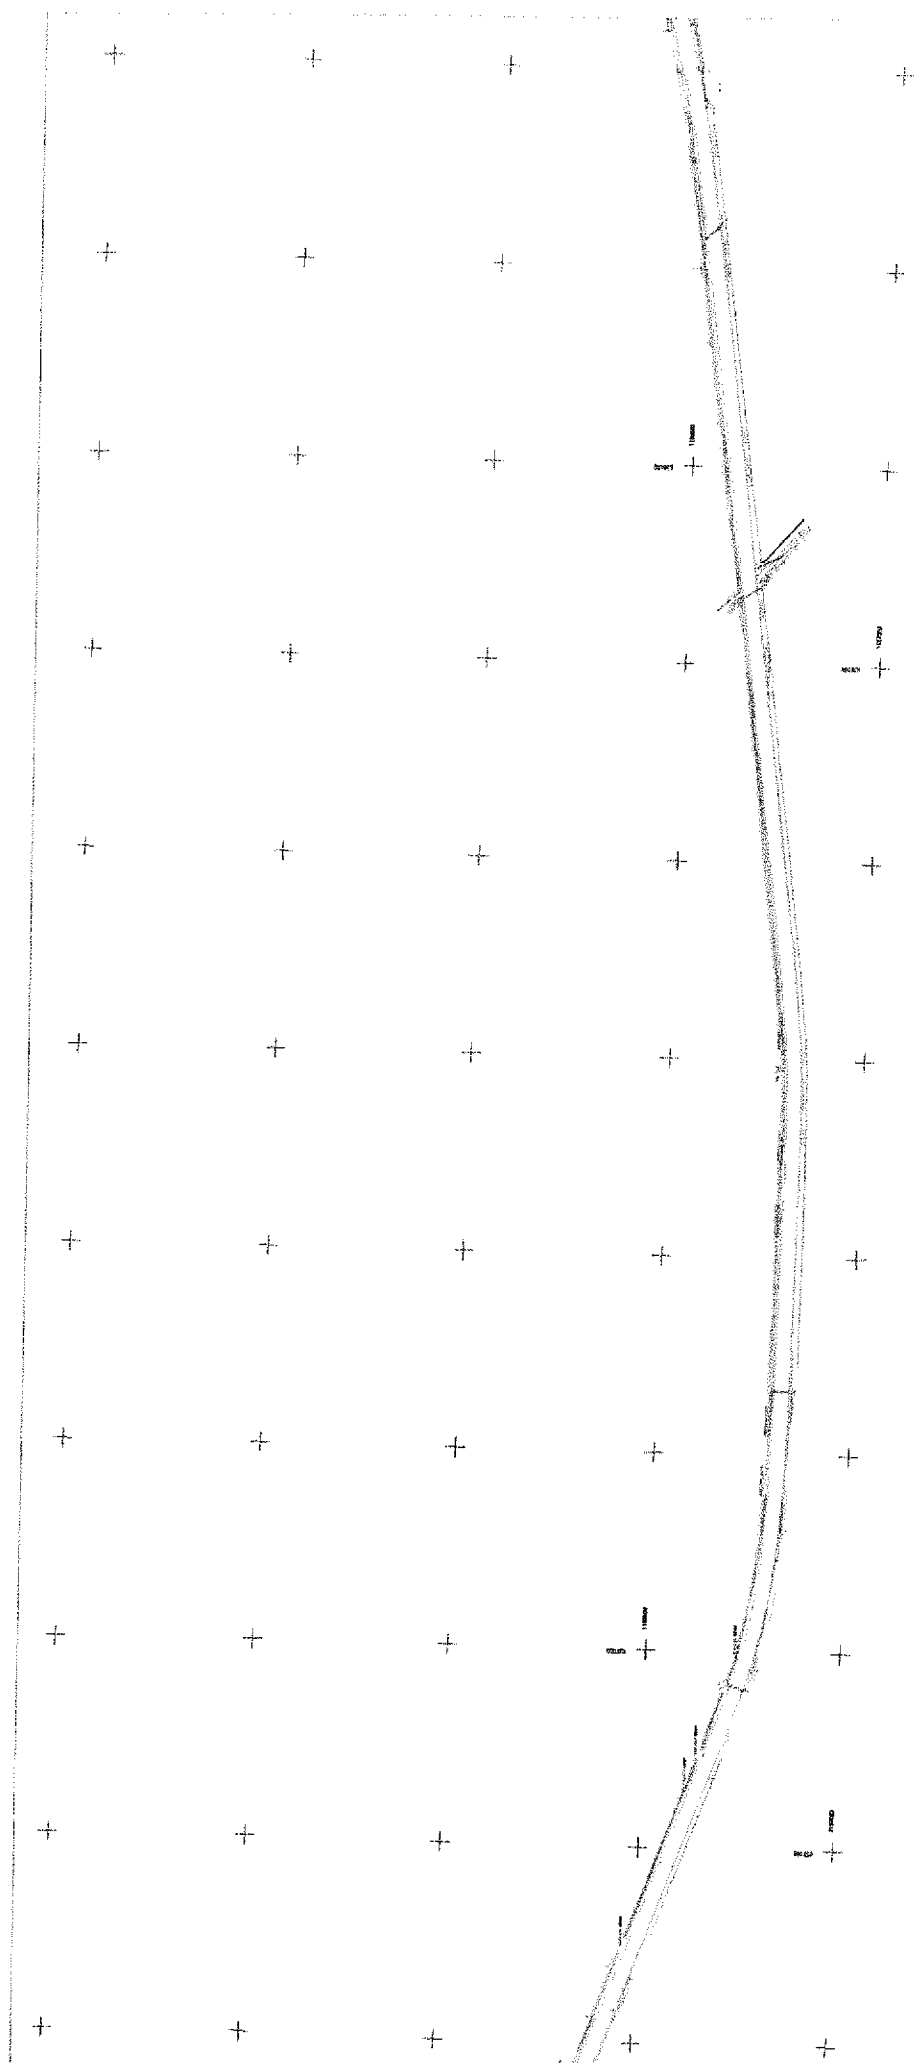

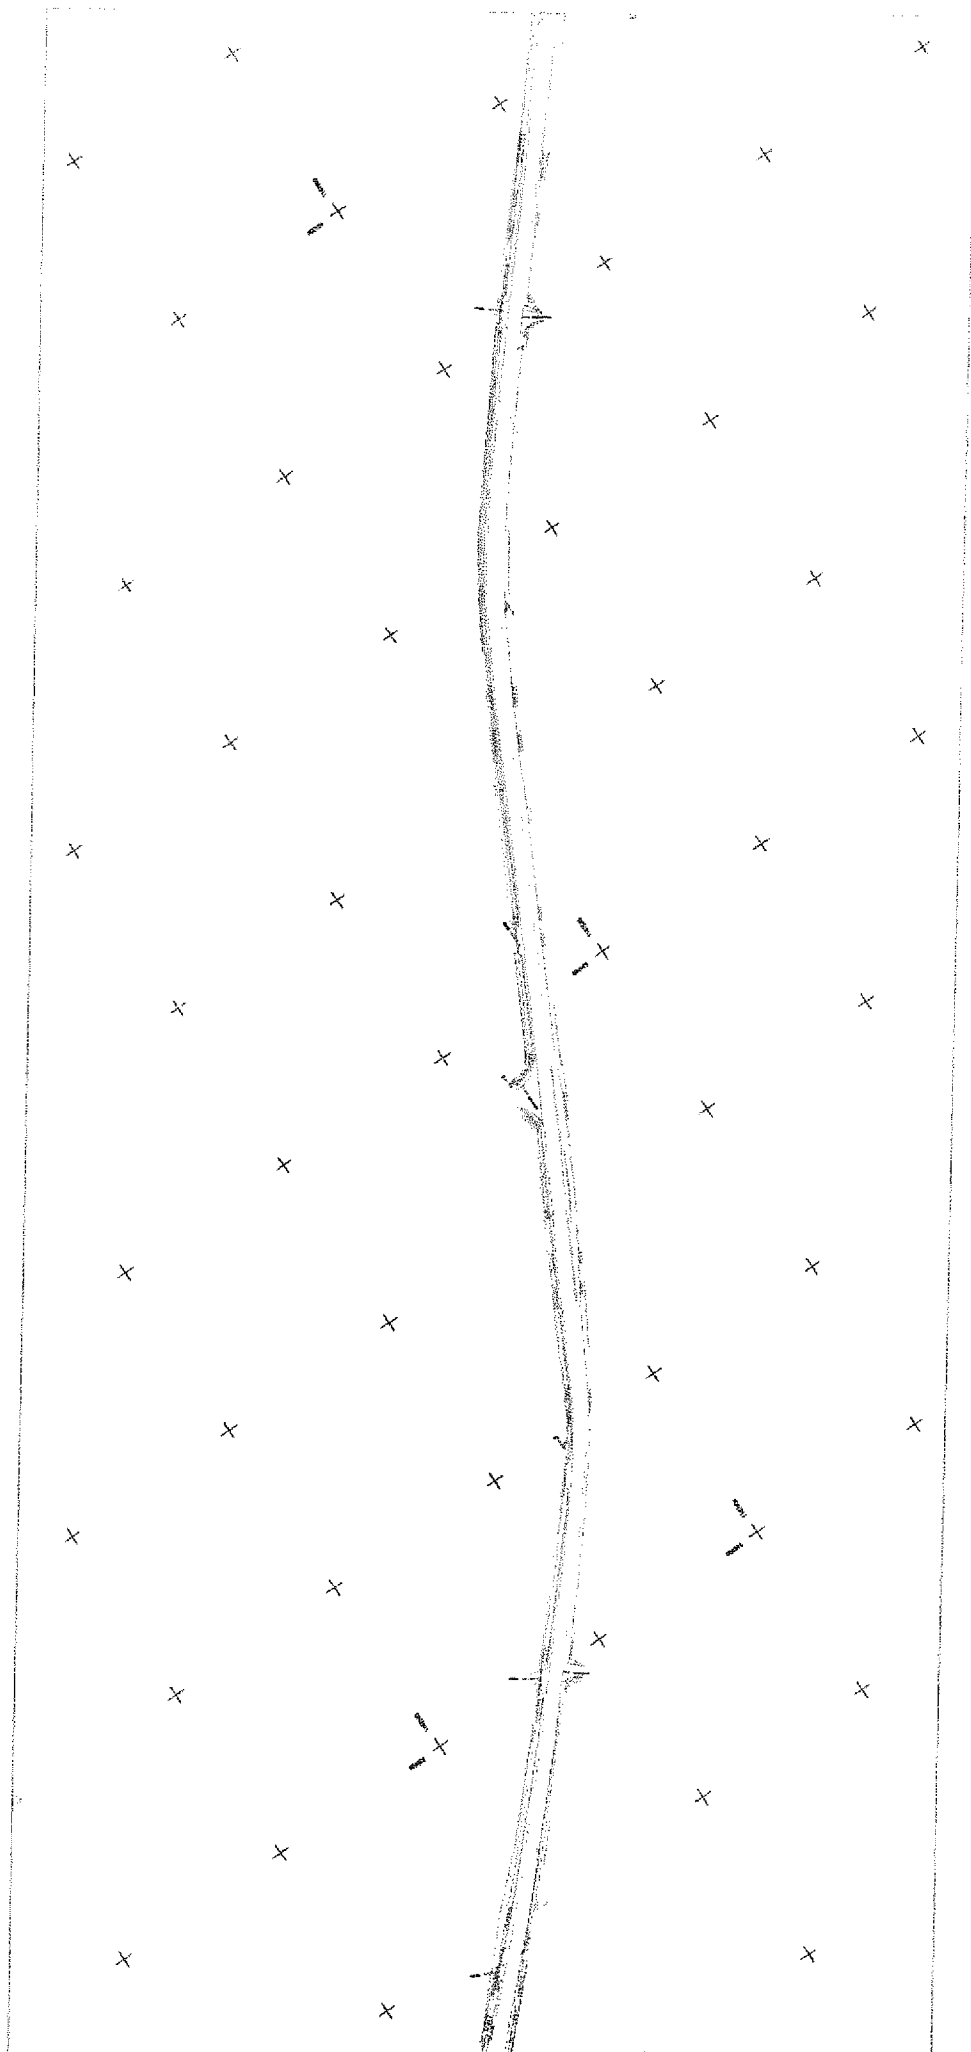

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Projektová

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-16

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.16 – SO 101.2**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 16 týkající se objektu SO 101.2. Během realizace stavby byl upřesněn rozsah položek sejmutí drnů a uložení sypaniny do násypu. Skutečný rozsah prací je doložen geodetickými protokoly. Jedná se o doměření zařaditelné do skupiny do skupiny 1 – Vyhrazené změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme

S pozdravem

**Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant**

DOPRAVOPROJEKT s.r.o.

email: info@dopravoprojekt.cz

Banžovská 100/1, 602 00 Brno

Společnost je založena v ČR (IČO: 253 11 111) a je zapsána v obchodním rejstříku.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba

Číslo SO/PS/

Číslo změny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201

Číslo změny

stavby

SO/PS

17

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Fotodokumentace- počet stran A4 2x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala nutnost dodláždění napojení římsy mostu na okolní terén, kde to projekt nepředpokládal.

Výpočet:

pol.č.30 (1m*1,55m*2strany)=3,1m2*0,2m=0,62m3*12000kč=7440kč

Nová položka -- cena stávající rozpočet -- jiné SO

pol.č.57 5,37m*395=2121,15kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	9 561,15 Kč	9 561,15 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum 11. 1. 2021	podpis
Technický dozor investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 11. 1. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 11. 1. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 11. 1. 2021	podpis



Aspe

Firma: Nabídka Marek

Strana: 1

3.13.1

Datum: 12.10.2022

Čas: 8:06:23

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 152-023
 Číslo a název rozpočtu: 001 - Most ev.č. 152-023

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.17

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdil cen celkem v Kč	rozdil cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	465312.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	28,000	28,620	0,620	12 000,00	336 000,00	0,00	7 440,00	343 440,00	7 440,00	2,21
		Nové položky											
57	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	0,000	5,370	5,370	395,00	0,00	0,00	2 121,15	2 121,15	2 121,15	100,00
		Celkem						336 000,00	0,00	9 561,15	345 561,15	9 561,15	2,85
		Celkem ve změně						5 068 478,95	0,00	9 561,15	5 078 040,10	9 561,15	0,19
		Všechny změny celkem						5 068 478,95	-640 168,84	396 237,26	4 824 347,37	9 561,15	0,19

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 inž. J. Kolář Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel: 568823921, Fax: 568821120

Aleš Novák


Za zhotovitele:


Datum: 8.11. 2022

Za objednatele:

Datum:

8. 11. 2022

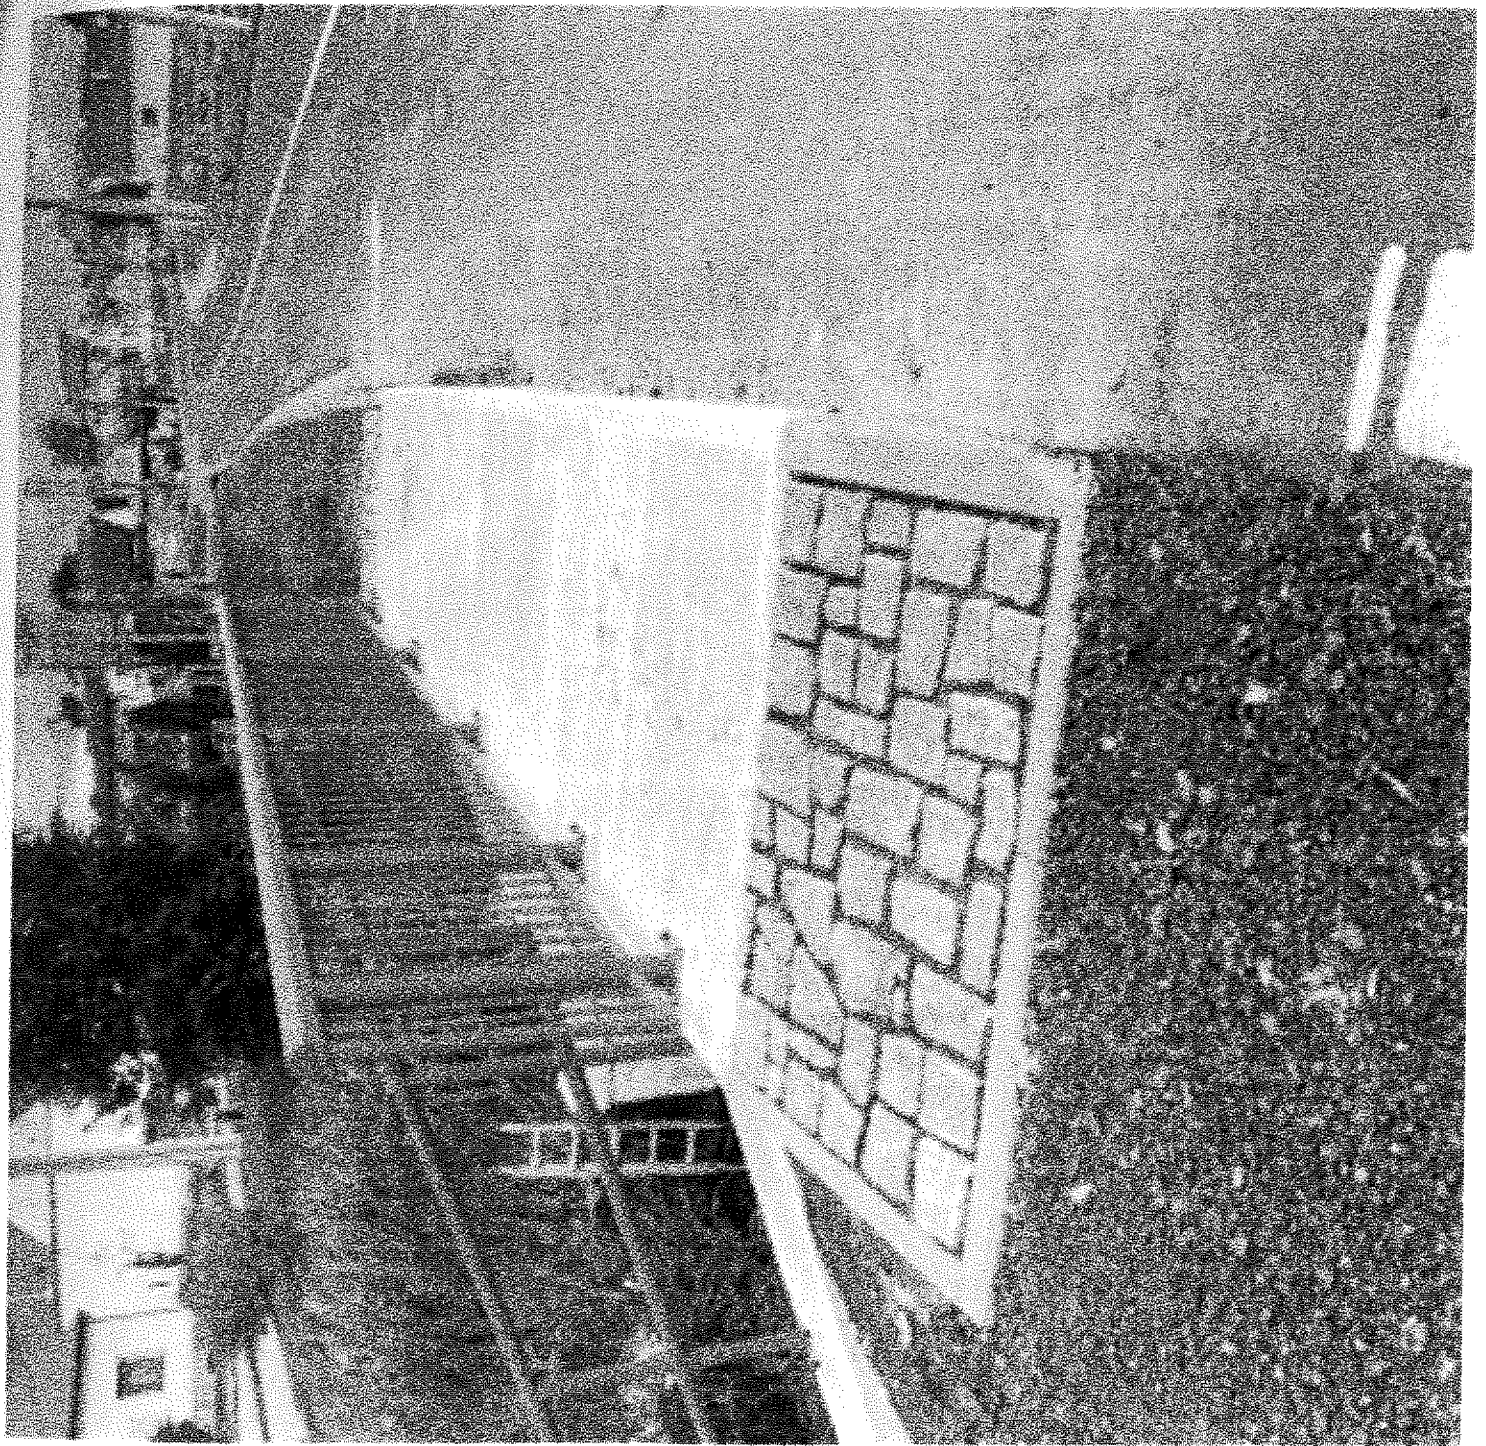

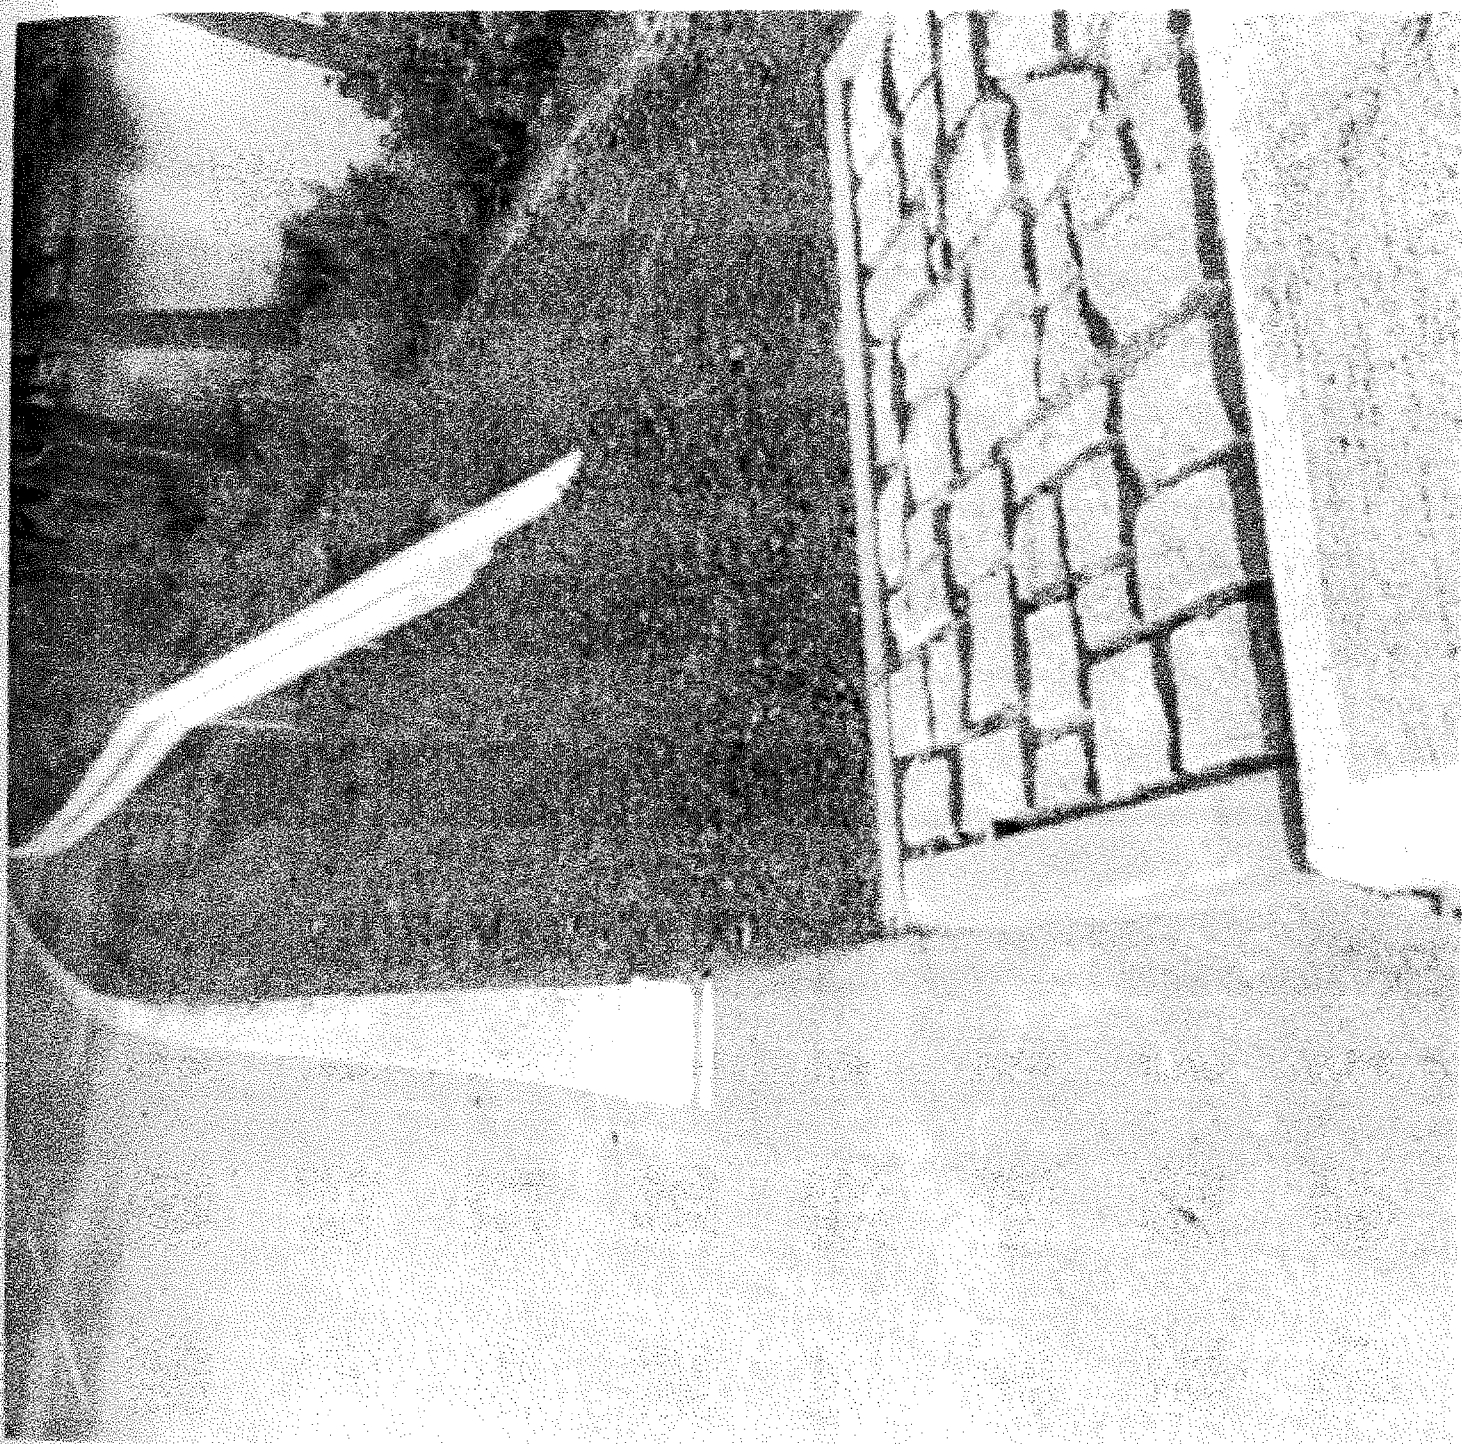

ORGANIZOC

OSTRAVA
8.11.2022

VỀ

II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.17 – SO 101

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 17 týkající se objektu SO 201. Během realizace stavby bylo dle skutečného sklonu terénu v blízkosti mostu upraveno technické řešení napojení mostní římsy na okolní terén. Byly navrženy a provedeny betonové obrubníky v napojení na římsu a dodláždění z lomového kamene.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba

Číslo SO/PS/

Číslo změny

Číslo změny

stavby

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2

SO/PS

18

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala nutnost výškově upravit dalších 8 ks poklopů, kde to projekt nepředpokládal.

Výpočet:





pol.č.39 8ks*1200kč=9600kč

Měněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	9 600,00 Kč	9 600,00 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum	1. 11. 2022	podpis	
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	11. 11. 2022	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	11. 11. 2022	podpis	
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum	11. 11. 2022	podpis	

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotopice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.18

poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	43,000	51,000	8,000	1 200,00	51 600,00	0,00	9 600,00	61 200,00	9 600,00	18,60
		Celkem						51 600,00	0,00	9 600,00	61 200,00	9 600,00	18,60
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	9 600,00	44 179 665,28	9 600,00	0,02
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	1 081 364,00	45 251 429,28	9 600,00	0,02

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 B. 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel.: 568823921, Fax: 568821000

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

8.11.2022

Za objednatele:

Datum:

8.11.2022

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ů ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-18

VYŘÍZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**III/152 Hrotopice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.18 – SO 101.2**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 18 týkající se objektu SO 101.2. Na základě skutečného množství zastížených poklopů, z nichž některé byly překryty AHV, byla provedena jejich výšková úprava.

Jedná se o doměření zařaditelné do skupiny do skupiny 1 – Vyhrazené změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

**Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant**

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 19
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 ZOV		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Situace - počet stran A4 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci mostu vyvstala nutnost zřízení obslužné panelové komunikace k dopravě materiálu (beton, dlažební kámen, apod.), kdy toto byla jediná možnost jak tento materiál pro práce pod mostem dopravit na místo.

Výpočet:

Nové položky:

pol.č.3 (54,5m*3m)=163,5m2*0,2m=32,7m3*50,15kč=1639,91kč, cena OTSKP2021 59kč-15%=50,15kč
pol.č.4 (54,5m*3m)=163,5m2*29kč=4741,50kč, cena rozpočet jiné SO
pol.č.5 (54,5m*3m)=163,5m2*0,2m=32,7m3*764,15kč=24987,71kč, cena OTSKP2021 899kč-15%=764,15kč
pol.č.6 (54,5m*3m)=163,5m2*1343kč=219580,50kč, cena OTSKP2021 1580kč-15%=1343kč
pol.č.7 163,5m2*(0,18m+0,2m)=62,13m3*403,75kč=25084,99kč, cena OTSKP2021 475kč-15%=403,75kč
pol.č.8 32,7m3*162,35kč=5308,85kč, cena OTSKP2021 191kč-15%=162,35kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	281 343,46 Kč	281 343,46 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum	podpis
Technický dozor investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 8. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 8. 11. 2022	podpis

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: A05 - Zásady organizace výstavby													
Číslo a název rozpočtu: 001 - Zásady organizace výstavby								č. ZBV č.19					
pof. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
7	11346.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL	M3	0,000	62,130	62,130	403,75	0,00	0,00	25 084,99	25 084,99	25 084,99	100,00
3	12110.	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	0,000	32,700	32,700	50,15	0,00	0,00	1 639,91	1 639,91	1 639,91	100,00
8	18230.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	32,700	32,700	162,35	0,00	0,00	5 308,85	5 308,85	5 308,85	100,00
4	21461.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	0,000	163,500	163,500	29,00	0,00	0,00	4 741,50	4 741,50	4 741,50	100,00
5	45152.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,000	32,700	32,700	764,15	0,00	0,00	24 987,71	24 987,71	24 987,71	100,00
6	58302.	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM	M2	0,000	163,500	163,500	1 343,00	0,00	0,00	219 580,50	219 580,50	219 580,50	100,00
Celkem								0,00	0,00	281 343,46	281 343,46	281 343,46	0,00
Celkem ve změně								1 688 465,00	0,00	281 343,46	1 969 808,46	281 343,46	16,66
Všechny změny celkem								1 688 465,00	0,00	281 343,46	1 969 808,46	281 343,46	16,66

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, provozovna Třebíč
Bratislavská 343, 74 01 Třebíč
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 568823921, Fax: 568821022

Za zhotovitele:

Aleš Novák


Datum:

8.11.2022

Za objednatele:

Datum:

11.11.2022

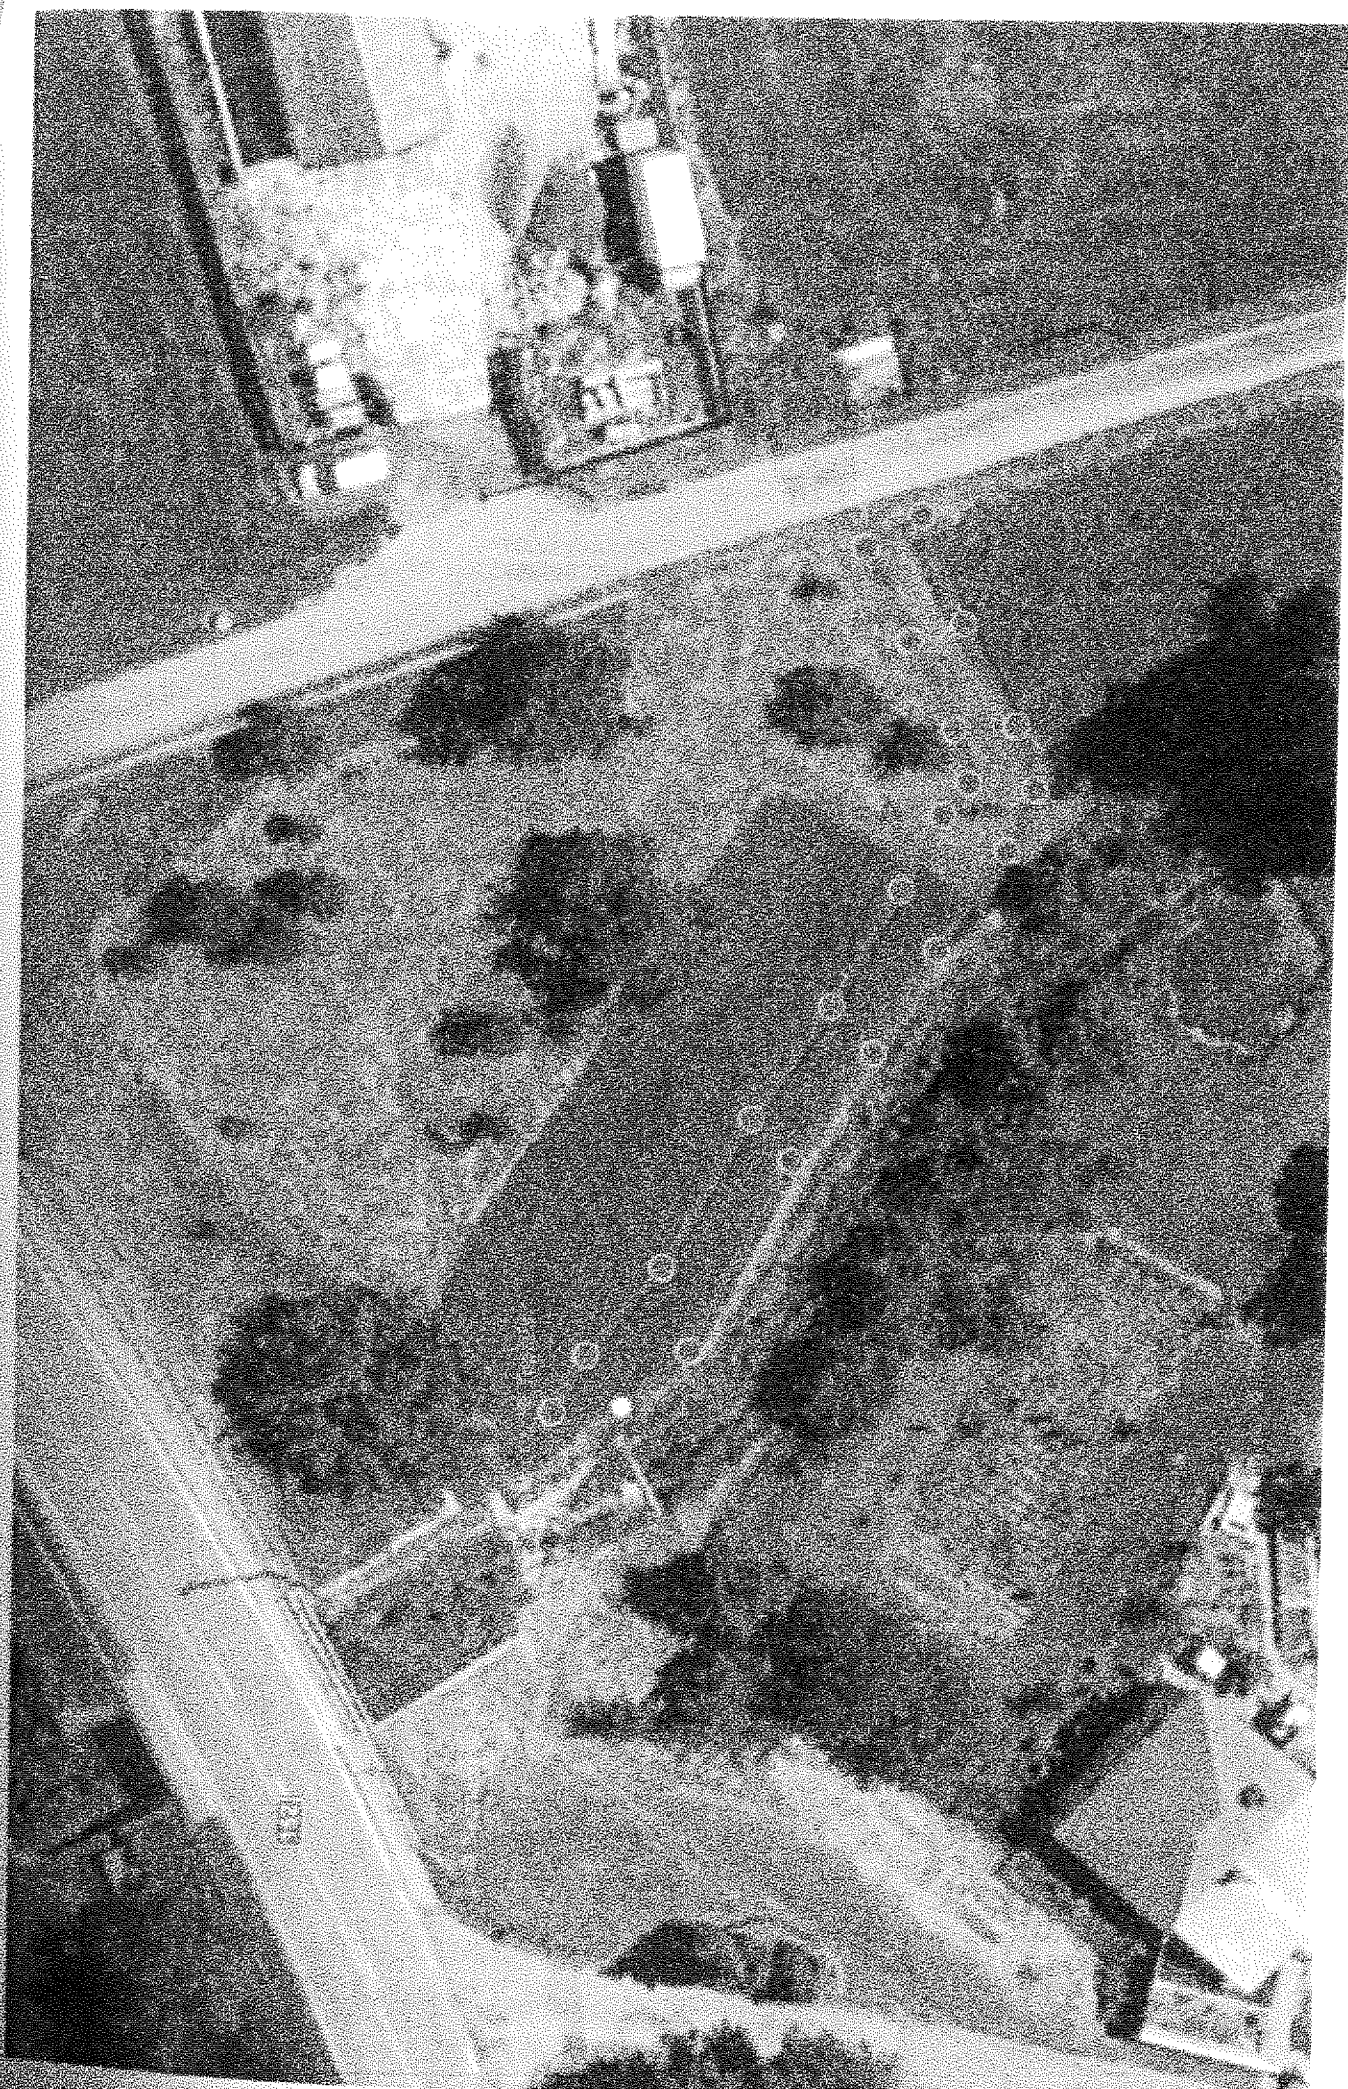

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-19

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.19 – A05**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 19 týkající se objektu A05 – Zásady organizace výstavby. Pro zajištění přístupu pod most SO201 byla v nezbytně nutném rozsahu vybudována panelová komunikace.

Jedná se o nezbytnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 4 – Nezbytné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 20
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Geodetické zaměření – počet stran A4 4x

Situace – počet stran A4 2x

Vzorový příčný řez – počet stran A4 1x

Stannovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala potřeba rozproštění omnice, se kterým projekt nepočítal.

Výpočet:

pol.č.18 (96,7m²+21,9m²+8850,4m²+4923,3m²+6299,3m²)=17991,6m² zaměřeno-16283m² z rozpočtu
=1708,6m²*32kč=54675,20kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	54 675,20 Kč	54 675,20 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 8. 1. 2022	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutil	datum 8. 1. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 1. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 8. 11. 2022	podpis

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.20

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdl cen celkem v Kč	rozdl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18222.R	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	16 283,000	17 991,600	1 708,600	32,00	521 056,00	0,00	54 675,20	575 731,20	54 675,20	10,49
		Celkem						521 056,00	0,00	54 675,20	575 731,20	54 675,20	10,49
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	54 675,20	44 224 740,48	54 675,20	0,12
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	1 136 039,20	45 306 104,48	54 675,20	0,12

COLAS CZ, a.s.
 oblast Jih, provozovna Třebíč
 Br. s. a. 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 tel.: 568823921, Fax: 568821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák


Datum:


8. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum:

8. 11. 2022

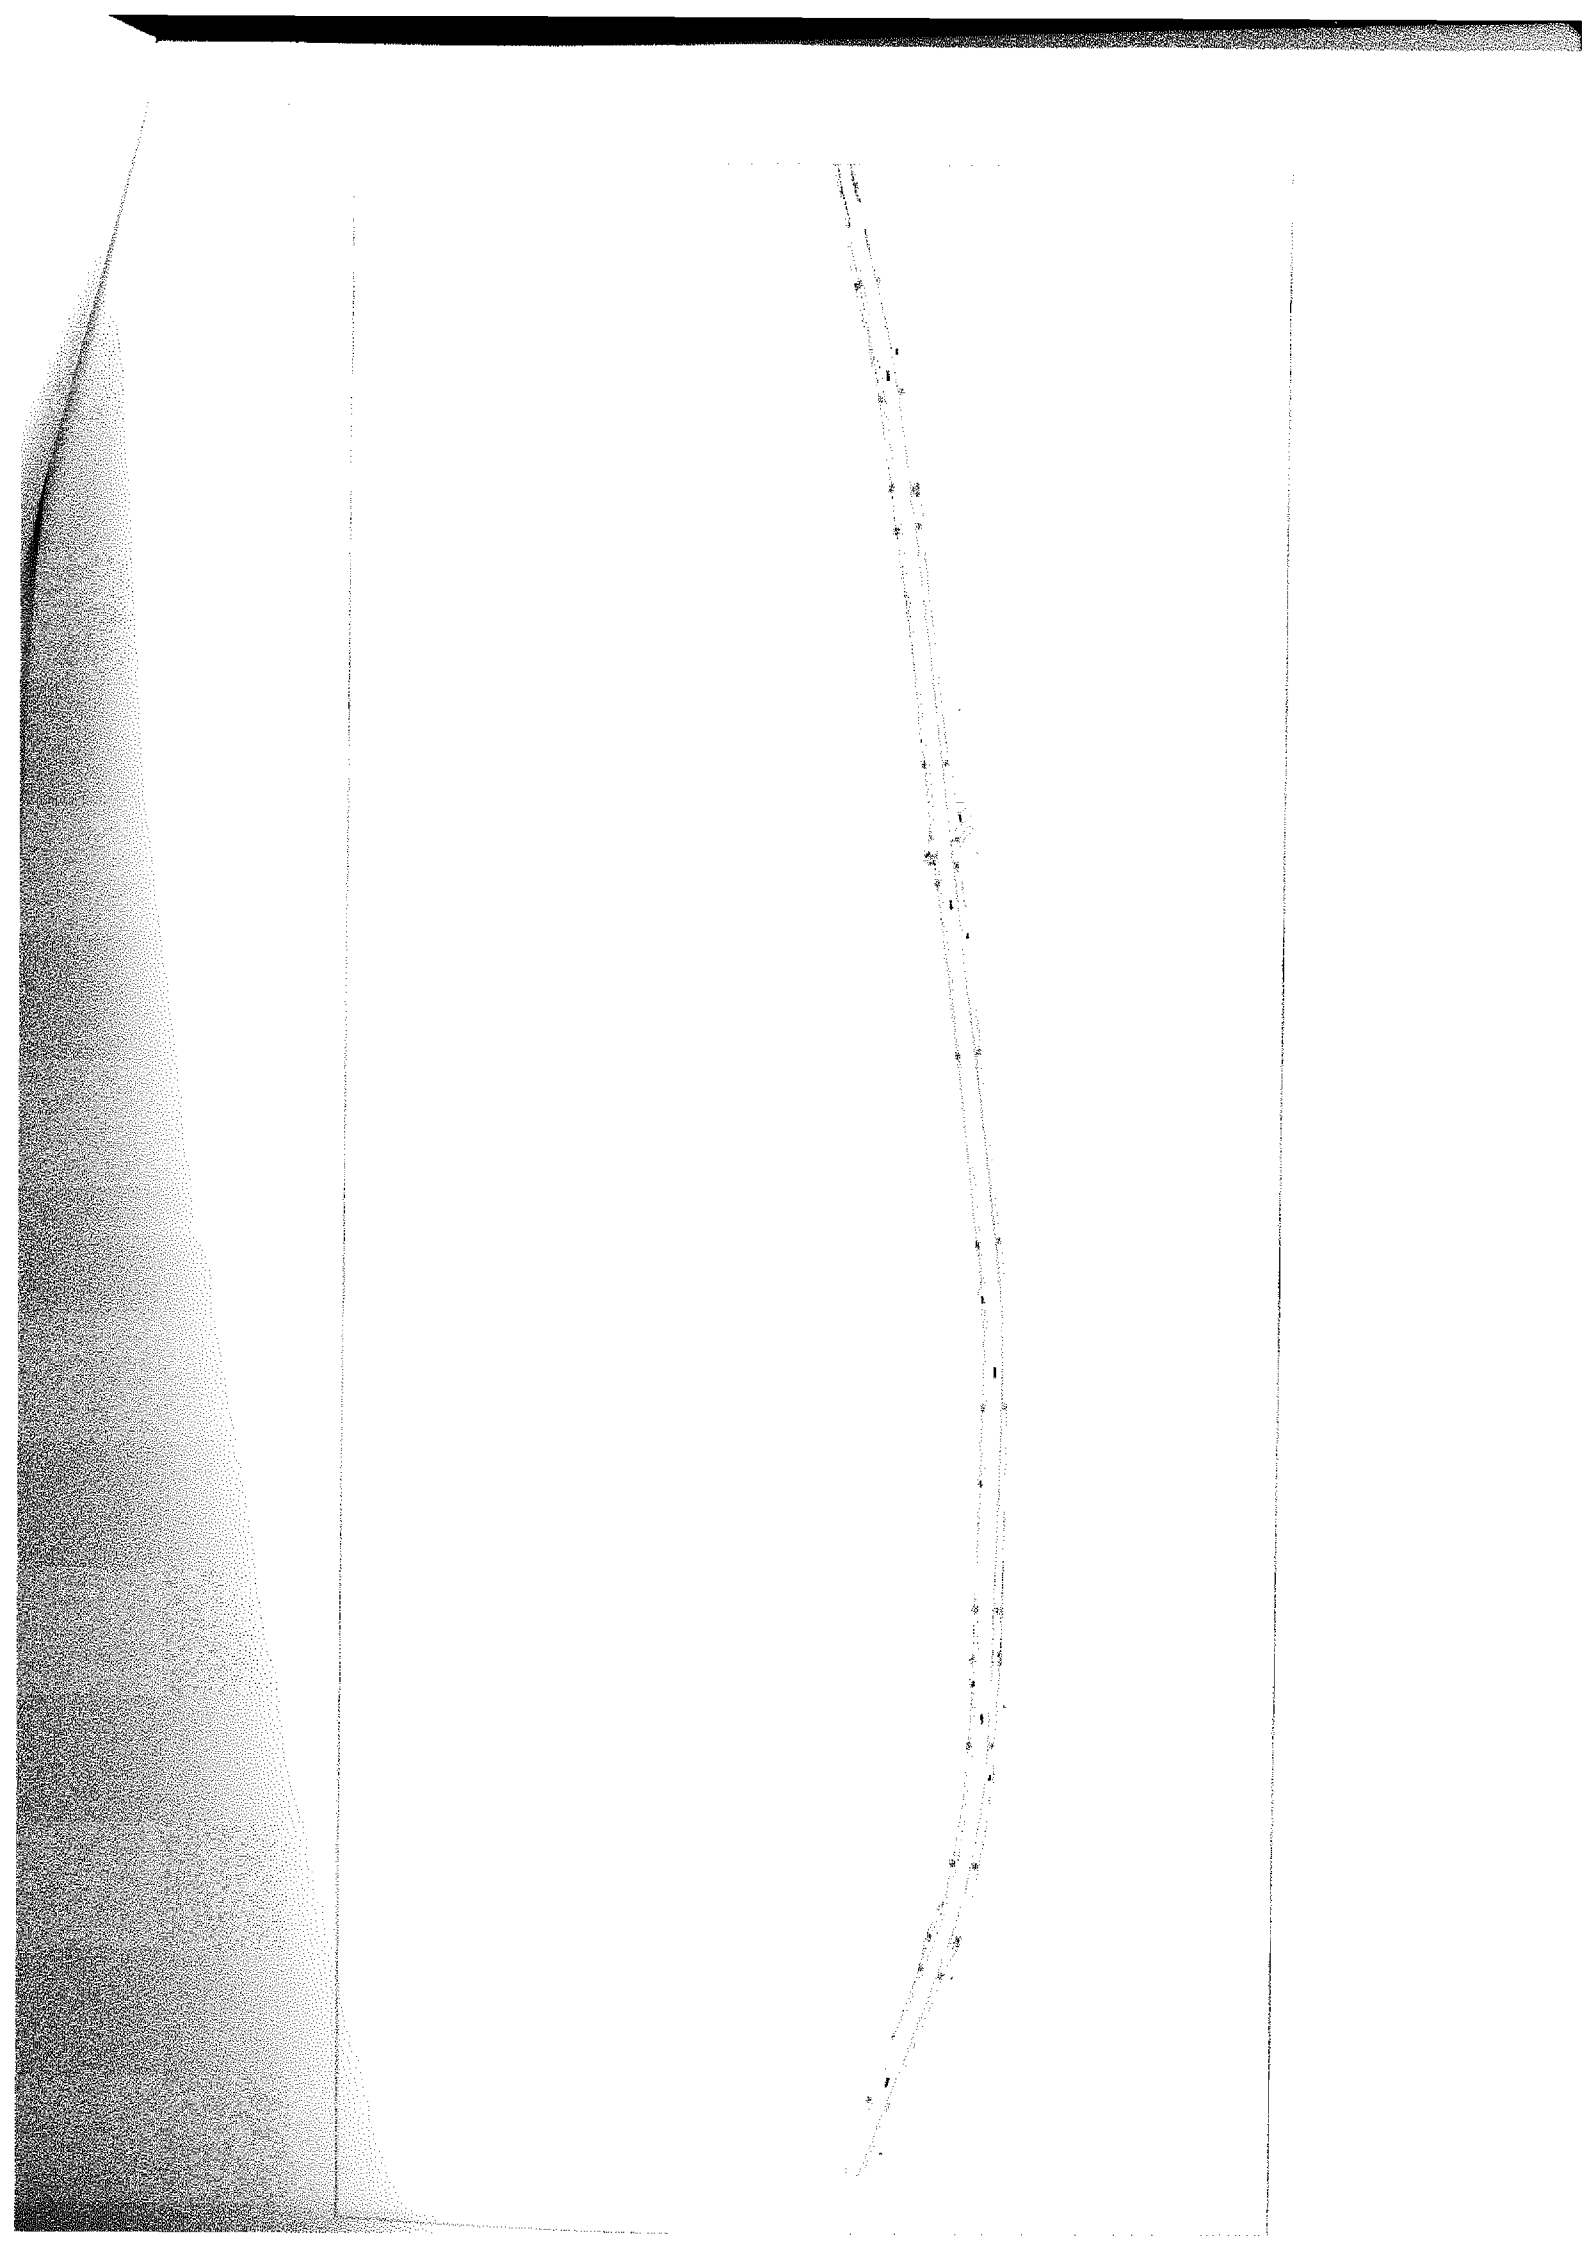

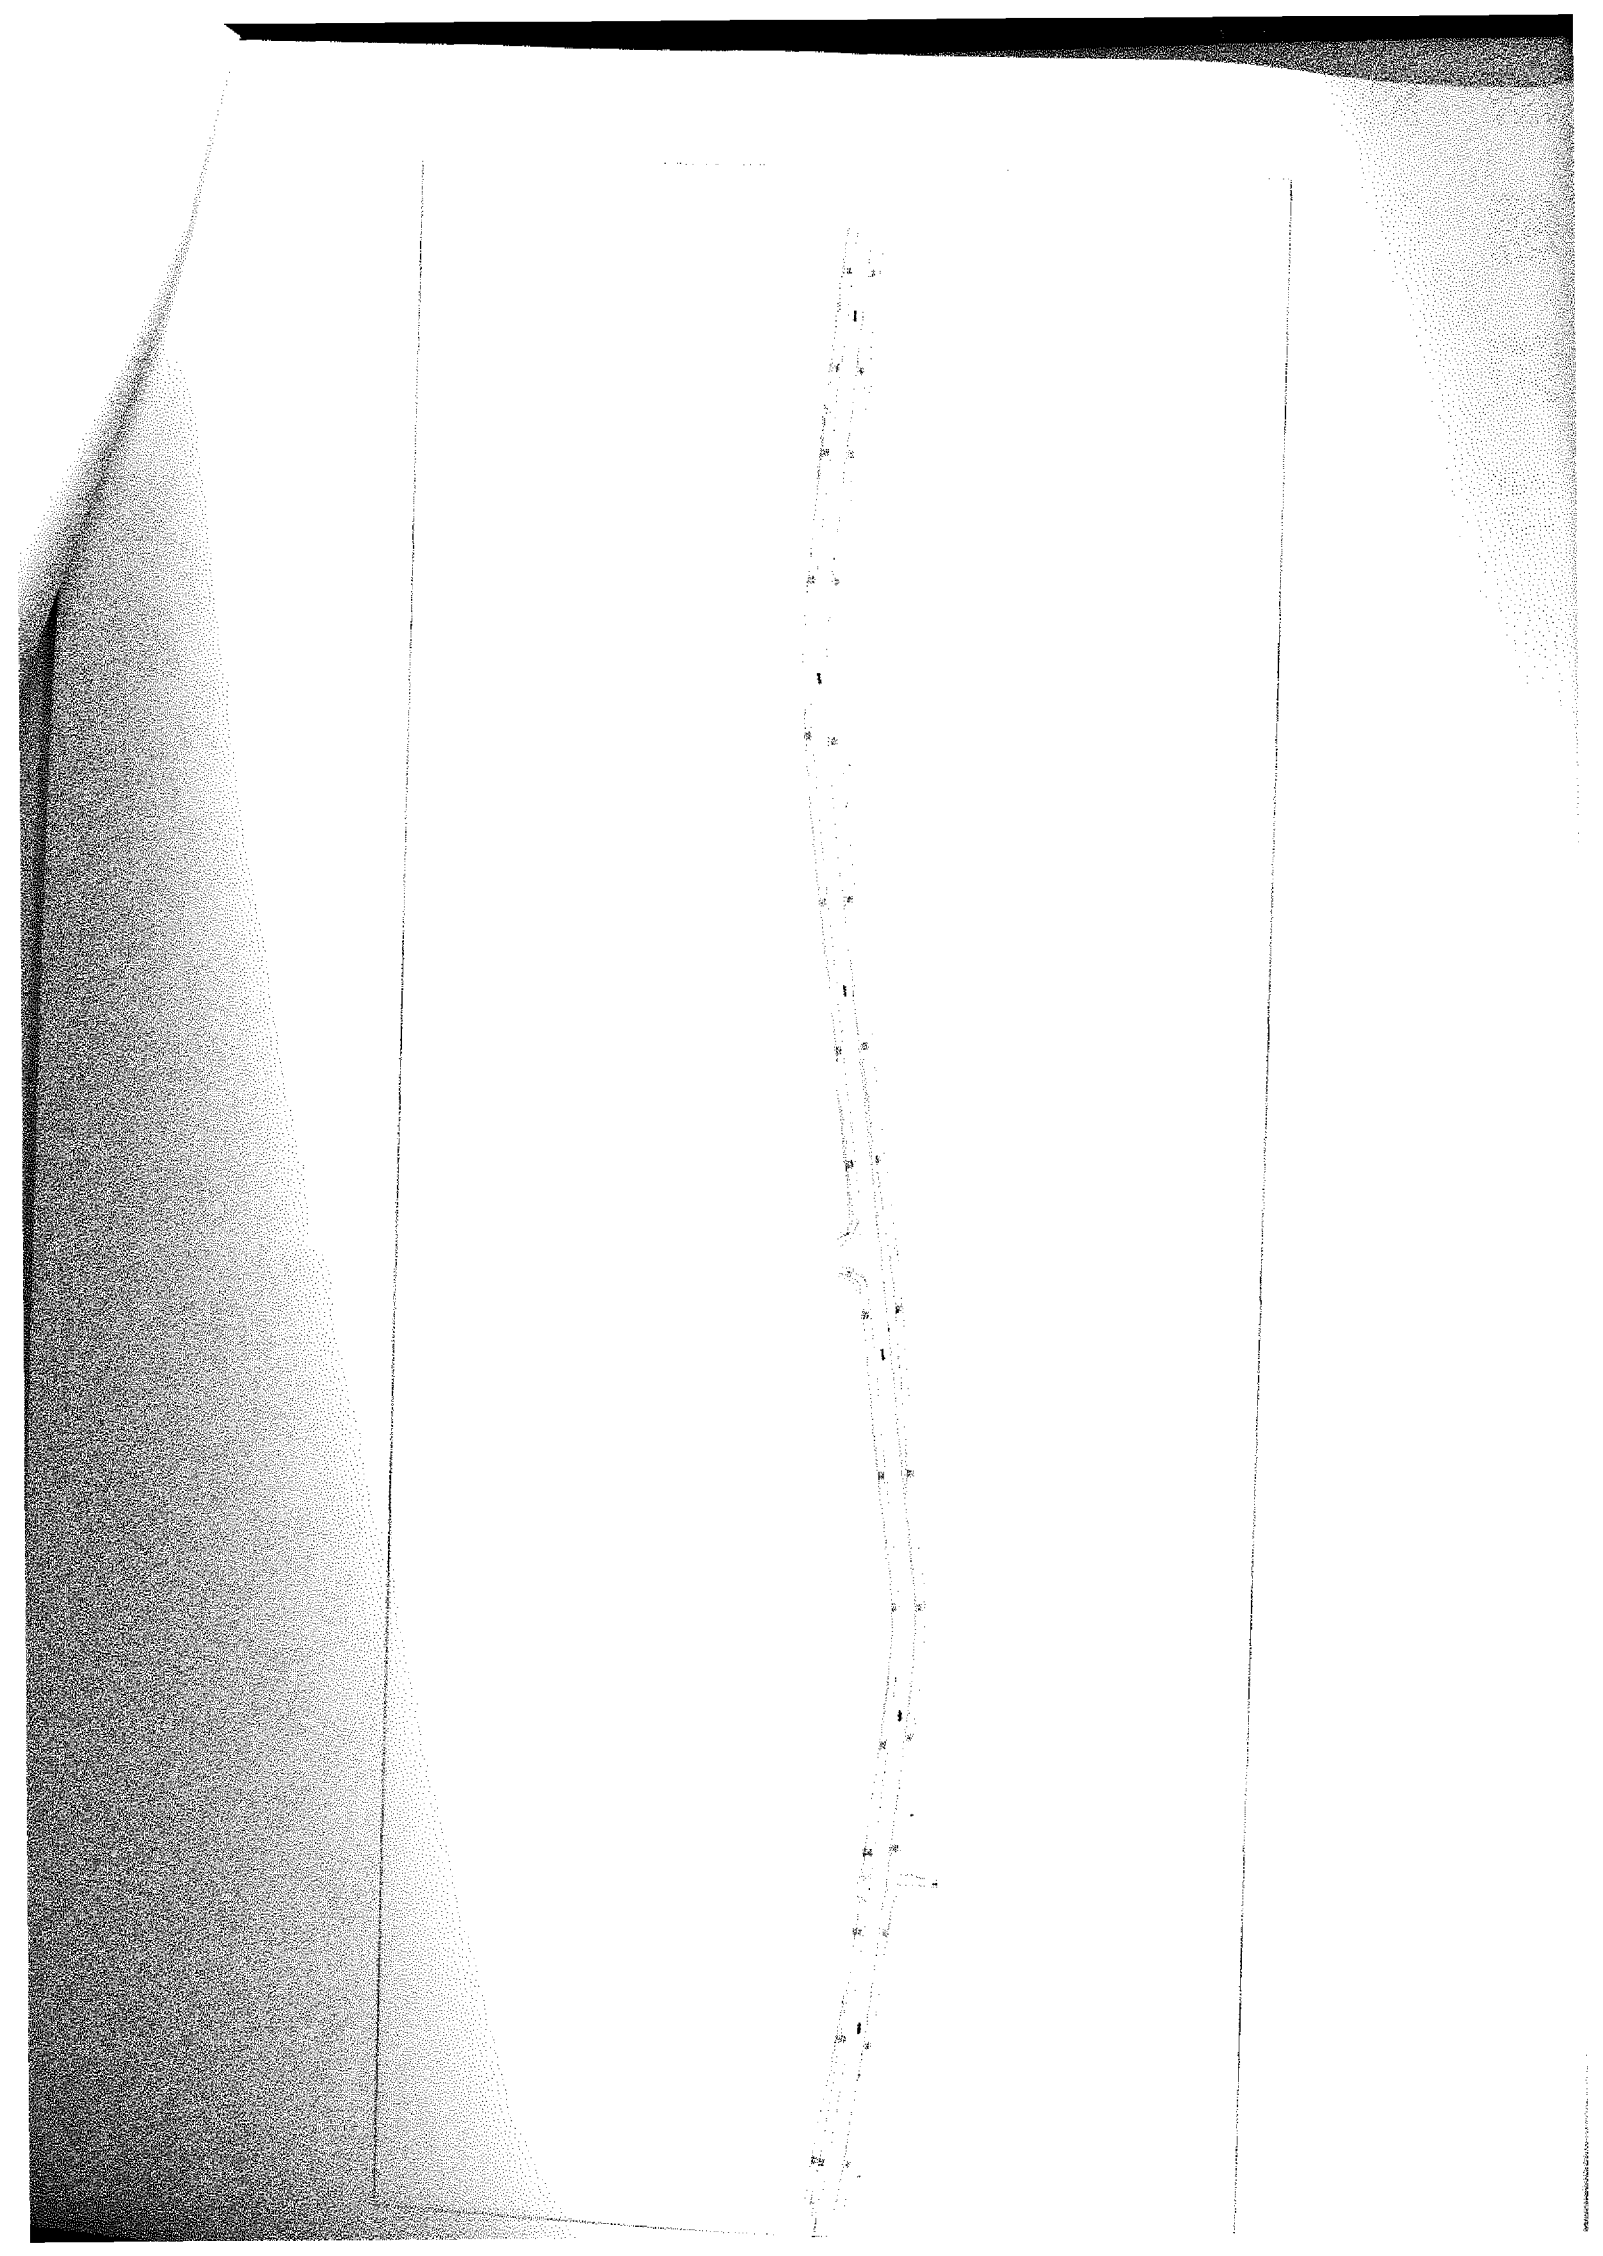

STANICE 1000 M
OD VODNÉHO ÚSTÍ
K VODNÉMU ÚSTÍ
VODNÉHO ÚSTÍ
VODNÉHO ÚSTÍ

5.0

6.0

5.1

5.4

5.3

5.2

JAROMERICE N R.

ODPOVĚDĚLÍ ORLICE (OSEV)

5.6

5.7

5.8

5.9

RESPECTABLE COURSE, USE IT

JANU

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - EXTRAVILÁN MEZI OBCEMI - VARIANTA E DLE DIAGNOSTIKY
ÚPRAVA STÁV. VOZOVKY VE STÁV. ŠÍŘKOVÉM USPOŘÁDÁNÍ
KM 5,010000 - 5,950000

SIL. II/152 - DLE SILN. PASPORTU KM 80,975 - 82,100, KM 83,360 - 84,300

M 1:50


NEZP. KRAJ. V.P. JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH V.P. NEZP. KRAJ.

FRÉZOVÁNÍ + POKLADKA

STÁV. PROMĚNNÁ ŠÍŘKA

3,98 (PROMĚNNÁ ŠÍŘKA)

3,33 (PROMĚNNÁ ŠÍŘKA)



FRÉZOVÁNÍ+POKLADKA ŽIVIČNÍCH VRSTEV:

ASfaltový beton pro brusné vrstvy	ADO 114, PnB 45/50-65	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1	40 mm
Asf. postřik spojovací 0.40 kg/m ²	PS CP	ČSN 736129, ČSN EN 13808	
Asfaltový beton pro ložné vrstvy	ACL 165, PnB 25/55-80	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1	70 mm
Asf. postřik spojovací 0.50 kg/m ²	PS CP	ČSN 736129, ČSN EN 13808	
Výztužná skelná síť 11 mm (náhodná pevnost 100N, s požadovaným pokrytím sítě 95% vážen, dle min. 25x25mm s samolepicím lepidlem na spodní straně síť je instalována na podkladní vrstvu z ACP			
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ADP 225 50/70	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1	90 mm
Asf. postřik spojovací 0.50 kg/m ²	PS CP	ČSN 736129, ČSN EN 13808	

LOKÁLNÍ SANACE: v případě zjištění rozpadu oet vrstev po odstranění stáv. povrchu
SANACE Z ACP 14+(S), 50/70 II 50mm, rozřez je ručně delovatel při vizuální
prohlídce odhalené způsobem organickým se zřetelčen objeveného
Asf. postřik spojovací 0.50 kg/m² PS C ČSN 736129, ČSN EN 13808
propojka dle diagnostiky vozovky 15-20% z frézované povrchy

SROVNÁVACÍ ROVINA

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Projektov inženýrská

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY U ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-20

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.20 – SO 101.2**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 20 týkající se objektu SO 101.2. Během realizace stavby byl upřesněn rozsah rozproštění ornice. Skutečný rozsah prací je doložen geodetickými protokoly. Jedná se o doměření zařaditelné do skupiny do skupiny 1 – Vyhrazené změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 21
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala potřeba ošet rozprostřenou omíci, se kterým projekt nepočítal.

Výpočet:

pol.č.81 dle pol.č.18 18222 – 1708,6m²*15kč=25629kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	25 629,00 Kč	25 629,00 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 11. 11.	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum . . .	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 8. 11. 2020	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 11. 11. 2020	podpis

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotopovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

č. ZBV č.21

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
61	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	1 708,600	1 708,600	15,00	0,00	0,00	25 629,00	25 629,00	25 629,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	25 629,00	25 629,00	25 629,00	0,00
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	25 629,00	44 195 694,28	25 629,00	0,06
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	1 161 668,20	45 331 733,48	25 629,00	0,06

POLAS CZ, a.s.
 společnost Jih, provozovna Třebíč
 Trnávská 3, Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 IČ: 568823921, Fax: 568821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

8. 11. 2022

Za objednatele:

Datum:

8. 11. 2022

**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

konzultace a organizace

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-21

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.21 – SO 101.2**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 21 týkající se objektu SO 101.2 Během realizace stavby byl upřesněn rozsah rozprostření ornice. Tato změna byla formálně řešena v ZBV č. 20. Na rozprostřenou ornici bylo následně provedeno ošetření hydroosevem, které je řešeno v tomto ZBV č.21. Skutečný rozsah prací je doložen geodetickými protokoly. Jedná se o doměření zařaditelné do skupiny do skupiny 1 – Vyhrazené změny.
Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme

S pozdravem


Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 22
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Geodetické zaměření - počet stran A4 1x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala potřeba zpevnění krajnic z r-mat., se kterým projekt nepočítal.

Výpočet:


pol.č.35 km 0,045 - km 0,130, dle zaměření $91,8m \cdot 1m = 91,8m^2 \cdot 37kč = 3396,60kč$

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	3 396,60 Kč	3 396,60 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 4. 11. 2022	podpis 
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 8. 11. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 8. 11. 2022	podpis 
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 1. 12. 2022	podpis 

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 001 - SO 101.1 SILNICE II/152 (km 0,000 - 0,450)

č. ZBV č.22

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
35	56963.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	0,000	91,800	91,800	37,00	0,00	0,00	3 396,60	3 396,60	3 396,60	100,00
		Celkem						0,00	0,00	3 396,60	3 396,60	3 396,60	0,00
		Celkem ve změně						3 810 440,65	0,00	3 396,60	3 813 837,25	3 396,60	0,09
		Všechny změny celkem						3 810 440,65	0,00	693 097,55	4 503 538,20	3 396,60	0,09

COLAS CZ, a.s.
 společnost s r.o., provozovna Třebíč
 Brněnská 343, 674 01 Třebíč
 DIČ: CZ26177005 (1)
 Tel: 565 222 900, 21922

Aleš Novák

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 8.11. 2022

Datum: 11. 2022

DOMESTIC
OFFICE

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ÚŽE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-22

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VỀ

II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.22 – SO 101.1

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 22 týkající se objektu SO 101.1. V km 0,045 – 0,130 byla po odsouhlasení doplněna nezpevněná krajnice z r-materiálu.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Geodetické zaměření - počet stran A4 3x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce: Při realizaci vyvstala potřeba zpevnění krajnic z r-mat., se kterým projekt nepočítal.

Výpočet:

pol.č.24

km 1,340 – km 2,575 LS+PS = 2326,1m-615 m šířka 1,5m u svodidel=1711,1m*0,75m=1283,325m2

km 1,800 – km 1,980 LS 180m*1,5m=270m2

km 1,440 – km 1,735 PS 295m*1,5m=442,5m2

km 1,775 – km 1,915 PS 140m*1,5m=210m2

km 2,750 – km 4,078 2024,7m-110m šířka u svodidel=1914,7*0,75m=1436,025m2

km 3,968 – km 4,078 110m*1,5m=165m2

km 4,810 – km 5,950 LS+PS 2081,2m*0,75m=1545,9m2

(1283,325+270+442,5+210+1436,025+165+1545,9)=5352,75m2 zaměřeno-4557m2

z rozpočtu=795,75m2*37=29442,75kč

Méněpráce:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-0,00 Kč	29 442,75 Kč	29 442,75 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 0. 11. 2022	podpis
Technický dozor investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 11. 2022	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy:			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 11. 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 11. 2022	podpis

3.13.1

Firma: Nabídka Marek

Strana

Datum: 12.10.2022

Čas: 12:30:51

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152

Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

č. ZBV č.23

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	56963.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	4 557,000	5 352,750	795,750	37,00	168 609,00	0,00	29 442,75	198 051,75	29 442,75	17,46
		Celkem						168 609,00	0,00	29 442,75	198 051,75	29 442,75	17,46
		Celkem ve změně						44 170 065,28	0,00	29 442,75	44 199 508,03	29 442,75	0,07
		Všechny změny celkem						44 170 065,28	0,00	1 191 110,95	45 361 176,23	29 442,75	0,07

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih, provozovna Třebíč
něnská 3, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 568823921, Fax: 568821922


Za zhotovitele:

Aleš Novák


Datum: 8.11. 2022


Za objednavatele:

Datum: 8.11. 2022

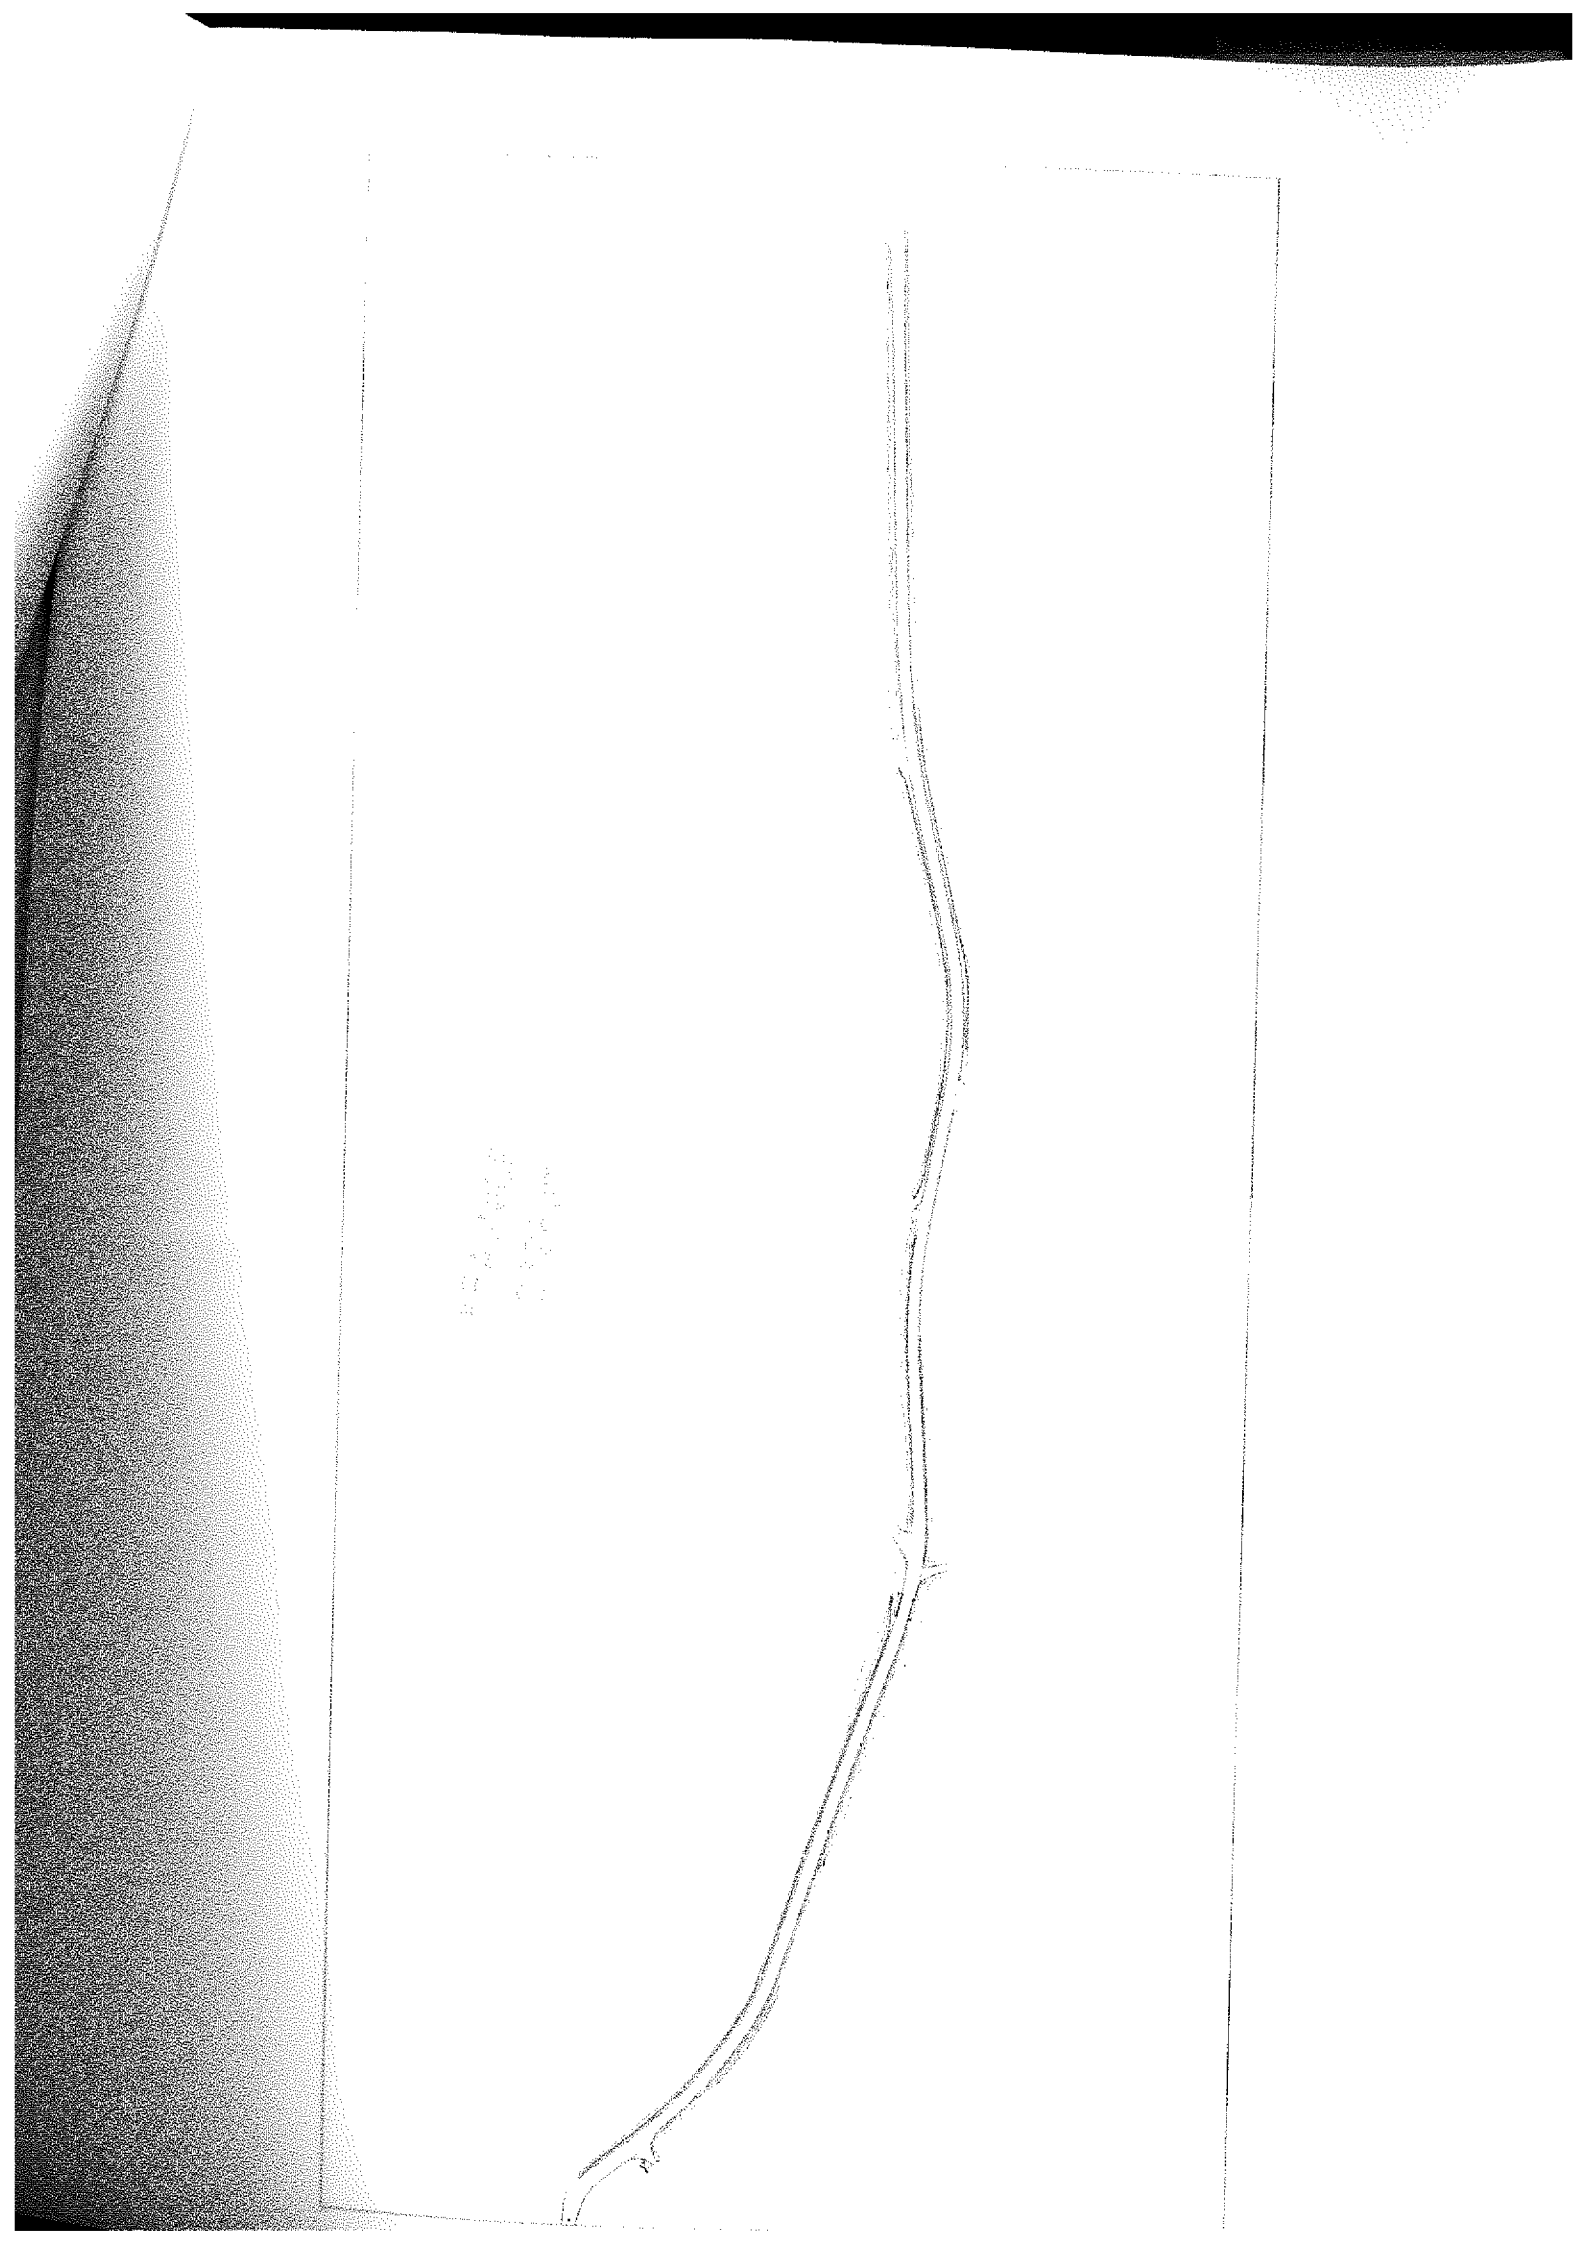

192-100
100-100



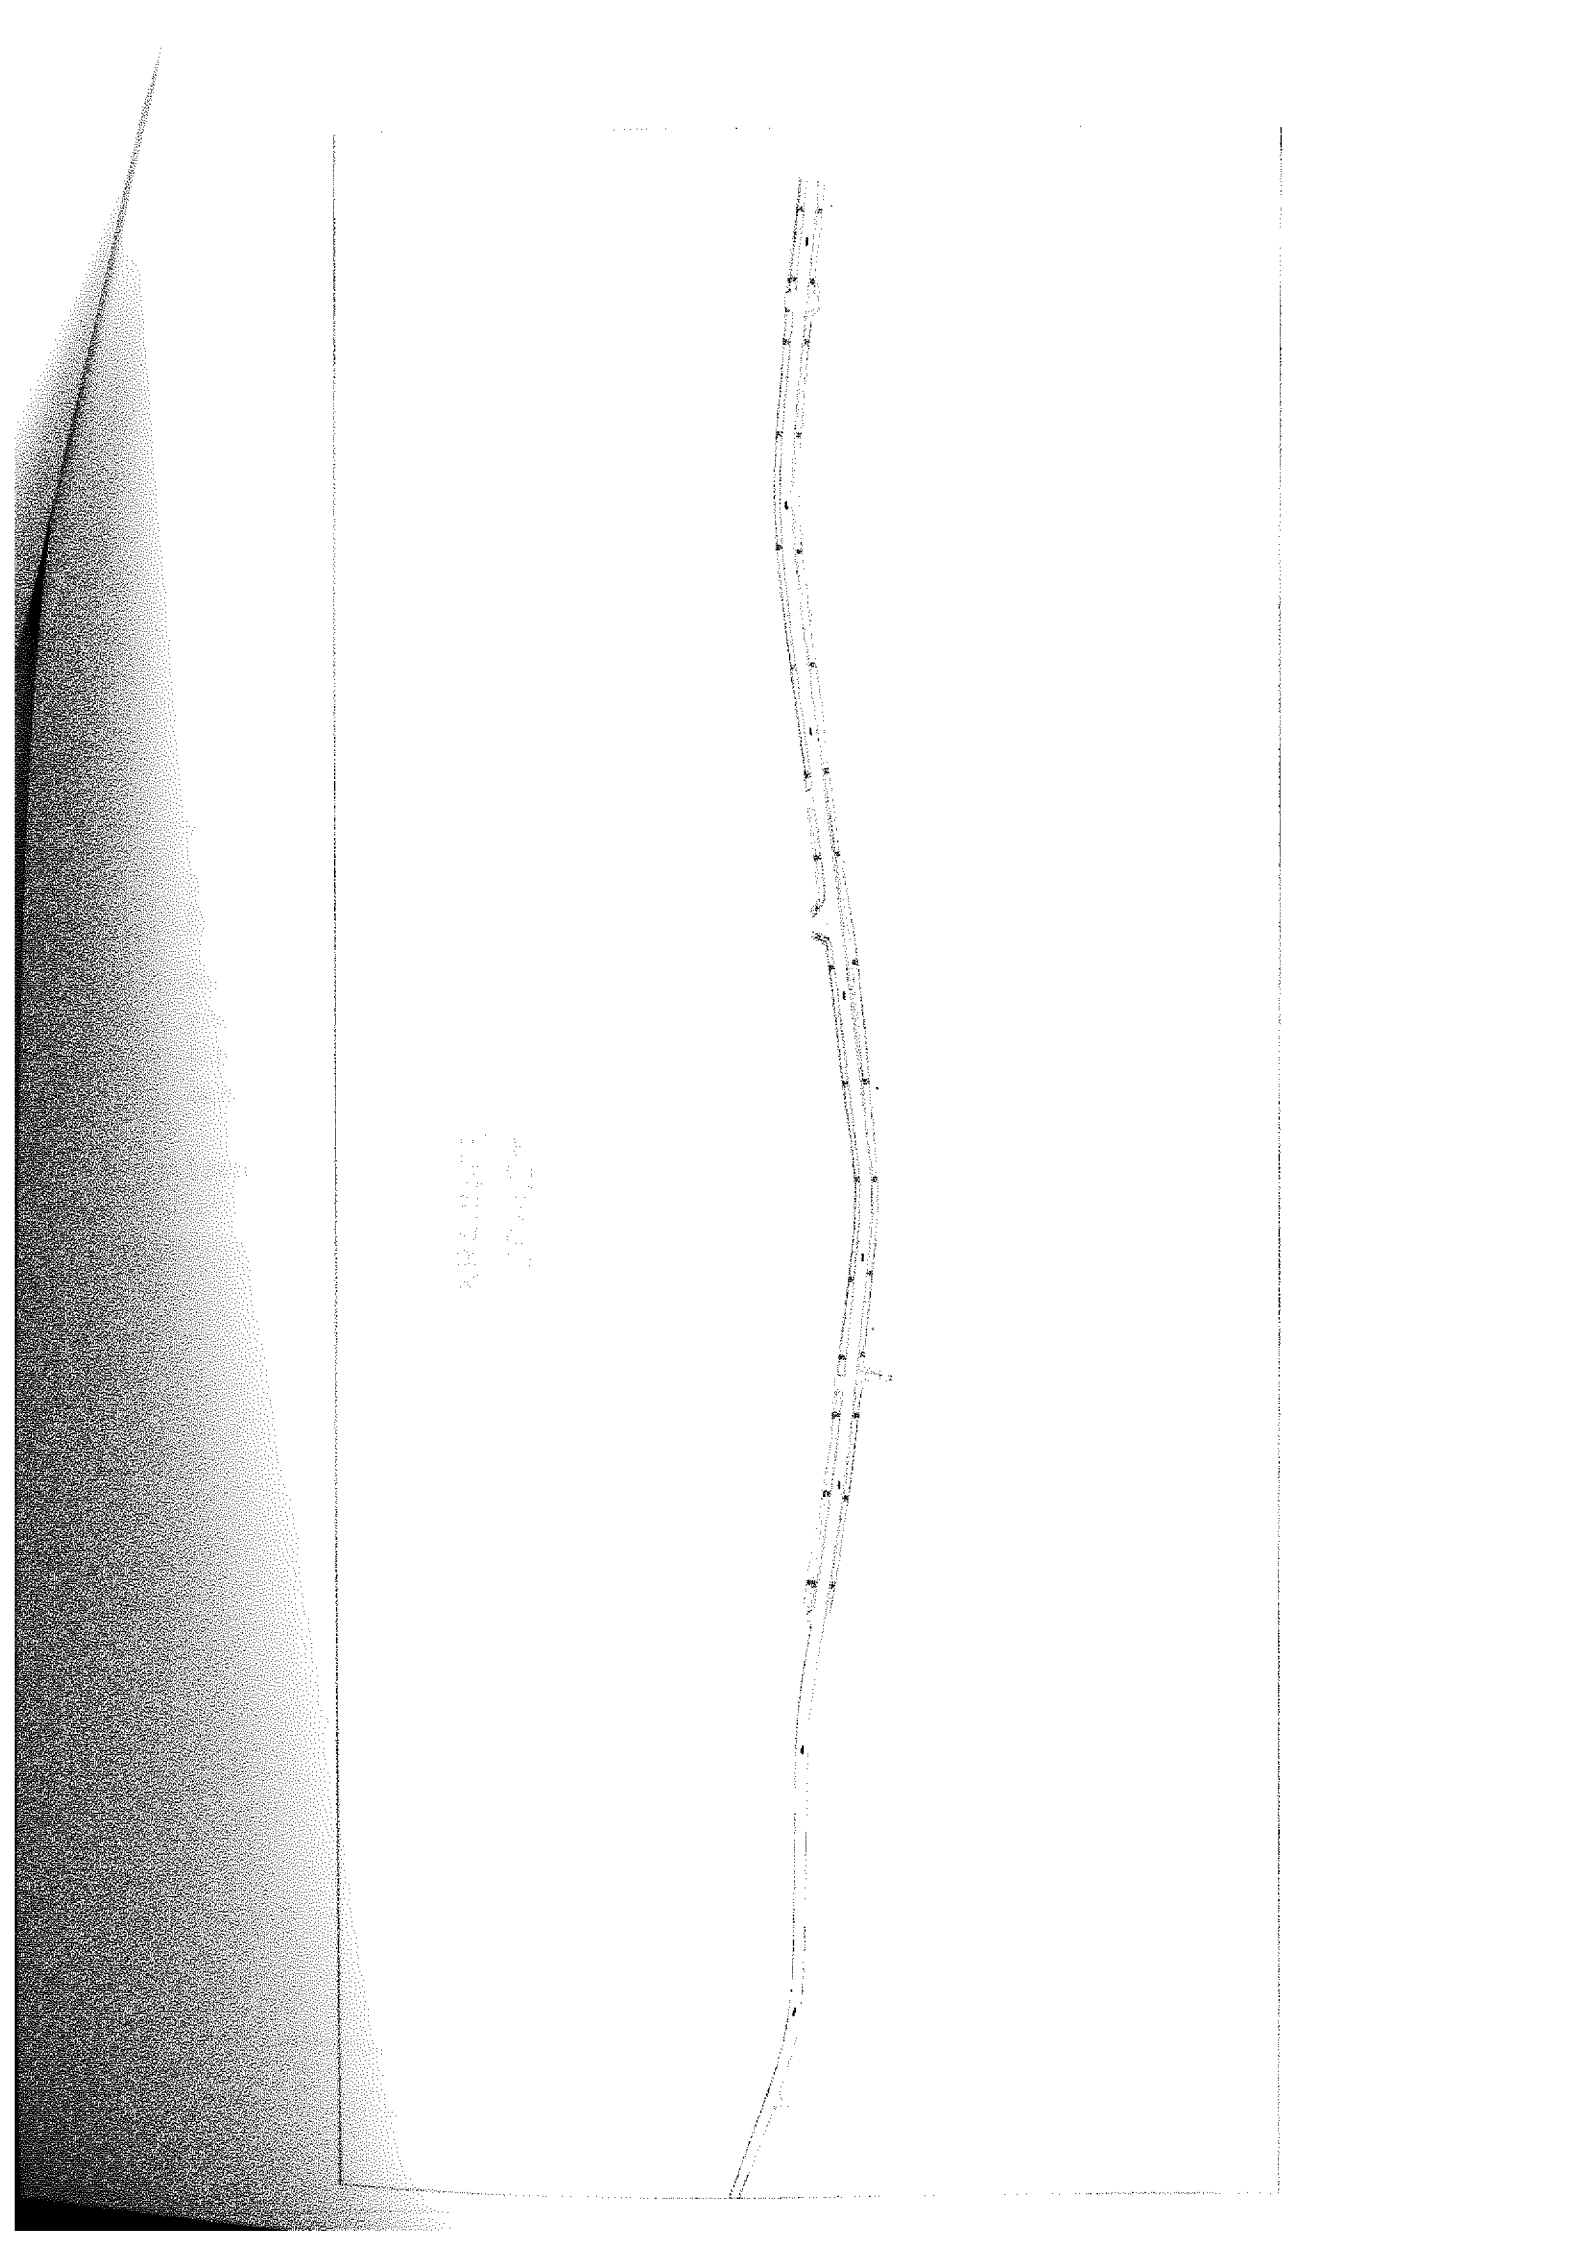

DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA

Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ú ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-23

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Martin Staněk/777116230

OSTRAVA
8.11.2022

VĚC

II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.23 – SO 101.2

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 23 týkající se objektu SO 101.2. Během realizace stavby bylo dohodnuto, že v nezbytně nutných úsecích bude doplněna nezpevněná krajnice z r-materiálu.

Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost zařaditelnou do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

Za AD s přeloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 24
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 2x

Stanovisko Autorského dozoru - počet stran A4 1x

RDS

Iniciátor změny: ☐ zhotovitel ☐ objednatel ☒ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Změna vyvolaná RDS po obnažení konstrukcí na mostním objektu včetně revize odvodnění konstrukce objektu a kontroly křídel mostu

Vícepráce: Dle RDS

Méněpráce: Dle RDS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-640 368,84 Kč	386 759,41 Kč	-253 609,43 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum 9. 11. 2022	podpis
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 9. 11. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 9. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 11. 11. 2022	podpis

3.13.1

Datum: 24.10.2022

Čas: 9:06:18

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2

Číslo a název varianty: 1.0 -

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 152-023

Číslo a název rozpočtu: 001 - Most ev.č. 152-023

č. ZBV č.24

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	12,330	19,600	7,270	900,00	11 097,00	0,00	6 543,00	17 640,00	6 543,00	58,96
15	261113.A	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR I D DO 25MM	M	20,400	19,040	-1,360	600,00	12 240,00	-816,00	0,00	11 424,00	-816,00	-6,67
16	261113.B	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR I D DO 25MM	M	473,600	432,000	-41,600	600,00	284 160,00	-24 960,00	0,00	259 200,00	-24 960,00	-8,78
17	261114.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR I D DO 35MM	M	3,360	4,540	1,180	800,00	2 688,00	0,00	944,00	3 632,00	944,00	35,12
18	26154.R	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR V D DO 200MM	M	2,400	9,000	6,600	7 000,00	16 800,00	0,00	46 200,00	63 000,00	46 200,00	275,00
19	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	96,000	112,000	16,000	136,00	13 056,00	0,00	2 176,00	15 232,00	2 176,00	16,67
21	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,914	1,587	-1,327	26 840,00	78 211,76	-35 616,68	0,00	42 595,08	-35 616,68	-45,54
22	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	54,410	37,550	-16,860	18 000,00	979 380,00	-303 480,00	0,00	675 900,00	-303 480,00	-30,99
23	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	10,882	1,660	-9,222	26 440,00	287 720,08	-243 829,68	0,00	43 890,40	-243 829,68	-84,75
24	42031.	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU	M3	8,760	14,600	5,840	5 800,00	50 808,00	0,00	33 872,00	84 680,00	33 872,00	66,67
25	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	10,200	10,886	0,686	14 000,00	142 800,00	0,00	9 604,00	152 404,00	9 604,00	6,73
26	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	2,448	2,080	-0,368	29 360,00	71 873,28	-10 804,48	0,00	61 068,80	-10 804,48	-15,03
27	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,008	32,858	-0,150	5 800,00	191 446,40	-870,00	0,00	190 576,40	-870,00	-0,45
28	45852.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	45,320	72,100	26,780	912,00	41 331,84	0,00	24 423,36	65 755,20	24 423,36	59,09

Za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel: 568823921, Fax: 568821922

Aleš Novák

Datum:

9. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum:

8. 11. 2022



Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 152-023
 Číslo a název rozpočtu: 001 - Most ev.č. 152-023

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.24

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	626111.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	166,040	241,340	75,300	996,00	165 375,84	0,00	74 998,80	240 374,64	74 998,80	45,35
36	626113.	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	83,020	120,620	37,600	2 510,00	208 380,20	0,00	94 376,00	302 756,20	94 376,00	45,29
37	62641.	SHEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	166,040	241,340	75,300	277,00	45 993,08	0,00	20 858,10	66 851,18	20 858,10	45,35
38	62652.	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	30,254	37,784	7,530	895,00	27 077,33	0,00	6 739,35	33 816,68	6 739,35	24,89
40	711442.	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	112,200	131,300	19,100	1 200,00	134 640,00	0,00	22 920,00	157 560,00	22 920,00	17,02
41	711509.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	28,560	68,100	39,540	190,00	5 426,40	0,00	7 512,60	12 939,00	7 512,60	138,45
43	87634.	CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	2,400	9,000	6,600	318,00	763,20	0,00	2 098,80	2 862,00	2 098,80	275,00
50	93140.	MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ	M	20,400	0,000	-20,400	980,00	19 992,00	-19 992,00	0,00	0,00	-19 992,00	-100,00
51	938543.	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	179,690	254,990	75,300	374,00	67 204,06	0,00	28 162,20	95 366,26	28 162,20	41,91
Nové položky													
56	87534.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	0,000	19,600	19,600	267,75	0,00	0,00	5 247,90	5 247,90	5 247,90	100,00
Celkem								2 858 464,47	-640 368,84	386 676,11	2 604 771,74	-253 692,73	-8,88
Celkem ve změně								5 068 478,95	-640 368,84	386 676,11	4 814 786,22	-253 692,73	-5,01
Všechny změny								5 068 478,95	-640 368,84	386 676,11	4 814 786,22	-253 692,73	-5,01

COLAS CZ, a.s.
 DIČ: CZ26177005 (1)
 síl. 568823921, Fax: 568821922

Za zhotovitele:

Aleš Novák

Datum:

9. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum:



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Projektová, inženýrská a konzultační organizace

**Kraj Vysočina
Žižkova 57
587 33 Jihlava**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY Ů ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
180005-ZBV-24

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Petr Pchálek/731 614 435

OSTRAVA
9.11.2022

VĚC

**II/152 Hrotovice – Dukovany, PD
Stanovisko projektanta k ZBV č.24 – SO 201**

Posíláme vám stanovisko AD k ZBV č. 24 týkající se objektu SO 201 Most ev.č.152-023.

V rámci stavby byly odsouhlaseny záznamem z jednání na stavbě ze dne 6.5.2022 změny které se týkají především položek číslo: 16, 22, 23, 40 a 50 ke kterému připojuji citaci ze záznamu:

- Vzhledem k odlišnému uspořádání ze koncem nosné konstrukce (dobetonávkou nosníku) kdy dle sdělení zhotovitele při bourání nebyla zastížena závěrná zídka bylo rozhodnuto že závěrná zídka a mostní závrh nebudou nově zřizovány. Tímto bude zachován stávající statický systém a systém odvodnění nosné konstrukce.
- Nově vybetonovaná sphaunující deska bude na koncích ukončena v podélném směru fabionem a rovněž mezi l opci nosníku (jejich dobetonávkou) a úložným prahem bude proveden fabion. Horní rubová hrana opěry (úložného prahu) bude rovněž zbroušena tak aby mohla být namontována izolace ale nebylo sníženo krytí vyztuže v opěře
- Nově namontovaná izolace asfaltovými pásy bude z nosné konstrukce pokračovat na úložný prah a následně rub opěry až po spodní hranu potrubního betonu pod drenáží za rubem opěr

položek číslo 18, 24, 28, 41, 43, 56 ke kterému připojuji citaci ze záznamu:

- Ve středu ockočarých opěr bude proveden odvrt opěry pro odvodnění rubu opěry ve výšce cca 0,2m nad hladinou nosníka. Vyvedení a zarovnování trubky přes odvrt bude dle detailu VL4 204.01. Drenáž za opěrou bude dle VL4 204.01a



**DOPRAVOPROJEKT
OSTRAVA**

Projektová, inženýrská a konzultační organizace

- Mis o původního jednoho vstupu uprostřed jednoho opěry, která je v současnosti podlouhlá, bude rozšířena na dva vstupy, celková délka opěry cca 0,3m nad odlazem, který bude opěr rubu opěry, který je v současnosti v úrovni terénu, bude zvýšen o cca 0,2m, aby se dostal do úrovně terénu a načtení, čímž bude vytvořen nový jednorázový křižovatkový přejezd. Příměstský tunel bude nastaven v úrovni terénu, což bude vyžadovat výstavbu výhledu.
- Povrch ZB příčných prahu vtoků nad mostem bude stejný, jaký je v současnosti, prahu bude zabetonována shora.
- Z šikmých křídel na vtoku nad mostem bude provedena v celé šířce oprava, krytím bude provedena jejich sanace.

a dopřesnění, že na základě skutečného stavu původní přechodové oblasti po jejím odkopání byla provedena její zvětšená výměna. S tímto souvisí i zvětšení rozsahu sanací rubu opěr (položka číslo 35, 36, 37, 38, 51)

Jedná se o nepředvídatelné skutečnosti zařaditelné do skupiny 3 – Nepředvídatelné změny.

U položek číslo 12, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27 se jedná o dopřesnění zařazeno do skupiny 1.

Za AD s přeloženým ZBV s celkovým snížením ceny o 253 609,43Kč souhlasíme.

S pozdravem

Ing. Martin Staněk
Vedoucí projektant

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 25
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 000		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

Položky, které nebudou do fakturované do množství díla PD, ale na základě RDS nebo geodetického zaměření.

pol. č.8 Po upřesnění rozsahu RDS na SO 201 nebylo nutné přepočítávat zatížitelnost mostu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-40 000,00 Kč	0,00 Kč	-40 000,00 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 22. 11. 2022	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 22. 11. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 22. 11. 2022	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 22. 11. 2022	podpis

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PŘELOŽKY
 Číslo a název rozpočtu: SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PŘELOŽKY

č. ZBV č.25

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	0,000	-1,000	40 000,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-100,00
		Celkem						40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-100,00
		Celkem ve změně						1 705 100,00	-40 000,00	0,00	1 665 100,00	-40 000,00	-2,35
		Všechny změny celkem						1 705 100,00	-40 000,00	0,00	1 665 100,00	-40 000,00	-2,35

Za zhotovitele:

Datum: 22. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum: 22. 11. 2022

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 26
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací počet stran A4 2x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č.1,2,8,9,10,11,13,16,17,19,24,25,26,

Položky, které nebudou do fakturované do množství díle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-100 861,17 Kč	0,00 Kč	-100 861,17 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum: 11.	podpis
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum: 11.	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum: 11.	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum: 11. 2021	podpis

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:49:51

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 001 - SO 101.1 SILNICE II/152 (km 0,000 - 0,450)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.26

pof. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílná celkem v Kč	rozdílná celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	69,960	0,000	-69,960	1,00	69,96	-69,96	0,00	0,00	-69,96	-100,00
2	014111.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-JO (INERTNÍ ODPAD)	M3	4,675	0,000	-4,675	150,00	701,25	-701,25	0,00	0,00	-701,25	-100,00
8	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	69,960	29,256	-40,704	290,00	20 288,40	-11 804,16	0,00	8 484,24	-11 804,16	-58,18
9	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	69,960	29,256	-40,704	100,00	6 996,00	-4 070,40	0,00	2 925,60	-4 070,40	-58,18
10	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	45,760	19,136	-26,624	581,00	26 586,56	-15 468,54	0,00	11 118,02	-15 468,54	-58,18
11	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	16,691	6,980	-9,711	660,00	11 016,06	-6 409,26	0,00	4 606,80	-6 409,26	-58,18
13	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,400	1,840	-2,560	900,00	3 960,00	-2 304,00	0,00	1 656,00	-2 304,00	-58,18
16	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 600,000	6 488,000	-112,000	8,00	52 800,00	-896,00	0,00	51 904,00	-896,00	-1,70
17	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 300,000	3 241,600	-58,400	195,00	643 500,00	-11 388,00	0,00	632 112,00	-11 388,00	-1,77
19	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	3 153,000	3 099,400	-53,600	275,00	867 075,00	-14 740,00	0,00	852 335,00	-14 740,00	-1,70
24	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	40,000	18,400	-21,600	551,00	22 040,00	-11 901,60	0,00	10 138,40	-11 901,60	-54,00
25	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ	KUS	8,000	5,000	-3,000	5 036,00	40 288,00	-15 108,00	0,00	25 180,00	-15 108,00	-37,50
26	89921.	KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	8,000	3,000	-5,000	1 200,00	9 600,00	-6 000,00	0,00	3 600,00	-6 000,00	-62,50
		Celkem						1 704 921,23	-100 861,17	0,00	1 604 060,06	-100 861,17	-5,92
		Celkem ve změně						3 810 440,65	-100 861,17	0,00	3 709 579,48	-100 861,17	-2,65

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 22. 11. 2022

Datum: 22. 11. 2022

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 001 - SO 101.1 SILNICE II/152 (km 0,000 - 0,450)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.26

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Všechny změny celkem						3 810 440,65	-100 861,17	693 097,55	4 402 677,03	-100 861,17	-2,65

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 27
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101.2		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 2x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č. 1,2,11,13,15,16,20,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,44,48,55,60

Položky, které nebudou do fakturované do množství díle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-478 459,71 Kč	0,00 Kč	-478 459,71 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum 22. 11. 2022	podpis
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 22. 11. 2022	podpis

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:50:45

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.27

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln celkem v Kč	rozdíln celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	7 223,700	0,000	-7 223,700	1,00	7 223,70	-7 223,70	0,00	0,00	-7 223,70	-100,00
2	014111.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	33,424	0,000	-33,424	150,00	5 013,60	-5 013,60	0,00	0,00	-5 013,60	-100,00
11	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	524,700	320,350	-204,350	190,00	99 693,00	-38 826,50	0,00	60 866,50	-38 826,50	-38,95
13	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6 173,700	5 976,335	-197,365	100,00	617 370,00	-19 736,50	0,00	597 633,50	-19 736,50	-3,20
15	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	343,200	209,540	-133,660	581,00	199 399,20	-77 656,46	0,00	121 742,74	-77 656,46	-38,95
16	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	125,186	76,444	-48,742	660,00	82 622,76	-32 169,72	0,00	50 453,04	-32 169,72	-38,94
20	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	33,000	20,136	-12,864	900,00	29 700,00	-11 577,60	0,00	18 122,40	-11 577,60	-38,98
23	567554.	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	34 250,910	34 246,420	-4,490	202,00	6 918 683,82	-906,98	0,00	6 917 776,84	-906,98	-0,01
25	572113.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	32 663,170	32 658,470	-4,700	12,00	391 958,04	-56,40	0,00	391 901,64	-56,40	-0,01
26	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	84 308,480	84 048,860	-259,620	8,00	674 467,84	-2 076,96	0,00	672 390,88	-2 076,96	-0,31
27	572214.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 373,000	1 362,600	-10,400	8,00	10 984,00	-83,20	0,00	10 900,80	-83,20	-0,76
28	57475.	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	7 276,900	6 995,000	-281,900	52,00	378 398,80	-14 658,80	0,00	363 740,00	-14 658,80	-3,87
29	574834.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	37 736,000	37 555,000	-181,000	165,00	6 226 440,00	-29 865,00	0,00	6 196 575,00	-29 865,00	-0,48
30	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	38 374,970	38 347,520	-27,450	253,00	9 708 867,41	-6 944,85	0,00	9 701 922,56	-6 944,85	-0,07

Za zhotovitele:

Datum: 22. 11. 2022

Za objednatele:

Datum: 22. 11. 2022



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 2

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:50:45

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 21120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -								č. ZBV č.27					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950)													
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	17 810,000	17 499,800	-310,200	157,00	2 796 170,00	-48 701,40	0,00	2 747 468,60	-48 701,40	-1,74
32	574E66.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 70MM	M2	15 444,380	15 350,120	-94,260	219,00	3 382 319,22	-20 642,94	0,00	3 361 676,28	-20 642,94	-0,61
33	574E88.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL 90MM	M2	7 345,550	7 296,000	-49,550	277,00	2 034 717,35	-13 725,35	0,00	2 020 992,00	-13 725,35	-0,67
34	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCEMÝM 5KG/M2	M2	34 942,350	34 937,240	-5,120	6,00	209 634,16	-30,72	0,00	209 623,44	-30,72	-0,01
35	577A2.	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M	343,100	72,600	-270,500	90,00	30 879,00	-24 345,00	0,00	6 534,00	-24 345,00	-78,84
37	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	300,000	201,470	-98,530	551,00	165 300,00	-54 290,03	0,00	111 009,97	-54 290,03	-32,84
44	9113B1.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	116,000	104,000	-12,000	748,00	86 768,00	-8 976,00	0,00	77 792,00	-8 976,00	-10,34
48	91238.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	24,000	14,000	-10,000	270,00	6 480,00	-2 700,00	0,00	3 780,00	-2 700,00	-41,67
55	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	986,000	975,000	-11,000	817,00	805 562,00	-8 987,00	0,00	796 575,00	-8 987,00	-1,12
60	969245.a	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	300,000	201,470	-98,530	500,00	150 000,00	-49 265,00	0,00	100 735,00	-49 265,00	-32,84
Celkem								35 018 671,96	-478 459,71	0,00	34 540 212,19	-478 459,71	-1,37
Celkem ve změně								44 170 065,28	-478 459,71	0,00	43 691 605,57	-478 459,71	-1,08
Všechny změny celkem								44 170 065,28	-478 459,71	1 251 087,85	44 942 693,42	-478 459,71	-1,08

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 003		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č.2,4,5

Položky, které nebudou do fakturované do množství díle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-16 820,00 Kč	0,00 Kč	-16 820,00 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 2. 11. 2022	podpis



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:51:10

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 003 - definitivní dopravní značení

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.28

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	23,000	21,000	-2,000	710,00	16 530,00	-1 420,00	0,00	14 910,00	-1 420,00	-8,70
4	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	16,000	-2,000	1 850,00	33 300,00	-3 700,00	0,00	29 600,00	-3 700,00	-11,11
5	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	2 709,500	2 651,000	-58,500	200,00	541 900,00	-11 700,00	0,00	530 200,00	-11 700,00	-2,16
		Celkem						591 530,00	-16 820,00	0,00	574 710,00	-16 820,00	-2,84
		Celkem ve změně						621 930,00	-16 820,00	0,00	605 110,00	-16 820,00	-2,70
		Všechny změny celkem						621 930,00	-16 820,00	0,00	605 110,00	-16 820,00	-2,70

Za zhotovitele:

Datum: 22. 11. 2022

Za objednatele:

Datum: 22. 11. 2022

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba

Číslo SO/PS/
Číslo změny
SO/PS

Číslo změny
stavby
29

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 004

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č. 1,2,12,13,21

Položky, které nebudou do fakturované do množství dle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-10 095,37 Kč	0,00 Kč	-10 095,37 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 22. 11. 22	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 22. 11. 22	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 22. 11. 22	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 22. 11. 22	podpis



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:51:32

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -								č. ZBV č.29					
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 004 - Propustky 152-046-047-048													
poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,200	0,000	-1,200	150,00	180,00	-180,00	0,00	0,00	-180,00	-100,00
2	014101.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	19,280	0,000	-19,280	1,00	19,28	-19,28	0,00	0,00	-19,28	-100,00
12	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,740	3,210	-0,530	2 933,00	11 044,22	-1 565,09	0,00	9 479,13	-1 565,09	-14,17
13	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,740	3,210	-0,530	6 000,00	22 440,00	-3 180,00	0,00	19 260,00	-3 180,00	-14,17
21	917211.	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	41,000	24,000	-17,000	303,00	12 423,00	-5 151,00	0,00	7 272,00	-5 151,00	-41,46
		Celkem						46 106,50	-10 095,37	0,00	36 011,13	-10 095,37	-21,90
		Celkem ve změně						343 550,17	-10 095,37	0,00	333 454,80	-10 095,37	-2,94
		Všechny změny celkem						343 550,17	-10 095,37	0,00	333 454,80	-10 095,37	-2,94

Za zhotovitele:

Datum:

22. 11. 2022

Za objednatele:

Datum:

22. 11. 2022

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 30
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 004		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č.1,14

Položky, které nebudou do fakturované do množství díle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-224 130,40 Kč	0,00 Kč	-224 130,40 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum 22. 11. 2021	podpis
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 22. 11. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 22. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 22. 11. 2021	podpis



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:51:57

Rozpis ocenění změn položek													
Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 005 - Propustky 152-049-050-051								č. ZBV č.30					
poř. č. polož.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl cen celkem v Kč	rozíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	150,400	0,000	-150,400	1,00	150,40	-150,40	0,00	0,00	-150,40	-100,00
14	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	67,000	29,670	-37,330	6 000,00	402 000,00	-223 980,00	0,00	178 020,00	-223 980,00	-55,72
		Celkem						402 150,40	-224 130,40	0,00	178 020,00	-224 130,40	-55,73
		Celkem ve změně						955 792,54	-224 130,40	0,00	731 662,14	-224 130,40	-23,45
		Všechny změny celkem						955 792,54	-224 130,40	310 045,49	1 041 707,63	-224 130,40	-23,45

Za zhotovitele:

Datum: 22. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum: 22. 11. 2022

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1.stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 31
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 006		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č.3,5,6,8,9

Položky, které nebudou do fakturované do množství díle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-167 661,10 Kč	0,00 Kč	-167 661,10 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	Jméno: Ing. Martin Staněk	datum 11. 11. 2021	podpis
Technický dozor Investora	Jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum 11. 11. 2021	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel	Jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum 11. 11. 2021	podpis
Zhotovitel	Jméno: Aleš Novák	datum 11. 11. 2021	podpis



Aspe

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:52:17

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2
 Číslo a název varianty: 1.0 -
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152
 Číslo a název rozpočtu: 006 - místní komunikace a hospodářské sjezdy

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. ZBV č.31

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozíl cen celkem v Kč	rozíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	572214.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 846,000	1 119,800	-726,200	8,00	14 768,00	-5 809,60	0,00	8 958,40	-5 809,60	-39,34
5	574B34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	923,000	559,900	-363,100	195,00	179 985,00	-70 804,50	0,00	109 180,50	-70 804,50	-39,34
6	574D36.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	923,000	559,900	-363,100	250,00	230 750,00	-90 775,00	0,00	139 975,00	-90 775,00	-39,34
8	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	433,800	430,400	-3,400	35,00	15 183,00	-119,00	0,00	15 064,00	-119,00	-0,78
9	919114.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	433,800	430,400	-3,400	45,00	19 521,00	-153,00	0,00	19 368,00	-153,00	-0,78
		Celkem						460 287,00	-167 661,10	0,00	292 545,90	-167 661,10	-36,43
		Celkem ve změně						890 992,60	-167 661,10	0,00	723 331,50	-167 661,10	-18,82
		Všechny změny celkem						890 992,60	-167 661,10	82 945,56	806 277,06	-167 661,10	-18,82

Za zhotovitele:

Datum:

22. 11. 2022

Za objednatele:

Datum:

22. 11. 2022

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba

Číslo SO/PS/

Číslo změny

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 007

Číslo změny

stavby

SO/PS

32

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č.2,3,4

Položky, které nebudou do fakturované do množství dle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-4 576,20 Kč	0,00 Kč	-4 576,20 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno: Ing. Martin Staněk datum podpis

Technický dozor Investora jméno: Ing. Břetislav Mutl datum 22. 11. 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno: Ing. Miroslav Dokulil datum 22. 11. 2022 podpis

Zhotovitel jméno: Aleš Novák datum 22. 11. 2022 podpis



Asne

Firma: COLAS CZ, a.s.

Strana: 1

3.13.1

Datum: 15.11.2022

Čas: 12:52:40

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 211120609 DI2 - II/152 Hrotovice - Dukovany DI2								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: 1.0 -													
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice II/152													
Číslo a název rozpočtu: 007 - vedlejší aktivita								č. ZBV č.32					
pof. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíln cen celkem v Kč	rozdíln cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	87633.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	34,000	29,000	-5,000	201,00	6 834,00	-1 005,00	0,00	5 829,00	-1 005,00	-14,71
3	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	6,400	4,000	-2,400	373,00	2 387,20	-895,20	0,00	1 492,00	-895,20	-37,50
4	91781.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	32,000	20,000	-12,000	223,00	7 136,00	-2 676,00	0,00	4 460,00	-2 676,00	-37,50
		Celkem						16 357,20	-4 576,20	0,00	11 781,00	-4 576,20	-27,98
		Celkem ve změně						57 157,20	-4 576,20	0,00	52 581,00	-4 576,20	-8,01
		Všechny změny celkem						57 157,20	-4 576,20	0,00	52 581,00	-4 576,20	-8,01

Za zhotovitele:

Datum:

22. 11. 2022

Za objednavatele:

Datum:

22. 11. 2022

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/152 Hrotovice – Dukovany, 1. stavba	Číslo SO/PS/ Číslo změny SO/PS	Číslo změny stavby 33
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen smlouva): 3.6.2021

Objednatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Ruběška 215/1, 190 00 Praha 9

Obsah:

Soupis prací - počet stran A4 1x

Iniciátor změny: ☒ zhotovitel ☐ objednatel ☐ projektant ☐

Odůvodnění a popis změny:

Vícepráce:

Méněpráce:

pol. č. 1, 2, 3, 4, 5

Položky, které nebudou do fakturované do množství dle PD, ale na základě geodetického zaměření a skutečnosti

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méně a Víceprací celkem
-17 744,75 Kč	0,00 Kč	-17 744,75 Kč

Vyjádření – souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno: Ing. Martin Staněk	datum	podpis
Technický dozor Investora	jméno: Ing. Břetislav Mutl	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy....			
Objednatel	jméno: Ing. Miroslav Dokulil	datum	podpis
Zhotovitel	jméno: Aleš Novák	datum 27. 11. 2022	podpis

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: 211120409 D12 - II/152 Hrotovice - Dukovany D12

Číslo a název varianty: 1.0-

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 152-023

Číslo a název rozpočtu: 001 - Most ev.č. 152-023

č. ZBV č.33

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014101.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	79,185	0,000	-79,185	150,00	11 877,75	-11 877,75	0,00	0,00	-11 877,75	-100,00
1	014101.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	189,496	0,000	-189,496	1,00	189,50	-189,50	0,00	0,00	-189,50	-100,00
2	014101.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	28,490	0,000	-28,490	150,00	4 273,50	-4 273,50	0,00	0,00	-4 273,50	-100,00
4	014101.D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	9,000	0,000	-9,000	150,00	1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	-1 350,00	-100,00
5	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,360	0,000	-0,360	150,00	54,00	-54,00	0,00	0,00	-54,00	-100,00
		Celkem						17 744,75	-17 744,75	0,00	0,00	-17 744,75	-100,00
		Celkem ve změně						5 068 478,95	-17 744,75	0,00	5 050 734,20	-17 744,75	-0,35
		Všechny změny celkem						5 068 478,95	-658 113,59	396 320,56	4 806 685,92	-17 744,75	-0,35

Za zhotovitele:

Datum: 22. 11. 2022

Za objednatele:

Datum:

22. 11. 2022
